



Příloha č. 5 Harmonogram

ID	Režim úkolu/WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	1	SO 204 Nadjezd na silnici II/634 (Rudolfovská)	752 dny	02.05.	21.10.24	
2	1.1	Příprava	2 dny	02.05.	203.05.22	
3	1.2	I. Etapa	424 dny	04.05.	228.08.23	
4	1.2.1	Výkopy vč. záporového pažení	44 dny	04.05.	216.06.22	
5	1.2.1.1	Sejmutí ornice vč. odvozu a uložení	1 den	04.05.	204.05.222	
6	1.2.1.2	Provádění výkopů po úroveň provádění pa	7 dny	05.05.	211.05.225	
7	1.2.1.3	Uložení zeminy na mezideponie a skládky	7 dny	05.05.	211.05.226SS	
8	1.2.1.4	Záporové pažení z kovu	9 dny	12.05.	220.05.226	
9	1.2.1.5	Provádění výkopů na základovou spáru vč	10 dny	21.05.	230.05.228	
10	1.2.1.6	Uložení zeminy na mezideponie a skládky	10 dny	21.05.	230.05.229SS	
11	1.2.1.7	Výdřeva záporového pažení	15 dny	23.05.	206.06.229SS+2 dny	
12	1.2.1.8	Vrty pro kotvení pažení	8 dny	07.06.	214.06.2211	
13	1.2.1.9	Zemní kotvy pro pažení	8 dny	09.06.	216.06.2212SS+2 dny	
14	1.2.2	Spodní stavba	169 dny	17.06.	202.12.22	
15	1.2.2.1	Základy	39 dny	17.06.	225.07.22	
16	1.2.2.1	Podkladní beton pod základy - dolní	1 den	17.06.	217.06.2213	
17	1.2.2.1	Podkladní beton pod základy - horní	1 den	19.06.	219.06.2216FS+1 den	
18	1.2.2.1	Bednění a vázání výztuže základů segm	10 dny	20.06.	229.06.2217	
19	1.2.2.1	Betonáž základů segmenty 6, 4, 2	2 dny	30.06.	201.07.2218	
20	1.2.2.1	Odbednění základů segmenty 6, 4, 2	1 den	05.07.	205.07.2219FS+3 dny	
21	1.2.2.1	Bednění a vázání výztuže základů segm	10 dny	02.07.	211.07.2219	
22	1.2.2.1	Betonáž základů segmenty 5, 3, 1	2 dny	12.07.	213.07.2221	
23	1.2.2.1	Odbednění základů segmenty 5, 3, 1	1 den	17.07.	217.07.2222FS+3 dny	
24	1.2.2.1	Vypnění prostoru mezi základy a pažen	2 dny	18.07.	219.07.2223	
25	1.2.2.1	Odstarnění záporového pažení	5 dny	21.07.	225.07.2224FS+1 den	
26	1.2.2.2	Rámové stojky (dířky)	130 dny	26.07.	202.12.22	
27	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 6 - P2 spodek	5 dny	26.07.	230.07.2225	
28	1.2.2.2	Bednění segment 6 - P2 spodek	4 dny	31.07.	203.08.2227	
29	1.2.2.2	Betonáž segment 6 - P2 spodek	1 den	04.08.	204.08.2228	
30	1.2.2.2	Odbednění segment 6 - P2 spodek	1 den	14.08.	214.08.2232	
31	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 4 - P2 spodek	5 dny	05.08.	209.08.2229	
32	1.2.2.2	Bednění segment 4 - P2 spodek	4 dny	10.08.	213.08.2231	
33	1.2.2.2	Betonáž segment 4 - P2 spodek	1 den	15.08.	215.08.2230	
34	1.2.2.2	Odbednění segment 4 - P2 spodek	1 den	26.08.	226.08.2237	
35	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 2 - P2 spodek	5 dny	16.08.	220.08.2233	

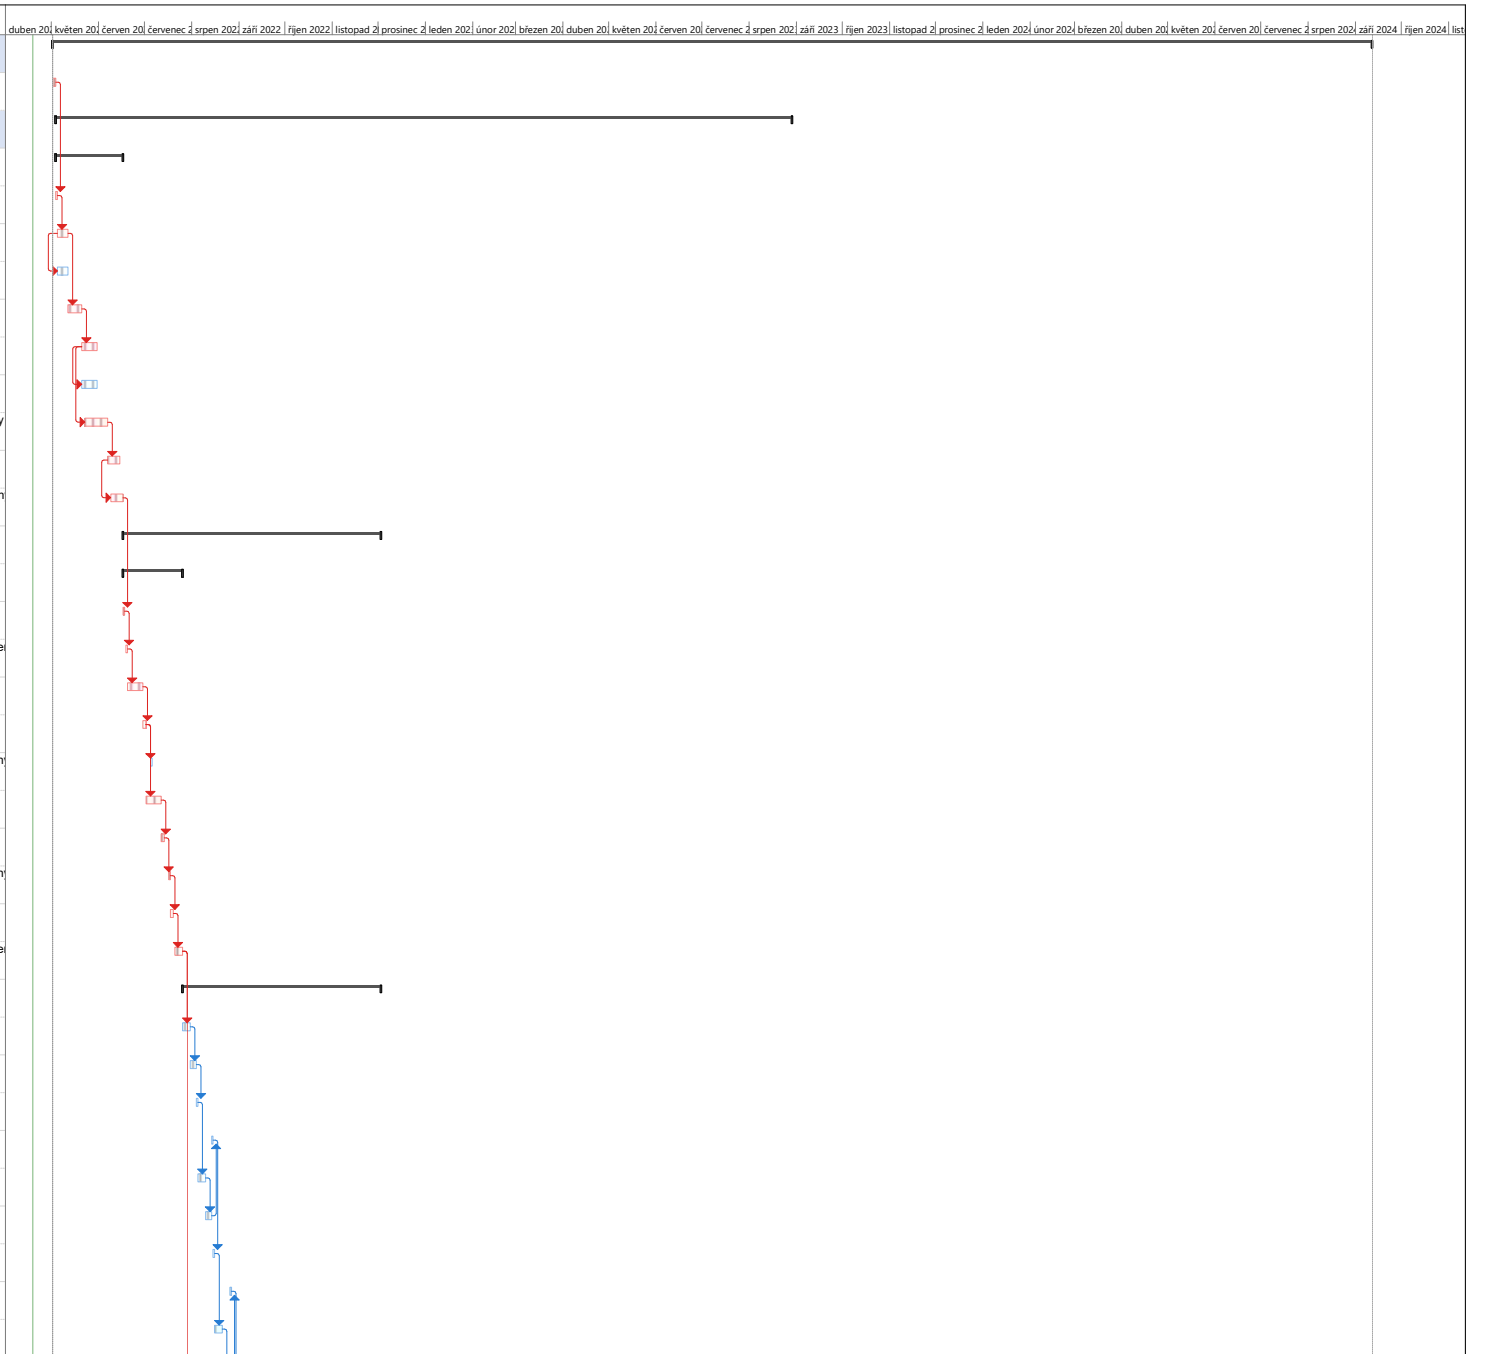

ID	RežirKód úkol,WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	duben 20	květen 20	červen 20	červenec 2	srpen 202	září 2022	říjen 2022	listopad 2	prosinec 2	leden 202	únor 202	březen 20	duben 20	květen 20	červen 20	červenec 2	srpen 202	září 2023	říjen 2023	listopad 2	prosinec 2	leden 202	únor 202	březen 20	duben 20	květen 20	červen 20	červenec 2	srpen 202	září 2024	říjen 2024	list	
71	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 1 - P2 hořejšek	5 dny	02.11. 206.11.	2267																																		
72	1.2.2.2	Bednění segment 1 - P2 hořejšek	4 dny	09.11. 212.11.	2269;71																																		
73	1.2.2.2	Betonáž segment 1 - P2 hořejšek	1 den	13.11. 213.11.	2272																																		
74	1.2.2.2	Odbednění segment 1 - P2 hořejšek	1 den	17.11. 217.11.	2270FS+1 de																																		
75	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 6 - O1	7 dny	26.07. 201.08.	2225																																		
76	1.2.2.2	Bednění segment 6 - O1	6 dny	01.08. 206.08.	2275SS+6 dn																																		
77	1.2.2.2	Betonáž segment 6 - O1	1 den	07.08. 207.08.	2276																																		
78	1.2.2.2	Odbednění segment 6 - O1	1 den	15.08. 215.08.	2281																																		
79	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 6 - O3	7 dny	02.08. 208.08.	2275																																		
80	1.2.2.2	Bednění segment 6 - O3	6 dny	08.08. 213.08.	2277;79FS-1																																		
81	1.2.2.2	Betonáž segment 6 - O3	1 den	14.08. 214.08.	2280																																		
82	1.2.2.2	Odbednění segment 6 - O3	1 den	23.08. 223.08.	2285																																		
83	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 4 - O1	7 dny	09.08. 215.08.	2279																																		
84	1.2.2.2	Bednění segment 4 - O1	6 dny	16.08. 221.08.	2278;83																																		
85	1.2.2.2	Betonáž segment 4 - O1	1 den	22.08. 222.08.	2284																																		
86	1.2.2.2	Odbednění segment 4 - O1	1 den	31.08. 231.08.	2289																																		
87	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 4 - O3	7 dny	16.08. 222.08.	2283																																		
88	1.2.2.2	Bednění segment 4 - O3	6 dny	24.08. 229.08.	2282;87																																		
89	1.2.2.2	Betonáž segment 4 - O3	1 den	30.08. 230.08.	2288																																		
90	1.2.2.2	Odbednění segment 4 - O3	1 den	08.09. 208.09.	2293																																		
91	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 2 - O1	7 dny	23.08. 229.08.	2287																																		
92	1.2.2.2	Bednění segment 2 - O1	6 dny	01.09. 206.09.	2286;91																																		
93	1.2.2.2	Betonáž segment 2 - O1	1 den	07.09. 207.09.	2292																																		
94	1.2.2.2	Odbednění segment 2 - O1	1 den	16.09. 216.09.	2297																																		
95	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 2 - O3	7 dny	30.08. 205.09.	2291																																		
96	1.2.2.2	Bednění segment 2 - O3	6 dny	09.09. 214.09.	2290;95																																		
97	1.2.2.2	Betonáž segment 2 - O3	1 den	15.09. 215.09.	2296																																		
98	1.2.2.2	Odbednění segment 2 - O3	1 den	24.09. 224.09.	22101																																		
99	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 5 - O1	7 dny	06.09. 212.09.	2295																																		
100	1.2.2.2	Bednění segment 5 - O1	6 dny	17.09. 222.09.	2294;99																																		
101	1.2.2.2	Betonáž segment 5 - O1	1 den	23.09. 223.09.	22100																																		
102	1.2.2.2	Odbednění segment 5 - O1	1 den	02.10. 202.10.	22105																																		
103	1.2.2.2	Vázání výztuže segment 5 - O3	7 dny	13.09. 219.09.	2299																																		
104	1.2.2.2	Bednění segment 5 - O3	6 dny	25.09. 230.09.	2298;103																																		
105	1.2.2.2	Betonáž segment 5 - O3	1 den	01.10. 201.10.	22104																																		

ID	RežirKód úkol/WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	duben 20 květen 20 červen 20 červenec 2 srpen 202 září 2022 říjen 2022 listopad 2 prosinec 2 leden 202 únor 202 březen 20 duben 20 květen 20 červen 20 červenec 2 srpen 202 září 2023 říjen 2023 listopad 2 prosinec 2 leden 202 únor 202 březen 20 duben 20 květen 20 červen 20 červenec 2 srpen 202 září 2024 říjen 2024 list																							
211	1.3.3.1	Izolace NK	7 dny	19.02.	225.02.	24210																								
212	1.3.4	Zásypy vč. izolace	24 dny	26.02.	220.03.	24																								
213	1.3.4.1	Izolace	6 dny	26.02.	202.03.	24211																								
214	1.3.4.2	Drenáž	4 dny	03.03.	206.03.	24213																								
215	1.3.4.3	Zásyp	12 dny	07.03.	218.03.	24214																								
216	1.3.4.4	Odstranění pažení	10 dny	11.03.	220.03.	24215SS+4 d																								
217	1.3.5	Římsy	29 dny	19.03.	216.04.	24																								
218	1.3.5.1	Bednění a vázání výztuže	21 dny	19.03.	208.04.	24215																								
219	1.3.5.2	Betonáž	2 dny	09.04.	210.04.	24218																								
220	1.3.5.3	Odbednění	2 dny	11.04.	212.04.	24219																								
221	1.3.5.4	Nátěry	4 dny	13.04.	216.04.	24220																								
222	1.4	III. Etapa	148 dny	17.04.	211.09.	24																								
223	1.4.1	PHS	11 dny	17.04.	227.04.	24221																								
224	1.4.2	Terénní úpravy	30 dny	28.04.	227.05.	24																								
225	1.4.2.1	Vývališťe	13 dny	28.04.	210.05.	24223																								
226	1.4.2.2	Schodiště	14 dny	11.05.	224.05.	24225																								
227	1.4.2.3	Rozprostření ornice	3 dny	25.05.	227.05.	24226																								
228	1.4.2.4	Zábradlí na římsách	10 dny	28.04.	207.05.	24223																								
229	1.4.3	Provedení dálnice pod mostem (SO 101)	110 dny	25.05.	211.09.	24226																								
230	1.5	<i>Hlavní mostní prohlídka</i>	0 dny	11.09.	211.09.	24229																								

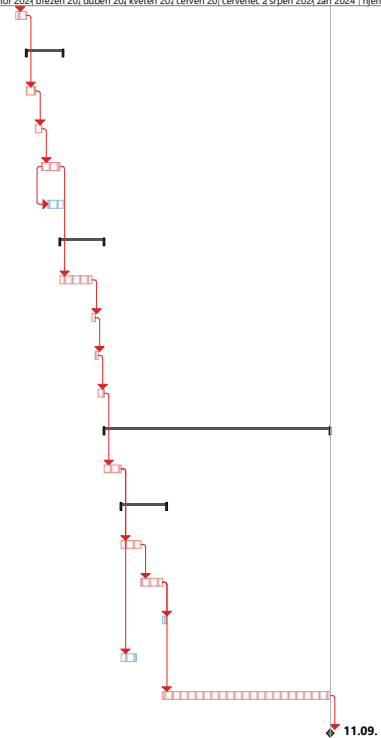



Projekt: Harmonogram SO 204 Datum: 19.04.22	Úkol		Souhm projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Kritický			
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhnmém úkolu		Vnější úkoly		Kritické rozdělení			
	Souhrnný		Neaktivní souhm		Ruční souhm		Vnější milník		Průběh			
