


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	XII	1. čtvrtletí	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	1. čtvrtletí	II	III	IV	V
1		Příloha č.2.1.2-METODA SOUBĚŽNÁ 292 dny	02.01. 24	12.02. 25																					
2		TE0 - Přípravné práce	3 dny	02.01. 24	04.01. 24																				
3		Obj4 - Přípravné práce	3 dny	02.01. 24	04.01. 24		5;26SS																		
4		TE1 - Demolice	92 dny	05.01. 24	13.05. 24																				
5		Obj4 - Demolice	92 dny	05.01. 24	13.05. 24	3	28SS;7FS-2																		
6		TE2 - Zemní práce a základové konstrukce	80 dny	18.04. 24	07.08. 24																				
7		Obj4 - Zemní práce a základové konstrukce	35 dny	18.04. 24	05.06. 24	5FS-25 dn	10;30SS																		
8		Obj4 - Zemní práce a základové konstrukce	11 dny	24.07. 24	07.08. 24	10FS-3 dn																			
9		TE3 - Hrubá spodní stavba	37 dny	06.06. 24	26.07. 24																				
10		Obj4 - Hrubá spodní stavba	37 dny	06.06. 24	26.07. 24	7	8FS-3 dny																		
11		TE4 - Hrubé stavební práce	69 dny	10.05. 24	14.08. 24																				
12		Obj4 - Hrubé stavební práce	69 dny	10.05. 24	14.08. 24	5FS-3 dny	14FS-10 dn																		
13		TE5 - Zastřešení	35 dny	01.08. 24	18.09. 24																				
14		Obj4 - Zastřešení	35 dny	01.08. 24	18.09. 24	12FS-10 d	34SS																		
15		TE6 - Hrubé vnitřní práce	69 dny	11.07. 24	15.10. 24																				
16		Obj4 - Hrubé vnitřní práce	69 dny	11.07. 24	15.10. 24	12FS-34 d	36SS;18SS+																		
17		TE7 - Vnitřní úpravy povrchů	85 dny	27.08. 24	23.12. 24																				
18		Obj4 - Vnitřní úpravy povrchů	85 dny	27.08. 24	23.12. 24	16SS+33 c	20FS-26 dn																		
19		TE8 - Vnitřní komplectace	56 dny	27.11. 24	12.02. 25																				
20		Obj4 - Vnitřní komplectace	56 dny	27.11. 24	12.02. 25	18FS-26 d	40SS																		
21		TE9 - Fasádní práce	62 dny	22.08. 24	15.11. 24																				
22		Obj4 - Fasádní práce	62 dny	22.08. 24	15.11. 24		24;42SS																		
23		TE10 - Vnější práce	36 dny	18.11. 24	06.01. 25																				
24		Obj4 - Vnější práce	36 dny	18.11. 24	06.01. 25	22	44SS																		
25		TE0 - Přípravné práce	4 dny	02.01. 24	05.01. 24																				
26		Hal1 - Přípravné práce	4 dny	02.01. 24	05.01. 24	3SS																			
27		TE1 - Demolice	27 dny	05.01. 24	12.02. 24																				
28		Hal1 - Demolice	27 dny	05.01. 24	12.02. 24	5SS																			
29		TE2 - Zemní práce a podkladní vrstvy	6 dny	18.04. 24	25.04. 24																				
30		Hal1 - Zemní práce a podkladní vrstvy	6 dny	18.04. 24	25.04. 24	7SS																			
31		TE3 - Hrubé stavební práce	9 dny	10.05. 24	22.05. 24																				
32		Hal1 - Hrubé stavební práce	9 dny	10.05. 24	22.05. 24	12SS																			
33		TE4 - Zastřešení	21 dny	01.08. 24	29.08. 24																				
34		Hal1 - Zastřešení	21 dny	01.08. 24	29.08. 24	14SS																			
35		TE5 - Hrubé vnitřní rozvody	11 dny	11.07. 24	25.07. 24																				
36		Hal1 - Hrubé vnitřní rozvody	11 dny	11.07. 24	25.07. 24	16SS																			
37		TE6 - Vnitřní úpravy povrchů	28 dny	27.08. 24	03.10. 24																				
38		Hal1 - Vnitřní úpravy povrchů	28 dny	27.08. 24	03.10. 24	18SS																			
39		TE7 - Vnitřní komplectace	19 dny	27.11. 24	23.12. 24																				
40		Hal1 - Vnitřní komplectace	19 dny	27.11. 24	23.12. 24	20SS																			
41		TE8 - Fasádní práce	28 dny	22.08. 24	30.09. 24																				
42		Hal1 - Fasádní práce	28 dny	22.08. 24	30.09. 24	22SS																			
43		TE9 - Vnější práce	13 dny	18.11. 24	04.12. 24																				
44		Hal1 - Vnější práce	13 dny	18.11. 24	04.12. 24	24SS																			

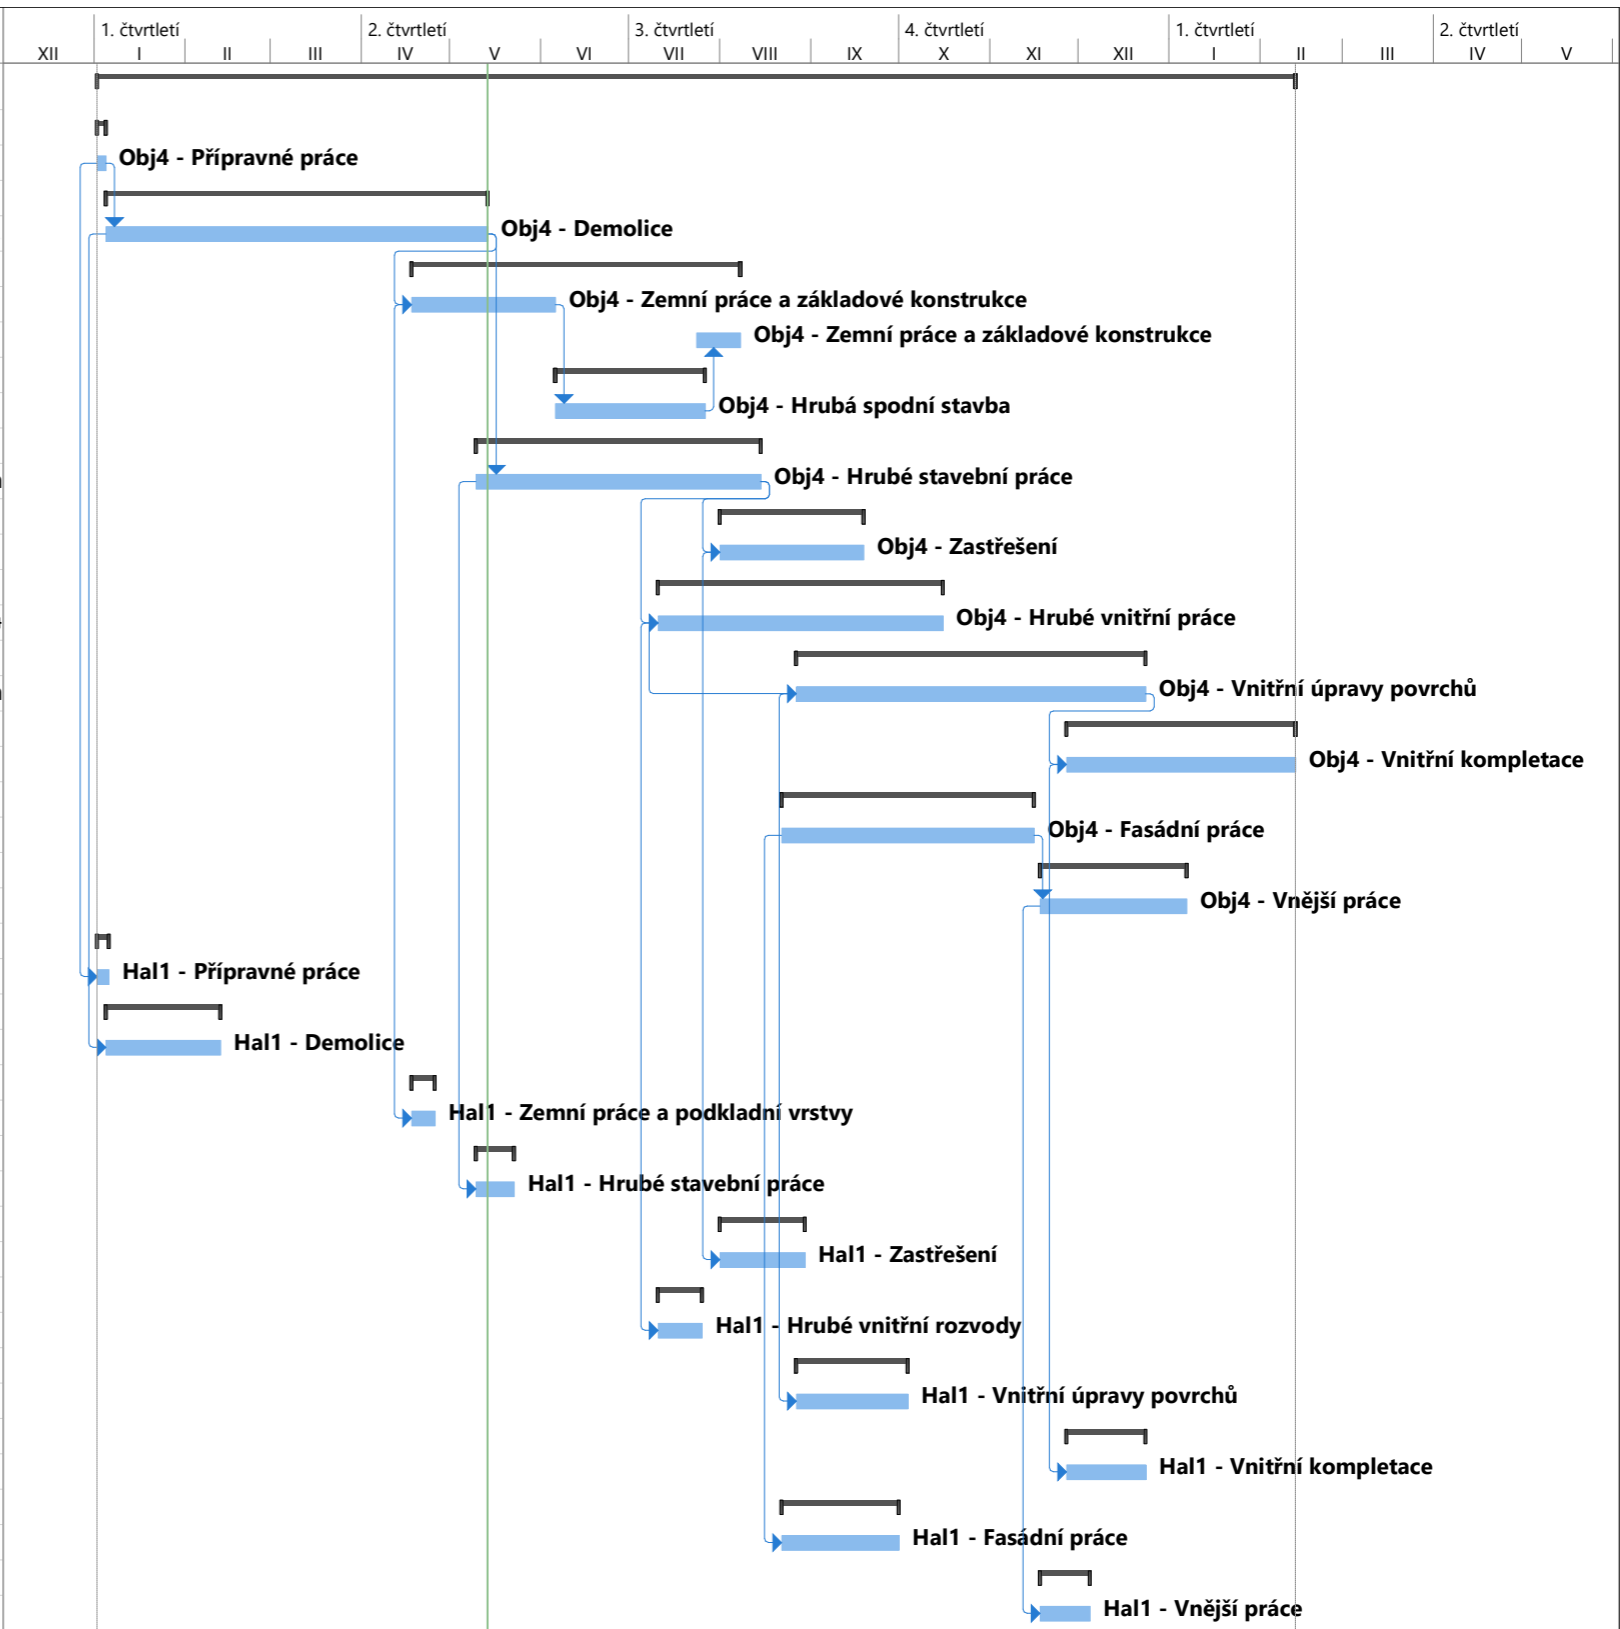

Projekt: PR02 project Datum: 14.05. 24	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			
