


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	ok	1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok					
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.				
1	<b>Stavba stanice metra s ražbou</b>	<b>1172,88 dny</b>	<b>1.2. 18</b>	<b>1.8. 22</b>																					
2	<b>1. etapa</b>	<b>185 dny</b>	<b>1.2. 18</b>	<b>17.10. 18</b>																					
3	<b>Příprava staveniště vč. Přeložek</b>	<b>185 dny</b>	<b>1.2. 18</b>	<b>17.10. 18</b>																					
4	vytyčení ZS	30 dny	1.2. 18	14.3. 18																					
5	oplocení ZS	30 dny	1.2. 18	14.3. 18																					
6	sejmutí ornice	30 dny	15.3. 18	25.4. 18																					
7	kácení	5 dny	15.3. 18	21.3. 18																					
8	demolice	20 dny	15.3. 18	11.4. 18																					
9	ochrana ing. Sí	1 den	15.3. 18	15.3. 18																					
10	vjezdy a výjezdy ze ZS	14 dny	16.3. 18	4.4. 18																					
11	přípojky ZS	30 dny	5.4. 18	16.5. 18																					

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	K	1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok	
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
12	provizorní cho	40 dny	15.3. 18	9.5. 18																	
13	buňkoviště	60 dny	17.5. 18	8.8. 18																	
14	zpevnění terér	14 dny	17.5. 18	5.6. 18																	
15	zápory	30 dny	6.9. 18	17.10. 18																	
16	svahování	50 dny	28.6. 18	5.9. 18																	
17	zajištění přelož	14 dny	17.5. 18	5.6. 18																	
18	<b>Příprava staveniště vč.</b>	<b>32 dny</b>	<b>9.8. 18</b>	<b>21.9. 18</b>																	
19	vytyčení ZS	10 dny	9.8. 18	22.8. 18																	
20	oplocení ZS	10 dny	9.8. 18	22.8. 18																	
21	sejmutí ornice	20 dny	23.8. 18	19.9. 18																	
22	kácení	5 dny	23.8. 18	29.8. 18																	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	ok	1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok	
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
23	demolice	10 dny	23.8. 18	5.9. 18																	
24	ochrana ing. Sí	1 den	23.8. 18	23.8. 18																	
25	vjezdy a výjezdy ze ZS	7 dny	24.8. 18	3.9. 18																	
26	přípojky ZS	7 dny	24.8. 18	3.9. 18																	
27	zařízení ZS	5 dny	24.8. 18	30.8. 18																	
28	zpevnění terér	10 dny	4.9. 18	17.9. 18																	
29	zajištění přelož	14 dny	4.9. 18	21.9. 18																	
30	<b>2 etapa-zajištění severní části jámy</b>	<b>140 dny</b>	<b>24.9. 18</b>	<b>5.4. 19</b>																	
31	zajištění severní části vozovky	13 dny	24.9. 18	10.10. 18																	
32	konstrukce pro provizorní	2 dny	11.10. 18	12.10. 18																	
33	přeložky na přemostění	14 dny	15.10. 18	1.11. 18																	
34	zajištění zbytku ja	57 dny	11.10. 18	28.12. 18																	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	ok	1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok	
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
35	těžba severní část	70 dny	31.12. 19	15.4. 19	IV.																
36	<b>3. etapa-zajištění jižní části jámy</b>	<b>145 dny</b>	<b>31.12. 19</b>	<b>19.7. 19</b>																	
37	zajištění jižní části vozovky pilotama, a zajištění pod	14 dny	31.12. 19	17.1. 19																	
38	konstrukce pro provizorní přemostění	3 dny	18.1. 19	22.1. 19																	
39	přeložky na přemostění	14 dny	23.1. 19	11.2. 19																	
40	zajištění zbytku jámy	50 dny	12.2. 19	22.4. 19																	
41	těžba jižní části	64 dny	23.4. 19	19.7. 19																	
42	<b>4. etapa-přeložení TBM, stavba 2. dílu. Úseků stanice</b>	<b>160 dny</b>	<b>23.4. 19</b>	<b>2.12. 19</b>																	
43	příprava staveniště pro	30 dny	23.4. 19	3.6. 19																	
44	pásová doprava na deponii	7 dny	23.4. 19	1.5. 19																	
45	základová deska, včetně jedné kolébky a startovací konstrukce	40 dny	23.4. 19	17.6. 19																	
46	protažení štítu s přeložením pásové dopravy,	60 dny	18.6. 19	9.9. 19																	

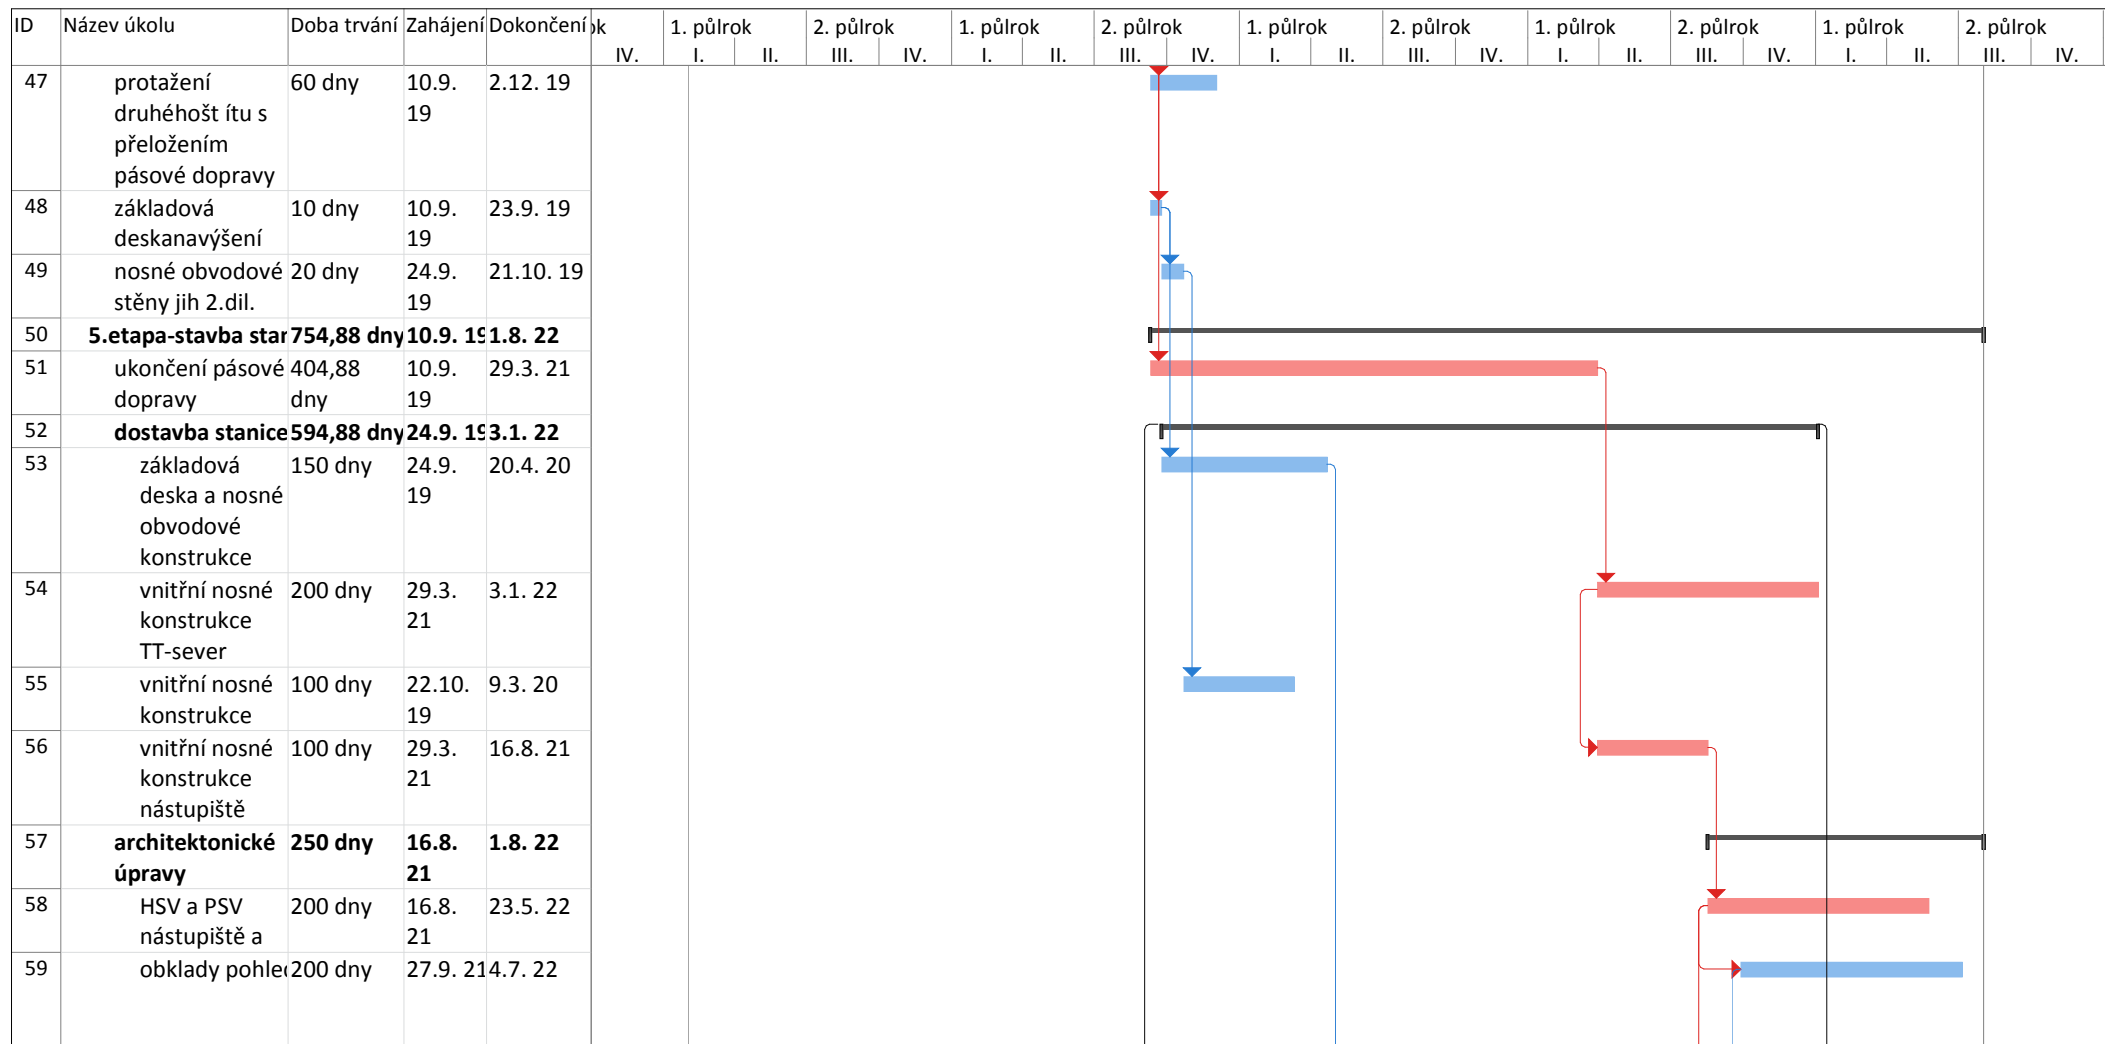

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	ok	1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok		1. půlrok		2. půlrok	
						I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
60	dokončovací p	180 dny	8.11. 21	18.7. 22																	
61	kabely vytápěr	220 dny	27.9. 21	1.8. 22																	
62	zásypy a izolace stanice	90 dny	21.4. 20	24.8. 20																	
63	výstavba podcho	20 dny	24.9. 19	21.10. 19																	
64	úklid staveniště	30 dny	3.1. 22	14.2. 22																	
65	úprava povrchů	100 dny	14.2. 22	24.7. 22																	
