



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	17/07/	21/ srpen 21/08/	25/09/	01/ listopad 30/10/	04/12/	11/ leden 08/01/	12/02/	21/ březen 19/03/	23/04/	01/ červen 28/05/	02/07/	11/ srpen 06/08/	10/09/	21/ říjen 15/10/	19/11/	01/ leden 24/12/	28/01/	11/ březen 04/03/	
1	ZAČÁTEK PROJEKTU	0 dny	04/09/ 2017 09:00	04/09/ 2017 09:00	5SS																			
2	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY - SO01	353 dny	04/09/ 2017 09:00	30/01/ 2019 18:00			04/09/																	
3	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A PŘÍPRAVNÉ BOURACÍ PRÁCE	352 dny	04/09/ 2017 09:00	29/01/ 2019 18:00																				
4	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	8 dny	04/09/ 2017 09:00	13/09/ 2017 18:00																				
5	Geodetické práce	1 den	04/09/ 2017 09:00	04/09/ 2017 18:00																				
6	Zařízení staveniště	6 dny	04/09/ 2017 09:00	11/09/ 2017 18:00	5SS																			
7	Staveništní výtah sloupový - 1 kpl	3 dny	07/09/ 2017 09:00	11/09/ 2017 18:00	6FF																			
8	Jeřáb věžový Liebherr 130 EC-B6 - 1 kpl	2 dny	12/09/ 2017 09:00	13/09/ 2017 18:00	6																			
9	ZÁVĚREČNÝ ÚKLID A ROZEBRÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	30 dny	13/12/ 2018 09:00	29/01/ 2019 18:00																				
10	Demontáž jeřábu	1 den	13/12/ 2018 09:00	13/12/ 2018 18:00	304																			
11	Demontáž výtahu	2 dny	03/01/ 2019 09:00	04/01/ 2019 18:00	378FS-1 den																			
12	Rozebrání staveniště	2 dny	11/01/ 2019 09:00	14/01/ 2019 18:00	11FS+4 dny																			
13	Závěrečný úklid	11 dny	15/01/ 2019 09:00	29/01/ 2019 18:00	12																			
14	PŘÍPRAVNÉ BOURACÍ PRÁCE	26 dny	12/09/ 2017 09:00	18/10/ 2017 18:00																				
15	Odpojení objektu	1 den	12/09/ 2017 09:00	12/09/ 2017 18:00	6																			
16	Dmtž koncových prvků, Z.P., otop. těles, dveří a skleň. p	2 dny	13/09/ 2017 09:00	14/09/ 2017 18:00	15																			
17	Demontáž podhledů a rozvodů v podhledech	4 dny	15/09/ 2017 09:00	20/09/ 2017 18:00	16																			
18	Dmtž obkladů, omítek SDK příček a rozvodů ve stěnách	6 dny	21/09/ 2017 09:00	29/09/ 2017 18:00	17																			
19	Demontáž vrstev podlah včetně rozvodů v podlaze	16 dny	22/09/ 2017 09:00	16/10/ 2017 18:00	18SS+1 den																			
20	Bourání příček a zárubní	8 dny	06/10/ 2017 09:00	17/10/ 2017 18:00	19FF+1 den																			
21	Demontáž svislých rozvodů a výtahů	3 dny	16/10/ 2017 09:00	18/10/ 2017 18:00	20FF+1 den																			
22	BOURACÍ PRÁCE STATIKA (I. ETAPA)	65 dny	17/10/ 2017 09:00	19/01/ 2018 18:00																				
23	9.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	6 dny	17/10/ 2017 09:00	24/10/ 2017 18:00																				
24	9.NP - Bourání stropů	3 dny	17/10/ 2017 09:00	19/10/ 2017 18:00	21SS+1 den																			
25	9.NP - Bourání zdiva	3 dny	20/10/ 2017 09:00	24/10/ 2017 18:00	24																			
26	8.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	4 dny	25/10/ 2017 09:00	30/10/ 2017 18:00																				
27	8.NP - Bourání stropů	3 dny	25/10/ 2017 09:00	27/10/ 2017 18:00	25																			
28	8.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	30/10/ 2017 09:00	30/10/ 2017 18:00	27																			
29	7.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	5 dny	31/10/ 2017 09:00	06/11/ 2017 18:00																				
30	7.NP - Bourání stropů	4 dny	31/10/ 2017 09:00	03/11/ 2017 18:00	28																			
31	7.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	06/11/ 2017 09:00	06/11/ 2017 18:00	30																			
32	6.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	5 dny	07/11/ 2017 09:00	13/11/ 2017 18:00																				
33	6.NP - Bourání stropů	4 dny	07/11/ 2017 09:00	10/11/ 2017 18:00	31																			
34	6.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	13/11/ 2017 09:00	13/11/ 2017 18:00	33																			
35	5.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	6 dny	14/11/ 2017 09:00	22/11/ 2017 18:00																				
36	5.NP - Bourání stropů	5 dny	14/11/ 2017 09:00	21/11/ 2017 18:00	34																			
37	5.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	22/11/ 2017 09:00	22/11/ 2017 18:00	36																			
38	4.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	6 dny	23/11/ 2017 09:00	30/11/ 2017 18:00																				
39	4.NP - Bourání stropů	5 dny	23/11/ 2017 09:00	29/11/ 2017 18:00	37																			
40	4.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	30/11/ 2017 09:00	30/11/ 2017 18:00	39																			
41	3.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	6 dny	01/12/ 2017 09:00	08/12/ 2017 18:00																				
42	3.NP - Bourání stropů	5 dny	01/12/ 2017 09:00	07/12/ 2017 18:00	40																			
43	3.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	08/12/ 2017 09:00	08/12/ 2017 18:00	42																			
44	2.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	5 dny	11/12/ 2017 09:00	15/12/ 2017 18:00																				
45	2.NP - Bourání stropů	4 dny	11/12/ 2017 09:00	14/12/ 2017 18:00	43																			
46	2.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	15/12/ 2017 09:00	15/12/ 2017 18:00	45																			
47	1.NP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	6 dny	18/12/ 2017 09:00	27/12/ 2017 18:00																				
48	1.NP - Bourání stropů	5 dny	18/12/ 2017 09:00	22/12/ 2017 18:00	46																			
49	1.NP - Bourání zdiva - výtahová šachta	1 den	27/12/ 2017 09:00	27/12/ 2017 18:00	48																			
50	1.PP - BOURACÍ PRÁCE STATIKA - I. ETAPA	16 dny	28/12/ 2017 09:00	19/01/ 2018 18:00																				
51	1.PP - Bourání stropů	6 dny	28/12/ 2017 09:00	05/01/ 2018 18:00	49																			
52	1.PP - Bourání zdiva - výtahová šachta	4 dny	08/01/ 2018 09:00	11/01/ 2018 18:00	51																			

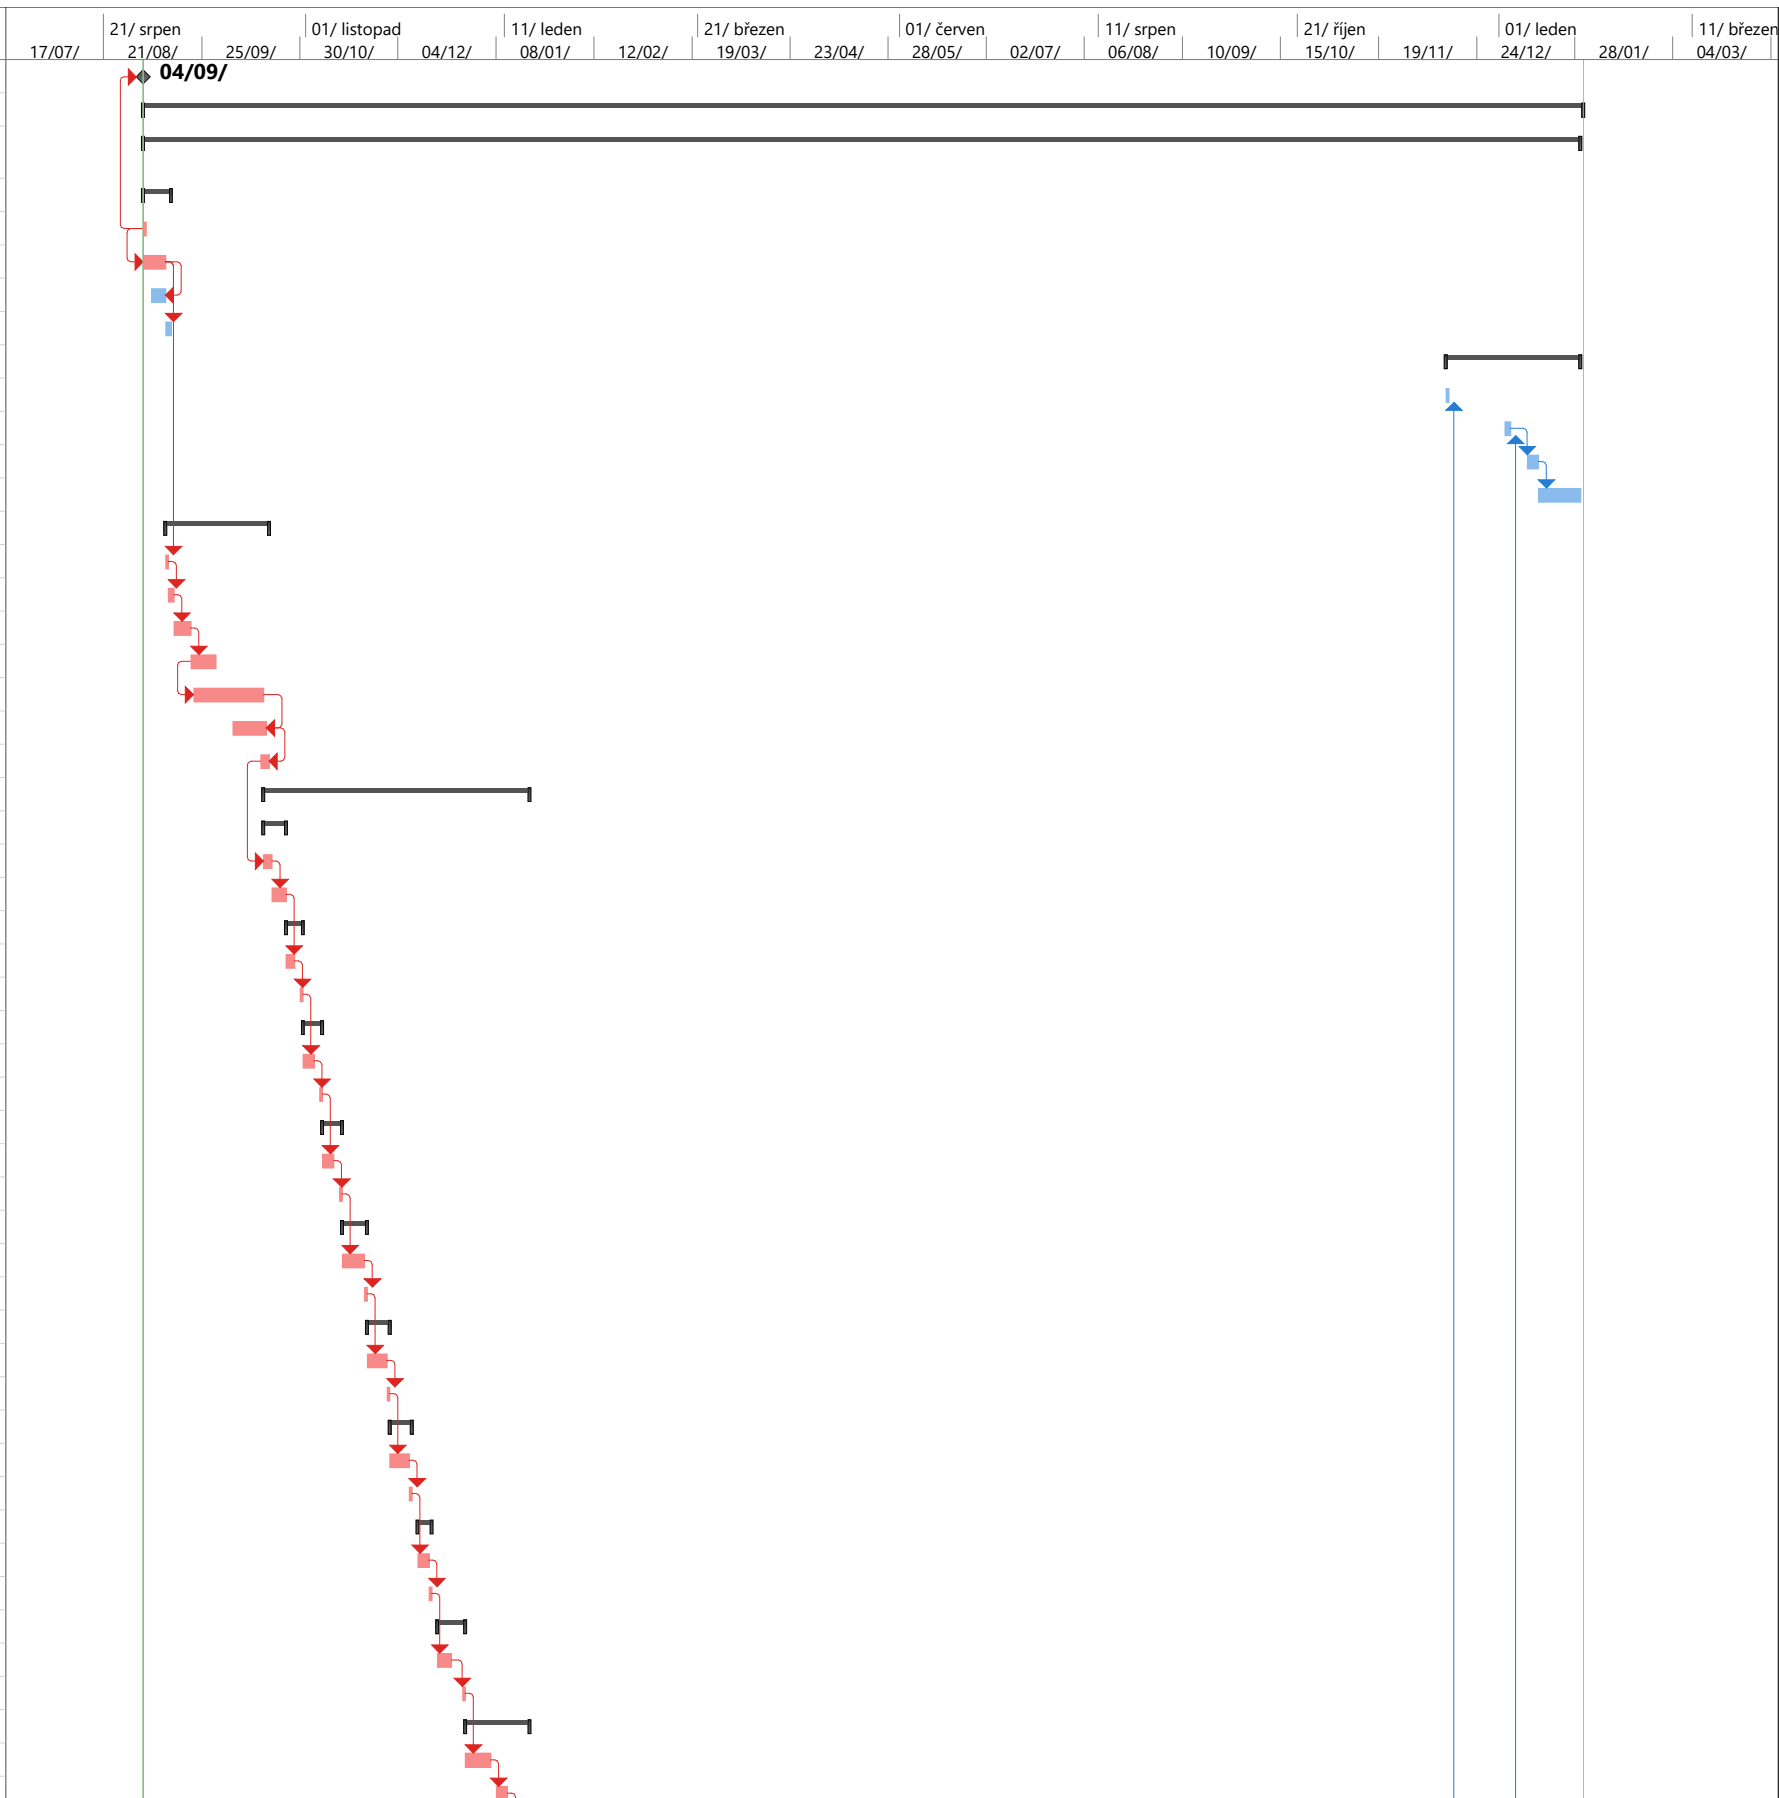

Projekt: DP-Casovy_plan_KC_mo
Datum: 02/11/ 2017 16:00

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín			
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický			
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení			
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	17/07/												01/ červen		11/ srpen		21/ říjen		01/ leden		11/ březen	
						21/ srpen	25/09/	01/ listopad	04/12/	11/ leden	12/02/	21/ březen	23/04/	28/05/	02/07/	06/08/	10/09/	15/10/	19/11/	24/12/	28/01/	04/03/					
159	Výztuž stropů betonářskou ocelí	2 dny	05/06/ 2018 09:00	06/06/ 2018 18:00	158																						
160	Betonáž stropů	3 dny	06/06/ 2018 09:00	08/06/ 2018 18:00	159SS+1 den																						
161	Odstranění bednění stropů	1 den	18/06/ 2018 09:00	18/06/ 2018 18:00	160FS+5 dny																						
162	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	20/06/ 2018 09:00	20/06/ 2018 18:00	161FS+1 den																						
163	2.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	18 dny	07/06/ 2018 09:00	02/07/ 2018 18:00																							
164	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	07/06/ 2018 09:00	07/06/ 2018 18:00	159																						
165	Zřízení bednění sloupů	1 den	08/06/ 2018 09:00	08/06/ 2018 18:00	164																						
166	Betonáž sloupů	1 den	11/06/ 2018 09:00	11/06/ 2018 18:00	165,160																						
167	Odstranění bednění sloupů	1 den	12/06/ 2018 09:00	12/06/ 2018 18:00	166																						
168	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	13/06/ 2018 09:00	13/06/ 2018 18:00	167																						
169	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	08/06/ 2018 09:00	08/06/ 2018 18:00	165SS																						
170	Výztuž schodišťových podest	1 den	11/06/ 2018 09:00	11/06/ 2018 18:00	169																						
171	Betonáž schodišťových podest	1 den	12/06/ 2018 09:00	12/06/ 2018 18:00	170,166																						
172	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	20/06/ 2018 09:00	20/06/ 2018 18:00	171FS+5 dny																						
173	Zřízení bednění stropů	2 dny	13/06/ 2018 09:00	14/06/ 2018 18:00	168SS																						
174	Výztuž stropů betonářskou ocelí	3 dny	14/06/ 2018 09:00	18/06/ 2018 18:00	173FS-1 den																						
175	Betonáž stropů	3 dny	15/06/ 2018 09:00	19/06/ 2018 18:00	174FF+1 den																						
176	Odstranění bednění stropů	2 dny	27/06/ 2018 09:00	28/06/ 2018 18:00	175FS+5 dny																						
177	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	02/07/ 2018 09:00	02/07/ 2018 18:00	176FS+1 den																						
178	3.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	17 dny	18/06/ 2018 09:00	12/07/ 2018 18:00																							
179	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	18/06/ 2018 09:00	18/06/ 2018 18:00	174FF																						
180	Zřízení bednění sloupů	1 den	19/06/ 2018 09:00	19/06/ 2018 18:00	179																						
181	Betonáž sloupů	1 den	20/06/ 2018 09:00	20/06/ 2018 18:00	175,180																						
182	Odstranění bednění sloupů	1 den	21/06/ 2018 09:00	21/06/ 2018 18:00	181																						
183	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	22/06/ 2018 09:00	22/06/ 2018 18:00	182																						
184	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	19/06/ 2018 09:00	19/06/ 2018 18:00	180SS																						
185	Výztuž schodišťových podest	1 den	20/06/ 2018 09:00	20/06/ 2018 18:00	184																						
186	Betonáž schodišťových podest	1 den	21/06/ 2018 09:00	21/06/ 2018 18:00	185,181																						
187	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	29/06/ 2018 09:00	29/06/ 2018 18:00	186FS+5 dny																						
188	Zřízení bednění stropů	1 den	22/06/ 2018 09:00	22/06/ 2018 18:00	183SS																						
189	Výztuž stropů betonářskou ocelí	3 dny	25/06/ 2018 09:00	27/06/ 2018 18:00	188																						
190	Betonáž stropů	3 dny	26/06/ 2018 09:00	28/06/ 2018 18:00	189SS+1 den																						
191	Odstranění bednění stropů	1 den	10/07/ 2018 09:00	10/07/ 2018 18:00	190FS+5 dny																						
192	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	12/07/ 2018 09:00	12/07/ 2018 18:00	191FS+1 den																						
193	4.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	17 dny	27/06/ 2018 09:00	23/07/ 2018 18:00																							
194	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	27/06/ 2018 09:00	27/06/ 2018 18:00	189FF																						
195	Zřízení bednění sloupů	1 den	28/06/ 2018 09:00	28/06/ 2018 18:00	194																						
196	Betonáž sloupů	1 den	29/06/ 2018 09:00	29/06/ 2018 18:00	190,195																						
197	Odstranění bednění sloupů	1 den	02/07/ 2018 09:00	02/07/ 2018 18:00	196																						
198	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	03/07/ 2018 09:00	03/07/ 2018 18:00	197																						
199	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	28/06/ 2018 09:00	28/06/ 2018 18:00	195SS																						
200	Výztuž schodišťových podest	1 den	29/06/ 2018 09:00	29/06/ 2018 18:00	199																						
201	Betonáž schodišťových podest	1 den	02/07/ 2018 09:00	02/07/ 2018 18:00	200																						
202	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	12/07/ 2018 09:00	12/07/ 2018 18:00	201FS+5 dny																						
203	Zřízení bednění stropů	1 den	03/07/ 2018 09:00	03/07/ 2018 18:00	198SS																						
204	Výztuž stropů betonářskou ocelí	2 dny	04/07/ 2018 09:00	09/07/ 2018 18:00	203																						
205	Betonáž stropů	3 dny	09/07/ 2018 09:00	11/07/ 2018 18:00	204FS-1 den																						
206	Odstranění bednění stropů	1 den	19/07/ 2018 09:00	19/07/ 2018 18:00	205FS+5 dny																						
207	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	23/07/ 2018 09:00	23/07/ 2018 18:00	206FS+1 den																						
208	5.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	18 dny	10/07/ 2018 09:00	02/08/ 2018 18:00																							
209	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	10/07/ 2018 09:00	10/07/ 2018 18:00	204																						
210	Zřízení bednění sloupů	1 den	11/07/ 2018 09:00	11/07/ 2018 18:00	209																						
211	Betonáž sloupů	1 den	12/07/ 2018 09:00	12/07/ 2018 18:00	205,210																						

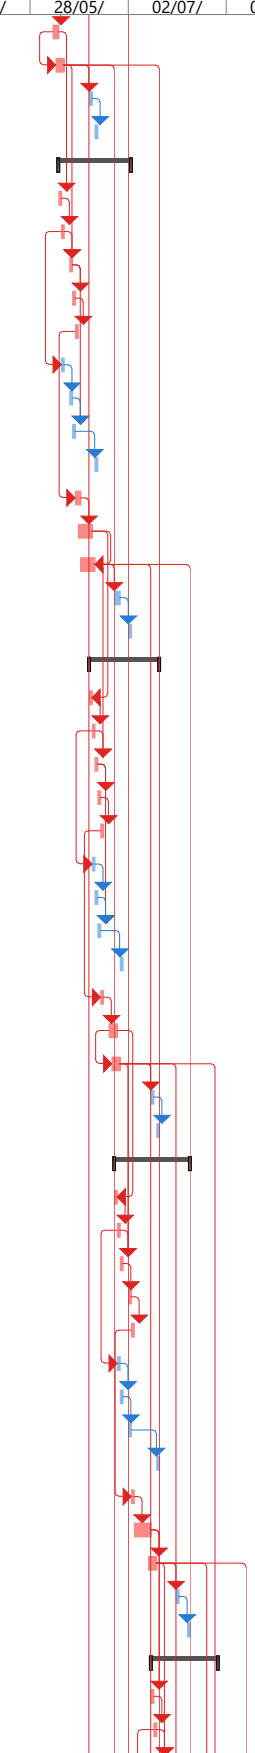

Projekt: DP-Casovy_plan_KC_mo Datum: 02/11/ 2017 16:00	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	17/07/	21/ srpen 21/08/	25/09/	01/ listopad 30/10/	04/12/	11/ leden 08/01/	12/02/	21/ březen 19/03/	23/04/	01/ červen 28/05/	02/07/	11/ srpen 06/08/	10/09/	21/ říjen 15/10/	19/11/	01/ leden 24/12/	28/01/	11/ březen 04/03/
212	Odstranění bednění sloupů	1 den	13/07/ 2018 09:00	13/07/ 2018 18:00	211																		
213	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	16/07/ 2018 09:00	16/07/ 2018 18:00	212																		
214	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	11/07/ 2018 09:00	11/07/ 2018 18:00	210SS																		
215	Výztuž schodišťových podest	1 den	12/07/ 2018 09:00	12/07/ 2018 18:00	214																		
216	Betonáž schodišťových podest	1 den	13/07/ 2018 09:00	13/07/ 2018 18:00	215																		
217	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	23/07/ 2018 09:00	23/07/ 2018 18:00	216FS+5 dny																		
218	Zřízení bednění stropů	1 den	16/07/ 2018 09:00	16/07/ 2018 18:00	213SS																		
219	Výztuž stropů betonářskou ocelí	3 dny	17/07/ 2018 09:00	19/07/ 2018 18:00	218																		
220	Betonáž stropů	3 dny	19/07/ 2018 09:00	23/07/ 2018 18:00	219FS-1 den																		
221	Odstranění bednění stropů	1 den	31/07/ 2018 09:00	31/07/ 2018 18:00	220FS+5 dny																		
222	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	02/08/ 2018 09:00	02/08/ 2018 18:00	221FS+1 den																		
223	6.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	18 dny	20/07/ 2018 09:00	14/08/ 2018 18:00																			
224	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	20/07/ 2018 09:00	20/07/ 2018 18:00	219																		
225	Zřízení bednění sloupů	1 den	23/07/ 2018 09:00	23/07/ 2018 18:00	224																		
226	Betonáž sloupů	1 den	24/07/ 2018 09:00	24/07/ 2018 18:00	220,225																		
227	Odstranění bednění sloupů	1 den	25/07/ 2018 09:00	25/07/ 2018 18:00	226																		
228	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	26/07/ 2018 09:00	26/07/ 2018 18:00	227																		
229	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	23/07/ 2018 09:00	23/07/ 2018 18:00	225SS																		
230	Výztuž schodišťových podest	1 den	24/07/ 2018 09:00	24/07/ 2018 18:00	229																		
231	Betonáž schodišťových podest	1 den	24/07/ 2018 09:00	24/07/ 2018 18:00	229																		
232	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	01/08/ 2018 09:00	01/08/ 2018 18:00	231FS+5 dny																		
233	Zřízení bednění stropů	1 den	26/07/ 2018 09:00	26/07/ 2018 18:00	228SS																		
234	Výztuž stropů betonářskou ocelí	3 dny	27/07/ 2018 09:00	31/07/ 2018 18:00	233																		
235	Betonáž stropů	3 dny	31/07/ 2018 09:00	02/08/ 2018 18:00	234FS-1 den																		
236	Odstranění bednění stropů	1 den	10/08/ 2018 09:00	10/08/ 2018 18:00	235FS+5 dny																		
237	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	14/08/ 2018 09:00	14/08/ 2018 18:00	236FS+1 den																		
238	7.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	18 dny	01/08/ 2018 09:00	24/08/ 2018 18:00																			
239	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	01/08/ 2018 09:00	01/08/ 2018 18:00	234																		
240	Zřízení bednění sloupů	1 den	02/08/ 2018 09:00	02/08/ 2018 18:00	239																		
241	Betonáž sloupů	1 den	03/08/ 2018 09:00	03/08/ 2018 18:00	235,240																		
242	Odstranění bednění sloupů	1 den	06/08/ 2018 09:00	06/08/ 2018 18:00	241																		
243	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	07/08/ 2018 09:00	07/08/ 2018 18:00	242																		
244	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	02/08/ 2018 09:00	02/08/ 2018 18:00	240SS																		
245	Výztuž schodišťových podest	1 den	03/08/ 2018 09:00	03/08/ 2018 18:00	244																		
246	Betonáž schodišťových podest	1 den	06/08/ 2018 09:00	06/08/ 2018 18:00	245																		
247	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	14/08/ 2018 09:00	14/08/ 2018 18:00	246FS+5 dny																		
248	Zřízení bednění stropů	1 den	07/08/ 2018 09:00	07/08/ 2018 18:00	243SS																		
249	Výztuž stropů betonářskou ocelí	3 dny	08/08/ 2018 09:00	10/08/ 2018 18:00	248																		
250	Betonáž stropů	2 dny	13/08/ 2018 09:00	14/08/ 2018 18:00	249																		
251	Odstranění bednění stropů	1 den	22/08/ 2018 09:00	22/08/ 2018 18:00	250FS+5 dny																		
252	Osazení prefabrikovaných schodišťových stupňů	1 den	24/08/ 2018 09:00	24/08/ 2018 18:00	251FS+1 den																		
253	8.NP - NOSNÉ KCE - II. ETAPA	17 dny	13/08/ 2018 09:00	04/09/ 2018 18:00																			
254	Výztuž pro zesílení sloupů	1 den	13/08/ 2018 09:00	13/08/ 2018 18:00	249																		
255	Zřízení bednění sloupů	1 den	14/08/ 2018 09:00	14/08/ 2018 18:00	254																		
256	Betonáž sloupů	1 den	15/08/ 2018 09:00	15/08/ 2018 18:00	250,255																		
257	Odstranění bednění sloupů	1 den	16/08/ 2018 09:00	16/08/ 2018 18:00	256																		
258	Osazování ostatních ocelových ztužujících prvků	1 den	17/08/ 2018 09:00	17/08/ 2018 18:00	257																		
259	Zřízení bednění schodišťových podest	1 den	14/08/ 2018 09:00	14/08/ 2018 18:00	255SS																		
260	Výztuž schodišťových podest	1 den	15/08/ 2018 09:00	15/08/ 2018 18:00	259																		
261	Betonáž schodišťových podest	1 den	16/08/ 2018 09:00	16/08/ 2018 18:00	260																		
262	Odstranění bednění schodišťových podest	1 den	24/08/ 2018 09:00	24/08/ 2018 18:00	261FS+5 dny																		
263	Zřízení bednění stropů	1 den	17/08/ 2018 09:00	17/08/ 2018 18:00	258SS																		
264	Výztuž stropů betonářskou ocelí	2 dny	20/08/ 2018 09:00	21/08/ 2018 18:00	263																		


Projekt: DP-Casovy_plan_KC_mo
Datum: 02/11/ 2017 16:00

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín			
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický			
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení			
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	17/07/	21/ srpen 21/08/	25/09/	01/ listopad 30/10/	04/12/	11/ leden 08/01/	12/02/	21/ březen 19/03/	23/04/	01/ červen 28/05/	02/07/	11/ srpen 06/08/	10/09/	21/ říjen 15/10/	19/11/	01/ leden 24/12/	28/01/	11/ březen 04/03/
318	AVT - rozvody	1 den	27/09/ 2018 09:00	27/09/ 2018 18:00	319FF																		
319	SHZ - rozvody	10 dny	14/09/ 2018 09:00	27/09/ 2018 18:00	316FF+1 den																		
320	Parapet v kontaktu se zeminou	3 dny	10/09/ 2018 09:00	12/09/ 2018 18:00	313SS+8 dny																		
321	PROVEDENÍ OMÍTEK A PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAH	24 dny	18/09/ 2018 09:00	22/10/ 2018 18:00																			
322	Dveřní zárubně	10 dny	18/09/ 2018 09:00	02/10/ 2018 18:00	317FF+1 den																		
323	Sanace, výspravy a vyrovnání povrchů	3 dny	27/09/ 2018 09:00	02/10/ 2018 18:00	322FF																		
324	Betonové stěrky	9 dny	27/09/ 2018 09:00	10/10/ 2018 18:00	323SS																		
325	Vnitřní omítky	20 dny	19/09/ 2018 09:00	17/10/ 2018 18:00	322SS+1 den																		
326	Rozvody v podlaže	20 dny	24/09/ 2018 09:00	22/10/ 2018 18:00	325SS+3 dny																		
327	PROVEDENÍ PODLAH, KOMPLETACE POVRCHŮ A TECHNOLOGIE	45 dny	27/09/ 2018 09:00	29/11/ 2018 18:00																			
328	Betonové podlahy	24 dny	27/09/ 2018 09:00	31/10/ 2018 18:00	326SS+3 dny																		
329	Montáž výtahů	20 dny	09/10/ 2018 09:00	05/11/ 2018 18:00	328FF+3 dny																		
330	SDK svislé kce	26 dny	08/10/ 2018 09:00	12/11/ 2018 18:00	328SS+6 dny																		
331	SDK parapet	14 dny	25/10/ 2018 09:00	13/11/ 2018 18:00	371FS+3 dny																		
332	Rozvody v podhledu	9 dny	22/10/ 2018 09:00	01/11/ 2018 18:00	328FF+1 den																		
333	Příslušenství ZTI v SDK stěnách a zdech	20 dny	08/10/ 2018 09:00	02/11/ 2018 18:00	328SS+6 dny																		
334	Osazení otopných těles	9 dny	02/11/ 2018 09:00	14/11/ 2018 18:00	331FF+1 den																		
335	Dveře a zárubně do SDK	9 dny	31/10/ 2018 09:00	12/11/ 2018 18:00	330FF																		
336	Proskené nadsvětílky a vnitřní okna	9 dny	02/11/ 2018 09:00	14/11/ 2018 18:00	335FF+2 dny																		
337	Příslušenství VZT 1.PP	9 dny	18/10/ 2018 09:00	30/10/ 2018 18:00	330SS+8 dny																		
338	Příslušenství VZT 1.NP-8.NP	18 dny	31/10/ 2018 09:00	23/11/ 2018 18:00	337																		
339	SDK podhledy	10 dny	13/11/ 2018 09:00	26/11/ 2018 18:00	338FF+1 den																		
340	Hliníkové mřížové podhledy a další podhledy	18 dny	05/11/ 2018 09:00	28/11/ 2018 18:00	338FF+3 dny																		
341	Dřevěné podhledy (1.PP)	5 dny	06/11/ 2018 09:00	12/11/ 2018 18:00	340SS+1 den																		
342	Ostatní (pož. rolety, kouřové clony, vnitř. markýzy)	9 dny	19/11/ 2018 09:00	29/11/ 2018 18:00	340FF+1 den																		
343	Poklopy	9 dny	19/11/ 2018 09:00	29/11/ 2018 18:00	340FF+1 den																		
344	KOMPLETACE TECHN. ZAŘÍZENÍ, DOKONČOVACÍ PRÁCE A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH	48 dny	19/11/ 2018 09:00	29/01/ 2019 18:00																			
345	Nivelační stěrka	21 dny	19/11/ 2018 09:00	17/12/ 2018 18:00	342SS,343SS																		
346	PUR stěrky ebo epoxidové nátěry včetně penetrace	19 dny	22/11/ 2018 09:00	18/12/ 2018 18:00	345SS+3 dny																		
347	Vnitřní zateplovací systém	6 dny	29/11/ 2018 09:00	06/12/ 2018 18:00	346SS+5 dny																		
348	Protipožární obklady	9 dny	07/12/ 2018 09:00	19/12/ 2018 18:00	346FF+1 den																		
349	MAR - kompletace (1.PP)	2 dny	07/12/ 2018 09:00	10/12/ 2018 18:00	348SS																		
350	MAR - kompletace (1.NP - 8.NP)	8 dny	11/12/ 2018 09:00	20/12/ 2018 18:00	348FF+1 den																		
351	SILNOPROUD - kompletace	21 dny	27/11/ 2018 09:00	28/12/ 2018 18:00	346SS+3 dny																		
352	EPS - kompletace	4 dny	17/12/ 2018 09:00	20/12/ 2018 18:00	348FF+1 den																		
353	SLABOPROUD - kompletace	10 dny	05/12/ 2018 09:00	18/12/ 2018 18:00	345FF+1 den																		
354	AVT - kompletace	1 den	21/12/ 2018 09:00	21/12/ 2018 18:00	352FF+1 den																		
355	SHZ - kompletace	1 den	27/12/ 2018 09:00	27/12/ 2018 18:00	354FF+1 den																		
356	Dřevěné podlahy	18 dny	07/12/ 2018 09:00	07/01/ 2019 18:00	348SS																		
357	Akustické úpravy	9 dny	21/12/ 2018 09:00	08/01/ 2019 18:00	356FF+1 den																		
358	Akustická a projekční činnost	1 den	29/01/ 2019 09:00	29/01/ 2019 18:00	364FS+2 dny																		
359	Omyvatelný nátěr stěn	4 dny	03/01/ 2019 09:00	08/01/ 2019 18:00	357FF																		
360	Zámečnické výrobky	10 dny	04/01/ 2019 09:00	17/01/ 2019 18:00	359SS+1 den																		
361	Malby a nátěry	10 dny	07/01/ 2019 09:00	18/01/ 2019 18:00	360FF+1 den																		
362	Umyvadlové desky a sestavy WC kabin	4 dny	16/01/ 2019 09:00	21/01/ 2019 18:00	361FF+1 den																		
363	Krycí dřevěné příčky	1 den	21/01/ 2019 09:00	21/01/ 2019 18:00	362FF																		
364	Vnitřní skleněné stěny	4 dny	21/01/ 2019 09:00	24/01/ 2019 18:00	366FF+1 den																		
365	Čistící zóny	1 den	22/01/ 2019 09:00	22/01/ 2019 18:00	363FF+1 den																		
366	Dveře a vrata	2 dny	22/01/ 2019 09:00	23/01/ 2019 18:00	365FF+1 den																		
367	Karusely a doplňky	2 dny	14/01/ 2019 09:00	15/01/ 2019 18:00	368FS+1 den																		

Projekt: DP-Casovy_plan_KC_mo Datum: 02/11/ 2017 16:00	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický		
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení		
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	17/07/	21/ srpen 21/08/	25/09/	01/ listopad 30/10/	04/12/	11/ leden 08/01/	12/02/	21/ březen 19/03/	23/04/	01/ červen 28/05/	02/07/	11/ srpen 06/08/	10/09/	21/ říjen 15/10/	19/11/	01/ leden 24/12/	28/01/	11/ březen 04/03/	
368	Gastronomické zařízení	1 den	10/01/ 2019 09:00	10/01/ 2019 18:00	361SS+3 dny																			
369	FASÁDA	65 dny	08/10/ 2018 09:00	10/01/ 2019 18:00																				
370	Zděné parapety	3 dny	08/10/ 2018 09:00	10/10/ 2018 18:00	56FF																			
371	Osazení fasádních panelů - okna (2.NP - 8.NP)	7 dny	11/10/ 2018 09:00	19/10/ 2018 18:00	370																			
372	Osazení vitrín 1.NP	5 dny	22/10/ 2018 09:00	26/10/ 2018 18:00	371																			
373	Zasklení 9.NP	2 dny	29/10/ 2018 09:00	30/10/ 2018 18:00	372																			
374	Fasádní obklad z tahokovu 9.NP	4 dny	31/10/ 2018 09:00	05/11/ 2018 18:00	373																			
375	Venkovní žaluzie	5 dny	06/11/ 2018 09:00	12/11/ 2018 18:00	374																			
376	Montáž nosného roštu pro fasádu	13 dny	13/11/ 2018 09:00	29/11/ 2018 18:00	375																			
377	Tl fasády a hydroizolace parapetů	9 dny	30/11/ 2018 09:00	12/12/ 2018 18:00	376																			
378	Cihelná fasáda	12 dny	13/12/ 2018 09:00	03/01/ 2019 18:00	377																			
379	Klempířské prvky fasády	6 dny	02/01/ 2019 09:00	09/01/ 2019 18:00	378FS-2 dny																			
380	Fasádní hodiny	1 den	10/01/ 2019 09:00	10/01/ 2019 18:00	379																			
381	KOLAUDACE A PŘEJÍMKA STAVBY	1 den	30/01/ 2019 09:00	30/01/ 2019 18:00																				
382	Kolaudace	1 den	30/01/ 2019 09:00	30/01/ 2019 18:00	358																			
383	Předání objektu	1 den	30/01/ 2019 09:00	30/01/ 2019 18:00	358																			
384	SO320 + SO340	17 dny	04/01/ 2019 09:00	29/01/ 2019 09:00	382SF-1 den																			
385	KONEC PROJEKTU	0 dny	30/01/ 2019 18:00	30/01/ 2019 18:00	382FF																			

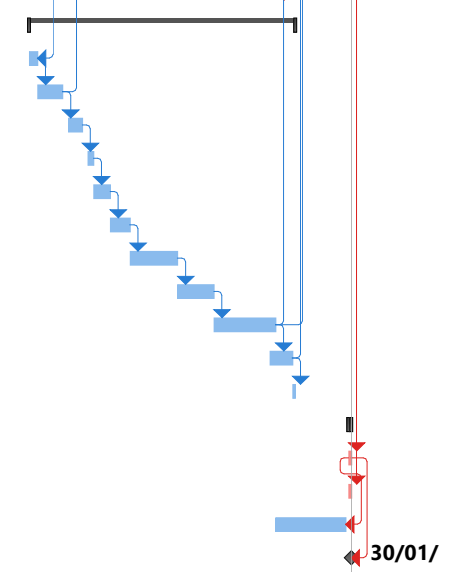

Projekt: DP-Casovy_plan_KC_mo Datum: 02/11/ 2017 16:00	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín			
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Kritický			
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Kritické rozdělení			
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Průběh			
