


ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	polyfunkční domy "Žižkov"	347 dny	2.3. 20	20.7. 21		
2	Práce na ZS	10 dny	2.3. 20	13.3. 20		
3	vytyčení stavby, oplocení	4 dny	2.3. 20	5.3. 20		12;4FS-1 den;7;8;5SS
4	ZS a přípojky	5 dny	5.3. 20	11.3. 20	3FS-1 den	13
5	pasportizace	10 dny	2.3. 20	13.3. 20	3SS	13FS-3 dny
6	demolice a příprava území	100 dny	6.3. 20	30.7. 20		
7	kácení stromů, ochrana stromů	6 dny	6.3. 20	13.3. 20	3	9
8	demolice objektů a zpevněných ploch	17 dny	6.3. 20	30.3. 20	3	9
9	demolice opěrných stěn	24 dny	31.3. 20	6.5. 20	8;7	15;14FS+15 dny
10	přeložka kanalizace (zahájit 25.5!)	48 dny	25.5. 20	30.7. 20		16FF+5 dny
11	Stavební jáma	147 dny	6.3. 20	6.10. 20		
12	výkop a odvoz zeminy	136 dny	6.3. 20	18.9. 20	3	13SS+4 dny;14FF+5 dny
13	zajištění stavební jámy	132 dny	12.3. 20	18.9. 20	12SS+4 dny;5FS-3 dny;4	15FF
14	pilotové založení	43 dny	29.7. 20	25.9. 20	12FF+5 dny;9FS+15 dny	15FF+6 dny
15	dokop, drenáže, podkladní betony	28 dny	27.8. 20	6.10. 20	14FF+6 dny;9;13FF	18FF+1 den
16	retenční nádrž	13 dny	21.7. 20	6.8. 20	10FF+5 dny	18
17	základy	7 dny	29.9. 20	7.10. 20		
18	monolit ZD	7 dny	29.9. 20	7.10. 20	15FF+1 den;16	21FS-1 den
19	spodní nosná kce	31 dny	7.10. 20	20.11. 20		
20	2.PP	16 dny	7.10. 20	29.10. 20		
21	monolit svislé kce	8 dny	7.10. 20	16.10. 20	18FS-1 den	22FS-1 den
22	monolit vodorovné kce	9 dny	16.10. 20	29.10. 20	21FS-1 den	24
23	1.PP	15 dny	30.10. 20	20.11. 20		
24	monolit svislé kce	8 dny	30.10. 20	10.11. 20	22	25FS-1 den
25	monolit vodorovné kce	8 dny	10.11. 20	20.11. 20	24FS-1 den	28
26	vrchní nosná kce	96 dny	23.11. 20	12.4. 21		
27	1.NP	13 dny	23.11. 20	9.12. 20		
28	monolit svislé kce	7 dny	23.11. 20	1.12. 20	25	29FS-1 den
29	monolit vodorovné kce	7 dny	1.12. 20	9.12. 20	28FS-1 den	31;47
30	2.NP	14 dny	10.12. 20	31.12. 20		
31	monolit svislé kce	7 dny	10.12. 20	18.12. 20	29	32FS-1 den;45;48
32	monolit vodorovné kce	8 dny	18.12. 20	31.12. 20	31FS-1 den	34;46FS+2 dny
33	3.NP	14 dny	4.1. 21	21.1. 21		
34	monolit svislé kce	7 dny	4.1. 21	12.1. 21	32	35FS-1 den
35	monolit vodorovné kce	8 dny	12.1. 21	21.1. 21	34FS-1 den	37
36	4.NP	13 dny	22.1. 21	9.2. 21		
37	monolit svislé kce	7 dny	22.1. 21	1.2. 21	35	38FS-1 den
38	monolit vodorovné kce	7 dny	1.2. 21	9.2. 21	37FS-1 den	40
39	5.NP	9 dny	10.2. 21	22.2. 21		
40	monolit svislé kce	4 dny	10.2. 21	15.2. 21	38	41
41	monolit vodorovné kce	5 dny	16.2. 21	22.2. 21	40	43FS+20 dny
42	Střecha	13 dny	23.3. 21	12.4. 21		
43	zateplení + hydroizolace	13 dny	23.3. 21	12.4. 21	41FS+20 dny	68
44	Hrubé vnitřní práce	83 dny	21.12. 20	21.4. 21		
45	montáž fasádních výplní	54 dny	21.12. 20	9.3. 21	31	46FF
46	montáž SDK	63 dny	6.1. 21	6.4. 21	32FS+2 dny;45FF	47SS-4 dny;48SS-8 dny;49SS+1 den;50FF
47	rozvod elektřiny	68 dny	30.12. 20	7.4. 21	29;46SS-4 dny	50FF+3 dny
48	rozvod VZT včetně strojovny	64 dny	22.12. 20	24.3. 21	31;46SS-8 dny;53FF+30 dny	62;56
49	rozvod ZTI včetně kotelny	68 dny	7.1. 21	14.4. 21	46SS+1 den	53SS+4 dny;64
50	omítky	51 dny	28.1. 21	12.4. 21	46FF;47FF+3 dny	51SS+7 dny;55FF+14 dny
51	hrubé podlahy	51 dny	8.2. 21	21.4. 21	50SS+7 dny	54SS+20 dny;57FF+25 dny;56FF+12 dny;72
52	Dokončovací práce	110 dny	13.1. 21	17.6. 21		
53	stěrka garáže a sklepy	8 dny	13.1. 21	22.1. 21	49SS+4 dny	48FF+30 dny
54	keramická dlažba a obklad	62 dny	8.3. 21	3.6. 21	51SS+20 dny	59FF+4 dny;64FF+11 dny;63FF+2 dny
55	zdvojená podlaha	30 dny	18.3. 21	30.4. 21	50FF+14 dny	56FF+5 dny
56	SDK podhledy	22 dny	8.4. 21	7.5. 21	48;51FF+12 dny;55FF+5 dny	60FF;58;62FF+5 dny;59FF+2 dny
57	dřevěná podlaha	13 dny	10.5. 21	26.5. 21	51FF+25 dny	65;59FF+5 dny
58	lepení koberců	15 dny	10.5. 21	28.5. 21	56	59FF+1 den
59	montáž zárubní a dveří	9 dny	28.5. 21	9.6. 21	54FF+4 dny;58FF+1 den;57FF+5 dny;56FF+2 dny	60FF+6 dny
60	malba	24 dny	17.5. 21	17.6. 21	59FF+6 dny;56FF	65FS+1 den
61	Kompletace a revize	54 dny	4.5. 21	20.7. 21		
62	VZT	9 dny	4.5. 21	14.5. 21	48;56FF+5 dny	65;63
63	elektro	9 dny	26.5. 21	7.6. 21	54FF+2 dny;62	65
64	ZTI	13 dny	2.6. 21	18.6. 21	54FF+11 dny;49	65FF+10 dny
65	úklid a opravy	20 dny	21.6. 21	20.7. 21	63;60FS+1 den;57;62;64FF+10 dny	78
66	Fasáda	68 dny	13.4. 21	19.7. 21		
67	Terasy a balkóny	64 dny	13.4. 21	13.7. 21		
68	zateplení, hydroizolace, klempířin	18 dny	13.4. 21	6.5. 21	43	71FF+4 dny
69	terasová a balkónová dlažba	17 dny	17.6. 21	13.7. 21	75SS-3 dny	
70	KZS	64 dny	19.4. 21	19.7. 21		
71	stavba lešení	18 dny	19.4. 21	12.5. 21	68FF+4 dny	72SS+8 dny
72	zateplení fasády + perlínka	37 dny	29.4. 21	18.6. 21	51;71SS+8 dny	73FF+1 den;75;74FF+1 den
73	klempířské prvky	6 dny	14.6. 21	21.6. 21	72FF+1 den	75
74	zámečnické výrobky	4 dny	16.6. 21	21.6. 21	72FF+1 den	75
75	finální povrchy	8 dny	22.6. 21	1.7. 21	72;73;74	69SS-3 dny;76FS-2 dny
76	demontáž lešení	12 dny	30.6. 21	19.7. 21	75FS-2 dny	78
77	Předání	0 dny	20.7. 21	20.7. 21		
78	předání	0 dny	20.7. 21	20.7. 21	76;65	

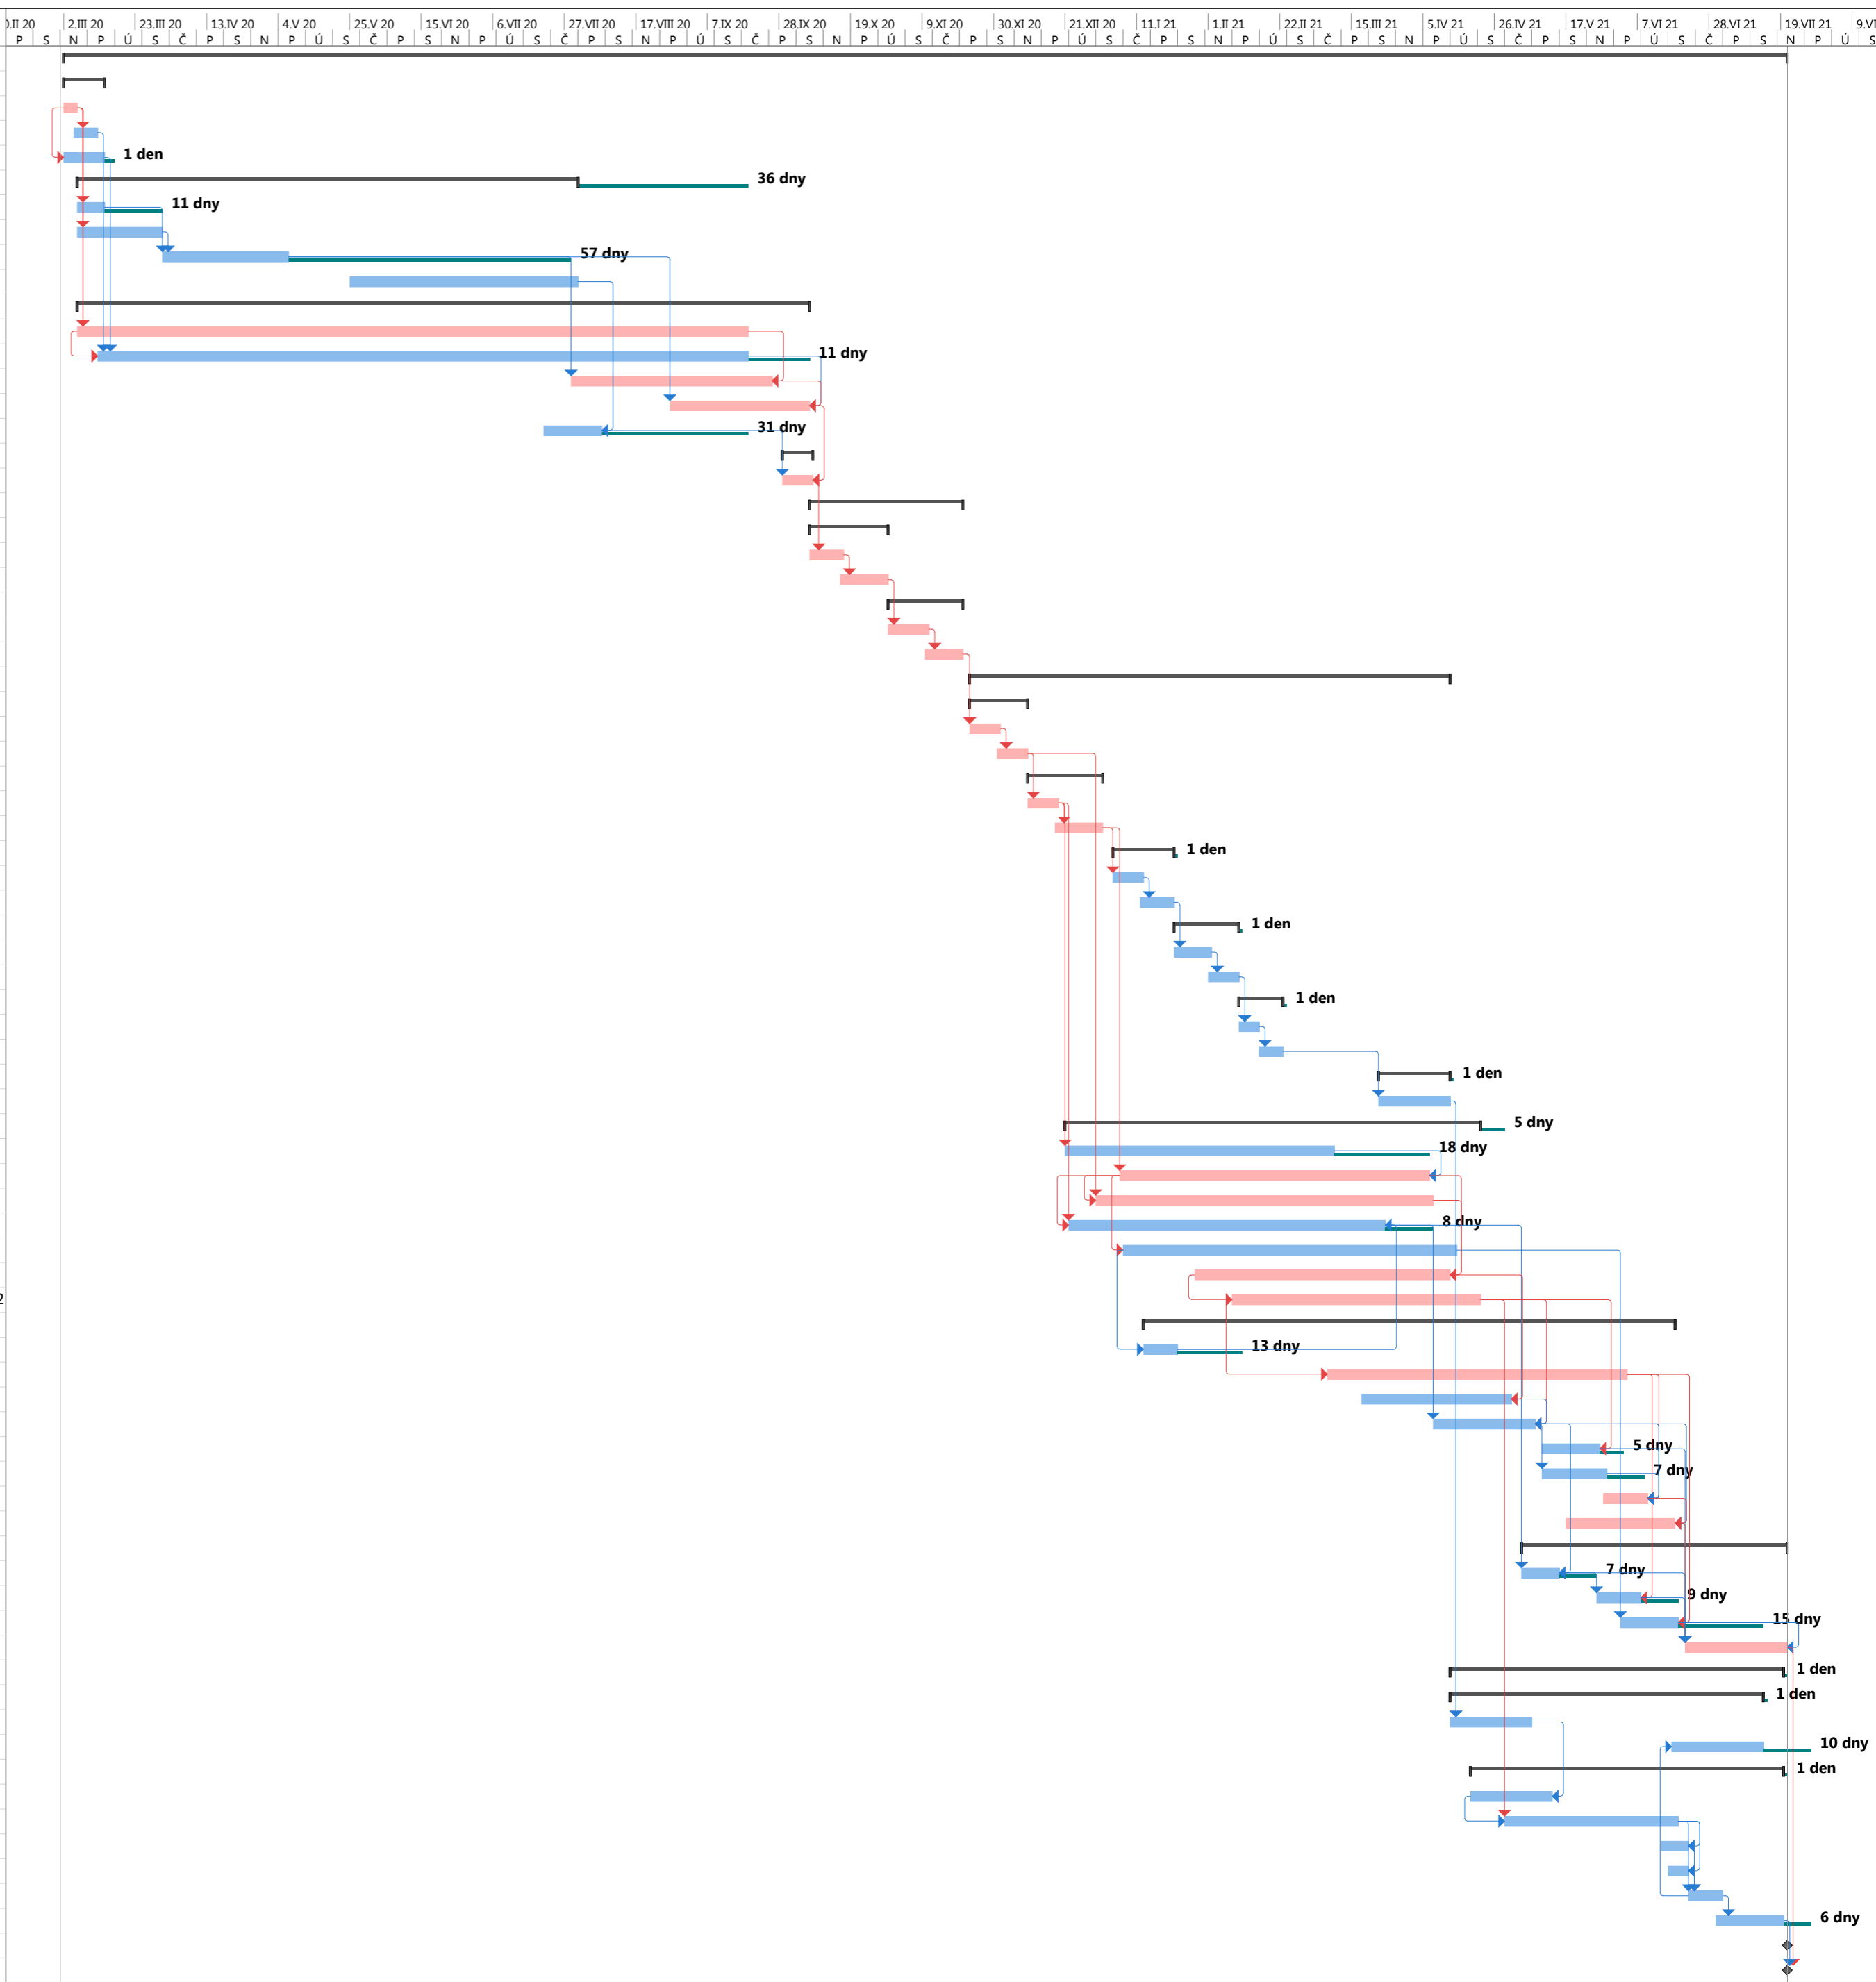

Kritický	Rozdělení	Skuz	Zahmutý kritický	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník
Rozdělení kritického úkolu	Milník	Souhmný	Rozdělení zahmutého kritického úkolu	Neaktivní souhmn	Ruční úkoly zahmuté v souhmném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termin
Úkol	Časová rezerva	Souhmn projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhmn	Vnější úkoly	Průběh
