



ID	Název úkolu	Trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Předchůdci
1	Stavba základní školy	0 251 ny dny?	30.9. 19	14.9. 20		
2	Přípravné práce	0 10 dny ny	30.9. 19	11.10. 19		
3	Převzetí staveniště + průzkumy	0 2 dny ny	30.9. 19	1.10. 19	4	
4	Vytyčení staveniště	0 1 den ny	2.10. 19	2.10. 19	5	3
5	Sejmutí ornice	ny 2 dny	3.10. 19	4.10. 19	6SS+1 den	4
6	Oplocení staveniště	0 1 den ny	4.10. 19	4.10. 19	7SS+1 den	5SS+1 den
7	Zařízení staveniště + úpravy	0 4 dny ny	7.10. 19	10.10. 19	8SS+1 den;10	6SS+1 den
8	Napojení zařízení staveniště na síť	0 4 dny ny	8.10. 19	11.10. 19		7SS+1 den
9	Zemní práce	0 29 dny ny	11.10. 19	20.11. 19		
10	Výkop stavební jámy	0 20 dny ny	11.10. 19	7.11. 19	17FS+3 dny	7
11	Záporové pažení	0 21 dny ny	14.10. 19	11.11. 19	12FF+1 den	8
12	Demontáž stávajících přípojek	0 4 dny ny	7.11. 19	12.11. 19	13;17	11FF+1 den
13	Vytyčení šachet kolektoru + šachty dojezdu výtahu	0 1 den ny	13.11. 19	13.11. 19	14	12
14	Přípojka dešťové kanalizace - pod objektem	0 4 dny ny	14.11. 19	19.11. 19	15SS+1 den	13
15	Přípojka splaškové kanalizace - pod objektem	0 4 dny ny	15.11. 19	20.11. 19	55	14SS+1 den
16	Základové konstrukce	0 26 ny dny?	13.11. 19	18.12. 19		
17	Zhotovení opěrné zdi	0 3 dny ny	13.11. 19	15.11. 19	18FS+1 den	12;10FS+3 dny
18	Odbednění opěrné zdi	0 1 den ny	19.11. 19	19.11. 19		17FS+1 den
19	Vytyčení dojezdu výtahové šachty a šachet kolektoru	0 1 den ny	20.11. 19	20.11. 19	20	18
20	Provádění základové desky dojezdu výtahové šachty a kolektoru	0 3 dny ny	21.11. 19	25.11. 19	21FS+2 dny;22FF+2 dny	19
21	Odbednění základové desky dojezdu výtahové šachty a kolektoru	0 1 den ny	28.11. 19	28.11. 19	23	20FS+2 dny;22
22	Uzemnění hromosvodu	0 3 dny ny	25.11. 19	27.11. 19	21	20FF+2 dny
23	Provádění stěn dojezdu výtahové šachty a kolektoru	0 2 dny ny	29.11. 19	2.12. 19	24FS+2 dny;25FS+1 den	21
24	Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty a kolektoru	0 1 den ny	5.12. 19	5.12. 19	26FS+1 den	23FS+2 dny;25
25	Betonáž podkladního betonu	0 1 den ny	4.12. 19	4.12. 19	24	23FS+1 den
26	Bednění základové desky	0 1 den ny	9.12. 19	9.12. 19	27	24FS+1 den
27	Armování základové desky	0 5 dny ny	10.12. 19	16.12. 19	28FF+1 den	26
28	Betonáž základové desky	0 2 dny ny	16.12. 19	17.12. 19	29	27FF+1 den
29	Odbednění základové desky	0 1 den ny	18.12. 19	18.12. 19	41	28

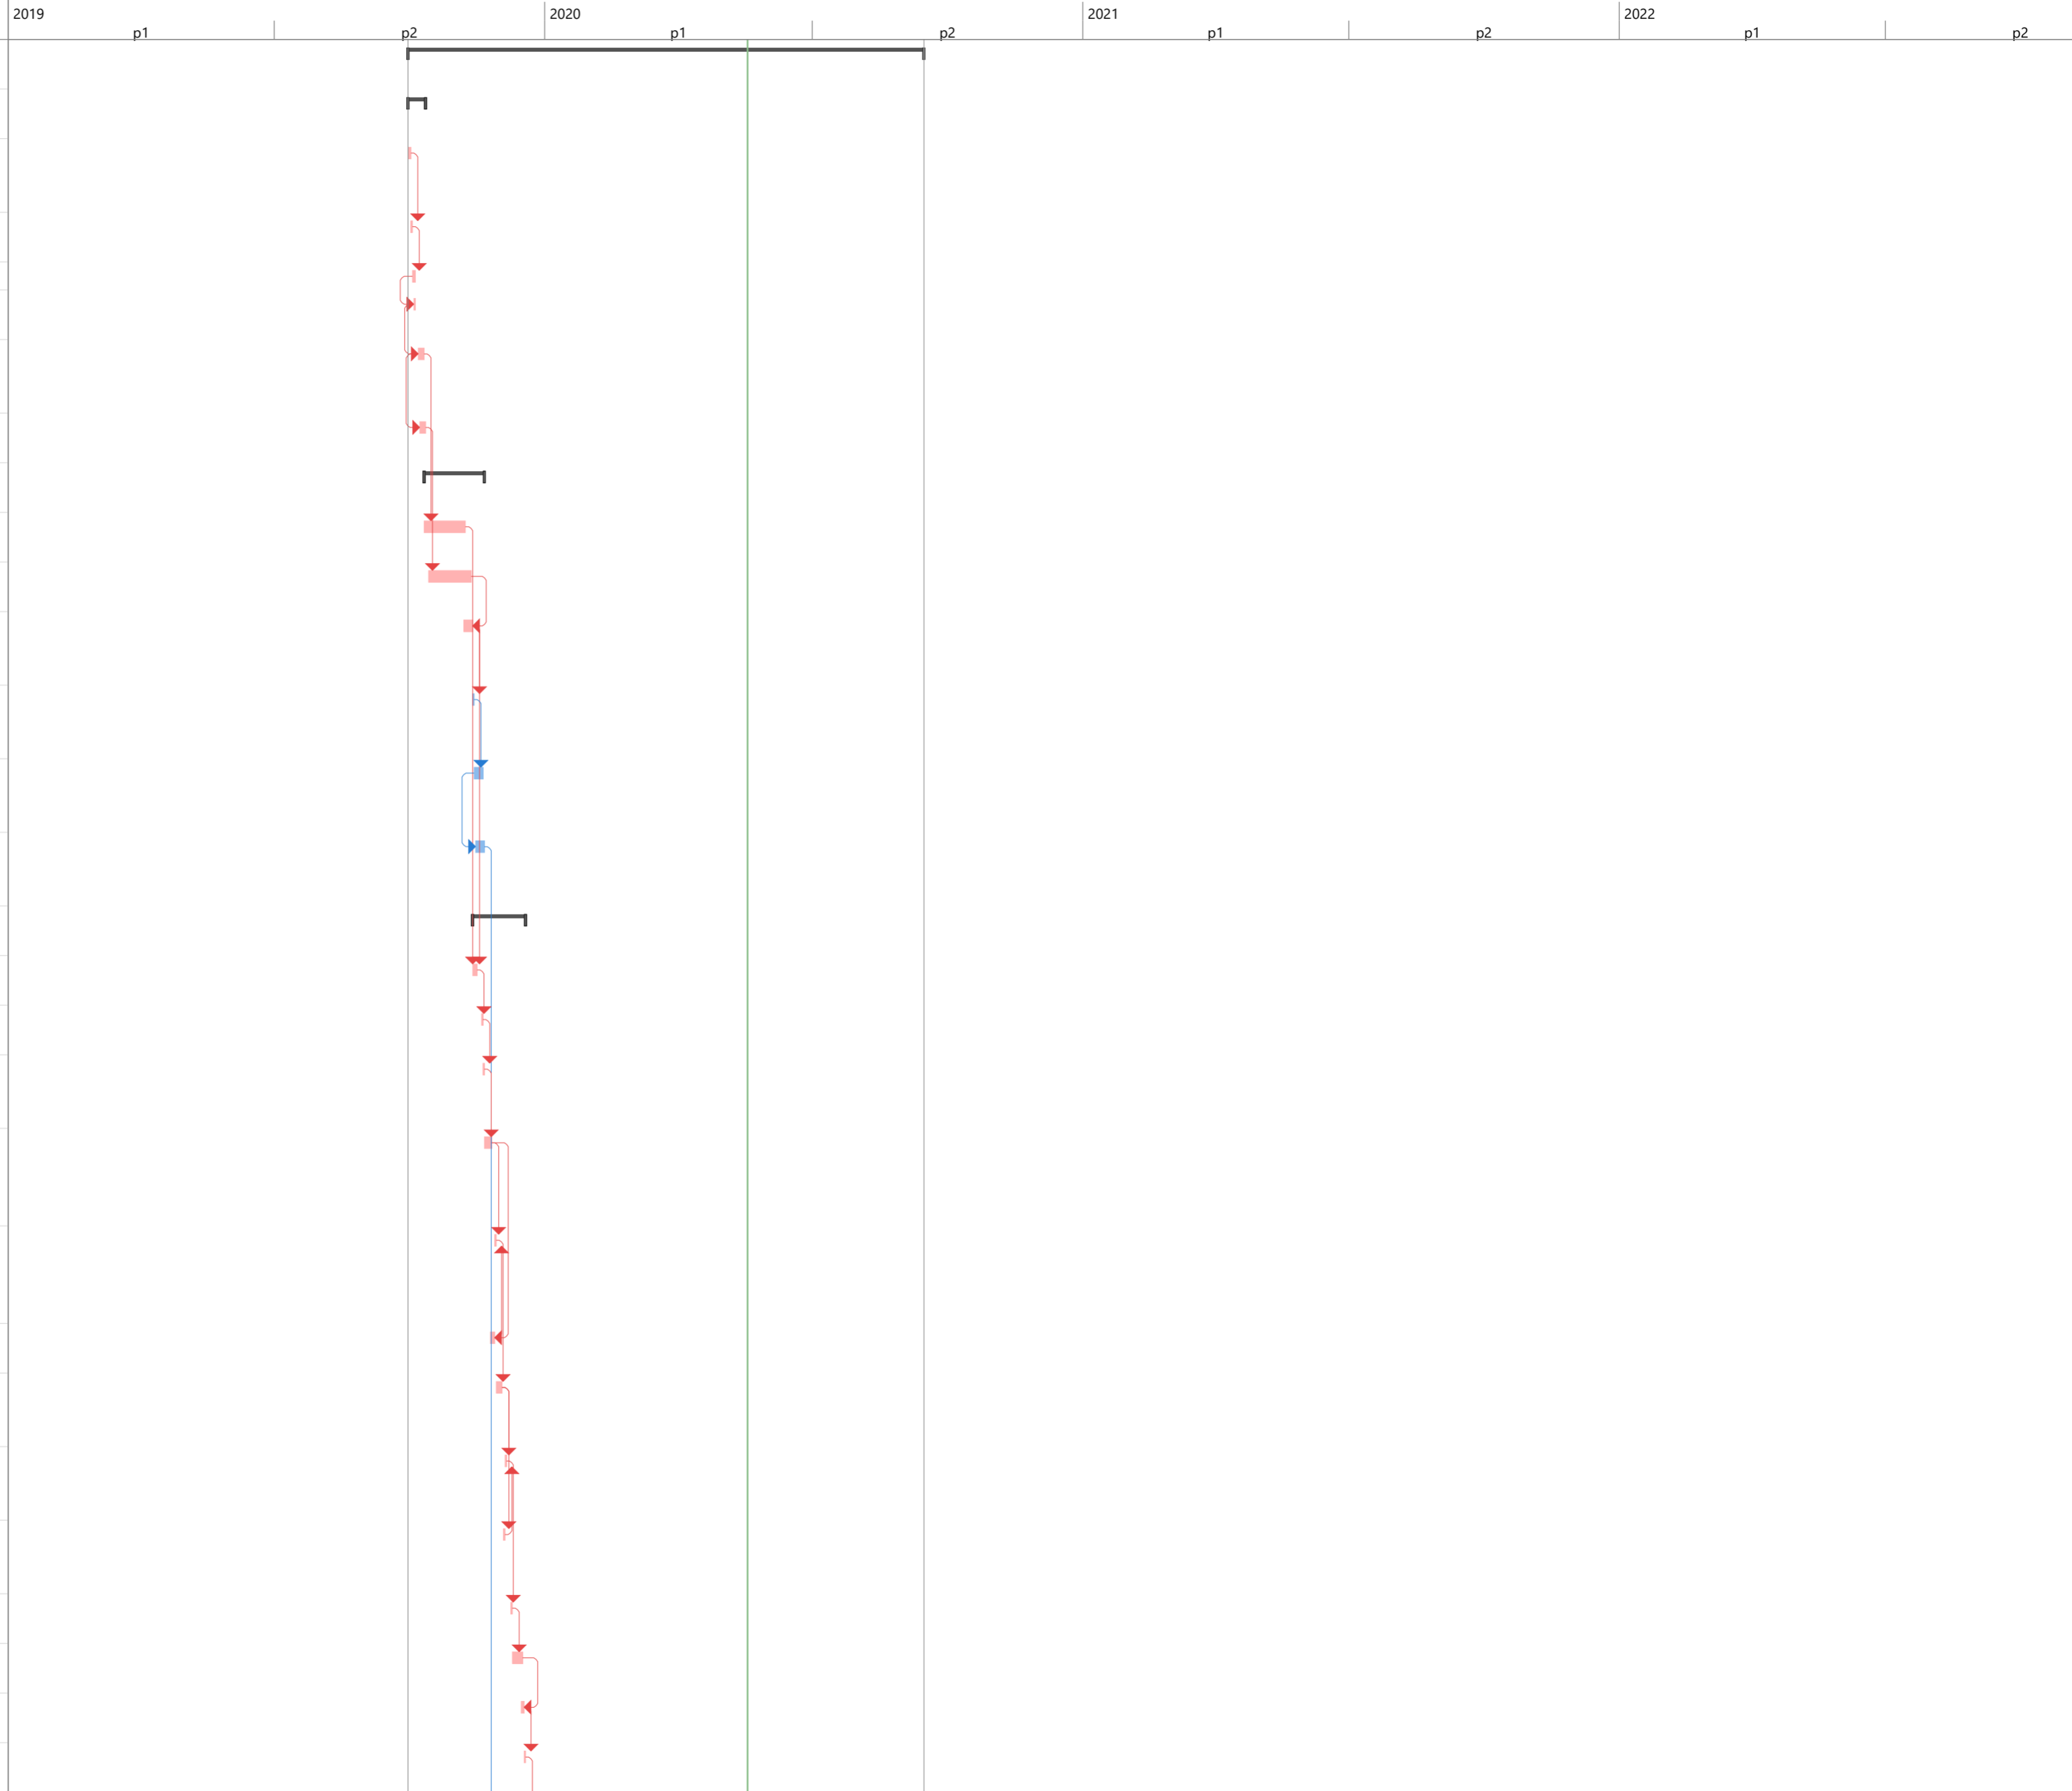


<ul style="list-style-type: none"> Kritický Rozdělení kritického úkolu Úkol Rozdělení 	<ul style="list-style-type: none"> Milník Časová rezerva Skluz Souhrnný 	<ul style="list-style-type: none"> Souhrn projektu Zahrnutý kritický Rozdělení zahrnutého kritického úkolu Neaktivní úkol 	<ul style="list-style-type: none"> Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání 	<ul style="list-style-type: none"> Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení 	<ul style="list-style-type: none"> Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín Průběh
---	---	---	--	---	---



ID	Re	Název	Vy	Doba	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	
úk			trvání	ny					
			zp						
30		Bourací práce	0 9 dny?	ny	6.12. 19	18.12. 19			2019 p1 p2 2020 p1 p2 2021 p1 p2 2022 p1 p2
31		Vybourání schodiště, dveří	0 1 den	ny	6.12. 19	6.12. 19 32		58	
32		Osazení nových dveří	0 1 den	ny	9.12. 19	9.12. 19 33		31	
33		Zazdění okenního otvoru	0 1 den	ny	10.12. 19	10.12. 19 34		32	
34		Vybourání okenního otvoru, stěny	0 1 den	ny	11.12. 19	11.12. 19 35		33	
35		Osazení nových dveří	0 1 den	ny	12.12. 19	12.12. 19 36		34	
36		Zazdění okenního otvoru	0 1 den	ny	13.12. 19	13.12. 19 37		35	
37		Vybourání okenního otvoru, stěny	0 1 den	ny	16.12. 19	16.12. 19 38		36	
38		Osazení nových dveří	0 1 den	ny	17.12. 19	17.12. 19 39		37	
39		Zazdění okenního otvoru	0 1 den?	ny	18.12. 19	18.12. 19 39		38	
40		Hrubá spodní stavba 1.PP	0 31 dny	ny	19.12. 19	30.1. 20			
41		Vytyčení nosných stěn a otvorů	0 1 den	ny	19.12. 19	19.12. 19 42		29	
42		Bednění nosných stěn	0 4 dny	ny	20.12. 19	25.12. 19 43SS+2 dny		41	
43		Armování nosných stěn	0 9 dny	ny	24.12. 19	3.1. 20 44FF+1 den		42SS+2 dny	
44		Dobednění nosných stěn	0 4 dny	ny	1.1. 20	6.1. 20 45FF+1 den		43FF+1 den	
45		Betonáž nosných stěn	0 3 dny	ny	3.1. 20	7.1. 20 46SS+1 den		44FF+1 den	
46		Odbednění nosných stěn	0 4 dny	ny	6.1. 20	9.1. 20 47SS+1 den		45SS+1 den	
47		Zdění nosných vnitřních stěn	0 2 dny	ny	7.1. 20	8.1. 20 48		46SS+1 den	
48		Bednění stropní konstrukce	0 3 dny	ny	9.1. 20	13.1. 20 49SS+2 dny		47	
49		Armování stropní konstrukce	0 5 dny	ny	13.1. 20	17.1. 20 50		48SS+2 dny	
50		Betonáž stropní konstrukce	0 1 den	ny	20.1. 20	20.1. 20 60FS+1 den;53FS+4 dny		49	
51		Odbednění stropní konstrukce	0 2 dny	ny	28.1. 20	29.1. 20 52SS+1 den		53	
52		Osazení prefabrikovaného schodiště	0 2 dny	ny	29.1. 20	30.1. 20 63FS+1 den		51SS+1 den	
53		Osazení ocelového schodiště	0 1 den	ny	27.1. 20	27.1. 20 51		50FS+4 dny	
54		Přípojky	ny 11 dny		21.11. 19	5.12. 19			
55		Přípojka kanalizace	0 2 dny	ny	21.11. 19	22.11. 19 56		15	
56		Přípojka dešťové kanalizace	0 4 dny	ny	25.11. 19	28.11. 19 57SS+2 dny		55	
57		Přípojka splaškové kanalizace	0 5 dny	ny	27.11. 19	3.12. 19 58FS-2 dny		56SS+2 dny	
58		Retenční nádrže	ny 4 dny		2.12. 19	5.12. 19 31		57FS-2 dny	
59		Hrubá vrchní stavba - 1.NP	0 36 dny	ny	22.1. 20	11.3. 20			
60		Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP	0 1 den	ny	22.1. 20	22.1. 20 61		50FS+1 den	
61		Zřízení bednění nosných stěn	0 4 dny	ny	23.1. 20	28.1. 20 62SS+2 dny		60	
62		Armování nosných stěn	0 6 dny	ny	27.1. 20	3.2. 20 63SS+5 dny		61SS+2 dny	
63		Dobednění nosných stěn	0 3 dny	ny	3.2. 20	5.2. 20 64SS+2 dny		62SS+5 dny;52FS+1 den	
64		Betonáž nosných stěn	0 3 dny	ny	5.2. 20	7.2. 20 65SS+1 den		63SS+2 dny	




Kritický	Milník	Souhrn projektu	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly
Rozdělení kritického úkolu	Časová rezerva	Zahrnutý kritický	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník
Úkol	Skluz	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín
Rozdělení	Souhrnný	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Průběh

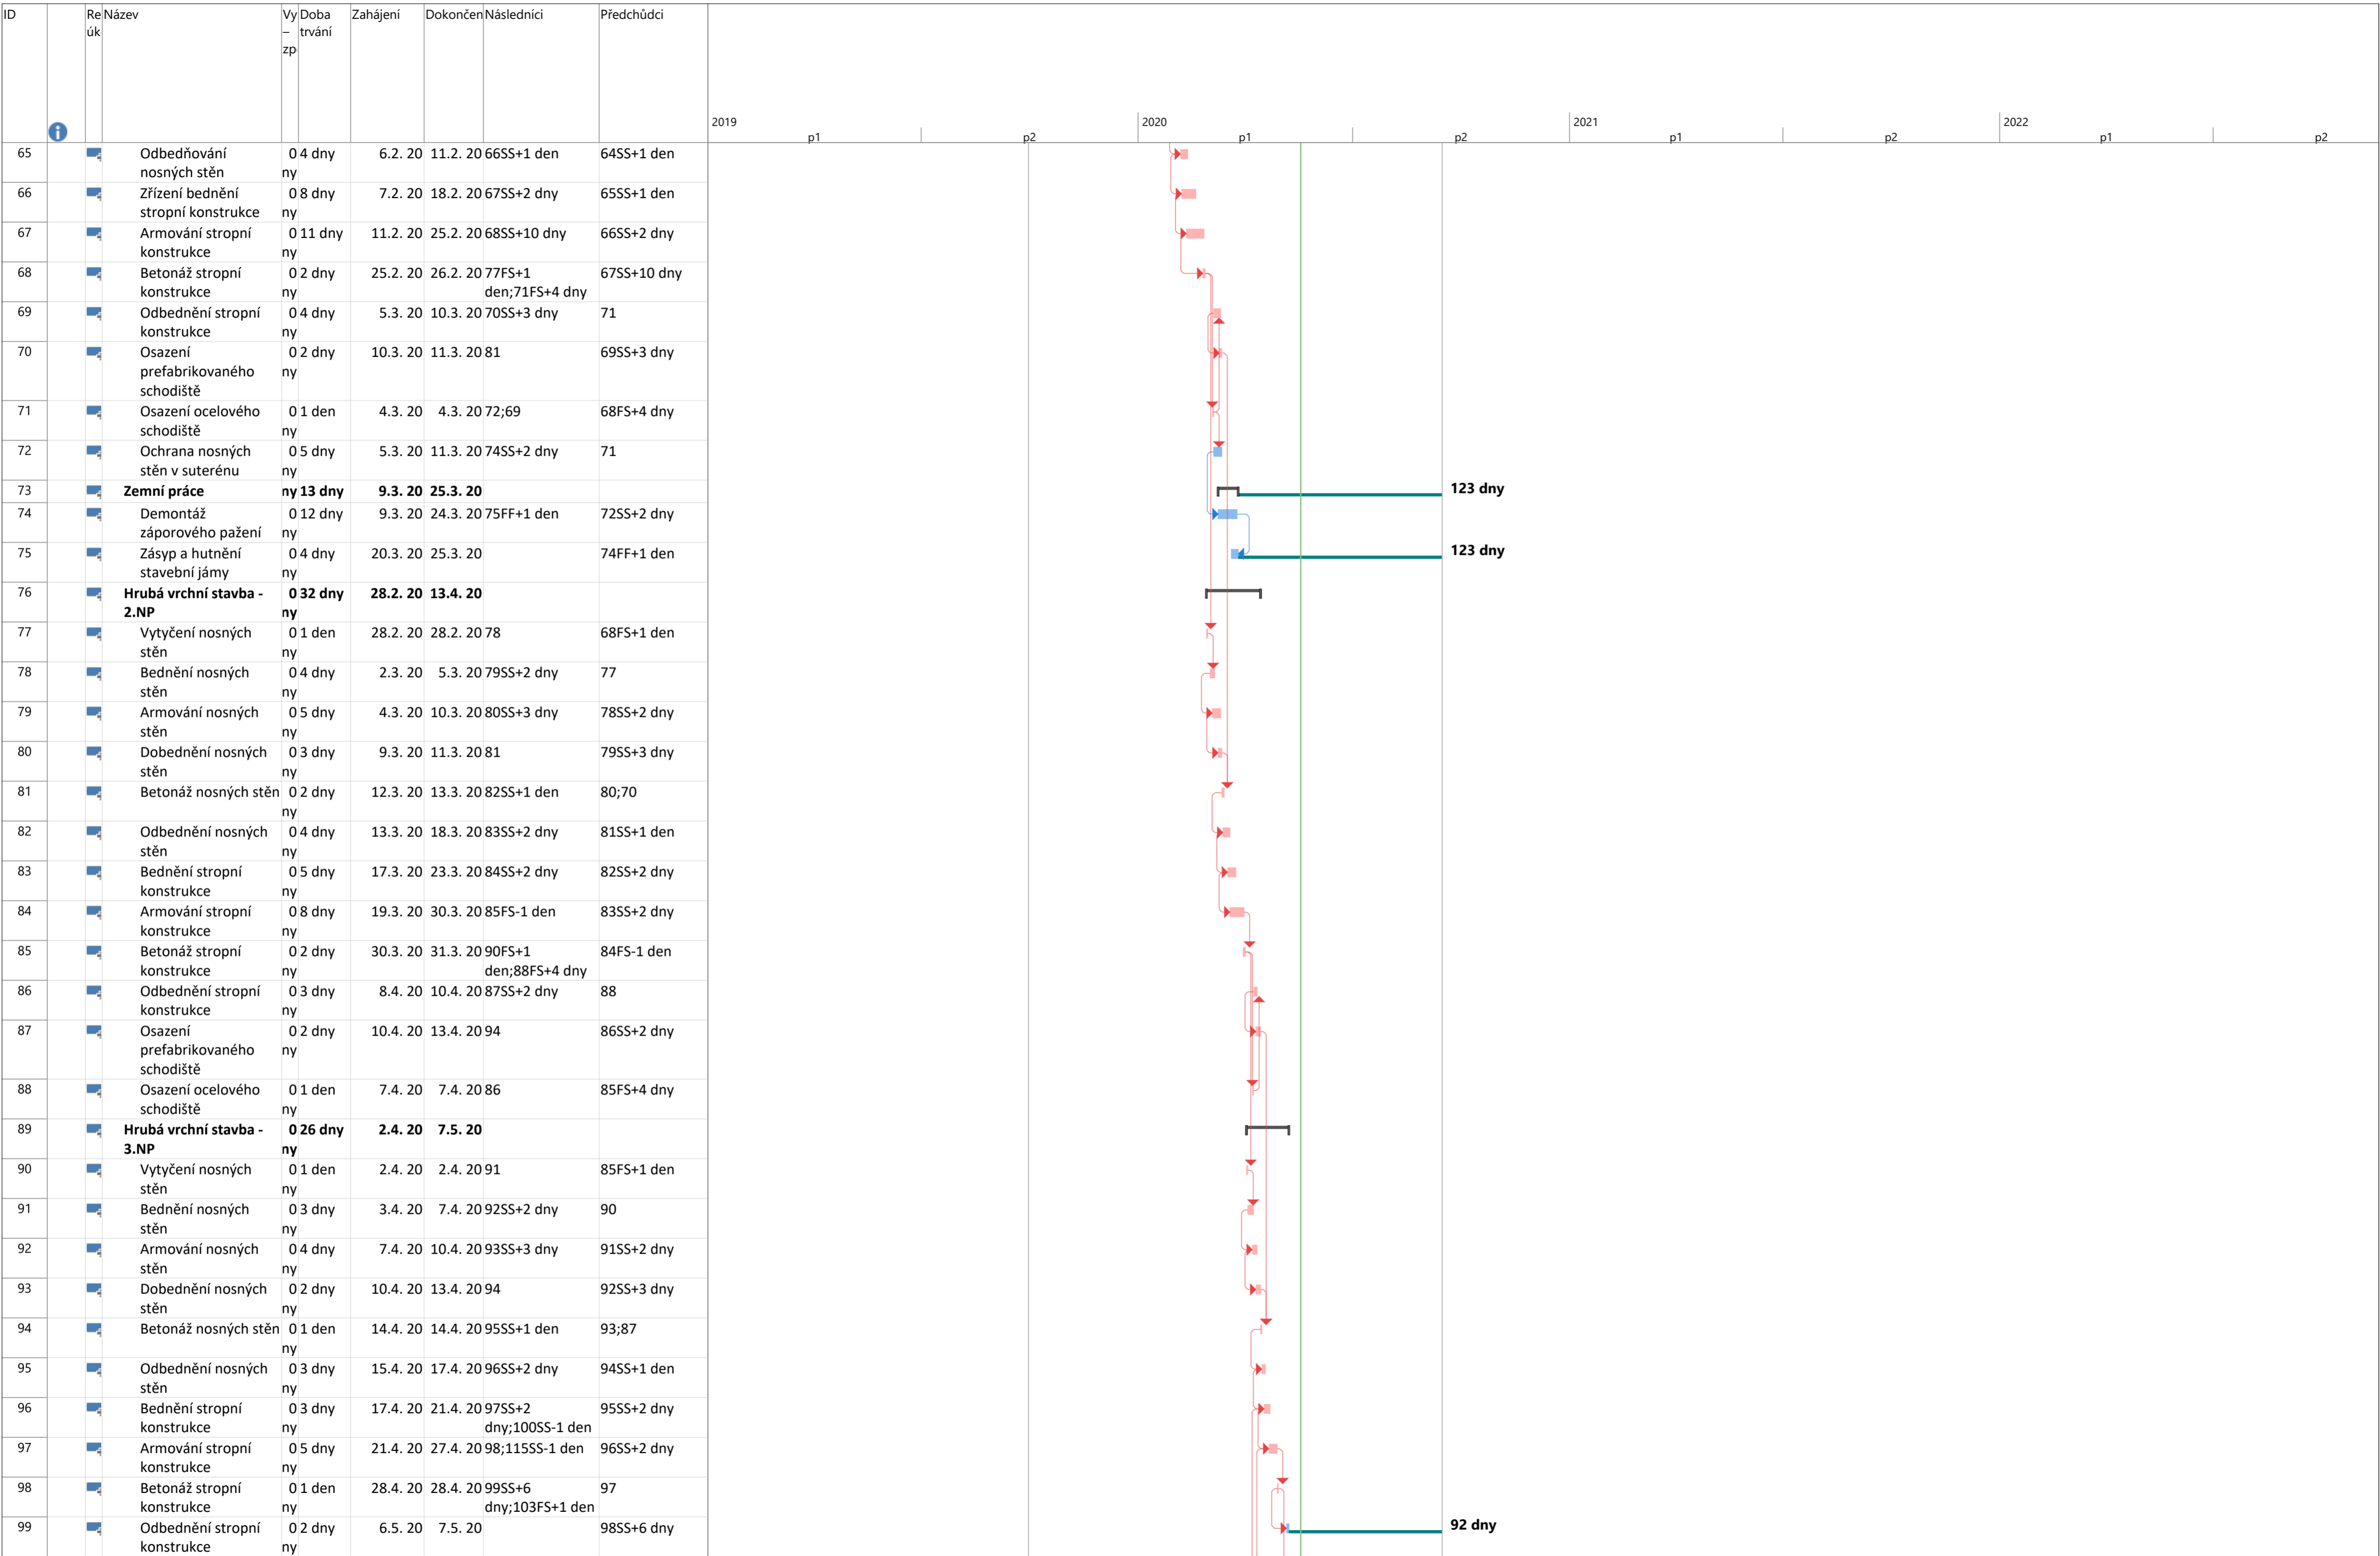

<ul style="list-style-type: none"> Kritický Rozdělení kritického úkolu Úkol Rozdělení 	<ul style="list-style-type: none"> Milník Časová rezerva Skluz Souhrnný 	<ul style="list-style-type: none"> Souhrn projektu Zahrnutý kritický Rozdělení zahrnutého kritického úkolu Neaktivní úkol 	<ul style="list-style-type: none"> Neaktivní milník Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání 	<ul style="list-style-type: none"> Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení Pouze s datem dokončení 	<ul style="list-style-type: none"> Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín Průběh
---	---	---	--	---	---

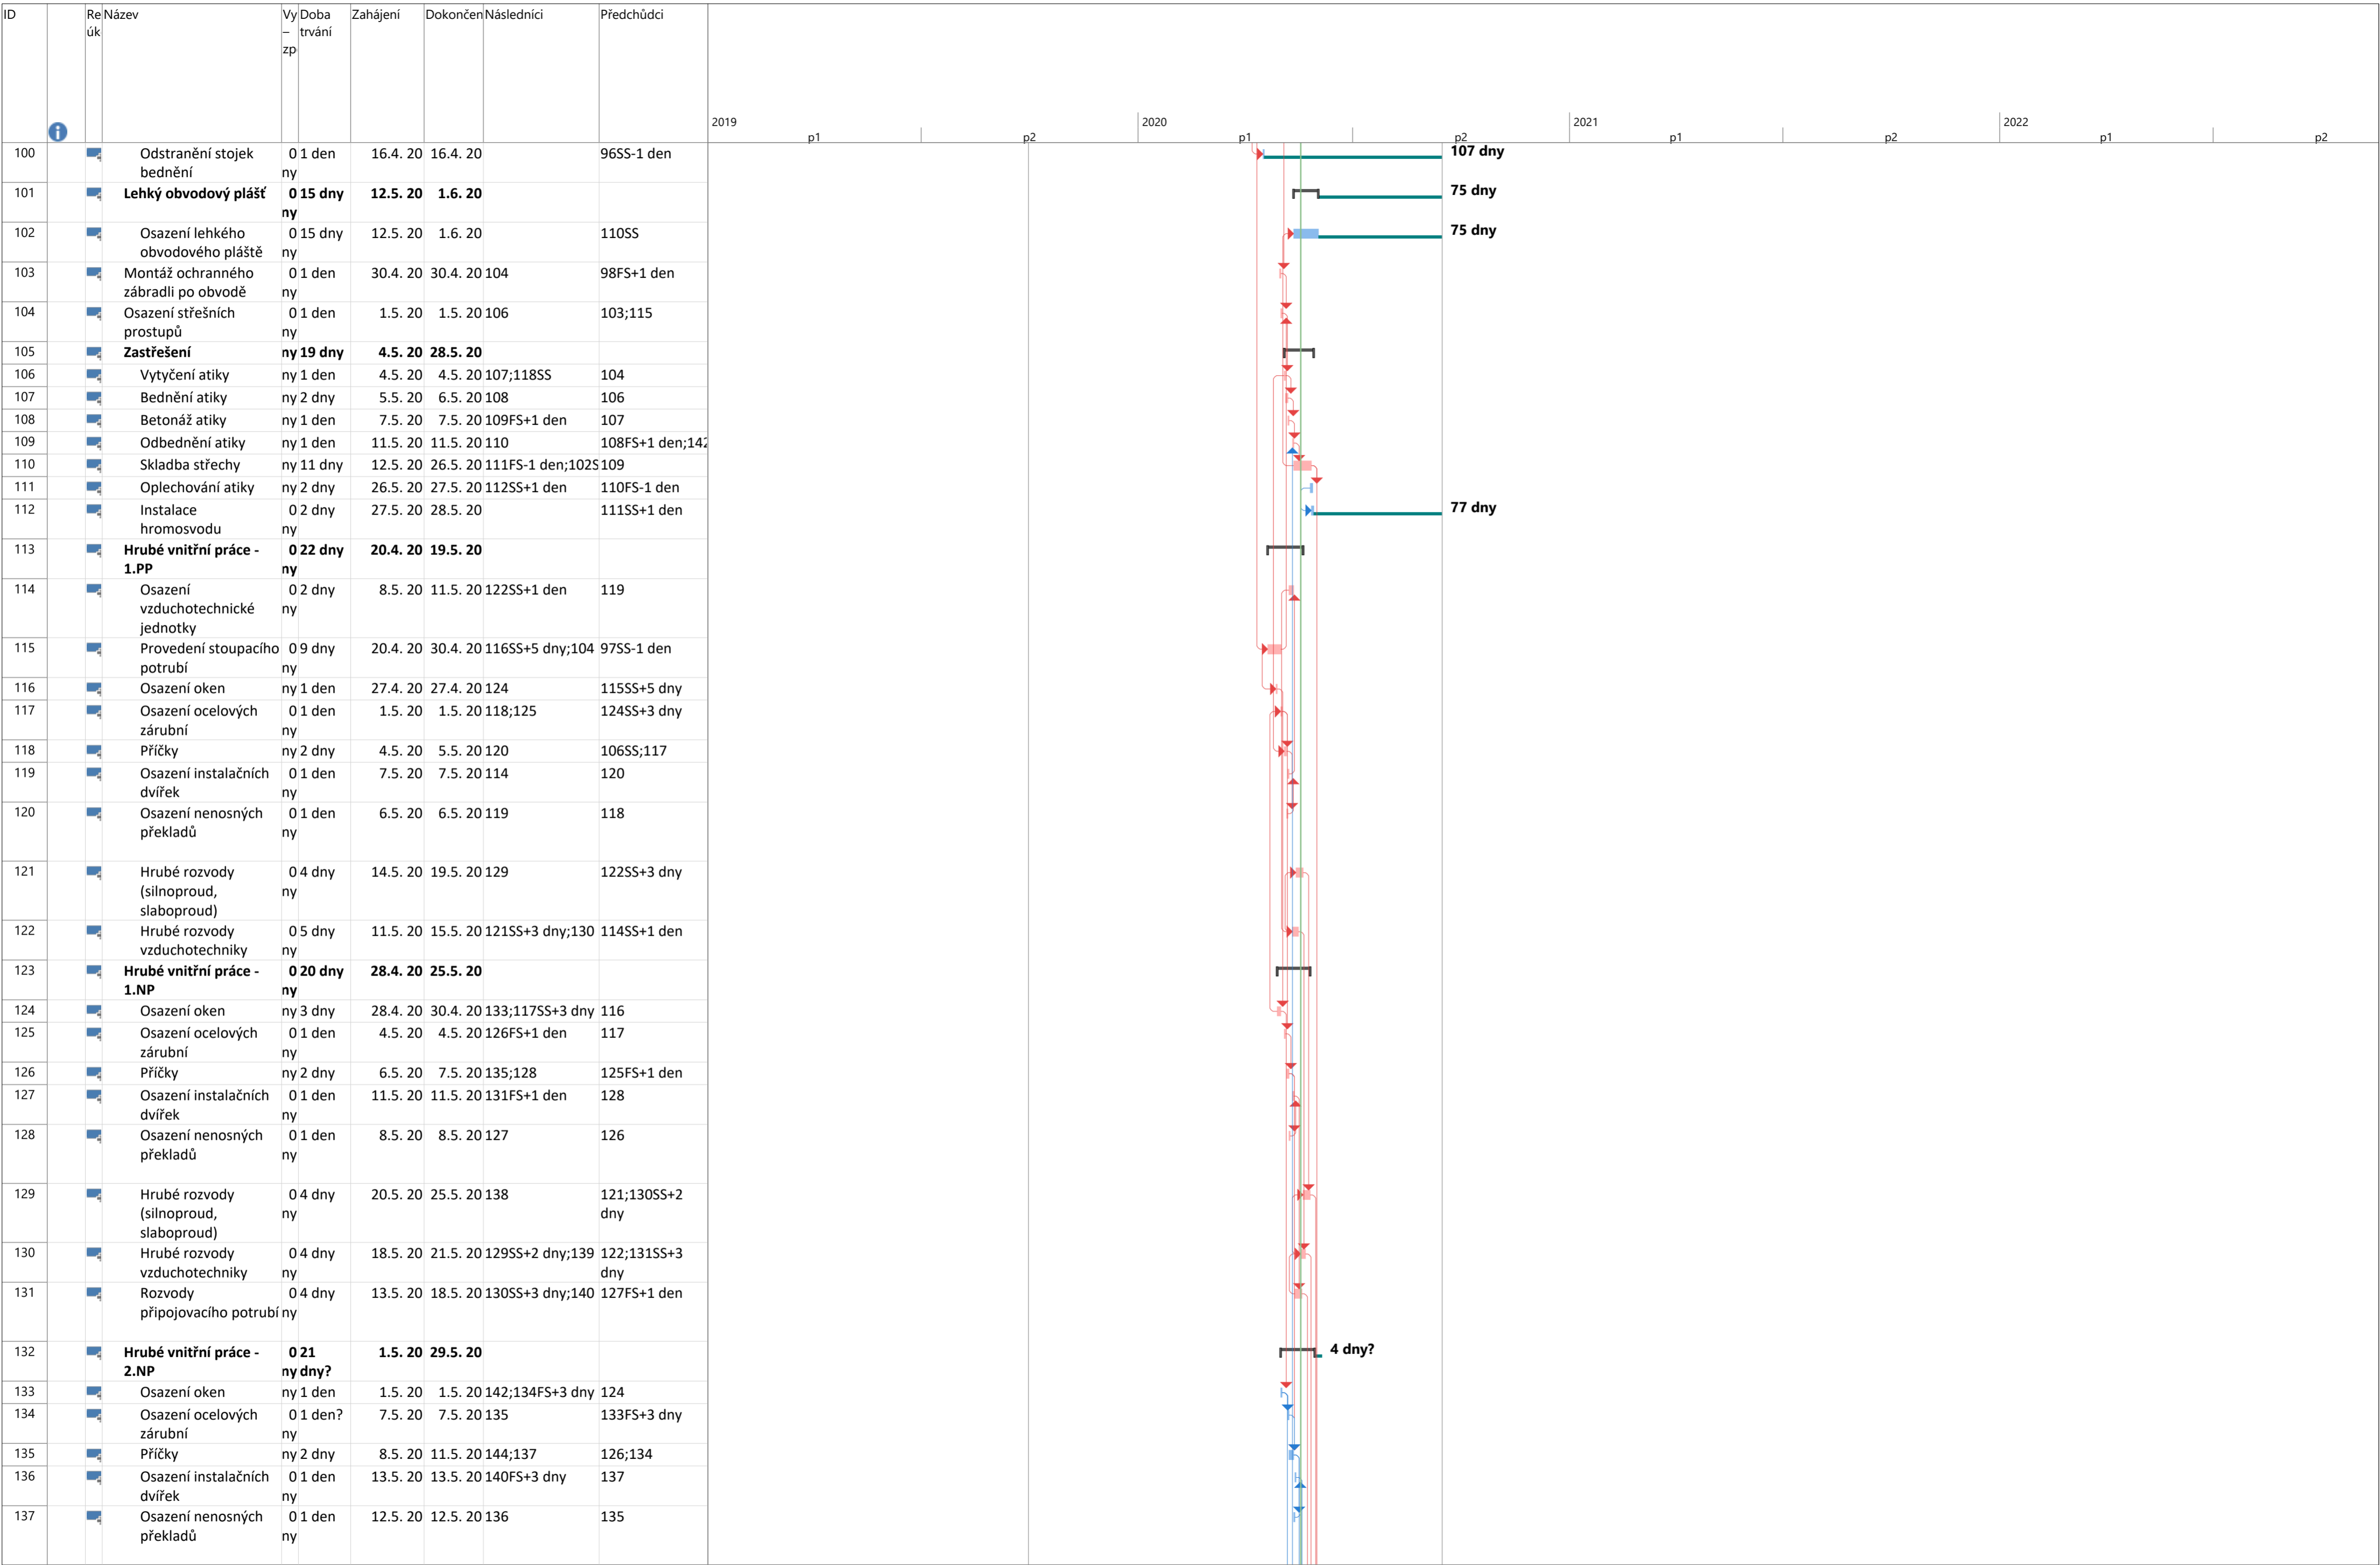


ID	Re- úk	Název	Vy- - zp	Doba - trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci
138		Hrubé rozvody (silnoproud, slaboproud)	ny	0 4 dny	26.5. 20	29.5. 20	147	129
139		Hrubé rozvody vzduchotechniky	ny	0 4 dny	22.5. 20	27.5. 20	148	130
140		Rozvody přípojovacího potrubí	ny	0 4 dny	19.5. 20	22.5. 20	149	131;136FS+3 dny
141		Hrubé vnitřní práce - 3.NP	ny	0 24 dny	4.5. 20	4.6. 20		
142		Osazení oken	ny	1 den	4.5. 20	4.5. 20	109;143FS+4 dny	133
143		Osazení ocelových zárubní	ny	0 1 den	11.5. 20	11.5. 20	144	142FS+4 dny
144		Příčky	ny	1 den	12.5. 20	12.5. 20	146	135;143
145		Osazení instalačních dvířek	ny	0 1 den	14.5. 20	14.5. 20	149FS+5 dny	146
146		Osazení nenosných překladů	ny	0 1 den	13.5. 20	13.5. 20	145	144
147		Hrubé rozvody (silnoproud, slaboproud)	ny	0 4 dny	1.6. 20	4.6. 20	175FS+1 den	138;148FF+2 dny
148		Hrubé rozvody vzduchotechniky	ny	0 4 dny	28.5. 20	2.6. 20	147FF+2 dny	139
149		Rozvody přípojovacího potrubí	ny	0 4 dny	25.5. 20	28.5. 20		140;145FS+5 dny
150		Hrubé úpravy - 1.PP	ny	47 dny	27.5. 20	30.7. 20		
151		Provedení omítky	ny	7 dny	27.5. 20	4.6. 20	152FF+5 dny;159;110	
152		Hrubé rozvody vytápění	ny	0 3 dny	9.6. 20	11.6. 20	154SS+1 den;160	151FF+5 dny
153		Teraco	ny	6 dny	15.6. 20	22.6. 20	155SS+2 dny	154SS+3 dny
154		Hrubé podlahy	ny	5 dny	10.6. 20	16.6. 20	155;161;153SS+3	152SS+1 den
155		Provedení SDK přesazených stěn	ny	0 2 dny	17.6. 20	18.6. 20	163	154;153SS+2 dny
156		Provedení SDK podhledu	ny	0 3 dny	25.6. 20	29.6. 20	164;200FS+1 den	163
157		Montáž požárních hydrantů	ny	0 3 dny	28.7. 20	30.7. 20	165	197FS+1 den
158		Hrubé úpravy - 1.PP , TĚLOCVIČNA	ny	43 dny	5.6. 20	4.8. 20		
159		Provedení omítky	ny	7 dny	5.6. 20	15.6. 20	183	151
160		Hrubé rozvody vytápění	ny	0 3 dny	12.6. 20	16.6. 20	161	152
161		Hrubá podlaha	ny	1 den	17.6. 20	17.6. 20	163	154;160
162		Podlaha	ny	11 dny	10.7. 20	24.7. 20	197FF	164FS-4 dny
163		Provedená SDK přesazených stěn	ny	0 4 dny	19.6. 20	24.6. 20	156	155;161
164		Provedení SDK podhledu	ny	0 12 dny	30.6. 20	15.7. 20	162FS-4 dny	156
165		Montáž požárních hydrantů	ny	0 3 dny	31.7. 20	4.8. 20	211FS-1 den	157
166		Hrubé úpravy - 1.NP	ny	29 dny	27.5. 20	6.7. 20		
167		Provedení omítky	ny	8 dny	27.5. 20	5.6. 20	168FS-4 dny;175	151SS
168		Hrubé rozvody vytápění	ny	0 5 dny	2.6. 20	8.6. 20	170SS+1 den	167FS-4 dny
169		Teraco	ny	5 dny	9.6. 20	15.6. 20		171SS
170		Hrubá podlaha	ny	5 dny	3.6. 20	9.6. 20	171FF+1 den	168SS+1 den
171		Provedení SDK přesazených stěn	ny	0 2 dny	9.6. 20	10.6. 20	172;169SS	170FF+1 den
172		Provedení SDK podhledu	ny	0 4 dny	11.6. 20	16.6. 20	217FS+2 dny	171
173		Montáž požárních hydrantů	ny	0 3 dny	2.7. 20	6.7. 20	223SS+2 dny	218SS+2 dny
174		Hrubé úpravy - 2.NP	ny	44 dny	8.6. 20	6.8. 20		
175		Provedení omítky	ny	12 dny	8.6. 20	23.6. 20	176FF+1 den	167;147FS+1 den
176		Hrubé rozvody vytápění	ny	0 5 dny	18.6. 20	24.6. 20	178SS+1 den	175FF+1 den
177		Teraco	ny	7 dny	7.7. 20	15.7. 20	179	232

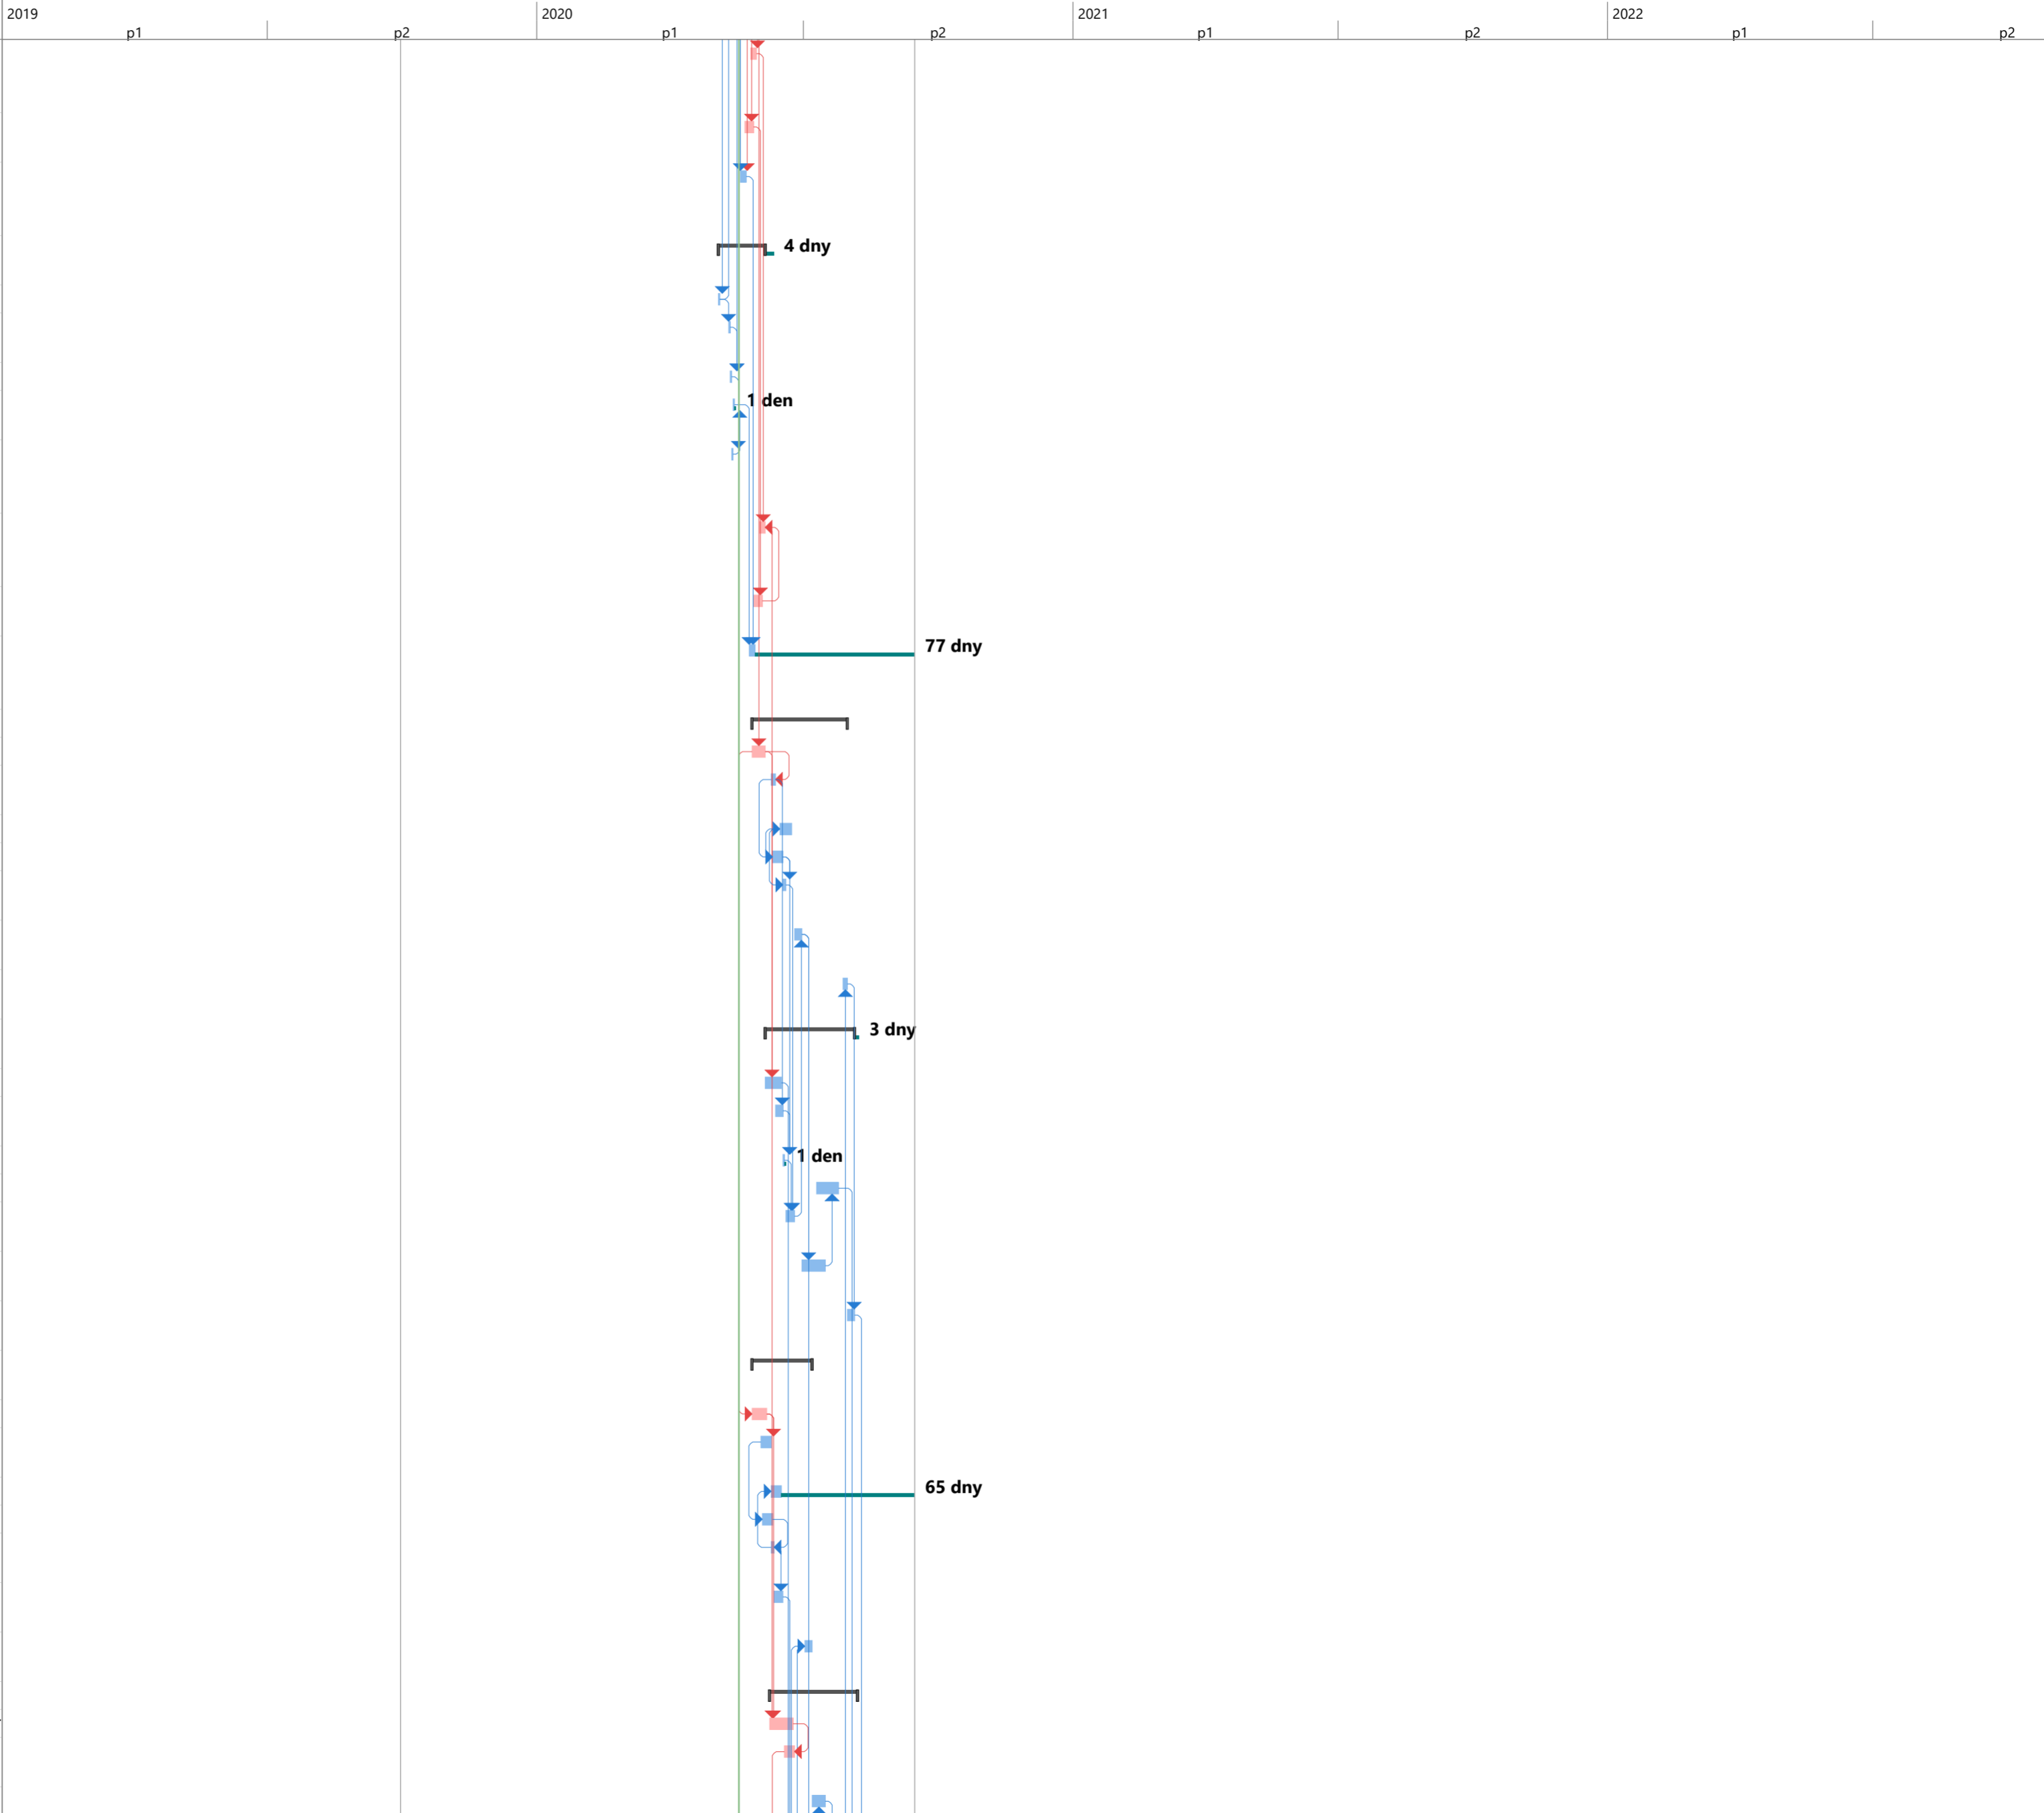


Kritický		Milník		Souhrn projektu		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Časová rezerva		Zahrnutý kritický		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník	
Úkol		Skluz		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Souhrnný		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	

ID	Rek	Název	Vy- trvá- ní zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021	2022		
									p1	p2	p1	p2	p1	p2
178		Hrubá podlaha	ny	8 dny	19.6. 20	30.6. 20	230FS+1 den;191	176SS+1 den						
179		Provedení SDK předsazených stěn	ny	0 2 dny	16.7. 20	17.7. 20	180	177						
180		Provedení SDK podhledu	ny	0 6 dny	20.7. 20	27.7. 20	233SS+3 dny;187	179						
181		Montáž požárních hydrantů	ny	0 3 dny	4.8. 20	6.8. 20	236SS+2 dny	231SS+2 dny						
182		Hrubé úpravy - 3.NP	ny	0 40 dny	16.6. 20	10.8. 20								
183		Provedení omítky	ny	8 dny	16.6. 20	25.6. 20	184FF;256	159						
184		Hrubé rozvody vytápění	ny	0 5 dny	19.6. 20	25.6. 20	186SS+2 dny	183FF						
185		Teraco	ny	6 dny	3.7. 20	10.7. 20	245FS+1 den	243FS+1 den						
186		Hrubá podlaha	ny	5 dny	23.6. 20	29.6. 20	243FS+1 den	184SS+2 dny						
187		Provedení SDK předsazených stěn	ny	0 2 dny	28.7. 20	29.7. 20	188	180						
188		Provedení SDK podhledu	ny	0 3 dny	30.7. 20	3.8. 20	244FS-1 den;189FS+2 dny	187						
189		Montáž požárních hydrantů	ny	0 3 dny	6.8. 20	10.8. 20	248FS-1 den	188FS+2 dny						
190		Přípojky - vodovod,horkovod	ny	0 13 dny	1.7. 20	17.7. 20								
191		Demolice silnice	ny	1 den	1.7. 20	1.7. 20	192	178						
192		Přípojka vodovodu	ny	3 dny	2.7. 20	6.7. 20	193	191						
193		Přípojka horkovodu	ny	4 dny	7.7. 20	10.7. 20	194FF+1 den	192						
194		Osazení vodoměrné šachty	ny	0 2 dny	10.7. 20	13.7. 20	195	193FF+1 den						
195		Výstavba silnice	ny	4 dny	14.7. 20	17.7. 20	267	194						
196		Dokončovací práce a kompletace - 1.PP	ny	0 49 dny	1.7. 20	7.9. 20								
197		Osazení vnitřních parapetů	ny	0 1 den	24.7. 20	24.7. 20	198;157FS+1 den	162FF						
198		Maliřské práce	ny	2 dny	27.7. 20	28.7. 20	199FS+2 dny;210	197						
199		Ocelové zábradlí	ny	2 dny	31.7. 20	3.8. 20	203	198FS+2 dny						
200		Provedení dlažeb + obkladů	ny	0 10 dny	1.7. 20	14.7. 20		156FS+1 den						
201		Finální úprava teraca ny	ny	0 3 dny	19.8. 20	21.8. 20	212	211FF						
202		Osazení dveří	ny	2 dny	20.8. 20	21.8. 20	204FS+1 den;212	211FF						
203		Lepení PVC	ny	1 den	4.8. 20	4.8. 20	211SS	199						
204		Montáž ZTI + otopných těles	ny	0 1 den	25.8. 20	25.8. 20	205	202FS+1 den;212						
205		Kompletace elektro + svítidla	ny	0 3 dny	26.8. 20	28.8. 20	206;213	204						
206		Kopletace vzduchotechniky	ny	0 2 dny	31.8. 20	1.9. 20	214;207FS+2 dny	205						
207		Kompletace topení	ny	1 den	4.9. 20	4.9. 20	208	206FS+2 dny						
208		úklid podlaží	ny	1 den	7.9. 20	7.9. 20	215	207						
209		Dokončovací práce a kompletace - 1.PP, TĚLOCVIČNA	ny	0 31 dny	29.7. 20	9.9. 20								
210		Maliřské práce	ny	1 den	29.7. 20	29.7. 20		198						
211		Provádění podlahy - tělocvična	ny	0 14 dny	4.8. 20	21.8. 20	202FF;201FF	165FS-1 den;203SS						
212		Osazení dveří	ny	1 den	24.8. 20	24.8. 20	204	202;201						
213		Kompletace elektro + svítidla	ny	0 3 dny	31.8. 20	2.9. 20		205						
214		Kompletace vzduchotechniky	ny	0 2 dny	2.9. 20	3.9. 20		206						
215		Úklid podlaží	ny	2 dny	8.9. 20	9.9. 20		208						
216		Dokončovací práce a kompletace - 1.NP	ny	0 26 dny	19.6. 20	24.7. 20								
217		Osazení vnitřních parapetů	ny	0 1 den	19.6. 20	19.6. 20	219	172FS+2 dny						
218		Maliřské práce	ny	0 3 dny	30.6. 20	2.7. 20	223FS+1 den;173SS+2 dny	220						
219		Ocelové zábradlí	ny	2 dny	22.6. 20	23.6. 20	220	217						
220		Provedení dlažeb + obkladů	ny	0 4 dny	24.6. 20	29.6. 20	218	219						

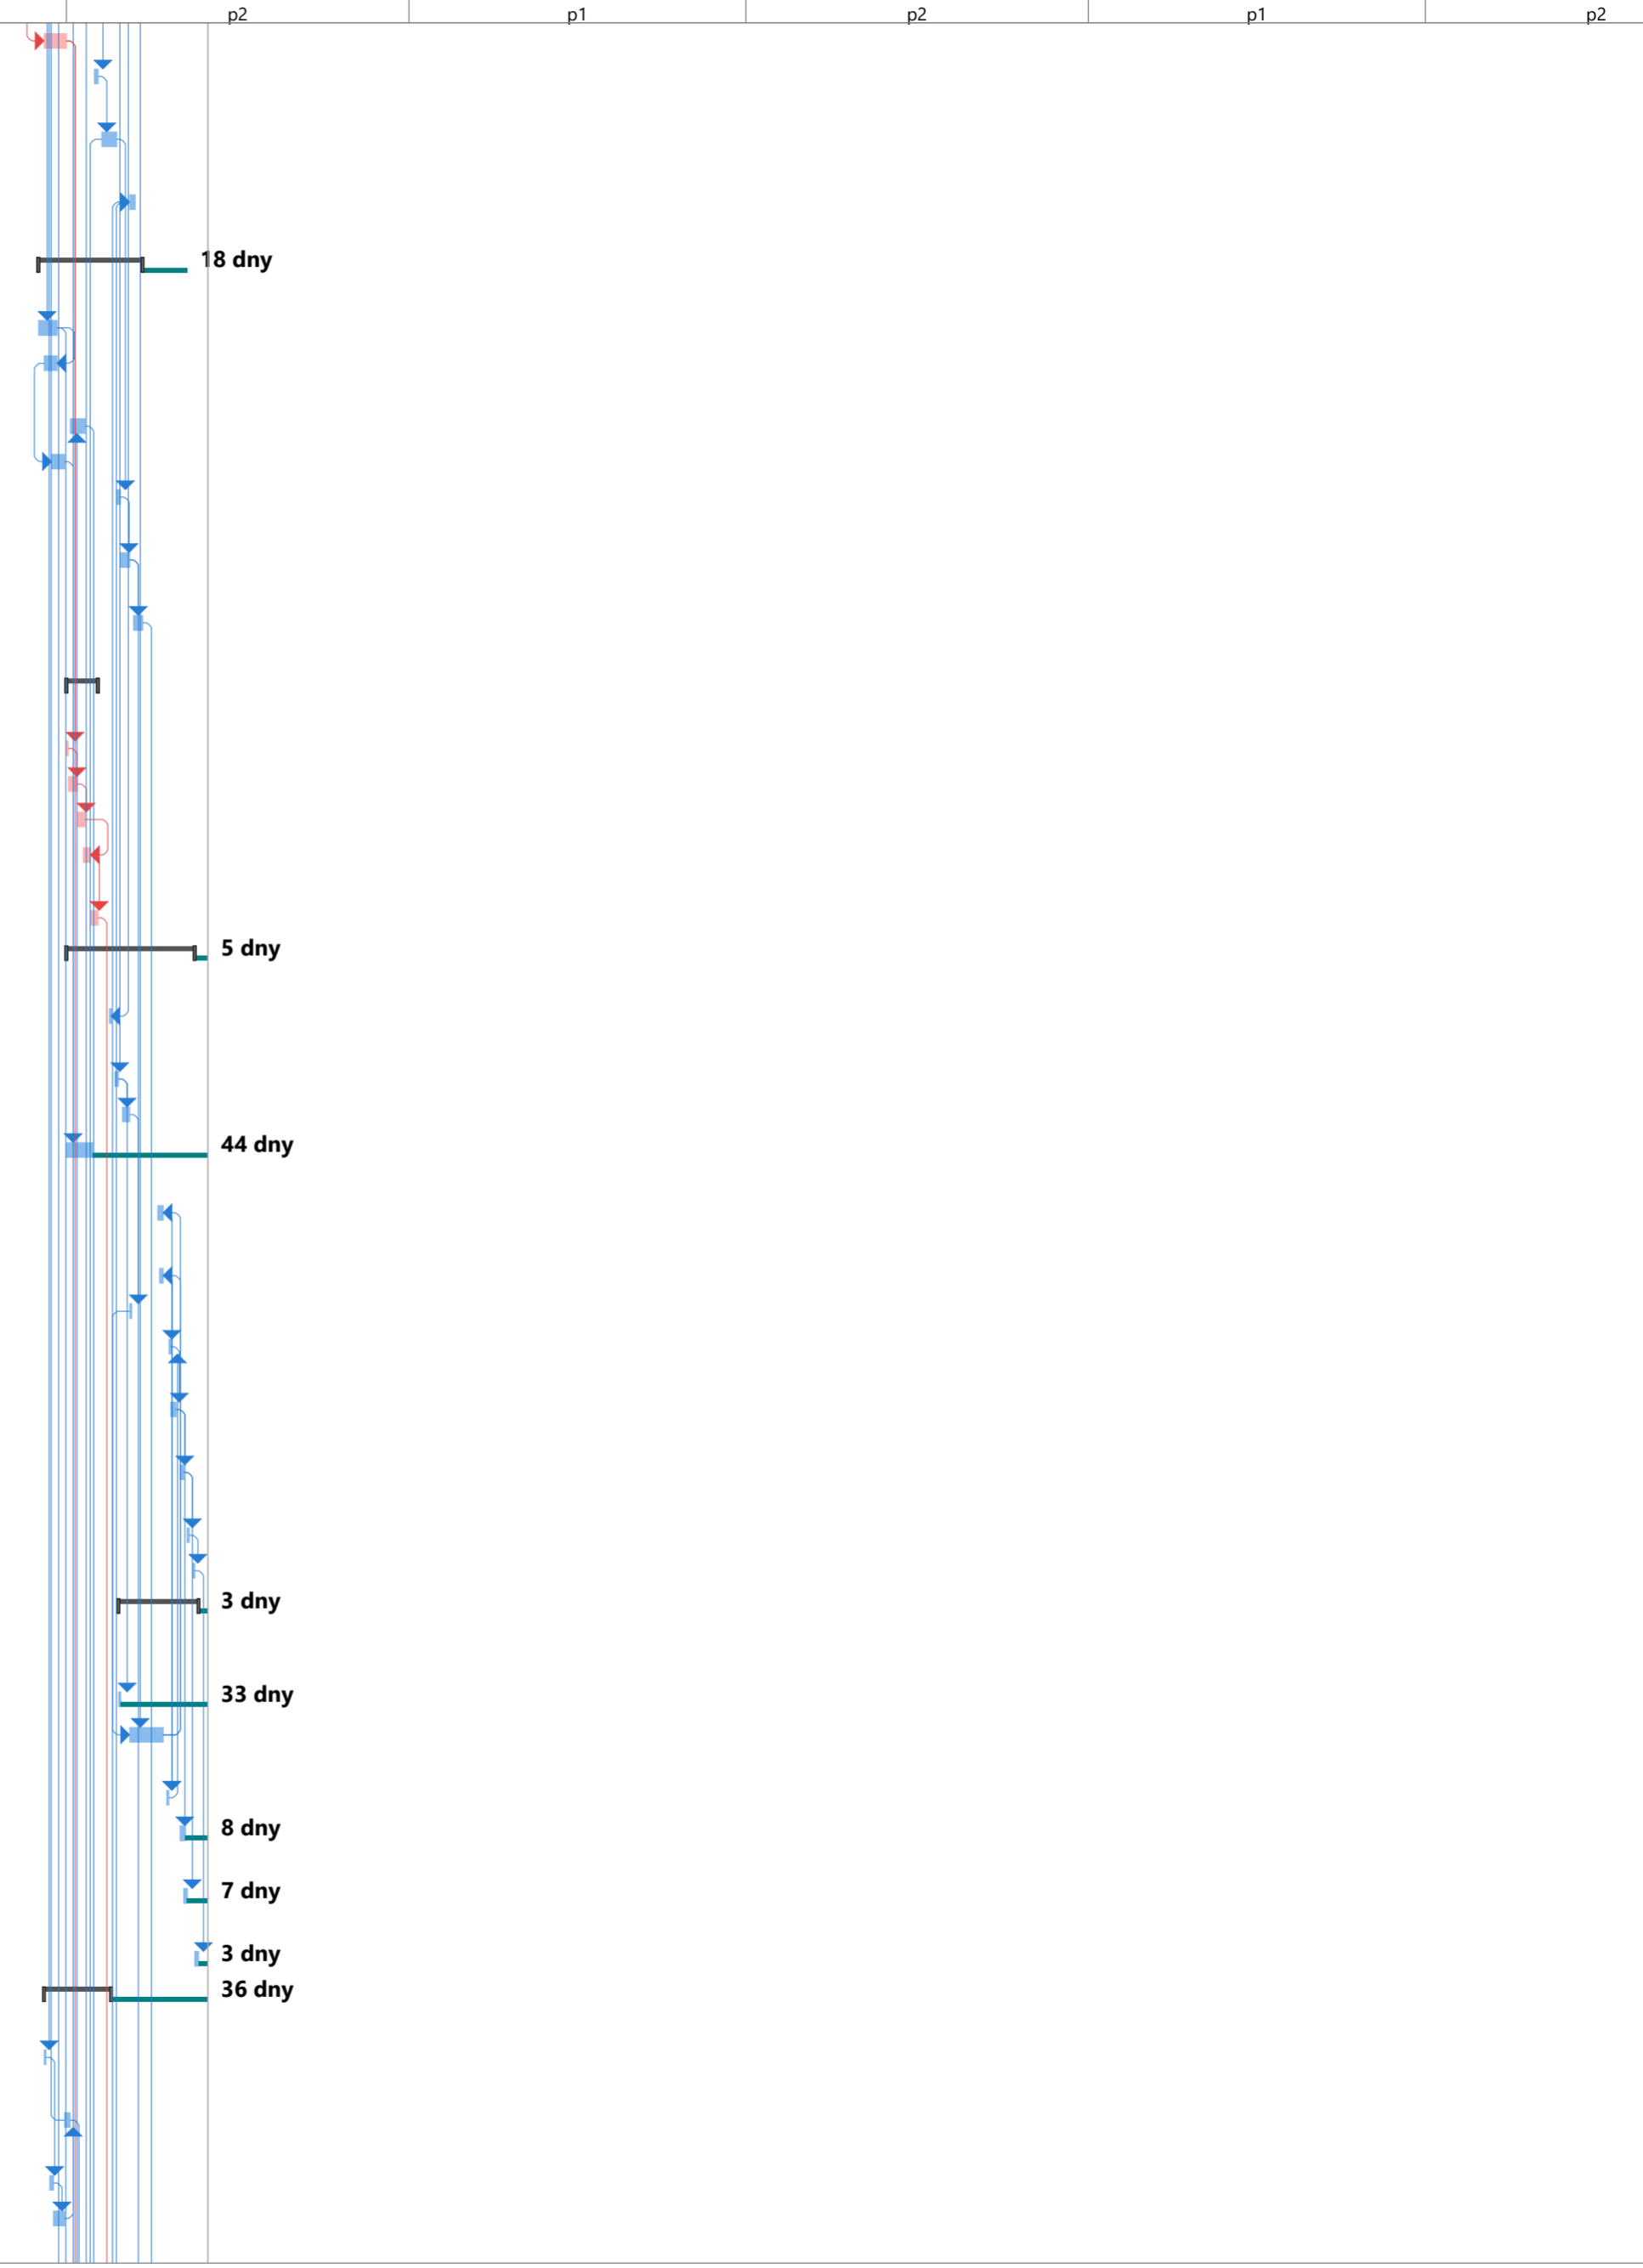

Kritický		Milník		Souhrn projektu		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Časová rezerva		Zahrnutý kritický		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník	
Úkol		Skluz		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Souhrnný		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	

ID	Re- úk	Název	Vy- - zp	Doba - trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021	2022
221		Finální úprava teraca	ny	0 3 dny	7.7. 20	9.7. 20	222FF+1 den	223SS+1 den				
222		Osazení dveří	ny	0 2 dny	9.7. 20	10.7. 20	224	223FS+1 den;221FF+1				
223		Lepení PVC	ny	0 2 dny	6.7. 20	7.7. 20	222FS+1 den;221SS+1 den	218FS+1 den;173SS+2				
224		Montáž ZTI + otopných těles	ny	0 1 den	13.7. 20	13.7. 20	225	222				
225		Kompletace elektro + svítidla	ny	0 1 den	14.7. 20	14.7. 20	226	224				
226		Kopletace vzduchotechniky	ny	0 4 dny	15.7. 20	20.7. 20	227	225				
227		Kompletace topení	ny	0 1 den	21.7. 20	21.7. 20	228	226				
228		Úklid podlaží	ny	3 dny	22.7. 20	24.7. 20		227				
229		Dokončovací práce a kompletace - 2.NP	ny	0 53 dny	1.7. 20	11.9. 20						
230		Osazení vnitřních parapetů	ny	0 1 den	2.7. 20	2.7. 20	232	178FS+1 den				
231		Malířské práce	ny	4 dny	31.7. 20	5.8. 20	236;181SS+2 dny	233				
232		Ocelové zábradlí	ny	2 dny	3.7. 20	6.7. 20	177	230				
233		Provedení dlažeb + obkladů	ny	0 6 dny	23.7. 20	30.7. 20	231	180SS+3 dny				
234		Finální úprava teraca	ny	0 3 dny	11.8. 20	13.8. 20	237FS+1 den	236FS-2 dny				
235		Osazení dveří	ny	3 dny	12.8. 20	14.8. 20	237	236FF+2 dny				
236		Lepení PVC	ny	5 dny	6.8. 20	12.8. 20	235FF+2 dny;234	231;181SS+2 dny				
237		Montáž ZTI + otopných těles	ny	0 2 dny	17.8. 20	18.8. 20	238SS	235;234FS+1 den				
238		Kompletace elektro + svítidla	ny	0 7 dny	17.8. 20	25.8. 20	239FF+1 den	237SS				
239		Kompletace vzduchotechniky	ny	0 4 dny	21.8. 20	26.8. 20	240	238FF+1 den				
240		Kompletace topení	ny	1 den	27.8. 20	27.8. 20	241	239				
241		Úklid podlaží	ny	5 dny	28.8. 20	3.9. 20	253FS+1 den	240				
242		Dokončovací práce a kompletace 3.NP	ny	0 1 den	1.7. 20	1.7. 20						
243		Osazení vnitřních parapetů	ny	0 1 den	1.7. 20	1.7. 20	185FS+1 den	186FS+1 den				
244		Malířské práce	ny	0 4 dny	3.8. 20	6.8. 20	248FF+4 dny	188FS-1 den				
245		Provedení dlažeb + obkladů	ny	0 6 dny	14.7. 20	21.7. 20		185FS+1 den				
246		Finální úprava teraca	ny	0 3 dny	11.8. 20	13.8. 20	247FS-1 den	248SS+1 den				
247		Osazení dveří	ny	0 2 dny	13.8. 20	14.8. 20	249	248FF+2 dny;246FS-1				
248		Lepení PVC	ny	0 3 dny	10.8. 20	12.8. 20	247FF+2 dny;246SS+1 den	244FF+4 dny;189FS-1				
249		Montáž ZTI + otopných těles	ny	0 1 den	17.8. 20	17.8. 20	250SS	247				
250		Kompletace elektro + svítidla	ny	0 7 dny	17.8. 20	25.8. 20	251FF+1 den	249SS				
251		Kopletace vzduchotechniky	ny	0 4 dny	21.8. 20	26.8. 20	252	250FF+1 den				
252		Kompletace topení	ny	1 den	27.8. 20	27.8. 20	254	251				
253		Úklid schodiště	ny	5 dny	7.9. 20	11.9. 20		241FS+1 den				
254		Úklid podlaží	ny	3 dny	28.8. 20	1.9. 20		252				
255		Fasádní úpravy	ny	38 dny	26.6. 20	18.8. 20						
256		Montáž zábradlí na terase	ny	0 1 den	26.6. 20	26.6. 20	257	183				
257		Skladba terasy	ny	6 dny	29.6. 20	6.7. 20	258SS+2 dny	256				
258		Montáž lešení	ny	5 dny	1.7. 20	7.7. 20	259SS+2 dny	257SS+2 dny				
259		Kontaktní zateplovací systém	ny	0 10 dny	3.7. 20	16.7. 20	260;262FF	258SS+2 dny				
260		Provedení fasádní omítky	ny	0 8 dny	17.7. 20	28.7. 20	261FS-2 dny	259;262				

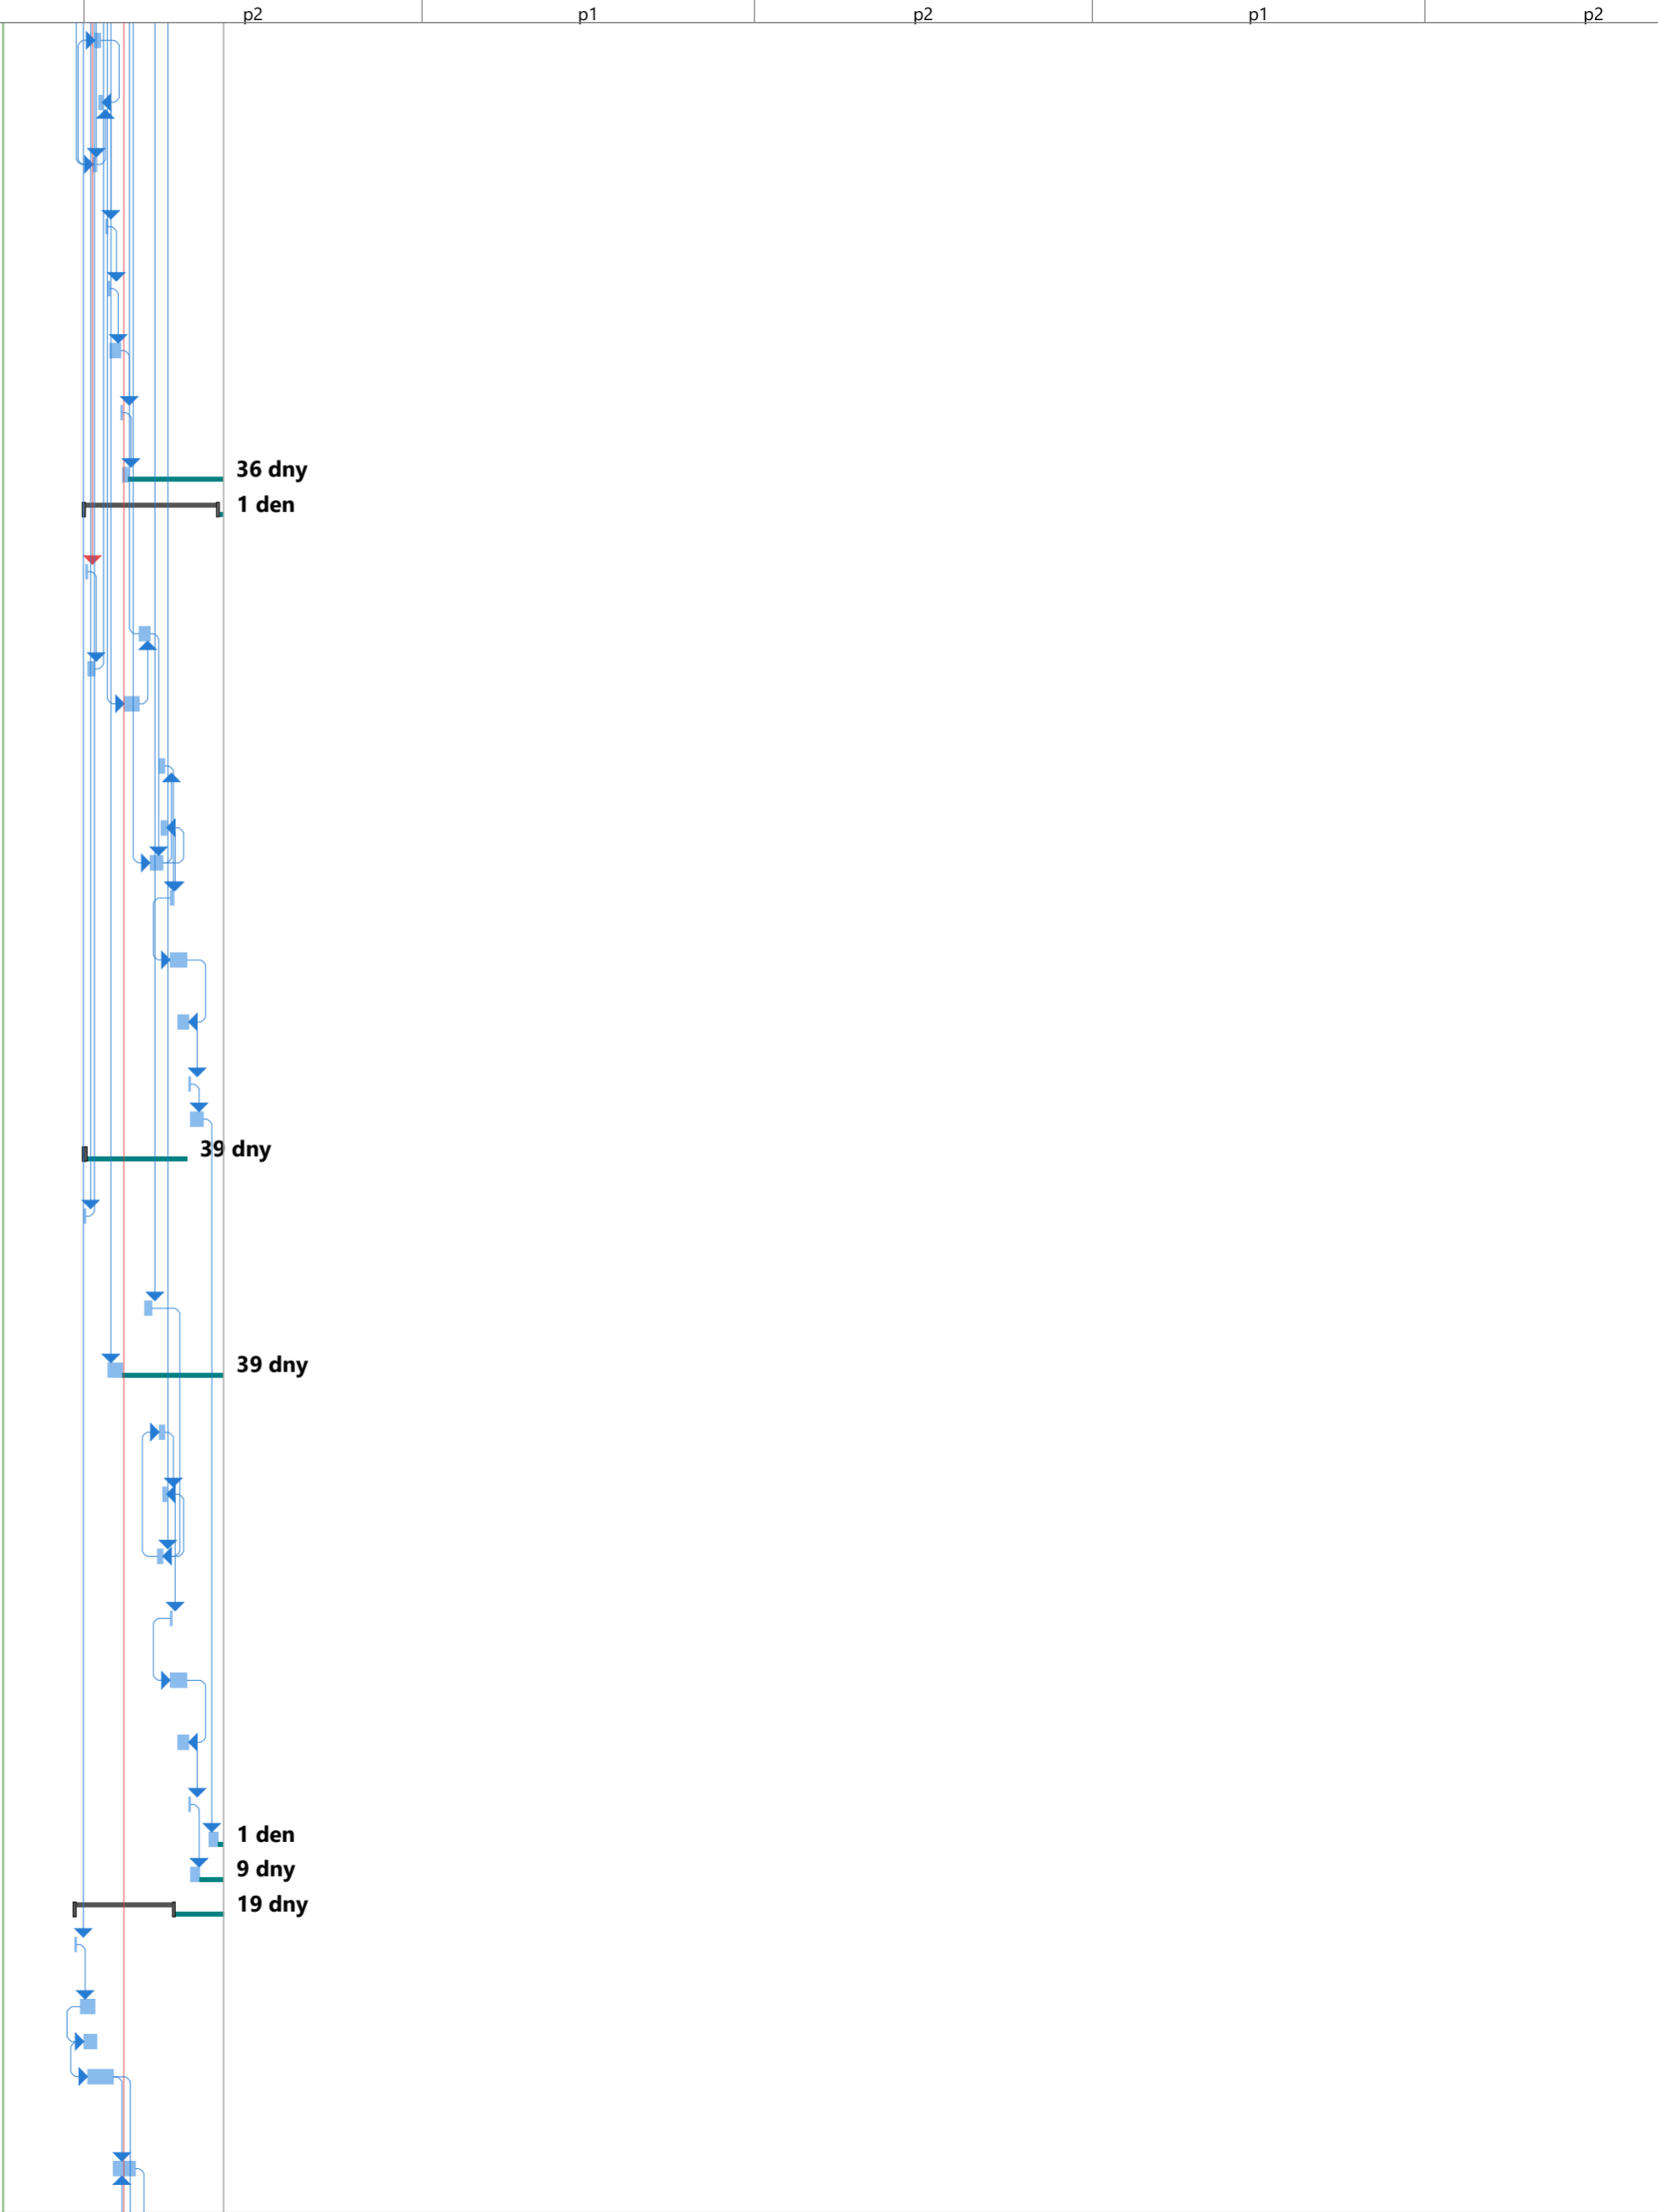

Kritický	█	Milník	◆	Souhrn projektu	 	Neaktivní milník	◇	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	█	Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu	⋯	Časová rezerva	█	Zahrnutý kritický	 	Neaktivní souhrn	 	Ruční souhrn	█	Vnější milník	◆
Úkol	█	Skluz	█	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	 	Ruční úkol	█	Pouze zahájení	█	Konečný termín	↓
Rozdělení	⋯	Souhrnný	 	Neaktivní úkol	 	Pouze s dobou trvání	█	Pouze s datem dokončení	█	Průběh	█

