


ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Převzetí staveniště	0 dny	20.04.18	20.04.18
2	Zařízení staveniště (oplocení + staveništní komunikace)	3 dny	23.04.18	25.04.18
3	Oplocení	417 dny	21.04.18	16.12.19
4	Informační cedule u vjezdu	417 dny	21.04.18	16.12.19
5	Dopravní značení	417 dny	21.04.18	16.12.19
6	Bezpečnostní tabulky	417 dny	21.04.18	16.12.19
7	Osvětlení	417 dny	21.04.18	16.12.19
8	Turnikety	417 dny	21.04.18	16.12.19
9	OOPP (reflexní vesta, helma, boty)	417 dny	21.04.18	16.12.19
10	Hasiči přístroj	417 dny	21.04.18	16.12.19
11	Jističi soupravy	417 dny	21.04.18	16.12.19
12	Odstranění stromů a křovin	3 dny	26.04.18	30.04.18
13	Zřízení stavebních buněk vč napojení na síť	2 dny	27.04.18	30.04.18
14	Vytýčení a výkop přeložek sítí	10 dny	02.05.18	15.05.18
15	Osazení přeložek sítí	11 dny	10.05.18	24.05.18
16	Vytýčení a výkop nových inženýrských sítí	8 dny	10.05.18	21.05.18
17	Osazení nových inženýrských sítí	8 dny	17.05.18	28.05.18
18	Vytýčení objektu a stavební jámy	1 den	29.05.18	29.05.18
19	Výkop stavební jámy pro monolitickou konstrukci	18 dny	30.05.18	22.06.18
20	Zajištění stavební jámy	10 dny	04.06.18	15.06.18
21	Montáž jeřábu	10 dny	13.06.18	26.06.18
22	Provedení podkladního betonu	4 dny	21.06.18	26.06.18
23	Provedení izolace proti zemní vlhkosti a radonu - vodorovná	4 dny	26.06.18	29.06.18
24	Bednění základových konstrukcí	3 dny	02.07.18	04.07.18
25	Armování základových konstrukcí	4 dny	04.07.18	11.07.18
26	Betonáž základových konstrukcí	5 dny	12.07.18	18.07.18
27	Odbednění základových konstrukcí	2 dny	23.07.18	24.07.18
28	Bednění stěn a sloupů 1PP	4 dny	25.07.18	30.07.18
29	Armování stěn a sloupů 1PP	4 dny	25.07.18	30.07.18
30	Betonáž stěn a sloupů 1PP	4 dny	31.07.18	03.08.18
31	Odbednění stěn a sloupů 1PP	2 dny	06.08.18	07.08.18
32	Prkna na ochranné zábradlí	207 dny?	21.08.18	07.11.19
33	Bednění stropní konstrukce 1PP	4 dny	08.08.18	13.08.18
34	Armování stropní konstrukce 1PP	2 dny	10.08.18	13.08.18
35	Betonáž stropní konstrukce 1PP	2 dny	14.08.18	15.08.18
36	Odbednění stropní konstrukce 1PP	1 den	20.08.18	20.08.18
37	Mobilní zábradlí	16 dny?	20.08.18	10.09.18
38	Přechodová lávka	18 dny?	20.08.18	12.09.18
39	Bednění schodiště 1PP	1 den	21.08.18	21.08.18
40	Armování schodiště 1PP	1 den	21.08.18	21.08.18
41	Betonáž schodiště 1PP	1 den	22.08.18	22.08.18
42	Ochranné zábradlí volného prostoru - schodiště	261 dny?	22.08.18	04.09.19
43	Odstojkování 1PP	1 den	03.10.18	03.10.18
44	Bednění stěn a sloupů 1NP	4 dny	27.08.18	30.08.18
45	Armování stěn a sloupů 1NP	4 dny	27.08.18	30.08.18
46	Betonáž stěn a sloupů 1NP	4 dny	31.08.18	05.09.18
47	Provedení izolace proti zemní vlhkosti a radonu - svislá	10 dny	22.08.18	04.09.18
48	Zateplení 1PP	10 dny	29.08.18	11.09.18
49	Zárys částí výkopů 1PP	5 dny	12.09.18	18.09.18
50	Vytýčení patek pod rampu	1 den	19.09.18	19.09.18
51	Výkopy patek pod rampu	6 dny	19.09.18	26.09.18
52	Základy pod rampu	10 dny	09.10.18	22.10.18
53	Ocelové sloupy - rampa	1 den?	23.10.18	23.10.18
54	Obetonování OK + zpětný zárys	1 den?	24.10.18	24.10.18
55	Odbednění stěn a sloupů 1NP	2 dny	10.09.18	11.09.18
56	Bednění stropní konstrukce 1NP	4 dny	12.09.18	17.09.18
57	Armování stropní konstrukce 1NP	2 dny	14.09.18	17.09.18
58	Betonáž stropní konstrukce 1NP	1 den	18.09.18	18.09.18
59	Odbednění stropní konstrukce 1NP	1 den	21.09.18	21.09.18
60	Mobilní zábradlí	15 dny?	21.09.18	12.10.18
61	Ochranné zábradlí volného prostoru	223 dny?	21.09.18	13.08.19
62	Bednění schodiště 1NP	1 den	24.09.18	24.09.18
63	Armování schodiště 1NP	1 den	24.09.18	24.09.18
64	Betonáž schodiště 1NP	1 den	25.09.18	25.09.18
65	Ochranné zábradlí volného prostoru - schodiště	229 dny?	25.09.18	23.08.19
66	Odstojkování 1NP	1 den	06.11.18	06.11.18
67	Bednění stěn a sloupů 2NP	4 dny	01.10.18	04.10.18
68	Armování stěn a sloupů 2NP	4 dny	01.10.18	04.10.18
69	Betonáž stěn a sloupů 2NP	2 dny	05.10.18	08.10.18
70	Odbednění stěn a sloupů 2NP	2 dny	11.10.18	12.10.18
71	Bednění stropní konstrukce 2NP	4 dny	15.10.18	18.10.18
72	Armování stropní konstrukce 2NP	2 dny	17.10.18	18.10.18
73	Betonáž stropní konstrukce 2NP	1 den	19.10.18	19.10.18
74	Odbednění stropní konstrukce 2NP	1 den	24.10.18	24.10.18
75	Mobilní zábradlí	17 dny?	24.10.18	15.11.18
76	Ochranné zábradlí volného prostoru	193 dny?	24.10.18	01.08.19
77	Bednění schodiště 2NP	1 den	25.10.18	25.10.18
78	Armování schodiště 2NP	1 den	25.10.18	25.10.18
79	Betonáž schodiště 2NP	1 den	26.10.18	26.10.18
80	Ochranné zábradlí volného prostoru - schodiště	199 dny?	26.10.18	13.08.19
81	Odstojkování 2NP	1 den	06.12.18	06.12.18
82	Bednění stěn a sloupů 3NP	4 dny	31.10.18	05.11.18
83	Armování stěn a sloupů 3NP	4 dny	31.10.18	05.11.18
84	Betonáž stěn a sloupů 3NP	4 dny	06.11.18	09.11.18
85	Odbednění stěn a sloupů 3NP	2 dny	14.11.18	15.11.18
86	Bednění stropní konstrukce 3NP	4 dny	16.11.18	21.11.18
87	Armování stropní konstrukce 3NP	2 dny	20.11.18	21.11.18
88	Betonáž stropní konstrukce 3NP	1 den	22.11.18	22.11.18
89	Odbednění stropní konstrukce 3NP	1 den	27.11.18	27.11.18
90	Mobilní zábradlí	16 dny?	27.11.18	18.12.18
91	Ochranné zábradlí volného prostoru	161 dny?	27.11.18	22.07.19
92	Bednění schodiště 3NP	1 den	28.11.18	28.11.18
93	Armování schodiště 3NP	1 den	28.11.18	28.11.18
94	Betonáž schodiště 3NP	1 den	29.11.18	29.11.18
95	Ochranné zábradlí volného prostoru - schodiště	167 dny?	29.11.18	01.08.19
96	Odstojkování 3NP	1 den	15.01.19	15.01.19
97	Bednění stěn a sloupů 4NP	4 dny	04.12.18	07.12.18
98	Armování stěn a sloupů 4NP	4 dny	04.12.18	07.12.18
99	Betonáž stěn a sloupů 4NP	4 dny	10.12.18	13.12.18
100	Odbednění stěn a sloupů 4NP	1 den	18.12.18	18.12.18
101	Bednění střešní konstrukce	4 dny	19.12.18	27.12.18
102	Armování střešní konstrukce	2 dny	21.12.18	27.12.18
103	Betonáž střešní konstrukce	1 den	28.12.18	28.12.18
104	Odbednění střešní konstrukce	1 den	03.01.19	03.01.19
105	Ochranné zábradlí volného prostoru - atika	95 dny?	03.01.19	21.05.19
106	Mobilní zábradlí	95 dny?	03.01.19	21.05.19
107	Osazení zachytňného systému	1 den?	03.01.19	03.01.19
108	Odstojkování 4NP	1 den	08.02.19	08.02.19
109	Bednění atiky	2 dny	03.01.19	04.01.19
110	Armování atiky	2 dny	03.01.19	04.01.19
111	Betonáž atiky	2 dny	07.01.19	08.01.19
112	Odbednění atiky	1 den	11.01.19	11.01.19
113	Vyzdívání příček 1PP	13 dny	31.12.18	17.01.19
114	Vyzdívání příček 1NP	13 dny	18.01.19	05.02.19
115	Vyzdívání příček 2NP	13 dny	06.02.19	22.02.19
116	Vyzdívání příček 3NP	13 dny	25.02.19	13.03.19
117	Vyzdívání příček 4NP	13 dny	14.03.19	01.04.19
118	Zajištění stavby proti srážkové vodě - parozábrana	5 dny	30.01.19	05.02.19
119	Střešní plášť	31 dny	29.03.19	16.05.19
120	Izolace atiky	2 dny	17.05.19	20.05.19
121	Vodorovná konstrukce rampy	12 dny	18.03.19	02.04.19
122	Ochranné zábradlí volného prostoru - rampa	110 dny?	18.03.19	23.08.19
123	Montáž lešení	5 dny	16.05.19	22.05.19
124	Lešení	60 dny	23.05.19	15.08.19
125	Montáž stavebního výtahu	1 den	23.05.19	23.05.19
126	Výplně otvorů vnější 1PP	5 dny	19.02.19	25.02.19
127	Výplně otvorů vnější 1NP	5 dny	26.02.19	04.03.19
128	Výplně otvorů vnější 2NP	5 dny	05.03.19	11.03.19
129	Výplně otvorů vnější 3NP	5 dny	12.03.19	18.03.19
130	Výplně otvorů vnější 4NP	5 dny	19.03.19	25.03.19
131	Rozvody ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, EPS 1PP	16 dny	18.02.19	11.03.19
132	Rozvody ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, EPS 1NP	16 dny	12.03.19	02.04.19



Úkol	Mínik	Souhrn
Oplocení staveniště(134 bm/den)		
Informační cedule - vjezd(4 ks)		
Dopravní značení(1 ks)		
Bezpečnostní tabulky (250 ks)		
Osvětlení staveniště(10 ks/den)		
Turnikety(2 ks/den)		
Helma(50 ks);Reflexní vesta(50 ks);Pracovní obuv(50 ks)		
Hasiči přístroj(10 ks)		
Jističi souprava(5 ks)		
Prkna na ochranu volného prostoru(1 469 bm)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(14 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(24 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(16 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(24 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(16 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(24 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(16 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(55 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(13,4 bm/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(24 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(24 sada/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(13 303,1 m2/den)		
Zábradlí ochranné - volný prostor(1 303,1 m2/den)		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
133	Rozvody ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, EPS 2NP	16 dny	03.04.19	26.04.19
134	Rozvody ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, EPS 3NP	16 dny	29.04.19	22.05.19
135	Rozvody ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, EPS 4NP	16 dny	23.05.19	13.06.19
136	Omítky 4NP	13 dny	02.05.19	21.05.19
137	Omítky 3NP	13 dny	22.05.19	07.06.19
138	Omítky 2NP	13 dny	10.06.19	26.06.19
139	Omítky 1NP	13 dny	27.06.19	16.07.19
140	Omítky 1PP	13 dny	17.07.19	02.08.19
141	Podlahy bez následných vrstev 4NP	9 dny	14.06.19	26.06.19
142	Podlahy bez následných vrstev 3NP	9 dny	27.06.19	10.07.19
143	Podlahy bez následných vrstev 2NP	9 dny	11.07.19	23.07.19
144	Podlahy bez následných vrstev 1NP	9 dny	24.07.19	05.08.19
145	Podlahy bez následných vrstev 1PP	9 dny	06.08.19	16.08.19
146	Obklady a dlažby 4NP	9 dny	28.06.19	11.07.19
147	Obklady a dlažby 3NP	9 dny	12.07.19	24.07.19
148	Obklady a dlažby 2NP	9 dny	25.07.19	06.08.19
149	Obklady a dlažby 1NP	9 dny	07.08.19	19.08.19
150	Obklady a dlažby 1PP	9 dny	20.08.19	30.08.19
151	Podhledy 4NP	8 dny	22.07.19	31.07.19
152	Podhledy 3NP	8 dny	01.08.19	12.08.19
153	Podhledy 2NP	8 dny	13.08.19	22.08.19
154	Podhledy 1NP	8 dny	23.08.19	03.09.19
155	Podhledy 1PP	8 dny	04.09.19	13.09.19
156	Vnější obvodový plášť	50 dny	24.05.19	02.08.19
157	Zámečnické konstrukce 4NP	8 dny	22.07.19	31.07.19
158	Zámečnické konstrukce 3NP	8 dny	01.08.19	12.08.19
159	Zámečnické konstrukce 2NP	8 dny	13.08.19	22.08.19
160	Zámečnické konstrukce 1NP	8 dny	23.08.19	03.09.19
161	Zámečnické konstrukce 1PP	8 dny	04.09.19	13.09.19
162	Malby a nátěry 4NP	6 dny	05.08.19	12.08.19
163	Malby a nátěry 3NP	6 dny	13.08.19	20.08.19
164	Malby a nátěry 2NP	6 dny	21.08.19	28.08.19
165	Malby a nátěry 1NP	6 dny	29.08.19	05.09.19
166	Malby a nátěry 1PP	6 dny	06.09.19	13.09.19
167	Kompletace ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, ESP 4NP	6 dny	19.08.19	26.08.19
168	Kompletace ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, ESP 3NP	6 dny	27.08.19	03.09.19
169	Kompletace ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, ESP 2NP	6 dny	04.09.19	11.09.19
170	Kompletace ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, ESP 1NP	6 dny	12.09.19	19.09.19
171	Kompletace ZTI, ÚT, VZT, elektro, chlazení, MaR, MP, ESP 1PP	6 dny	20.09.19	27.09.19
172	Výtahy	30 dny	02.09.19	11.10.19
173	Truhlářské konstrukce 4NP	5 dny	26.08.19	30.08.19
174	Truhlářské konstrukce 3NP	5 dny	02.09.19	06.09.19
175	Truhlářské konstrukce 2NP	5 dny	09.09.19	13.09.19
176	Truhlářské konstrukce 1NP	5 dny	16.09.19	20.09.19
177	Truhlářské konstrukce 1PP	5 dny	23.09.19	27.09.19
178	Náslapné vrstvy 4NP	7 dny	07.08.19	15.08.19
179	Náslapné vrstvy 3NP	7 dny	16.08.19	26.08.19
180	Náslapné vrstvy 2NP	7 dny	27.08.19	04.09.19
181	Náslapné vrstvy 1NP	7 dny	05.09.19	13.09.19
182	Náslapné vrstvy 1PP	7 dny	16.09.19	24.09.19
183	Demontáž lešení	5 dny	25.09.19	01.10.19
184	Dokončovací práce 4NP	5 dny	07.10.19	11.10.19
185	Dokončovací práce 3NP	5 dny	14.10.19	18.10.19
186	Dokončovací práce 2NP	5 dny	21.10.19	25.10.19
187	Dokončovací práce 1NP	5 dny	29.10.19	04.11.19
188	Dokončovací práce 1PP	5 dny	05.11.19	11.11.19
189	Spojovací koridor	0 dny	21.01.19	21.01.19
190	Bourací práce	10 dny	15.01.19	28.01.19
191	Nosná OK	20 dny	29.01.19	25.02.19
192	Betonová mazanina	4 dny	26.02.19	01.03.19
193	Opláštění koridoru vč. Střešního pláště, výplní otvorů	25 dny	24.05.19	27.06.19
194	Podlahy	5 dny	28.06.19	04.07.19
195	Vnitřní povrchy stěn	5 dny	02.07.19	09.07.19
196	Podhledy	5 dny	04.07.19	11.07.19
197	Dokončovací práce	7 dny	10.07.19	18.07.19
198	Sadové úpravy	10 dny	07.10.19	18.10.19
199	Komunikace a chodníky	15 dny	14.10.19	04.11.19
200	Úklid objektu	5 dny	12.11.19	18.11.19
201	Dokončení objektu	5 dny	19.11.19	25.11.19
202	Odstranění vad a nedodělků	10 dny	26.11.19	09.12.19
203	Likvidace zařízení staveniště	5 dny	10.12.19	16.12.19
204	Převzetí stavby kolaudace	1 den	17.12.19	17.12.19
205				
206		1 den?	31.05.19	31.05.19

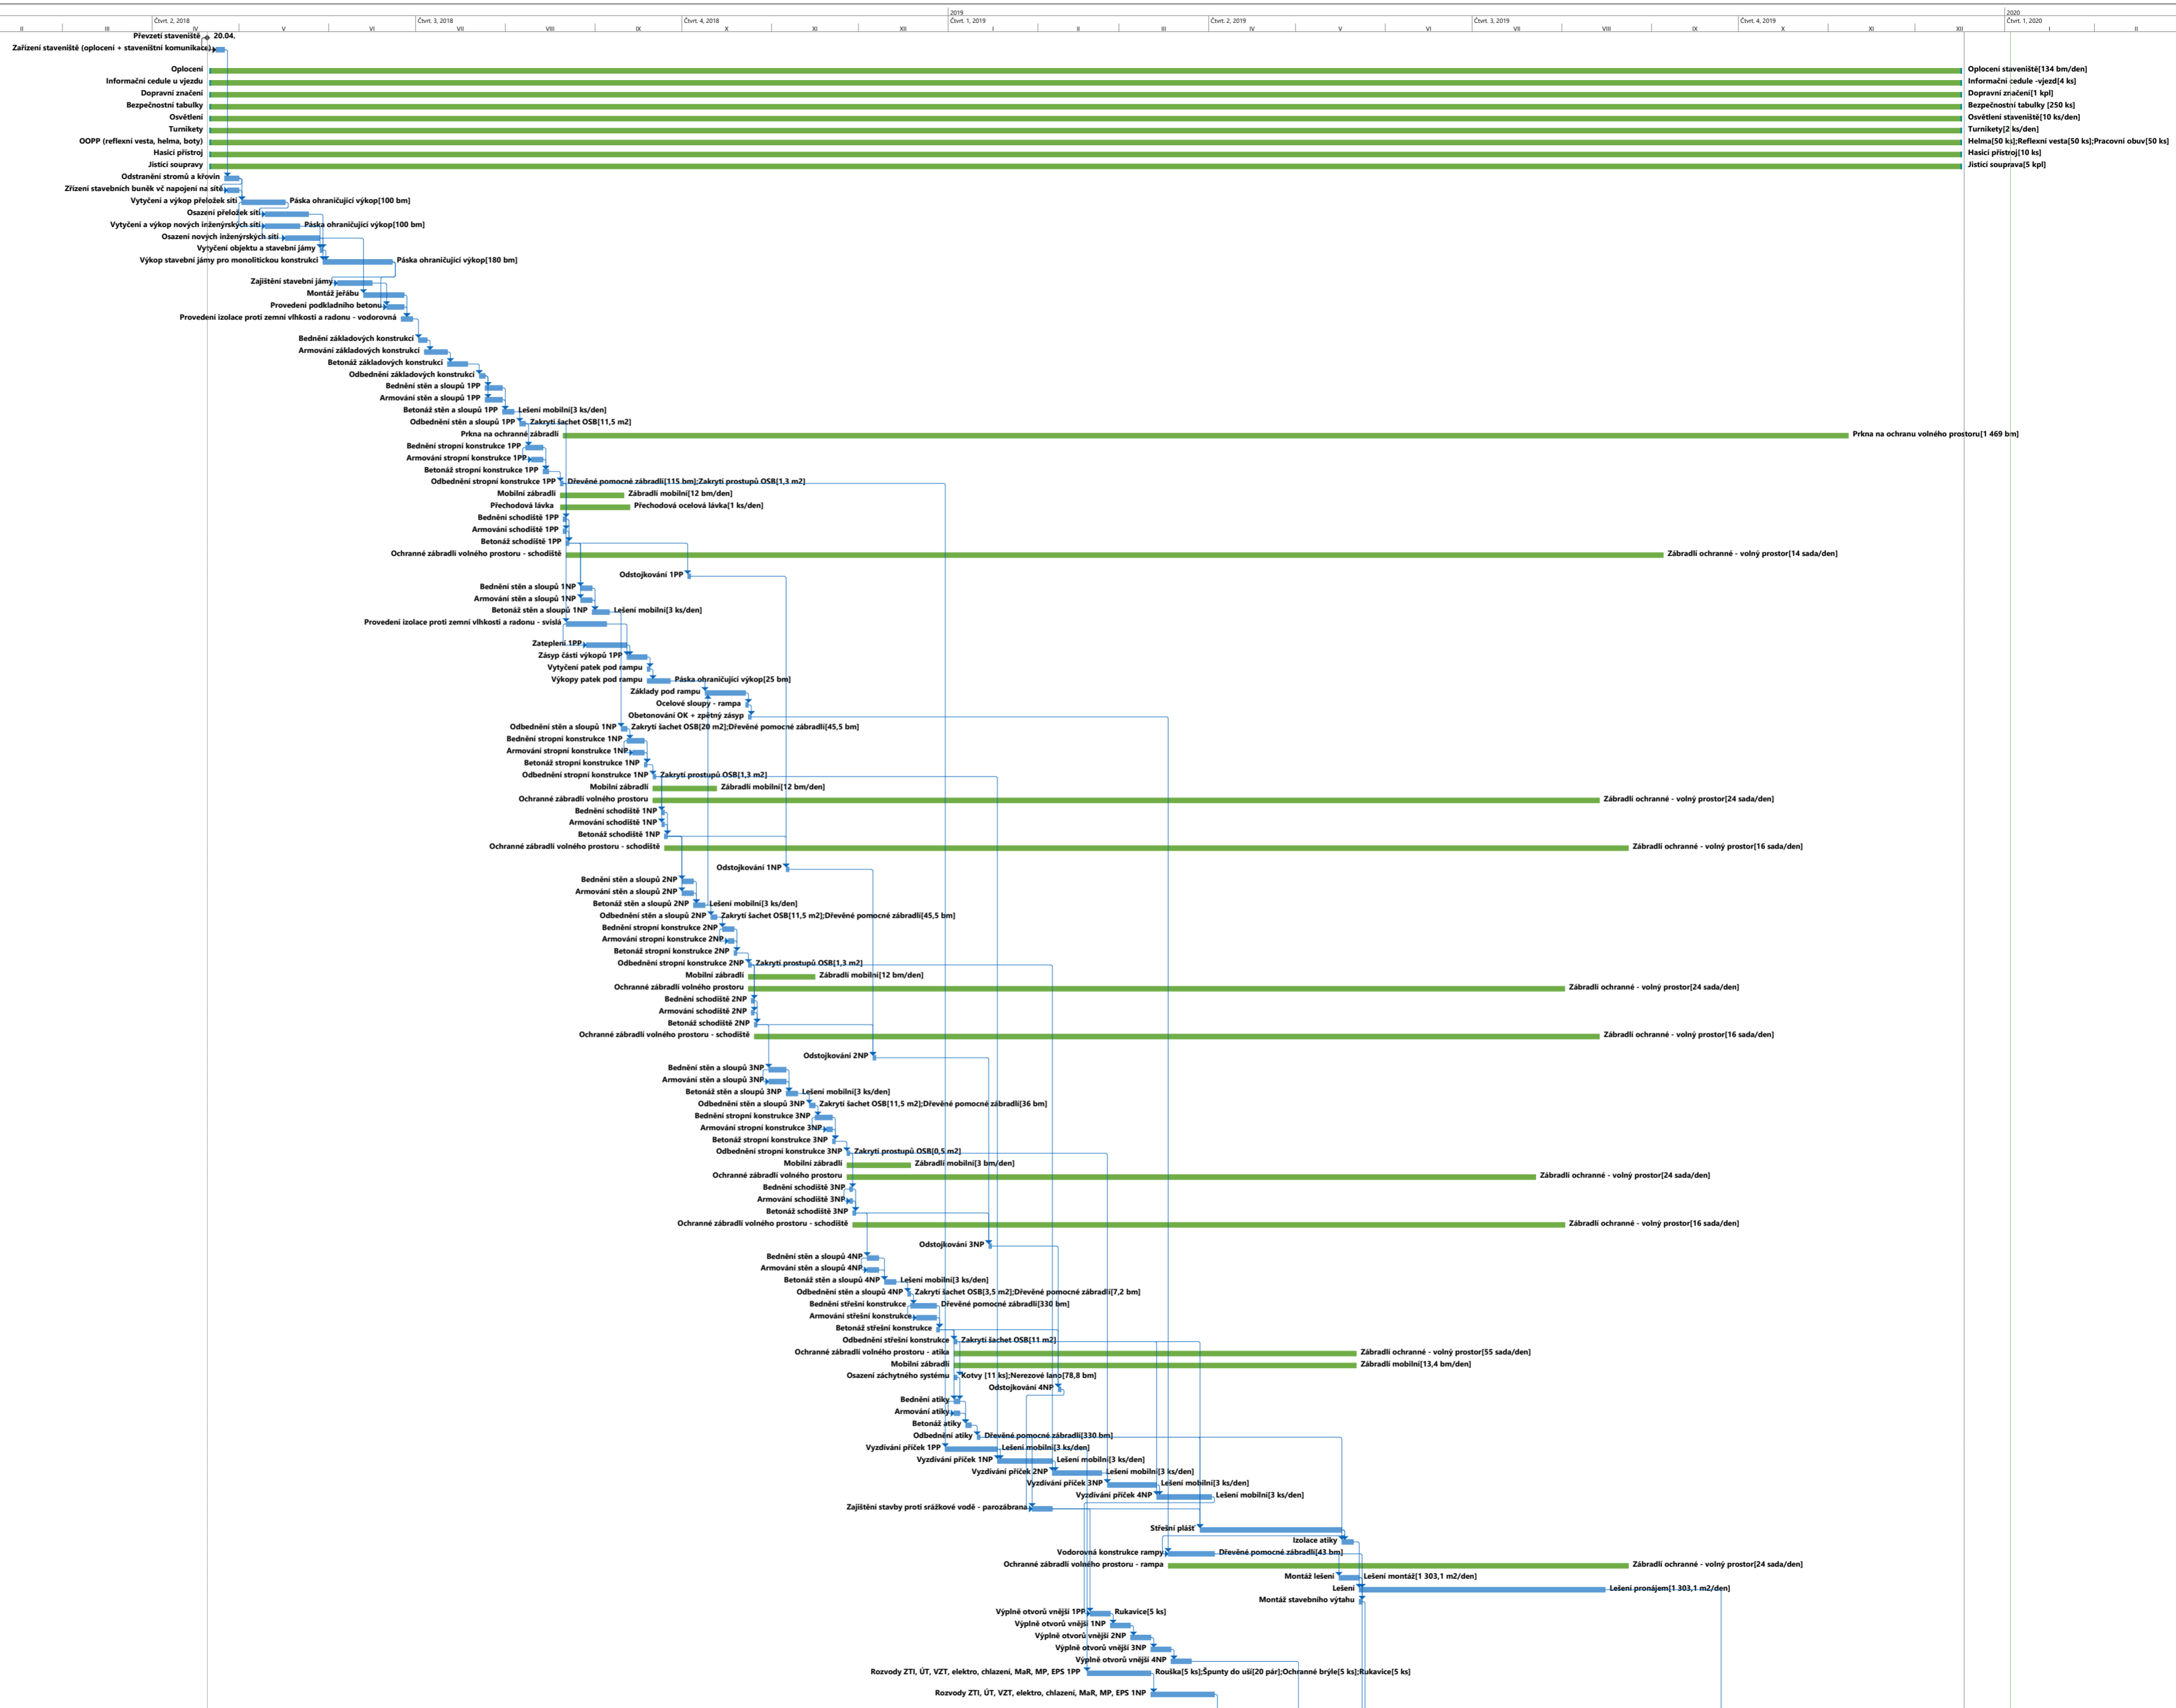
