ID	Název úkolu	Doba trvání	Začátek	Dokončení
0	**HMG_29_12**	**472 dny**	**3.2. 14**	**20.1. 15**
1	**Chod**	**112 dny**	**3.2. 14**	**21.7. 14**
2	Vytýčení staveniště	3 dny	3.2. 14	5.2. 14
3	Výstavba staveniště	21 dny	4.2. 14	24.2. 14
4	Likvidace krytu vozovek	4 dny	4.2. 14	7.2. 14
5	Sejmutí ornice	3 dny	8.2. 14	10.2. 14
6	Přeložky VO	10 dny	10.2. 14	19.2. 14
7	Přeložky vodovodu	3 dny	14.2. 14	17.2. 14
8	Přeložky vodovodu	14 dny	17.2. 14	2.3. 14
9	Přeložky kanalizace	14 dny	11.2. 14	24.2. 14
10	Bourací práce - CZ + podkoželky	20 dny	25.2. 14	18.3. 14
11	Výstavba OZ 1	4 dny	17.3. 14	20.3. 14
12	Výstavba OZ 2	4 dny	20.3. 14	23.3. 14
13	Ojetochování radiotelefonů	5 dny	23.3. 14	27.3. 14
14	Přípojka kanalizace	14 dny	27.3. 14	9.4. 14
15	Zkopacíční vodovodního řádu	7 dny	8.4. 14	14.4. 14
16	Přípojka vodovodu	10 dny	15.4. 14	24.4. 14
17	Základování bojlerů	5 dny	22.4. 14	26.4. 14
18	Zemní prvky v zemi	5 dny	22.4. 14	26.4. 14
19	**Výkopy**	**159 dny**	**24.2. 14**	**1.7. 14**
20	Výkop stavební jámy a základů	60 dny	24.2. 14	24.4. 14
21	Zřízení trativodů	2 dny	25.4. 14	26.4. 14
22	Zásypy a násypy	7 dny	25.6. 14	1.7. 14
23	**Základy**	**41 dny**	**23.4. 14**	**2.6. 14**
24	Uzemnění hromosvodu	2 dny	23.4. 14	24.4. 14
25	Podbetonování základových konstrukcí	5 dny	25.4. 14	29.4. 14
26	Penetrace + hydroizolace v základech	14 dny	28.4. 14	15.5. 14
27	Bednění, armování, betonáž základů	5 dny	30.5. 14	14.5. 14
28	Bednění, armování, betonáž základové desky	21 dny	13.5. 14	2.6. 14
29	Betonáž ostatních prvků i chat	5 dny	16.5. 14	20.5. 14
30	**1PP - hrubá stavba**	**60 dny**	**28.5. 14**	**20.7. 14**
31	Bednění, armování, betonáž 1PP zvonů	10 dny	28.5. 14	6.6. 14
32	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 1PP	4 dny	6.6. 14	9.6. 14
33	Odbednění stěn a sloupů 1PP	2 dny	10.6. 14	11.6. 14
34	Bednění, armování, betonáž 1PP vodorovná	12 dny	11.6. 14	22.6. 14
35	Hydroizolace spodní stavby - asfaltové pásy	16 dny	7.6. 14	22.6. 14
36	Odbednění a přetvrdlostních schodiště kpl 1PP	1 den	13.6. 14	13.6. 14
37	Kladení extrudovaného polystyrénu na stěny 1PP	3 dny	22.6. 14	24.6. 14
38	Betonáž ostatních vodorovných/svislých	1 den	25.6. 14	25.6. 14
39	Odstranění podbetonování stropu 1PP	3 dny	27.6. 14	27.6. 14
40	**1NP - hrubá stavba**	**60 dny**	**23.6. 14**	**21.8. 14**
41	Bednění,armování betonáž stropů a stěn 1NP	10 dny	23.6. 14	2.7. 14
42	Vyzdění nosné stěny	4 dny	29.6. 14	2.7. 14
43	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 1NP	4 dny	2.7. 14	5.7. 14
44	Odbednění stěn a sloupů 1NP	2 dny	6.7. 14	7.7. 14
45	Odbednění a přetvrdlostních schodiště 1NP	1 den	9.7. 14	9.7. 14
46	Bednění,armování a betonáž stropů 1NP	12 dny	7.7. 14	18.7. 14
47	Odbednění stropů a podepírání 1NP	3 dny	21.7. 14	23.7. 14
48	Odstranění podepírání stropu 1NP	1 den	21.8. 14	21.8. 14
49	**2NP - hrubá stavba**	**60 dny**	**18.7. 14**	**16.9. 14**
50	Bednění,armování betonáž stropů a stěn 2NP	10 dny	18.7. 14	28.7. 14
51	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 2NP	4 dny	28.7. 14	31.7. 14
52	Odbednění stěn a sloupů 2NP	2 dny	1.8. 14	2.8. 14
53	Odbednění a přetvrdlostních schodiště 2NP	1 den	4.8. 14	4.8. 14
54	Bednění,armování a betonáž stropů 2NP	12 dny	2.8. 14	13.8. 14
55	Odbednění stropů a podepírání 2NP	2 dny	16.8. 14	17.8. 14
56	Odstranění podepírání stropu 2NP	1 den	15.9. 14	15.9. 14
57	**3NP - hrubá stavba**	**60 dny**	**14.8. 14**	**12.10. 14**
58	Bednění,armování betonáž stropů a stěn 3NP	10 dny	14.8. 14	25.8. 14
59	Bednění, armování, betonáž schodiště kpl 3NP	4 dny	25.8. 14	28.8. 14
60	Odbednění stěn a sloupů 3NP	2 dny	29.8. 14	30.8. 14
61	Odbednění a přetvrdlostních schodiště 3NP	1 den	30.8. 14	30.8. 14
62	Bednění,armování a betonáž stropů 3NP	12 dny	28.8. 14	8.9. 14
63	Odbednění stropů a podepírání 3NP	3 dny	11.9. 14	13.9. 14
64	Odstranění podepírání stropu 3NP	1 den	12.10. 14	12.10. 14
65	**4NP - hrubá stavba**	**45 dny**	**9.9. 14**	**23.10. 14**
66	Bednění,armování betonáž stropů a stěn 4NP	10 dny	9.9. 14	18.9. 14
67	Odbednění stěn a sloupů 4NP	2 dny	22.9. 14	23.9. 14
68	Bednění,armování a betonáž stropů 4NP	12 dny	23.9. 14	4.10. 14
69	Odbednění stropů a podepírání 4NP	3 dny	7.10. 14	9.10. 14
70	Odstranění podepírání stropu 4NP	1 den	23.10. 14	23.10. 14
71	**Střecha**	**44 dny**	**5.10. 14**	**2.12. 14**
72	Montáž konstrukcí VZT na střeše	8 dny	5.10. 14	12.10. 14
73	Montáž chladicích jednotek	14 dny	5.10. 14	18.10. 14
74	Montáž vetikoudů a vývod na střechu	8 dny	5.10. 14	12.10. 14
75	Záchytný systém	14 dny	8.10. 14	21.10. 14
76	Sklaďba střechy	35 dny	12.10. 14	15.11. 14
77	Ojetochování atiky střechy	3 dny	11.11. 14	13.11. 14
78	Provedení hromovodu	5 dny	11.11. 14	15.11. 14
79	Chapeme vikvaréků na střechu a násyp kamenivo	2 dny	16.11. 14	17.11. 14
80	**Fasáda**	**90 dny**	**27.8. 14**	**31.12. 14**
81	Zřízení venkovního lešení	10 dny	27.8. 14	8.10. 14
82	KZS	45 dny	29.9. 14	12.11. 14
83	Montáž hliníkových konstrukcí na fasádě	45 dny	29.9. 14	12.11. 14
84	Zřízení otlučky nad vstupními dveřmi - 1NP	1 den	4.11. 14	4.11. 14
85	Usazení vnějších parapetů	4 dny	7.11. 14	10.11. 14
86	Demontáž venkovního lešení	6 dny	13.11. 14	18.11. 14
87	Obklady z kamene sokl	35 dny	25.2. 15	31.3. 15
88	**Terasa**	**31 dny**	**14.11. 14**	**14.12. 14**
89	Ojetochování terasy	4 dny	14.11. 14	17.11. 14
90	Hydroizolace z PVC a asfaltových pásů na terasách	14 dny	18.11. 14	1.12. 14
91	Betonáž betonové dlažby na terasy	14 dny	2.12. 14	14.12. 14
92	**Koridor**	**115 dny**	**7.10. 14**	**4.2. 15**
93	Otoučení omítek - vedlejší budova	2 dny	7.10. 14	8.10. 14
94	Vybourání otvoru - vedlejší budova	2 dny	9.10. 14	10.10. 14
95	Ocelová konstrukce + trapez. plechy - spoj. koridor	30 dny	12.10. 14	10.11. 14
96	Betonáž stropů - spojovací koridor	4 dny	11.11. 14	14.11. 14
97	Montáž fasády - spojovací koridor	10 dny	21.11. 14	30.11. 14
98	Betonová mazanina - spojovací koridor	4 dny	9.12. 14	12.12. 14
99	Sklaďba podlahy PVC - spojovací koridor	12 dny	24.1. 15	4.2. 15
100	**Rampa**	**82 dny**	**5.8. 14**	**25.10. 14**
101	Ocelová rampa	30 dny	5.8. 14	3.9. 14
102	Hydroizolace z asfaltových pásů - ocel. Rampa	2 dny	8.9. 14	9.9. 14
103	Extr. Polystyren + pálované sklo - ocel. Rampa	1 den	5.9. 14	5.9. 14
104	Hydroizolace z asfaltových pásů - ocel. Rampa	1 den	6.9. 14	6.9. 14
105	Drážkobetonová deska - ocel. Rampa	2 dny	7.9. 14	8.9. 14
106	Egaledovyl prostěkisuny nátěr - ocel. Rampa	5 dny	21.10. 14	25.10. 14
107	**1PP - ANP**	**242 dny**	**18.9. 14**	**17.5. 15**
108	Zděni příček 1PP	14 dny	11.10. 14	24.10. 14
109	Zděni příček 1NP	12 dny	18.9. 14	30.9. 14
110	Zděni příček 2NP	12 dny	30.9. 14	12.10. 14
111	Zděni příček 3NP	12 dny	12.10. 14	24.10. 14
112	Zděni příček 4NP	12 dny	24.10. 14	6.11. 14
113	Realizace SDK příček 1PP - rastrování	4 dny	2.12. 14	5.12. 14
114	Realizace SDK příček 1NP - rastrování	10 dny	6.10. 14	16.10. 14
115	Realizace SDK příček 2NP - rastrování	5 dny	16.10. 14	21.10. 14
116	Realizace SDK příček 3NP - rastrování	4 dny	21.10. 14	25.10. 14
117	Realizace SDK příček 4NP - rastrování	3 dny	25.10. 14	27.10. 14
118	Montáž potrubí s armaturami - vytápění	90 dny	5.10. 14	2.1. 15
119	VZT - 1PP - sviislé	2 dny	31.10. 14	1.11. 14
120	VZT - 1NP - sviislé	2 dny	29.10. 14	30.10. 14
121	VZT - 2NP - sviislé	2 dny	27.10. 14	28.10. 14
122	VZT - 3NP - sviislé	2 dny	24.10. 14	25.10. 14
123	VZT - 4NP - sviislé	2 dny	23.10. 14	24.10. 14
124	Kanalizační potrubí - dešťové	7 dny	29.10. 14	4.11. 14
125	Patrahi rozvod elektra	14 dny	9.10. 14	22.10. 14
126	Elektrorozvody - 1PP - pod omítky	7 dny	23.10. 14	29.10. 14
127	Elektrorozvody - 1NP - pod omítky	7 dny	30.10. 14	5.11. 14
128	Elektrorozvody - 2NP - pod omítky	10 dny	6.11. 14	15.11. 14
129	Elektrorozvody - 3NP - pod omítky	10 dny	16.11. 14	25.11. 14
130	Elektrorozvody - 4NP - pod omítky	5 dny	26.11. 14	30.11. 14
131	Elektrorozvody - 1PP - do podlahy	3 dny	24.12. 14	26.12. 14
132	Elektrorozvody - 1NP - do podlahy	8 dny	16.12. 14	23.12. 14
133	Elektrorozvody - 2NP - do podlahy	5 dny	9.12. 14	12.12. 14
134	Elektrorozvody - 3NP - do podlahy	5 dny	6.12. 14	10.12. 14
135	Elektrorozvody - 4NP - do podlahy	5 dny	1.12. 14	5.12. 14
136	Omítání cementovou omítkou pod dlaždaly - ručně	25 dny	25.12. 14	18.1. 15
137	Topelné izolace podlah v 1PP - pod mazaniny	7 dny	6.11. 14	12.11. 14
138	Betonové mazaniny 1PP	14 dny	13.11. 14	26.11. 14
139	Topelné izolace podlah v 1NP - pod mazaniny	6 dny	27.11. 14	2.12. 14
140	Betonové mazaniny 1NP	9 dny	3.12. 14	11.12. 14
141	Topelné izolace EPS 50 mm - 2NP - pod mazaniny	6 dny	12.12. 14	17.12. 14
142	Betonové mazaniny 2NP	11 dny	18.12. 14	28.12. 14
143	Topelné izolace EPS 50 mm - 3NP - pod mazaniny	5 dny	29.12. 14	2.1. 15
144	Betonové mazaniny 3NP	11 dny	3.1. 15	13.1. 15
145	Topelné izolace EPS 50 mm - 4NP - pod mazaniny	5 dny	14.1. 15	19.1. 15
146	Betonové mazaniny 4NP	11 dny	19.1. 15	29.1. 15
147	Hydroizolace z asfaltových pásů - SLP elektro	1 den	5.11. 14	6.11. 14
148	Topelné izolace EPS 140 mm - SLP elektro	1 den	4.11. 14	5.11. 14
149	Montáž balkonového zábradlí všechny patra	10 dny	1.11. 14	11.11. 14
150	Montáž stropjony výtahu	5 dny	12.11. 14	16.11. 14
151	Montáž výtahu + osazení dveří	5 dny	25.12. 14	29.12. 14
152	Mezibetoná plyny	90 dny	4.11. 14	3.2. 15
153	VZT - 1PP	12 dny	20.2. 15	3.3. 15
154	VZT - 2NP	10 dny	18.2. 15	27.2. 15
155	VZT - 3NP	10 dny	4.2. 15	17.2. 15
156	VZT - 3NP	28 dny	18.1. 15	15.2. 15
157	VZT - 4NP	16 dny	2.1. 15	17.1. 15
158	Kanalizační potrubí + armatury - splaškové	60 dny	5.11. 14	3.1. 15
159	Dlažba na schodištích	30 dny	14.2. 15	15.3. 15
160	EPS - kabelář + všechny součásti systému	60 dny	8.12. 14	5.2. 15
161	Pokládka dlažby + hydroizolační stěrka - 1PP	10 dny	8.1. 15	17.1. 15
162	Pokládka dlažby + hydroizolační stěrka - 1NP	7 dny	18.1. 15	24.1. 15
163	Keramické obklady - 1NP	23 dny	25.1. 15	18.2. 15
164	Nášlapné vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 2NP	7 dny	18.4. 15	24.4. 15
165	Keramické obklady - 2NP	23 dny	25.4. 15	19.5. 15
166	Nášlapné vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 3NP	7 dny	17.2. 15	23.2. 15
167	Keramické obklady - 3NP	23 dny	24.2. 15	18.3. 15
168	Nášlapné vrstva - Dlažba + vyrovnávací stěrka - 4NP	7 dny	19.3. 15	25.3. 15
169	Keramické obklady - 4NP	23 dny	26.3. 15	17.4. 15
170	Obrouštění a penetrace po odbednění	10 dny	3.10. 14	12.10. 14
171	Vodovodní potrubí + armatury	60 dny	20.11. 14	18.1. 15
172	Nábě RUK - SLP elektro a elektrorozvodna	1 den	8.1. 15	8.1. 15
173	Protokolovaný nátěr - 1PP	2 dny	9.1. 15	10.1. 15
174	Zkjoušobný nátěr ve výtahové šachtě	1 den	31.1. 15	31.1. 15
175	Ocelové kce + dveřnicový kotlenec - elektrorozvodna	5 dny	14.1. 15	18.1. 15
176	Montáž ocel. Kce - stropjony a šachtu. Mód. - 1NP	5 dny	19.1. 15	23.1. 15
177	Elektronické komunikace	120 dny	27.11. 14	26.5. 15
178	Realizace SDK příček 1PP - zakládání	4 dny	17.1. 15	20.1. 15
179	Realizace SDK příček 1NP - zakládání	10 dny	21.1. 15	30.1. 15
180	Realizace SDK příček 2NP - zakládání	5 dny	31.1. 15	4.2. 15
181	Realizace SDK příček 3NP - zakládání	4 dny	5.2. 15	8.2. 15
182	Realizace SDK příček 4NP - zakládání	3 dny	9.2. 15	11.2. 15
183	Omítání vápenocementé- omítka výtah Šachet - ruč.	14 dny	11.12. 14	24.12. 14
184	Omítání sádrovou omítkou 1PP	10 dny	19.1. 15	28.1. 15
185	Omítání sádrovou omítkou 1NP	5 dny	29.1. 15	2.2. 15
186	Omítání sádrovou omítkou 2NP	5 dny	3.2. 15	7.2. 15
187	Omítání sádrovou omítkou 3NP	5 dny	10.2. 15	14.2. 15
188	Omítání sádrovou omítkou 4NP	7 dny	13.2. 15	19.2. 15
189	Realizace SDK podhledů 1PP	11 dny	23.1. 15	2.2. 15
190	Realizace SDK podhledů 1NP	17 dny	3.2. 15	19.2. 15
191	Realizace SDK podhledů 2NP	19 dny	20.2. 15	10.3. 15
192	Realizace SDK podhledů 3NP	15 dny	11.3. 15	25.3. 15
193	Realizace SDK podhledů 4NP	15 dny	26.3. 15	9.4. 15
194	Čištění fasády	14 dny	29.1. 15	11.2. 15
195	Montáž výplavení - ZTI	90 dny	20.1. 15	19.4. 15
196	Poklidka PVC + vyrovnávací stěrkou - 1PP	10 dny	9.2. 15	20.2. 15
197	Poklidka PVC + vyrovnávací stěrkou - 1NP	10 dny	3.4. 15	7.4. 15
198	Poklidka PVC + vyrovnávací stěrka - 2NP	20 dny	8.3. 15	27.3. 15
199	Poklidka PVC + vyrovnávací stěrka - 3NP	17 dny	28.3. 15	15.4. 15
200	Poklidka PVC + vyrovnávací stěrka - 4NP	17 dny	14.4. 15	30.4. 15
201	Malby - 1PP	20 dny	10.2. 15	2.3. 15
202	Natírání zárubní - 1PP	2 dny	2.3. 15	4.3. 15
203	Malby - 1NP	10 dny	4.3. 15	14.3. 15
204	Natírání zárubní - 1NP	2 dny	14.3. 15	16.3. 15
205	Malby - 2NP	10 dny	16.3. 15	26.3. 15
206	Natírání zárubní - 2NP	2 dny	26.3. 15	28.3. 15
207	Malby - 3NP	10 dny	28.3. 15	8.4. 15
208	Natírání zárubní - 3NP	2 dny	7.4. 15	9.4. 15
209	Malby - 4NP	14 dny	9.4. 15	22.4. 15
210	Natírání zárubní - 4NP	2 dny	23.4. 15	24.4. 15
211	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 1PP	2 dny	8.4. 15	10.4. 15
212	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 1NP	5 dny	10.4. 15	15.4. 15
213	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 2NP	5 dny	15.4. 15	20.4. 15
214	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 3NP	5 dny	20.4. 15	25.4. 15
215	Osazení dveří vnitřních - dřevěných - 4NP	8 dny	25.4. 15	2.5. 15
216	Kompletace elektra - 1PP	5 dny	20.3. 15	25.3. 15
217	Kompletace elektra - 2NP	8 dny	25.3. 15	2.4. 15
218	Kompletace elektra - 3NP	8 dny	2.4. 15	10.4. 15
219	Kompletace elektra - 4NP	8 dny	10.4. 15	18.4. 15
220	Kompletace elektra - 4NP	5 dny	18.4. 15	22.4. 15
221	MaR	120 dny	12.11. 14	11.3. 15
222	Přeložky	30 dny	5.1. 15	3.2. 15
223	Protipožární opatření - ucpávky	15 dny	4.2. 15	18.2. 15
224	Zkoušky systému ZTI	7 dny	20.4. 15	26.4. 15
225	Zkoušky a revize VZT	7 dny	25.4. 15	1.5. 15
226	Montáž otopných těles	10 dny	9.4. 15	18.4. 15
227	Montáž armatur	10 dny	9.4. 15	18.4. 15
228	Montáž potrubí s armaturami - chlazení	30 dny	17.11. 14	24.12. 14
229	Zkoušky systému - chlazení	7 dny	29.4. 15	5.5. 15
230	EPS - Programování + uřízení + revize	7 dny	22.4. 15	28.4. 15
231	Montáž schodišťových zábradlí	7 dny	27.4. 15	3.5. 15
232	Montáž vnitřních hliníkových stěn	20 dny	13.4. 15	2.5. 15
233	Montáž hliníkových dveří	5 dny	8.4. 15	12.4. 15
234	Osazení vnitřních parapetů všech patar	5 dny	20.2. 15	24.2. 15
235	Osazení ochranných prvků stěn a sloupků	15 dny	1.5. 15	15.5. 15
236	Osazení revizních dvířek	21 dny	15.4. 15	5.5. 15
237	Truhlářské výplavení - kuchyně, šatně a pracovní linky	60 dny	17.3. 15	15.5. 15
238	Malířské práce	60 dny	17.3. 15	15.5. 15
239	**Úpravy venkovní**	**89 dny**	**18.2. 15**	**17.6. 15**
240	Zemní práce na komunikacích	7 dny	18.2. 15	25.2. 15
241	Trativody	2 dny	25.2. 15	27.2. 15
242	Asfaltový beton	5 dny	27.2. 15	4.3. 15
243	Zámková dlažba	3 dny	4.3. 15	7.3. 15
244	Okapový chodník	14 dny	1.4. 15	14.4. 15
245	Přípojková cesta - záměnová dlažba	14 dny	7.3. 15	20.3. 15
246	Násyp a rozprostření ornice	14 dny	18.3. 15	1.4. 15
247	Osetí a osazení zeleně	30 dny	8.4. 15	8.5. 15
248	Malé stavební	10 dny	8.5. 15	17.5. 15
249	**Přípojky**	**30 dny**	**3.3. 15**	**13.4. 15**
250	Přeložka kabel. vedení	1 den	17.4. 15	17.4. 15
251	Odstranění VaN	30 dny	18.4. 15	17.5. 15
252	Přípojka VaN	2 dny	18.5. 15	19.5. 15
253	Kolaudace	1 den	6.5. 15	6.5. 15
254	Předání stavby	1 den	20.5. 15	20.5. 15

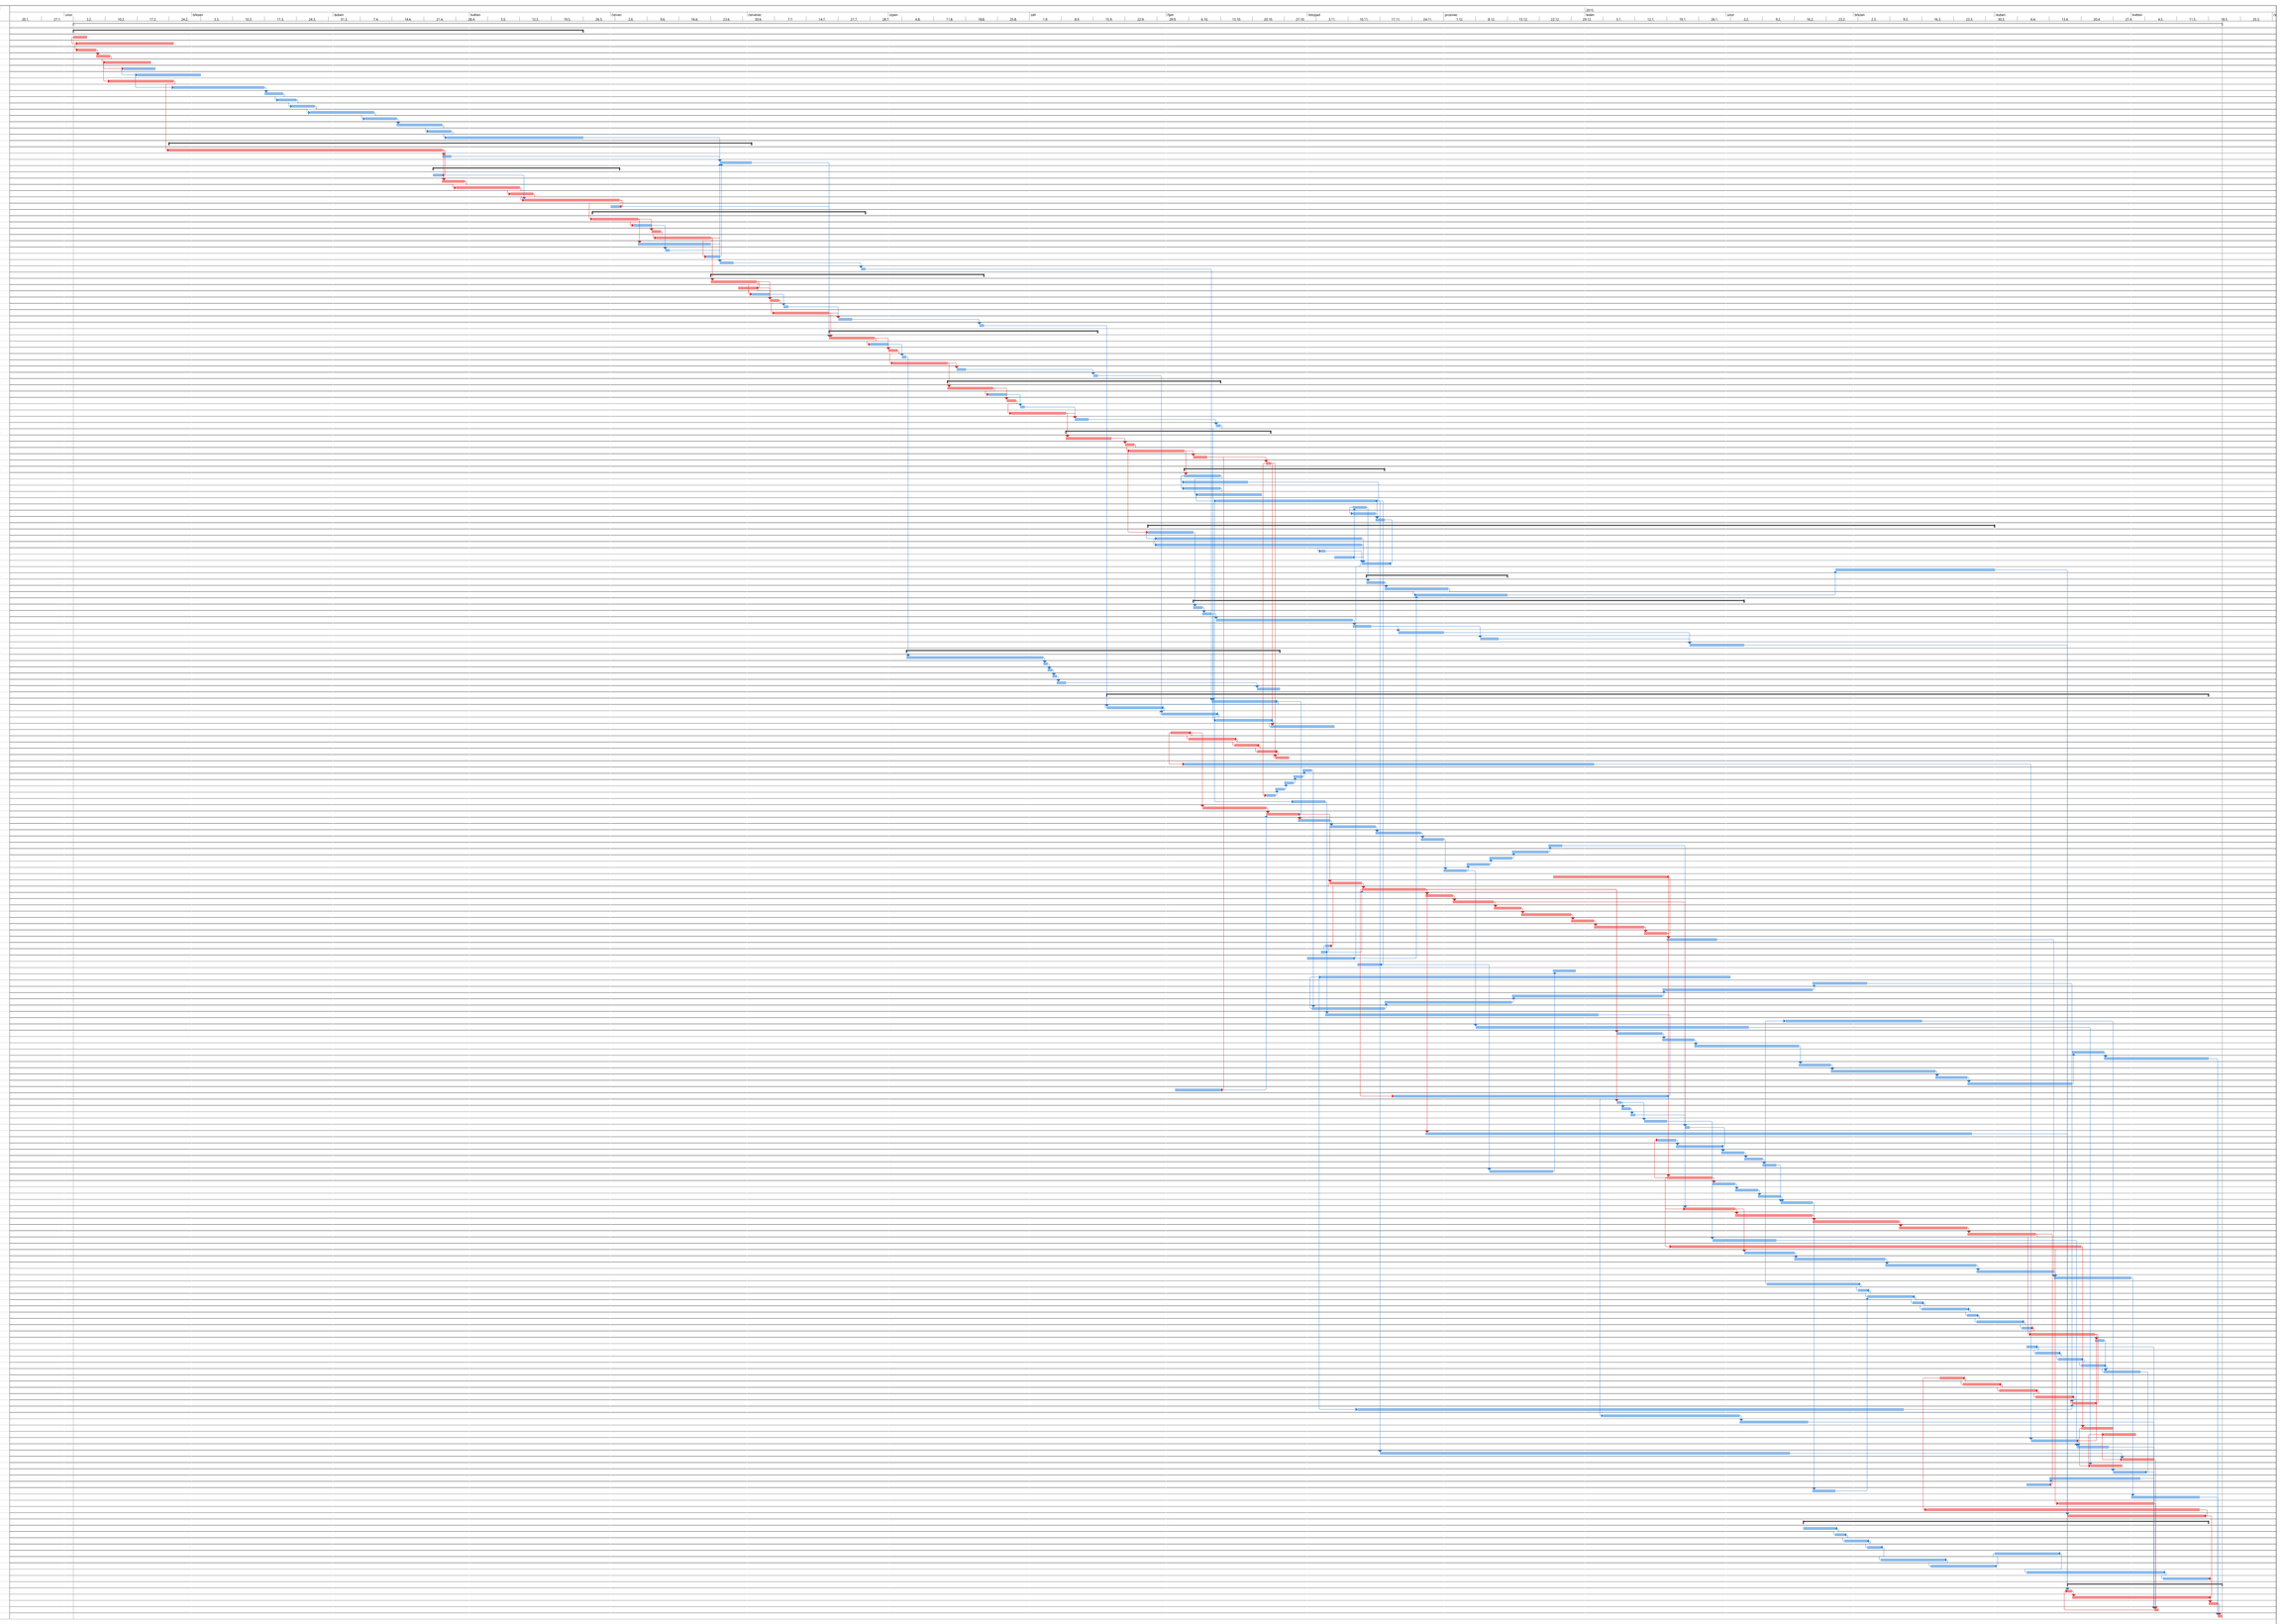

Projekt: HMG_29_12 | Chod | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neplatný úkol | Neplatný milník | Neplatný souhrn | Ruční úkol | Pouze s dílčím trvání | Ruční úkoly vyhnutí v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Kritický | Kritické rozdělení | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu
