DP-project

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Vytyčení staveniště	2 dny	27.02. 17	28.02. 17
2	Oplocení staveniště	1 den	01.03. 17	01.03. 17
3	Odstranění stávajícího porostu	1 den	01.03. 17	01.03. 17
4	Semutí ornice tl. 150 mm	1 den	02.03. 17	02.03. 17
5	Zařízení staveniště	9 dny	03.03. 17	15.03. 17
6	Zpevněná komunikace (staveništní)	5 dny	09.03. 17	15.03. 17
7	Beranění zápor	2 dny	03.03. 17	06.03. 17
8	Odkopávky a prokopávky nezapažené	9 dny	07.03. 17	17.03. 17
9	Záporové pažení	6,5 dny	09.03. 17	20.03. 17
10	Hloubení rýh a šachet včetně začištění	4 dny	20.03. 17	23.03. 17
11	Základ pod jeřáb	1 den	16.03. 17	16.03. 17
12	Montáž jeřábu	1 den	27.03. 17	27.03. 17
13	Zemnící pásky	1 den	24.03. 17	24.03. 17
14	Provedení ležatých rozvodů	3 dny	27.03. 17	29.03. 17
15	Podklad základů - ŠP, geotextilie, podkl.b	4 dny	30.03. 17	04.04. 17
16	Bednění základových pasů	2 dny	05.04. 17	06.04. 17
17	Výztuž základových pasů	4 dny	07.04. 17	12.04. 17
18	Betonáž základových pasů	3 dny	13.04. 17	17.04. 17
19	Odbednění základových pasů	2 dny	18.04. 17	19.04. 17
20	Hydroizolace pod základovou desku	7 dny	20.04. 17	28.04. 17
21	Bednění základové desky	1 den	01.05. 17	01.05. 17
22	Výztuž základových desek	5 dny	02.05. 17	08.05. 17
23	Betonáž základové desky	4 dny	09.05. 17	12.05. 17
24	Odbednění základové desky	1 den	15.05. 17	15.05. 17
25	Provedení drenáže	1 den	16.05. 17	16.05. 17
26	Stěna z tvárnic ztraceného bednění	6 dny	16.05. 17	23.05. 17
27	Bednění a vyztužení nosných konstrukcí	5 dny	24.05. 17	30.05. 17
28	Betonáž nosných konstrukcí	4 dny	31.05. 17	05.06. 17
29	Odbednění nosných konstrukcí	1,5 dny	06.06. 17	07.06. 17
30	Sjezd do garáží	6 dny	17.05. 17	24.05. 17
31	Opěrná stěna sjezdu do garáží	9 dny	25.05. 17	06.06. 17
32	Zesílení výztuže kolem sloupů	1,5 dny	07.06. 17	08.06. 17
33	Schodiště 1PP-1NP	2 dny	09.06. 17	12.06. 17
34	Bednění stropů deskových s vložením izo	3 dny	09.06. 17	13.06. 17
35	Výztuž stropů	3 dny	13.06. 17	15.06. 17
36	Betonáž stropů deskových	5 dny	15.06. 17	21.06. 17
37	Odbednění schodiště + přestojkování	1 den	22.06. 17	22.06. 17
38	Osazení schodišťových ramen	1 den	23.06. 17	23.06. 17
39	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	03.07. 17	04.07. 17
40	Odstojkování schodiště	1 den	21.07. 17	21.07. 17
41	Odstojkování stropu	1 den	01.08. 17	01.08. 17
42	Stěny ze ztraceného bednění	2 dny	22.06. 17	23.06. 17
43	Bednění a výztuž nosných konstrukcí	2 dny	26.06. 17	27.06. 17
44	Betonáž nosných konstrukcí	3 dny	28.06. 17	30.06. 17
45	Odbednění nosných konstrukcí	1 den	04.07. 17	04.07. 17
46	Zdění nosných konstrukcí	12 dny	22.06. 17	07.07. 17
47	Schodiště 1NP-2NP	2 dny	05.07. 17	06.07. 17
48	Bednění stropů deskových	3 dny	07.07. 17	11.07. 17
49	Výztuž stropů deskových	3 dny	12.07. 17	14.07. 17
50	Betonáž stropů deskových	5 dny	18.07. 17	24.07. 17
51	Odbednění a přestojkování schodiště	1 den	18.07. 17	18.07. 17
52	Osazení schodišťových ramen	1 den	19.07. 17	19.07. 17
53	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	03.08. 17	04.08. 17
54	Odstojkování schodiště	1 den	16.08. 17	16.08. 17
55	Odstojkování stropu	1 den	01.09. 17	01.09. 17
56	Obsyp objektu hutněný 1 výška (po angl.	2 dny	25.07. 17	26.07. 17
57	Anglické dvorky	7 dny	27.07. 17	04.08. 17
58	Zásyp stavební jámy (Mimo angl.dvorky)	2 dny	27.07. 17	28.07. 17
59	Zásyp stavební jámy hutněný	2 dny	14.09. 17	15.09. 17
60	Stěny ze ztraceného bednění	2 dny	25.07. 17	26.07. 17
61	Bednění a výztuž nosných konstrukcí	2 dny	27.07. 17	28.07. 17
62	Betonáž nosných konstrukcí	3 dny	31.07. 17	02.08. 17
63	Odbednění nosných konstrukcí	1,5 dny	04.08. 17	07.08. 17
64	Zdění nosných konstrukcí	12 dny	25.07. 17	09.08. 17
65	Schodiště 2NP-3NP	2 dny	07.08. 17	09.08. 17
66	Bednění stropů deskových	3 dny	09.08. 17	14.08. 17
67	Výztuž stropů deskových	3 dny	14.08. 17	17.08. 17
68	Betonáž stropů deskových	5 dny	18.08. 17	25.08. 17
69	Odbednění a přestojkování schodiště	1 den	18.08. 17	21.08. 17
70	Osazení schodišťových ramen	1 den	21.08. 17	22.08. 17
71	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	05.09. 17	07.09. 17
72	Odstojkování schodiště	1 den	18.09. 17	19.09. 17
73	Odstojkování stropu	1 den	04.10. 17	05.10. 17
74	Stěny ze ztraceného bednění	2 dny	25.08. 17	29.08. 17
75	Bednění a výztuž nosných konstrukcí	2 dny	29.08. 17	31.08. 17
76	Betonáž nosných konstrukcí	3 dny	31.08. 17	05.09. 17
77	Odbednění nosných konstrukcí	1,5 dny	06.09. 17	07.09. 17
78	Zdění nosných konstrukcí	10 dny	25.08. 17	08.09. 17
79	Schodiště 3NP-4NP	2 dny	08.09. 17	12.09. 17
80	Bednění stropů deskových	2,5 dny	12.09. 17	14.09. 17
81	Výztuž stropů deskových	2,5 dny	14.09. 17	18.09. 17
82	Betonáž stropů deskových	4 dny	18.09. 17	22.09. 17
83	Odbednění a přestojkování schodiště	1 den	21.09. 17	22.09. 17
84	Osazení schodišťových ramen	1 den	22.09. 17	25.09. 17
85	Odbednění a přestojkování stropu	2 dny	03.10. 17	05.10. 17
86	Odstojkování schodiště	1 den	20.10. 17	23.10. 17
87	Odstojkování stropu	1 den	01.11. 17	02.11. 17
88	Zdění kontrukce	1 den	22.09. 17	25.09. 17
89	Venkovní schodiště na terénu	4 dny	07.06. 17	12.06. 17
90	Hydroizolace spodní stavby	7 dny	05.07. 17	13.07. 17
91	Tepelná izolace spodní stavby	3 dny	14.07. 17	18.07. 17
92	Montáž nosné konstrukce střechy	25 dny	25.09. 17	30.10. 17
93	Montáž střešní krytiny	20 dny	30.10. 17	27.11. 17
94	Demontáž jeřábu	1 den	30.10. 17	31.10. 17
95	Montáž lešení + stavebního výtahu	2 dny	31.10. 17	02.11. 17
96	Osazení vnějších otvorů	7 dny	02.11. 17	13.11. 17
97	Provedení souvrství terasy a ochozu	6 dny	13.11. 17	21.11. 17
98	Montáž hromosvodu	2 dny	21.11. 17	23.11. 17
99	Montáž zábradlí ochozu a terasy	2 dny	23.11. 17	27.11. 17
100	Montáž výstupků z fasády	2 dny	27.11. 17	29.11. 17
101	Montáž vnějších parapetů	2 dny	29.11. 17	01.12. 17
102	Obklad vnějších stěn cihelnými pásky	21 dny	01.12. 17	01.01. 18
103	Provádění vnějších omítek	14 dny	12.12. 17	01.01. 18
104	Vnější obklady Cetris	10 dny	18.12. 17	01.01. 18
105	Montáž klempířských prvků	3 dny	01.01. 18	04.01. 18
106	Demontáž lešení, stavebního výtahu	2 dny	04.01. 18	08.01. 18
107	Svislé rozvody ZTI a kanalizace	15 dny	10.10. 17	31.10. 17
108	Montáž VZT	5 dny	24.10. 17	31.10. 17
109	Zdění příček	13 dny	26.10. 17	14.11. 17
110	Rozvody elektro	14 dny	01.11. 17	21.11. 17
111	Vnitřní rozvody vodorovné - četa 1	12 dny	03.11. 17	21.11. 17
112	Vnitřní rozvody vodorovné - četa 2	14 dny	14.11. 17	04.12. 17
113	Podlahové vytápění	19 dny	13.11. 17	08.12. 17
114	Podlahy	33 dny	17.11. 17	03.01. 18
115	SDK předstěny, příčky, podhledy	31 dny	28.11. 17	10.01. 18
116	Vnitřní omítky	30 dny	07.12. 17	18.01. 18
117	Keramické obklady	18 dny	01.01. 18	25.01. 18
118	Montáž výtahu	21 dny	01.01. 18	30.01. 18
119	Vnitřní parapety	9 dny	16.01. 18	29.01. 18
120	Mntáž zábradlí na schodišti, a u prosvětlo	5 dny	18.01. 18	25.01. 18
121	Keramická dlažba	24 dny	17.01. 18	20.02. 18
122	Osazení kotle, montáž zařízení	5 dny	23.01. 18	30.01. 18
123	Malby - četa 1	14 dny	29.01. 18	16.02. 18
124	Malby - četa 2	12 dny	06.02. 18	22.02. 18
125	Finální vrstvy podlah	20 dny	08.02. 18	08.03. 18
126	Osazování zařizovacích předmětů	15 dny	19.02. 18	12.03. 18
127	Osazování obložkových zárubní a dveří	15 dny	20.02. 18	13.03. 18
128	Rozvid vody a kanal. pod stropem	3 dny	02.08. 17	04.08. 17
129	Izolace tepelná stropu	8 dny	07.08. 17	16.08. 17
130	Montáž přístřešku nad vchodem	5 dny	08.01. 18	15.01. 18
131	Zpevněné plochy, chodník, komunikace	25 dny	15.01. 18	19.02. 18
132	Vodovodní přípojka	6 dny	18.09. 17	25.09. 17
133	Kanalizační přípojka	6 dny	26.09. 17	03.10. 17
134	Přípojka elektro	6 dny	04.10. 17	11.10. 17
135	Stavba oplocení	14 dny	12.10. 17	31.10. 17
136	Sadové úpravy	4 dny	19.02. 18	23.02. 18
137	Úklid	5 dny	07.03. 18	14.03. 18
138	Předání	1 den	14.03. 18	15.03. 18
139	Kolaudace	1 den	15.03. 18	16.03. 18

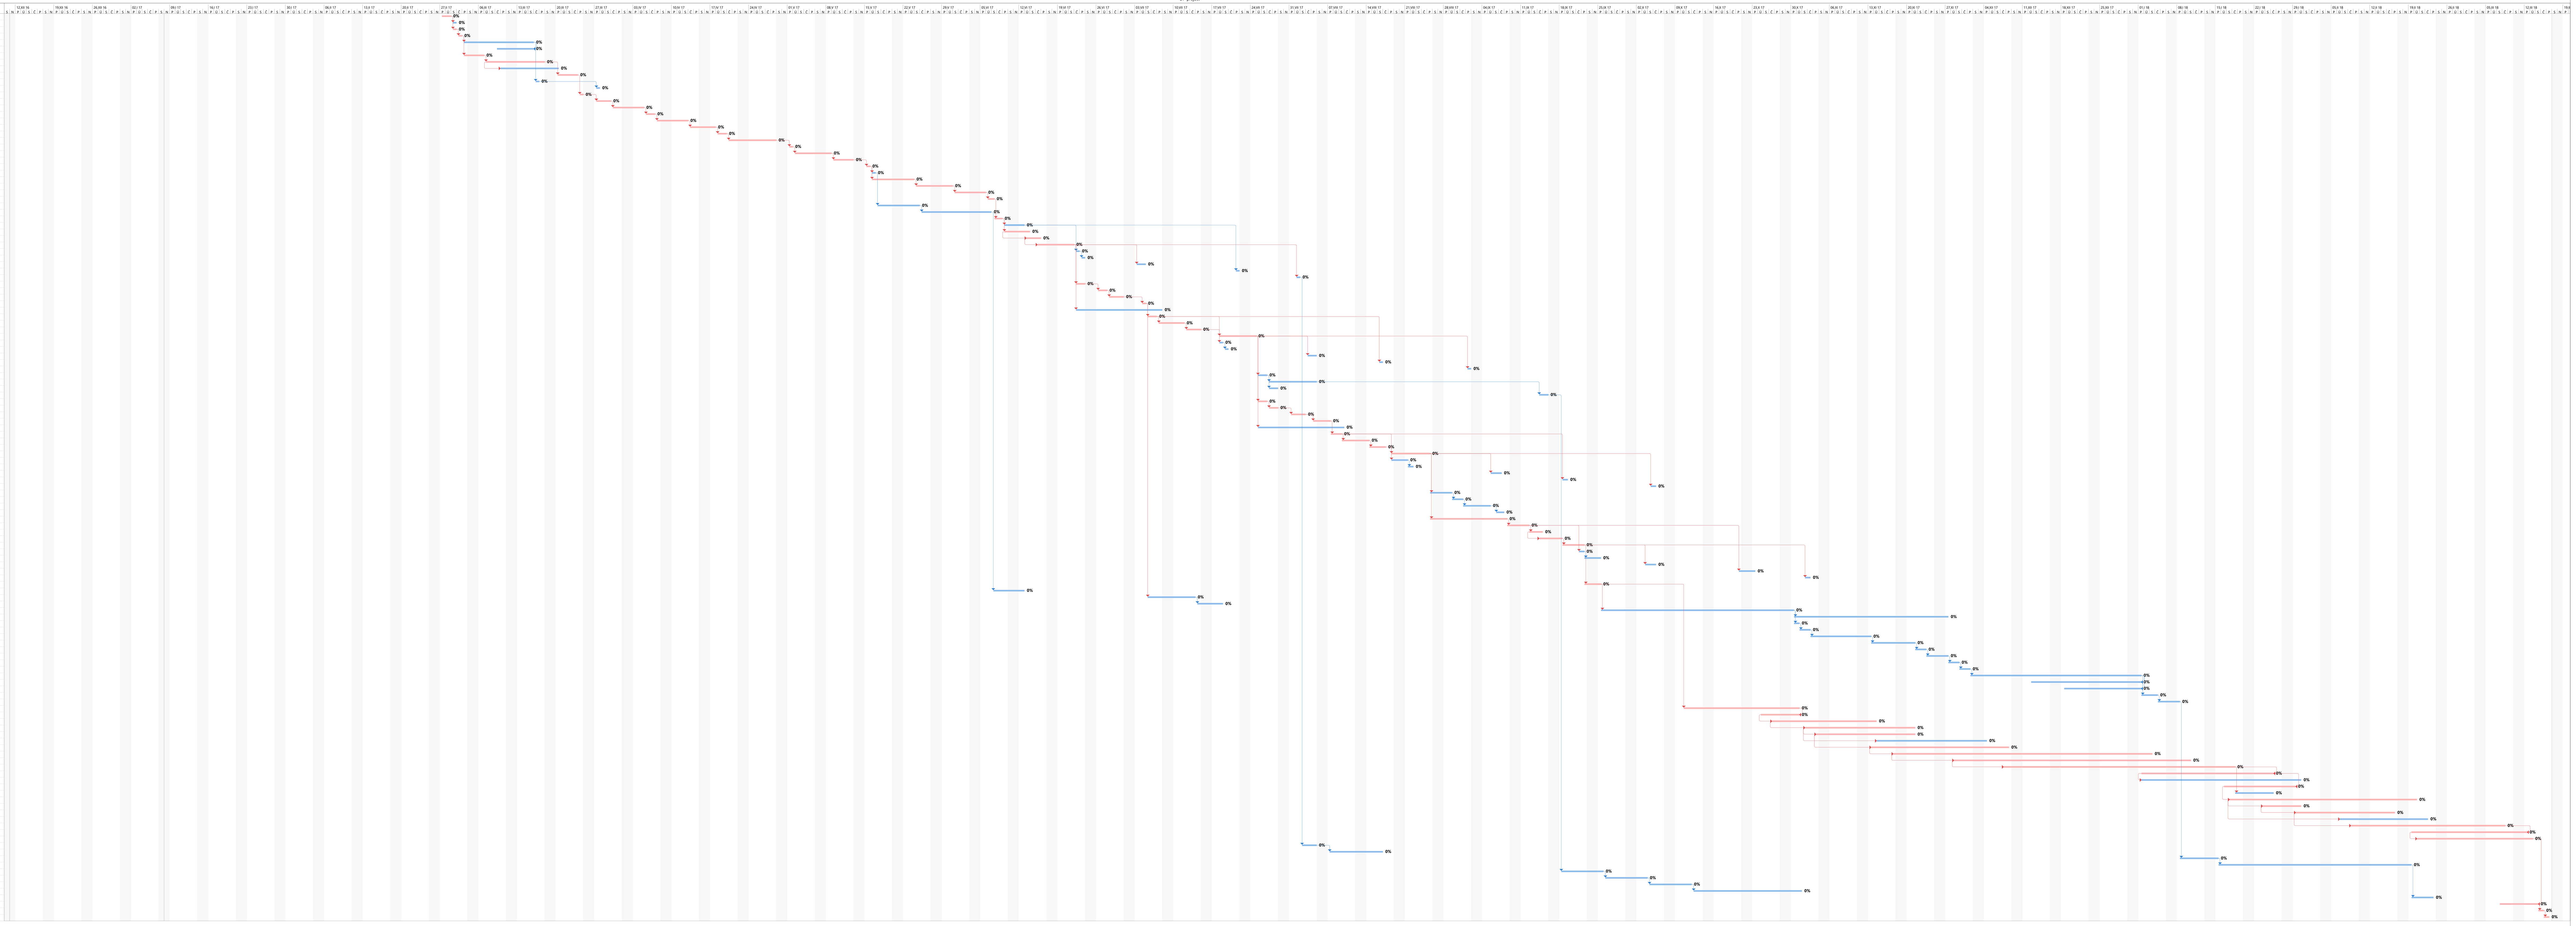

Kritický | Rozdělení kritického úkolu | Průběh kritického úkolu | Úkol | Rozdělení | Průběh úkolu | Ruční úkol | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Pouze s dobou trvání | Směrný plán | Rozdělení podle směrného plánu | Milník podle směrného plánu | Milník | Průběh souhrnného úkolu | Souhrnný | Ruční souhrn | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Konečný termín
