21602_Depo autocisteren a produktovod - skutečný průběh IA

Datum skutečného zahájení projektu / schválení IŽ: 22.11.2004 / 5.10.2017
Dokončení realizace dle IŽ / skutečné dokončení: 30.12.2019 / 21.4.2019
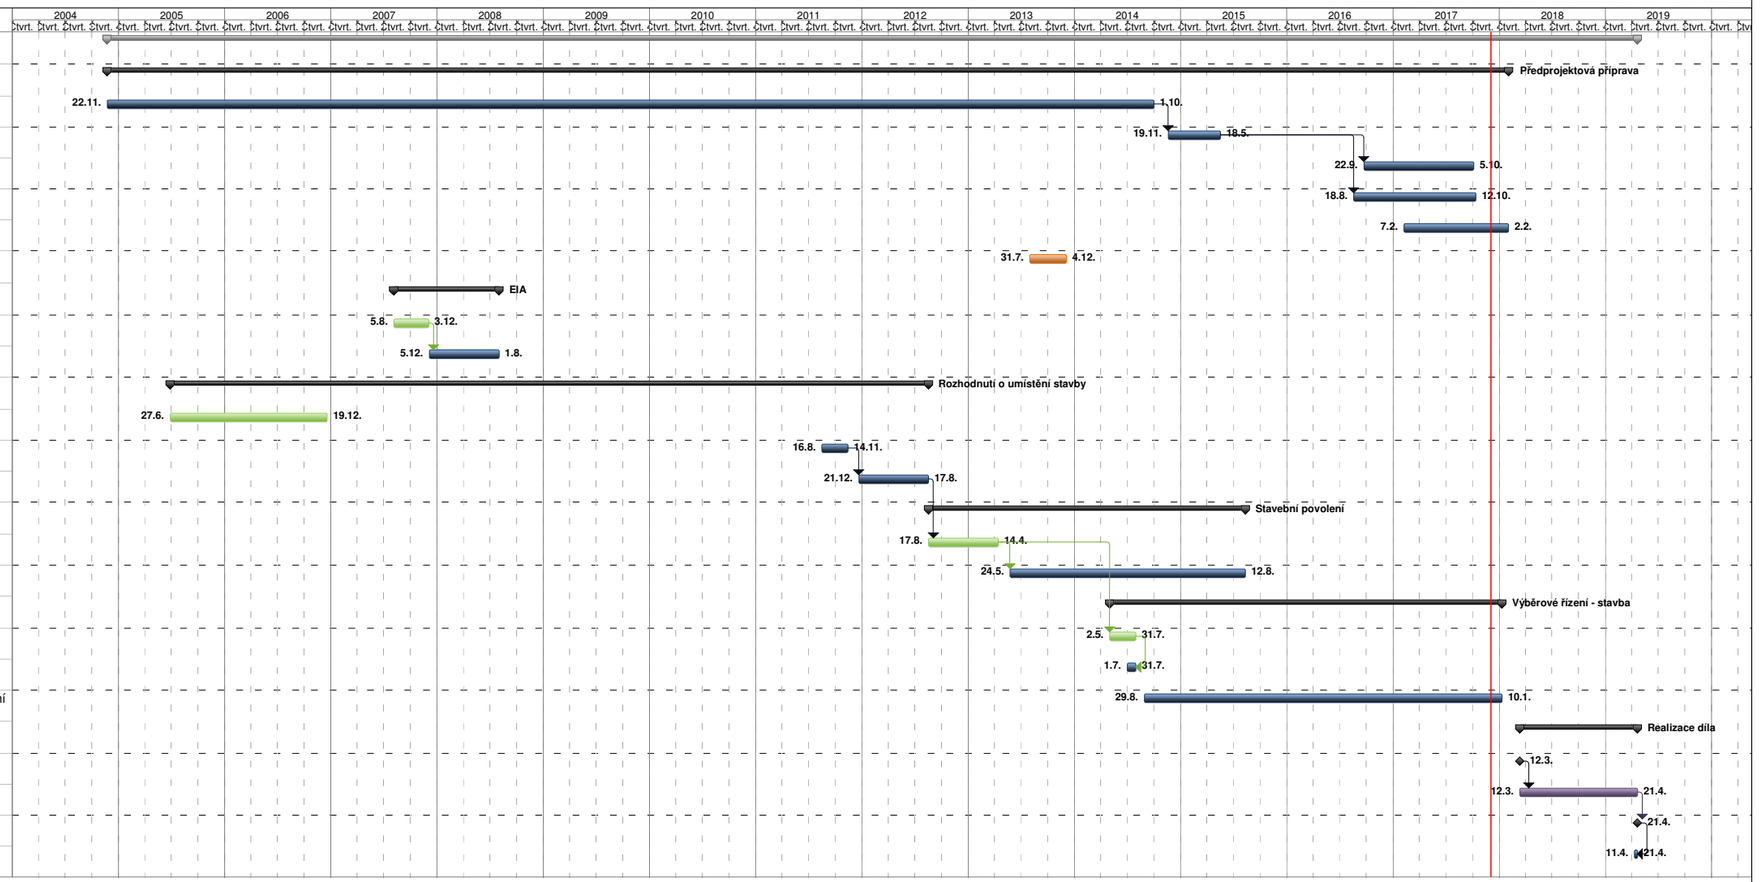
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Poznámky
0	**21602_Depo autocisteren a produktovod**	**5263 d**	**22.11. 04**	**21.4. 19**	
1	**1 Předprojektová příprava**	**4820 d**	**22.11. 04**	**2.2. 18**	
2	1.1 Investiční žádost - specifikace požadavku uživatele	120 měs	22.11. 04	1.10. 14	
3	1.2 Investiční žádost - schvalování WF1 TAS	6 měs	19.11. 14	18.5. 15	
4	1.3 Investiční žádost - přeschválení WF1 TAS	378 d	22.9. 16	5.10. 17	
5	1.4 Projednání žádosti ve výborech	14 měs	18.8. 16	12.10. 17	
6	1.5 Investiční žádost - schválení ve WF3 TAS	12 měs	7.2. 17	2.2. 18	STÁLE PROBÍHÁ
7	**2 Výběrové řízení na Zhotovitele DPS**	**18 t**	**31.7. 13**	**4.12. 13**	
8	**3 EIA**	**362 d**	**5.8. 07**	**1.8. 08**	
9	3.1 Dokumentace EIA	4 měs	5.8. 07	3.12. 07	
10	3.2 Projednání EIA	8 měs	5.12. 07	1.8. 08	
11	**4 Rozhodnutí o umístění stavby**	**2608 d**	**27.6. 05**	**17.8. 12**	
12	4.1 DÚR, včetně připomínek OJ	18 měs	27.6. 05	19.12. 06	
13	4.2 Přepracování DÚR - nová legislativa	3 měs	16.8. 11	14.11. 11	
14	4.3 Projednání a získání Územního rozhodnutí	8 měs	21.12. 11	17.8. 12	
15	**5 Stavební povolení**	**1090 d**	**17.8. 12**	**12.8. 15**	
16	5.1 DSP, včetně připomínek OJ	8 měs	17.8. 12	14.4. 13	
17	5.2 Projednání a získání Stavebního povolení	27 měs	24.5. 13	12.8. 15	
18	**6 Výběrové řízení - stavba**	**1349 d**	**2.5. 14**	**10.1. 18**	
19	6.1 DPS, včetně připomínek OJ	3 měs	2.5. 14	31.7. 14	
20	6.2 Zadávací dokumentace	1 měs	1.7. 14	31.7. 14	
21	6.3 Výběr zhotovitele	41 měs	29.8. 14	10.1. 18	29.11.2017 lhůta pro odvolání
22	**7 Realizace díla**	**405 d**	**12.3. 18**	**21.4. 19**	
23	7.1 Předání staveniště Zhotoviteli	0 d	12.3. 18	12.3. 18	
24	7.2 Realizace	405 d	12.3. 18	21.4. 19	
25	7.3 Předání díla a staveniště Objednateli	0 d	21.4. 19	21.4. 19	
26	7.4 Kolaudace	10 d	11.4. 19	21.4. 19
