ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Logistické centrum LIDL Brandýs - Přístavba skladu chlazených prostor "Východ", skladu vratných obalů a přestavba vnitřních dispozic skladu“**	**509 dny**	**2.11. 16**	**29.3. 18**
2	Převzetí staveniště	0 dny	2.11. 16	2.11. 16
3	**Zahájení realizace díla**	**0 dny**	**7.11. 16**	**7.11. 16**
4	Zařízení staveniště	4 dny	7.11. 16	10.11. 16
5	**1.část díla - Přístavba kontejnerové rampy**	**173 dny**	**7.11. 16**	**30.4. 17**
6	Bourací práce	32 dny	6.12. 16	7.1. 17
7	Dešťová kanalizace	19 dny	22.12. 16	10.1. 17
8	Kanalizace splašková	30 dny	7.11. 16	6.12. 16
9	Požární vodovod	19 dny	22.12. 16	10.1. 17
10	Piloty a kalichy	10 dny	26.11. 16	5.12. 16
11	Zemní práce	25 dny	21.12. 16	15.1. 17
12	Podkladní kce	4 dny	18.1. 17	21.1. 17
13	Izolace spodní stavby	2 dny	16.1. 17	17.1. 17
14	Prefa konstrukce	15 dny	6.12. 16	20.12. 16
15	Obvodový plášť na stávající stěně	14 dny	28.11. 16	11.12. 16
16	Ocelová konstrukce a opláštění	14 dny	15.12. 16	20.1. 17
17	Střecha	60 dny	21.12. 16	19.2. 17
18	Odvodnění	14 dny	16.1. 17	29.1. 17
19	Podlaha	7 dny	30.1. 17	5.2. 17
20	Výplně otvorů	5 dny	13.2. 17	17.2. 17
21	Zámečnické kce	30 dny	22.1. 17	20.2. 17
22	Vnitřní rozvody	45 dny	20.2. 17	5.4. 17
23	Zpevněné plochy	7 dny	6.4. 17	12.4. 17
24	Kompletace, dokončovací práce	25 dny	22.3. 17	16.4. 17
25	Oplocení provizorního skladu palet	3 dny	19.12. 16	21.12. 16
26	Zemní práce pro příjezdovou komunikaci	10 dny	10.11. 16	19.11. 16
27	Podkladní vrstvy a obrubníky	13 dny	7.12. 16	19.12. 16
28	Živičné vrstvy příjezdové komunikace	8 dny	20.12. 16	12.4. 17
29	Druhý vjezd na pozemek	5 dny	20.1. 17	24.1. 17
30	Oplocení	26 dny	25.1. 17	19.2. 17
31	Dopravní značení	3 dny	13.4. 17	15.4. 17
32	**Dokončení stavebních prací 1.části díla**	**0 dny**	**16.4. 17**	**16.4. 17**
33	**Kolaudační souhlas k 1.části díla**	**0 dny**	**30.4. 17**	**30.4. 17**
34	**2.část díla - Parkoviště pro osobní vozidla**	**164 dny**	**1.12. 16**	**15.5. 17**
35	Sejmutí ornice	10 dny	1.12. 16	10.12. 16
36	Archeologický průzkum	51 dny	11.12. 16	31.1. 17
37	Zemní práce	10 dny	1.2. 17	10.2. 17
38	Odvodnění	14 dny	11.2. 17	24.2. 17
39	Podkladní kce	10 dny	25.2. 17	6.3. 17
40	Obrubníky a zámková dlažba	33 dny	7.3. 17	8.4. 17
41	Živičné povrchy	10 dny	9.4. 17	18.4. 17
42	Kompletace, dokončovací práce	10 dny	15.4. 17	25.4. 17
43	**Dokončení stavebních prací 2.části díla**	**0 dny**	**25.4. 17**	**25.4. 17**
44	**Kolaudační souhlas k 2.části díla**	**0 dny**	**15.5. 17**	**15.5. 17**
45	**3.část díla - Přístavba mrazáku TIKO**	**178 dny**	**3.1. 17**	**30.6. 17**
46	Bourací práce	32 dny	3.1. 17	3.2. 17

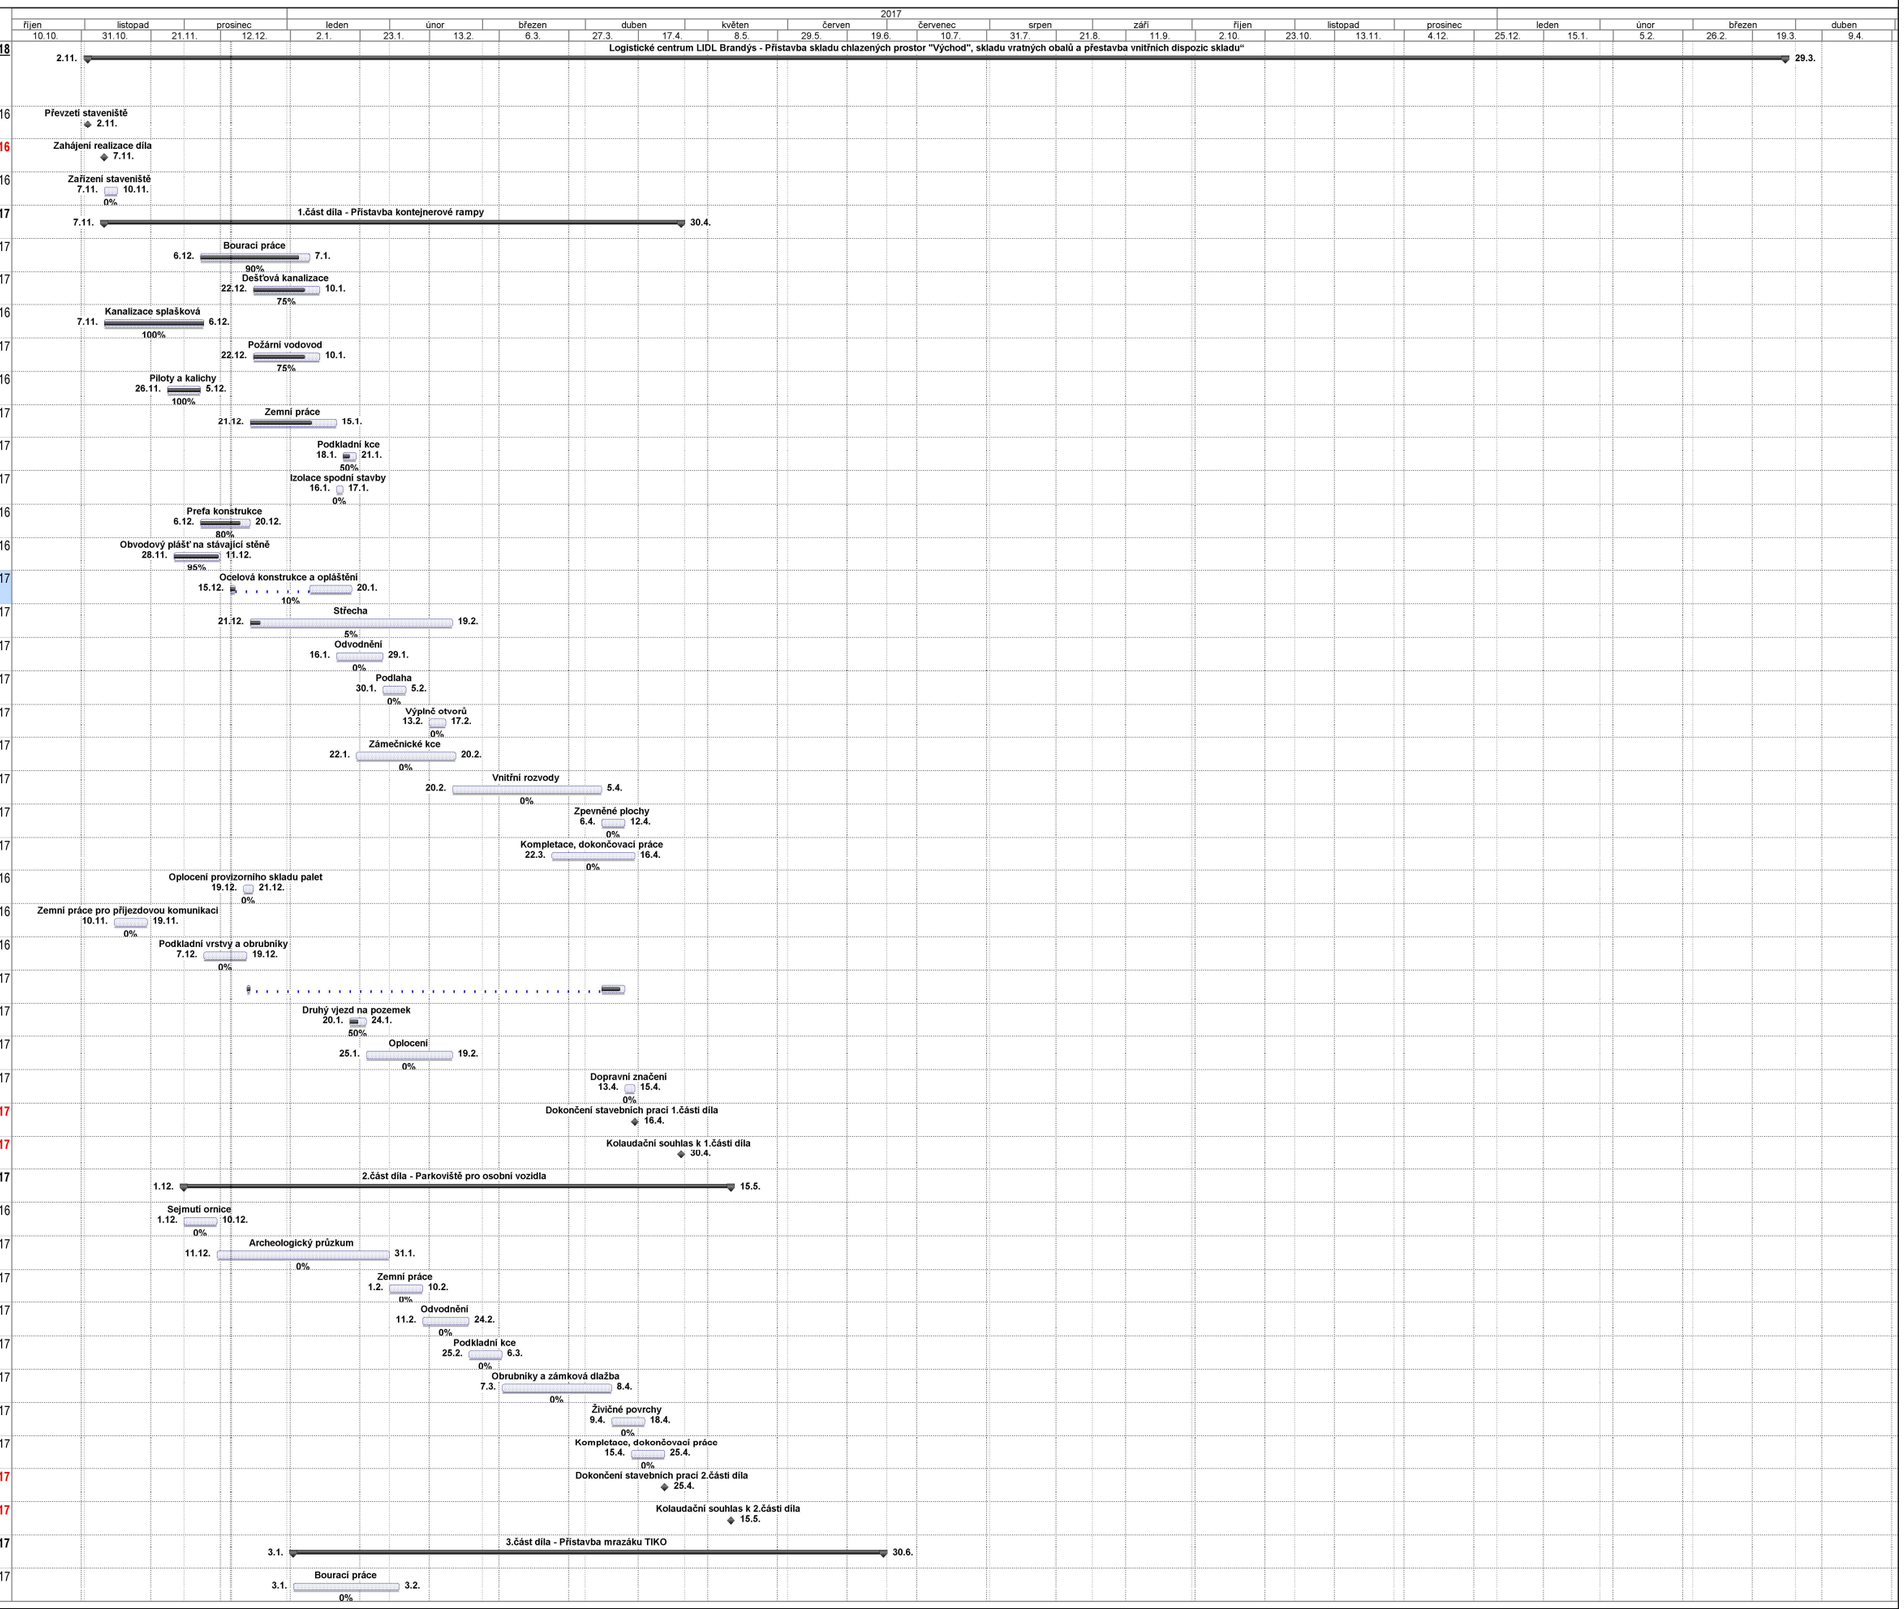

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
47	Piloty a kalichy	10 dny	10.1. 17	19.1. 17
48	Zemní práce	9 dny	8.2. 17	16.2. 17
49	Izolace spodní stavby	7 dny	20.2. 17	26.2. 17
50	Prefa konstrukce	20 dny	31.1. 17	19.2. 17
51	Opláštění plechem	14 dny	20.2. 17	5.3. 17
52	Střecha	35 dny	20.2. 17	26.3. 17
53	Podkladní kce	11 dny	27.3. 17	6.4. 17
54	Podlaha	7 dny	7.4. 17	13.4. 17
55	Výplně otvorů	5 dny	11.6. 17	15.6. 17
56	Zámečnické kce	30 dny	22.4. 17	21.5. 17
57	Vnitřní rozvody	55 dny	22.4. 17	15.6. 17
58	Přípojka VN	30 dny	1.3. 17	30.3. 17
59	Kompletace, dokončovací práce	25 dny	25.5. 17	19.6. 17
60	**Dokončení skeletu, střechy, podlahy 3.části díla**	**0 dny**	**24.4. 17**	**24.4. 17**
61	**Dokončení stavebních prací 3.části díla**	**0 dny**	**19.6. 17**	**19.6. 17**
62	**Kolaudační souhlas k 3.části díla**	**0 dny**	**30.6. 17**	**30.6. 17**
63	**4.část díla - Vrátnice a hlavní nový areálový vjezd**	**89 dny**	**3.5. 17**	**31.7. 17**
64	Piloty a kalichy	5 dny	3.5. 17	7.5. 17
65	Zemní práce	3 dny	8.5. 17	10.5. 17
66	Izolace spodní stavby	1 den	13.5. 17	13.5. 17
67	Prefa konstrukce	5 dny	8.5. 17	12.5. 17
68	Střecha	8 dny	13.5. 17	20.5. 17
69	Stavební práce	36 dny	21.5. 17	25.6. 17
70	Podlaha	7 dny	14.6. 17	20.6. 17
71	Výplně otvorů	5 dny	4.6. 17	8.6. 17
72	Vnitřní rozvody	36 dny	1.6. 17	6.7. 17
73	Kompletace, dokončovací práce	19 dny	7.7. 17	26.7. 17
74	Úprava komunikace vjezdu	21 dny	21.6. 17	11.7. 17
75	Úprava vrat a závory vjezdu	19 dny	23.6. 17	11.7. 17
76	**Dokončení stavebních prací 4.části díla**	**0 dny**	**26.7. 17**	**26.7. 17**
77	**Kolaudační souhlas k 4.části díla**	**0 dny**	**31.7. 17**	**31.7. 17**
78	**5.část díla demontáž TIKO a montáž MASO**	**91 dny**	**15.8. 17**	**14.11. 17**
79	Bourací práce	14 dny	15.8. 17	28.8. 17
80	Vnitřní rozvody	29 dny	29.8. 17	26.9. 17
81	Obklady stěn a sloupů - PIR panely	10 dny	27.9. 17	6.10. 17
82	Podhledy - PIR panely	10 dny	7.10. 17	16.10. 17
83	Podlaha	8 dny	17.10. 17	24.10. 17
84	Zámečnické kce	12 dny	25.10. 17	5.11. 17
85	Výplně otvorů	4 dny	6.11. 17	9.11. 17
86	Kompletace, dokončovací práce	19 dny	23.10. 17	11.11. 17
87	**Dokončení stavebních prací 4.části díla**	**0 dny**	**11.11. 17**	**11.11. 17**
88	**Kolaudační souhlas k 4.části díla**	**0 dny**	**14.11. 17**	**14.11. 17**
89	**6.část díla přestavba Řetízkový dopravník**	**45 dny**	**15.9. 17**	**30.10. 17**
90	Bourací práce	15 dny	15.9. 17	29.9. 17
91	Montáž řetízkového dopravníku	22 dny	30.9. 17	21.10. 17
92	Kompletace, dokončovací práce	6 dny	21.10. 17	27.10. 17
93	**Dokončení stavebních prací 4.části díla**	**0 dny**	**27.10. 17**	**27.10. 17**

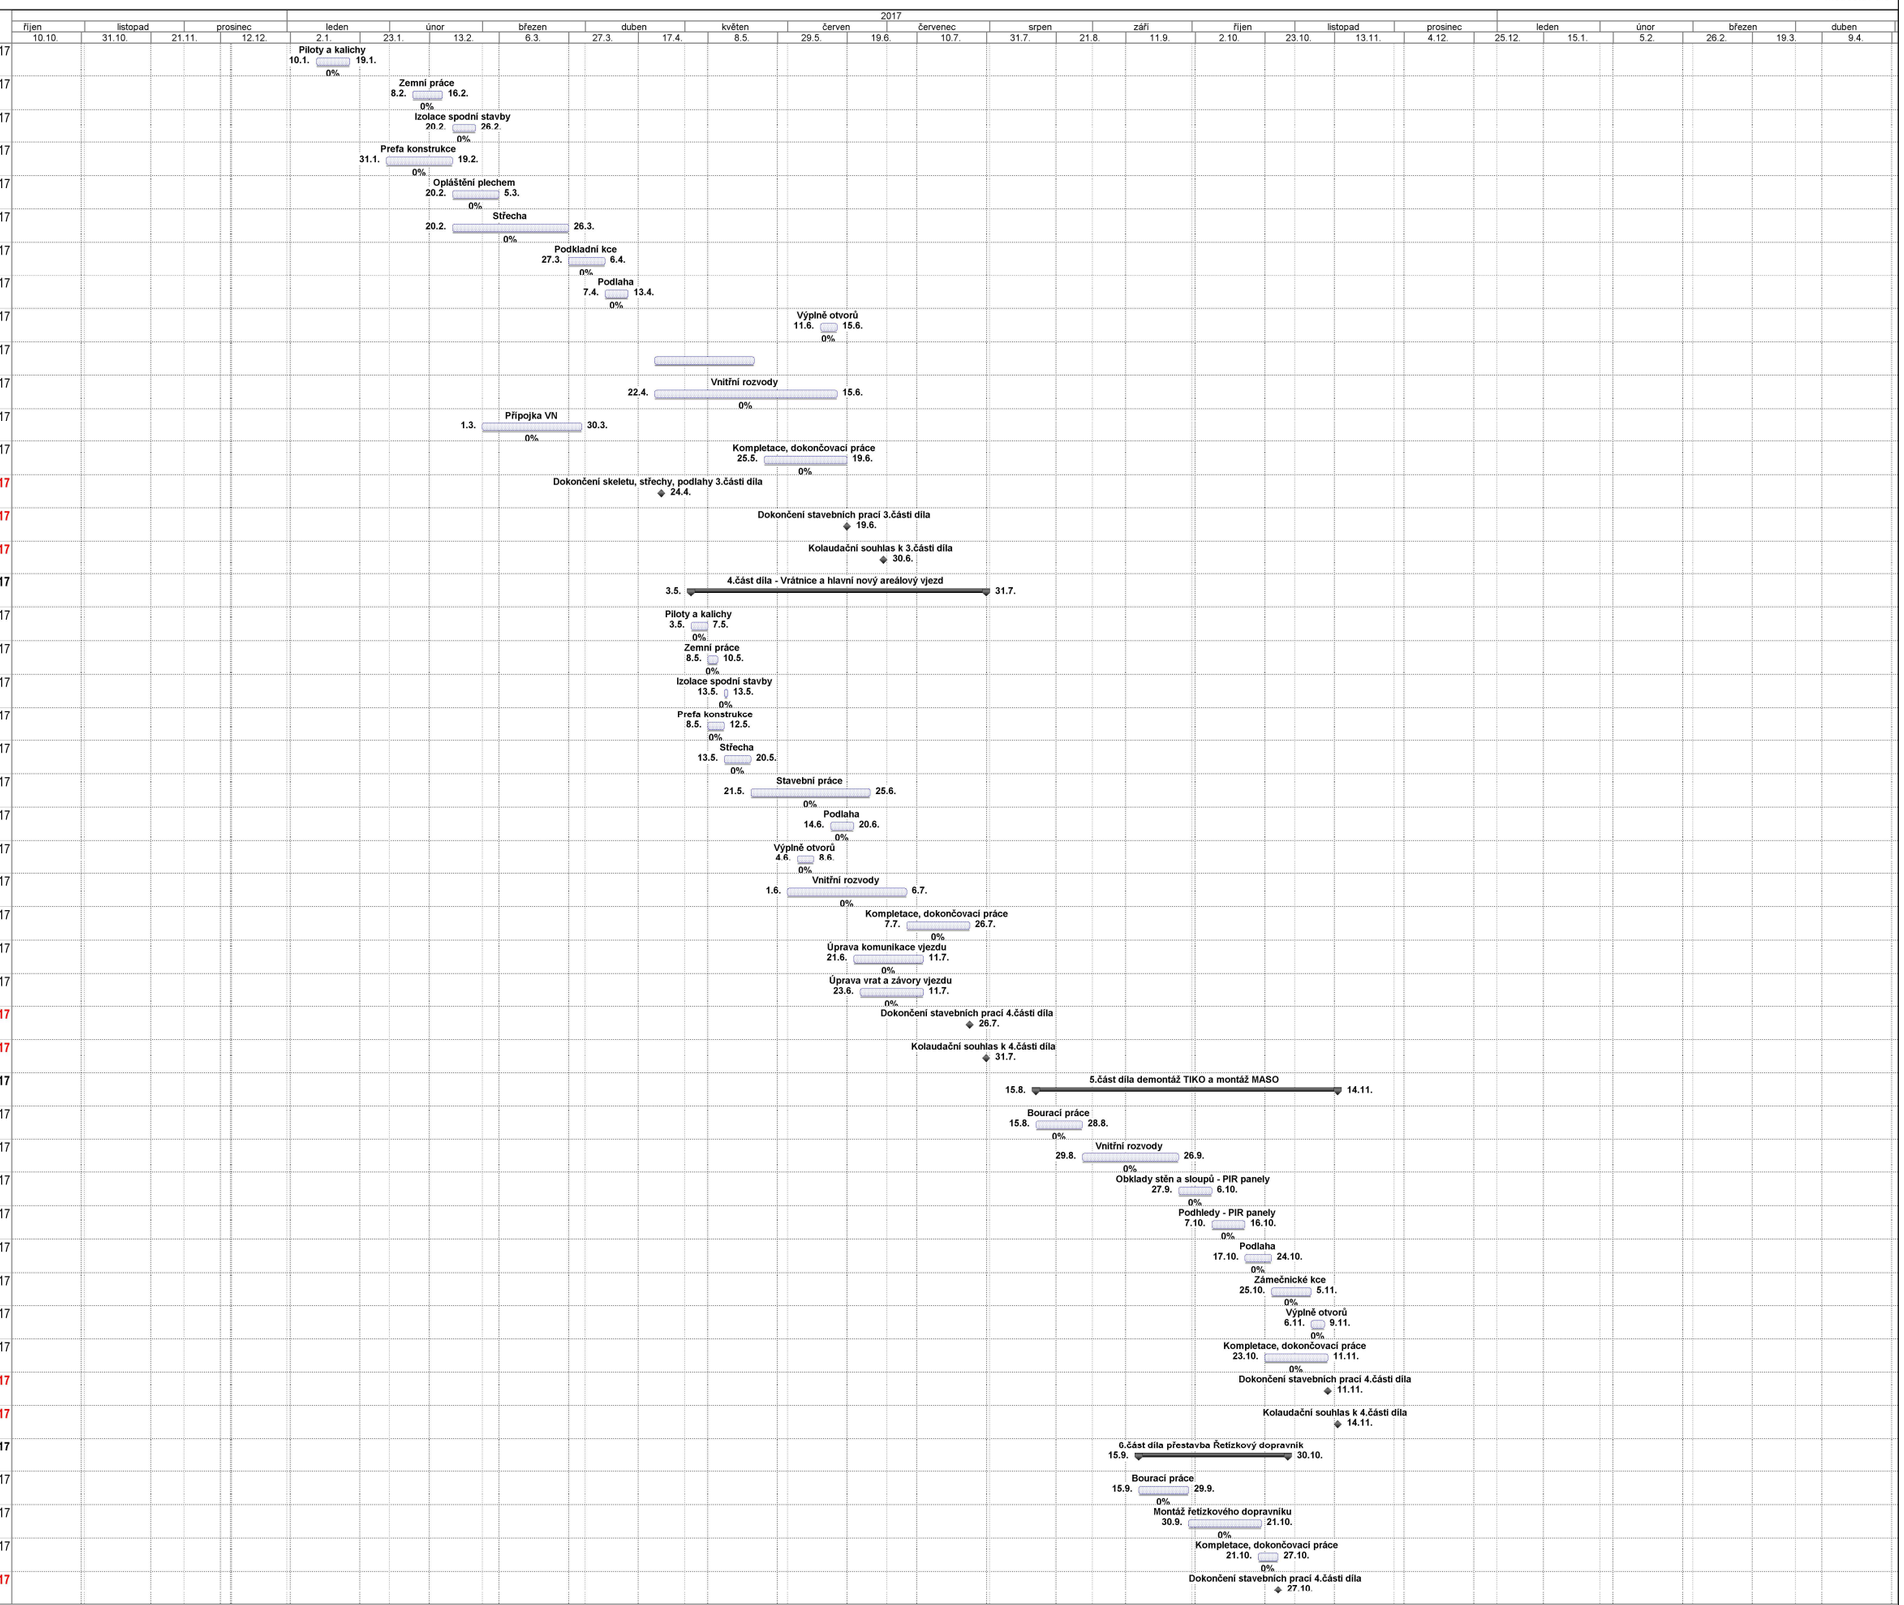
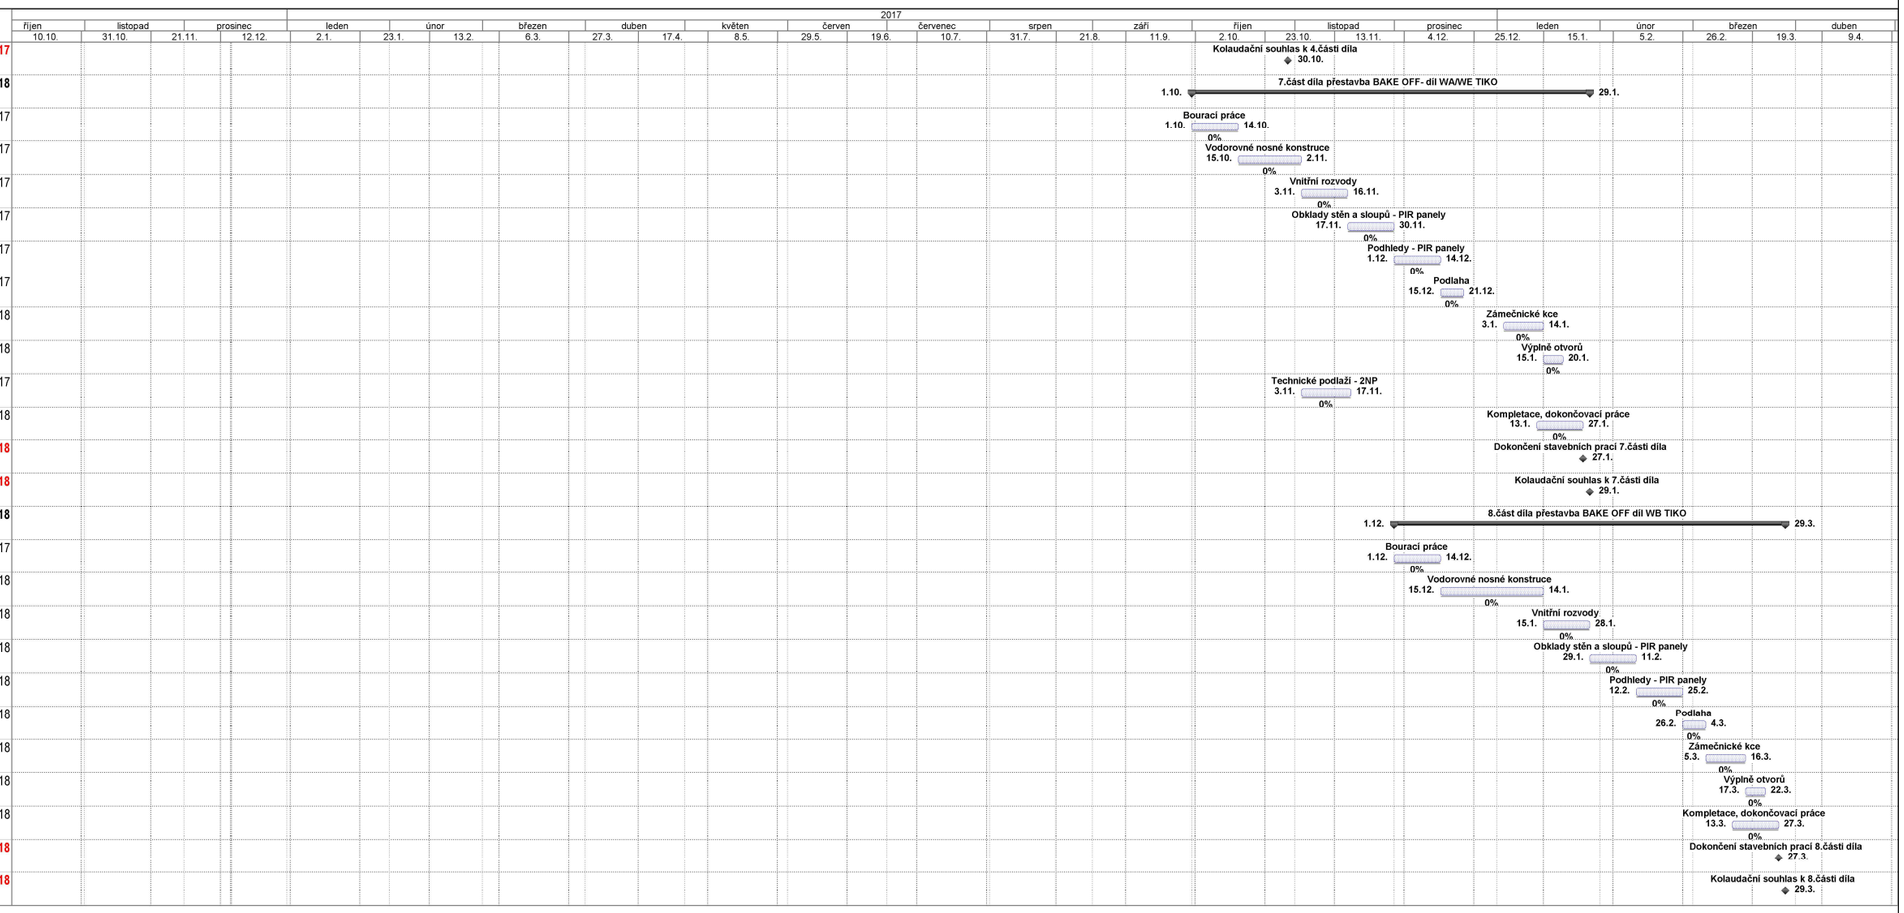
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
94	**Kolaudační souhlas k 4.části díla**	**0 dny**	**30.10. 17**	**30.10. 17**
95	**7.část díla přestavba BAKE OFF- díl WA/WE TIKO**	**118 dny**	**1.10. 17**	**29.1. 18**
96	Bourací práce	14 dny	1.10. 17	14.10. 17
97	Vodorovné nosné konstruce	19 dny	15.10. 17	2.11. 17
98	Vnitřní rozvody	14 dny	3.11. 17	16.11. 17
99	Obklady stěn a sloupů - PIR panely	14 dny	17.11. 17	30.11. 17
100	Podhledy - PIR panely	14 dny	1.12. 17	14.12. 17
101	Podlaha	7 dny	15.12. 17	21.12. 17
102	Zámečnické kce	12 dny	3.1. 18	14.1. 18
103	Výplně otvorů	6 dny	15.1. 18	20.1. 18
104	Technické podlaží - 2NP	15 dny	3.11. 17	17.11. 17
105	Kompletace, dokončovací práce	14 dny	13.1. 18	27.1. 18
106	**Dokončení stavebních prací 7.části díla**	**0 dny**	**27.1. 18**	**27.1. 18**
107	**Kolaudační souhlas k 7.části díla**	**0 dny**	**29.1. 18**	**29.1. 18**
108	**8.část díla přestavba BAKE OFF díl WB TIKO**	**116 dny**	**1.12. 17**	**29.3. 18**
109	Bourací práce	14 dny	1.12. 17	14.12. 17
110	Vodorovné nosné konstruce	29 dny	15.12. 17	14.1. 18
111	Vnitřní rozvody	14 dny	15.1. 18	28.1. 18
112	Obklady stěn a sloupů - PIR panely	14 dny	29.1. 18	11.2. 18
113	Podhledy - PIR panely	14 dny	12.2. 18	25.2. 18
114	Podlaha	7 dny	26.2. 18	4.3. 18
115	Zámečnické kce	12 dny	5.3. 18	16.3. 18
116	Výplně otvorů	6 dny	17.3. 18	22.3. 18
117	Kompletace, dokončovací práce	14 dny	13.3. 18	27.3. 18
118	**Dokončení stavebních prací 8.části díla**	**0 dny**	**27.3. 18**	**27.3. 18**
119	**Kolaudační souhlas k 8.části díla**	**0 dny**	**29.3. 18**	**29.3. 18**
