ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Názvy zdrojů
1		**VARIANTA BÍLÁ VANA**	**124 dny**	**04.04. 19**	**01.10. 19**			
2		**TE 1 - Základy**	**33 dny**	**04.04. 19**	**24.05. 19**			
3		**Podkladní beton**	**12 dny**	**04.04. 19**	**23.04. 19**			
4		bednění čel podkladního betonu	1 den	04.04. 19	04.04. 19		5	12_betonáři
5		betonáž podkladního betonu - C12/15 tl. 150 mm	1 den	05.04. 19	05.04. 19	4	6	12_betonáři
6		odbednění čel podkladního betonu u objektu G, bednění u objektu F	1 den	08.04. 19	08.04. 19	5	7	12_betonáři
7		hlazení podkladního betonu - zvýšený požadavek na rovinnost	3 dny	09.04. 19	11.04. 19	6	8	12_betonáři
8		separační PE fólie+ betonáž podkladního betonu - C12/15 tl. 150 mm	1 den	12.04. 19	12.04. 19	7	9	12_betonáři
9		odbednění čel podkladové desky	1 den	15.04. 19	15.04. 19	8	10	12_betonáři
10		hlazení podkladního betonu - zvýšený požadavek na rovinnost	3 dny	16.04. 19	18.04. 19	9	11	12_betonáři
11		separační PE fólie pro zajištění kluznosti	1 den	23.04. 19	23.04. 19	10	13;14	12_betonáři
12		**ZD1**	**5 dny**	**24.04. 19**	**30.04. 19**			
13		bednění čel základové desky bílé vany a osazení smykových trnů	1 den	24.04. 19	24.04. 19	11	19	12_betonáři
14		výztuž základové desky	2 dny	24.04. 19	25.04. 19	11	15;20	17_železáři
15		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	26.04. 19	26.04. 19	14	16;21	21_kvalifikovaní pracc
16		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	29.04. 19	29.04. 19	15	17;22	12_betonáři
17		odbednění čel základové desky	1 den	30.04. 19	30.04. 19	16	27	21_kvalifikovaní pracc
18		**ZD2**	**6 dny**	**25.04. 19**	**03.05. 19**			
19		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	25.04. 19	25.04. 19	13	25	12_betonáři
20		výztuž základové desky	2 dny	26.04. 19	29.04. 19	14	26	17_železáři
21		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	29.04. 19	29.04. 19	15		21_kvalifikovaní pracc
22		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	30.04. 19	30.04. 19	16	23FS+1 den	12_betonáři
23		odbednění čel základové desky	1 den	03.05. 19	03.05. 19	22FS+1 de	33	21_kvalifikovaní pracc
24		**ZD3**	**7 dny**	**26.04. 19**	**07.05. 19**			
25		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	26.04. 19	26.04. 19	19		12_betonáři
26		výztuž základové desky	2 dny	30.04. 19	02.05. 19	20	28;32	17_železáři
27		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	02.05. 19	02.05. 19	17		21_kvalifikovaní pracc
28		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	03.05. 19	03.05. 19	26	29FS+1 den	12_betonáři
29		odbednění čel základové desky	1 den	07.05. 19	07.05. 19	28FS+1 de	39	21_kvalifikovaní pracc
30		**ZD4**	**6 dny**	**02.05. 19**	**10.05. 19**			
31		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	02.05. 19	02.05. 19	22		12_betonáři
32		výztuž základové desky	2 dny	03.05. 19	06.05. 19	26	34;38	17_železáři
33		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	06.05. 19	06.05. 19	23		21_kvalifikovaní pracc
34		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	07.05. 19	07.05. 19	32	35FS+1 den	12_betonáři
35		odbednění čel základové desky	1 den	10.05. 19	10.05. 19	34FS+1 de	45	21_kvalifikovaní pracc
36		**ZD5**	**6 dny**	**06.05. 19**	**14.05. 19**			
37		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	06.05. 19	06.05. 19	28		12_betonáři
38		výztuž základové desky	2 dny	07.05. 19	09.05. 19	32	40;44	17_železáři
39		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	09.05. 19	09.05. 19	29		21_kvalifikovaní pracc
40		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	10.05. 19	10.05. 19	38	41FS+1 den	12_betonáři
41		odbednění čel základové desky	1 den	14.05. 19	14.05. 19	40FS+1 de	51	21_kvalifikovaní pracc
42		**ZD6**	**6 dny**	**09.05. 19**	**16.05. 19**			
43		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	09.05. 19	09.05. 19	34		12_betonáři
44		výztuž základové desky	2 dny	10.05. 19	13.05. 19	38	46;50	17_železáři
45		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	13.05. 19	13.05. 19	35		21_kvalifikovaní pracc
46		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	14.05. 19	14.05. 19	44	47FS+1 den	12_betonáři
47		odbednění čel základové desky	1 den	16.05. 19	16.05. 19	46FS+1 de	57	21_kvalifikovaní pracc
48		**ZD7**	**6 dny**	**13.05. 19**	**20.05. 19**			
49		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	13.05. 19	13.05. 19	40		12_betonáři
50		výztuž základové desky	2 dny	14.05. 19	15.05. 19	44	52;56	17_železáři
51		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	15.05. 19	15.05. 19	41		21_kvalifikovaní pracc
52		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	16.05. 19	16.05. 19	50	53FS+1 den	12_betonáři
53		odbednění čel základové desky	1 den	20.05. 19	20.05. 19	52FS+1 de	63	21_kvalifikovaní pracc
54		**ZD8**	**6 dny**	**15.05. 19**	**22.05. 19**			
55		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	15.05. 19	15.05. 19	46		12_betonáři
56		výztuž základové desky	2 dny	16.05. 19	17.05. 19	50	58;62	17_železáři
57		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	17.05. 19	17.05. 19	47		21_kvalifikovaní pracc
58		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	20.05. 19	20.05. 19	56	59FS+1 den	12_betonáři
59		odbednění čel základové desky	1 den	22.05. 19	22.05. 19	58FS+1 de	69	21_kvalifikovaní pracc
60		**ZD9**	**6 dny**	**17.05. 19**	**24.05. 19**			
61		bednění čel základové desky bílé vany	1 den	17.05. 19	17.05. 19	52		12_betonáři
62		výztuž základové desky	2 dny	20.05. 19	21.05. 19	56	64;68	17_železáři
63		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	21.05. 19	21.05. 19	53		21_kvalifikovaní pracc
64		betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	22.05. 19	22.05. 19	62	65FS+1 den	12_betonáři
65		odbednění čel základové desky	1 den	24.05. 19	24.05. 19	64FS+1 de	76	21_kvalifikovaní pracc
66		**TE 2 - Hrubá spodní stavba**	**94 dny**	**22.05. 19**	**01.10. 19**			
67		**2PP_S1**	**8 dny**	**22.05. 19**	**31.05. 19**			
68		výztuž stěn	2 dny	22.05. 19	23.05. 19	62	75	17_železáři
69		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	23.05. 19	23.05. 19	59	70	21_kvalifikovaní pracc
70		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	24.05. 19	24.05. 19	69		05_elektrikáři
71		bednění obvodových stěn 2.PP	2 dny	23.05. 19	24.05. 19	64	72	12_betonáři
72		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	27.05. 19	27.05. 19	71	73FS+3 dny	12_betonáři
73		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	31.05. 19	31.05. 19	72FS+3 dr		01_dělníci - malá četa
74		**2PP_S2**	**7 dny**	**24.05. 19**	**03.06. 19**			
75		výztuž stěn	2 dny	24.05. 19	27.05. 19	68	82	17_železáři
76		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	27.05. 19	27.05. 19	65	77	21_kvalifikovaní pracc
77		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	28.05. 19	28.05. 19	76		05_elektrikáři
78		bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	28.05. 19	28.05. 19	72	79;83	12_betonáři
79		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	29.05. 19	29.05. 19	78	80FS+2 dny	12_betonáři
80		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	03.06. 19	03.06. 19	79FS+2 dr		01_dělníci - malá četa
81		**2PP_S3**	**6 dny**	**28.05. 19**	**04.06. 19**			
82		výztuž stěn	2 dny	28.05. 19	29.05. 19	75	89	17_železáři
83		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	29.05. 19	29.05. 19	78	84	21_kvalifikovaní pracc
84		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	30.05. 19	30.05. 19	83		05_elektrikáři
85		bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	30.05. 19	30.05. 19	79	86;90	12_betonáři
86		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	31.05. 19	31.05. 19	85	87FS+1 den	12_betonáři
87		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	04.06. 19	04.06. 19	86FS+1 de		01_dělníci - malá četa
88		**2PP_S4**	**8 dny**	**30.05. 19**	**10.06. 19**			
89		výztuž stěn	2 dny	30.05. 19	31.05. 19	82	96	17_železáři
90		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	31.05. 19	31.05. 19	85	91	21_kvalifikovaní pracc
91		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	03.06. 19	03.06. 19	90		05_elektrikáři
92		bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	03.06. 19	03.06. 19	86	93;100	12_betonáři
93		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	04.06. 19	04.06. 19	92	94FS+3 dny	12_betonáři
94		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	10.06. 19	10.06. 19	93FS+3 dr		01_dělníci - malá četa
95		**2PP_S5**	**8 dny**	**03.06. 19**	**12.06. 19**			
96		výztuž stěn	1 den	03.06. 19	03.06. 19	89	98	17_železáři
97		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	05.06. 19	05.06. 19	98		05_elektrikáři
98		výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	04.06. 19	04.06. 19	96	104;97	17_železáři
99		bednění vnitřních stěn 2.PP	1 den	05.06. 19	05.06. 19	100	101	12_betonáři
100		papírové bednění sloupů oválných	1 den	04.06. 19	04.06. 19	92	99	21_kvalifikovaní pracc
101		betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 + betonáž sloupů oválných C35/45-XC1	1 den	06.06. 19	06.06. 19	99	102FS+3 dny;107	01_dělníci - malá četa
102		odbednění vnitřních stěn + odstranění papírového bednění sloupů oválných	1 den	12.06. 19	12.06. 19	101FS+3 dny		01_dělníci - malá četa
103		**2PP_S6**	**8 dny**	**05.06. 19**	**14.06. 19**			
104		výztuž stěn	1 den	05.06. 19	05.06. 19	98	106	17_železáři
105		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	07.06. 19	07.06. 19	106		05_elektrikáři
106		výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	06.06. 19	06.06. 19	104	105;108;11	17_železáři
107		bednění vnitřních stěn 2.PP	1 den	07.06. 19	07.06. 19	101	109;113	12_betonáři
108		papírové bednění sloupů oválných	1 den	07.06. 19	07.06. 19	106		21_kvalifikovaní pracc
109		betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 + betonáž sloupů oválných C35/45-XC1	1 den	10.06. 19	10.06. 19	107	110FS+3 dny	01_dělníci - malá četa
110		odbednění vnitřních stěn + odstranění papírového bednění sloupů oválných	1 den	14.06. 19	14.06. 19	109FS+3 dny		01_dělníci - malá četa
111		**2PP_S7**	**8 dny**	**07.06. 19**	**18.06. 19**			
112		výztuž stěn	2 dny	07.06. 19	10.06. 19	106	115;119	17_železáři
113		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	10.06. 19	10.06. 19	107	114	21_kvalifikovaní pracc
114		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	11.06. 19	11.06. 19	113		05_elektrikáři
115		bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	11.06. 19	11.06. 19	112	116;120	12_betonáři
116		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	12.06. 19	12.06. 19	115	117FS+3 dn	12_betonáři
117		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	18.06. 19	18.06. 19	116FS+3 c		01_dělníci - malá četa
118		**2PP_S8**	**8 dny**	**11.06. 19**	**20.06. 19**			
119		výztuž stěn	2 dny	11.06. 19	12.06. 19	112	126	17_železáři
120		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	12.06. 19	12.06. 19	115	121	21_kvalifikovaní pracc
121		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	13.06. 19	13.06. 19	120		05_elektrikáři
122		bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	13.06. 19	13.06. 19	116	123;127	12_betonáři
123		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	14.06. 19	14.06. 19	122	124FS+3 dn	12_betonáři
124		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	20.06. 19	20.06. 19	123FS+3 c		12_betonáři
125		**2PP_S9**	**8 dny**	**13.06. 19**	**24.06. 19**			
126		výztuž stěn	2 dny	13.06. 19	14.06. 19	119	134	17_železáři
127		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	14.06. 19	14.06. 19	122	128	21_kvalifikovaní pracc
128		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	17.06. 19	17.06. 19	127		05_elektrikáři
129		bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	17.06. 19	17.06. 19	123	130;135	12_betonáři
130		betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	18.06. 19	18.06. 19	129	131FS+3 dn	12_betonáři
131		odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	24.06. 19	24.06. 19	130FS+3 c		12_betonáři
132		**2PP_V1**	**25 dny**	**13.06. 19**	**18.07. 19**			
133		bednění stropní desky	2 dny	13.06. 19	14.06. 19	116	140	14_tesaři
134		výztuž stropní desky	2 dny	17.06. 19	18.06. 19	126	136;141	17_železáři
135		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	18.06. 19	18.06. 19	129		21_kvalifikovaní pracc
136		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	19.06. 19	19.06. 19	134	137FS+4 dn	12_betonáři
137		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	26.06. 19	26.06. 19	136FS+4 c		12_betonáři
138		odstojkování	1 den	18.07. 19	18.07. 19	136FS+19		01_dělníci - malá četa
139		**2PP_V2**	**25 dny**	**17.06. 19**	**22.07. 19**			
140		bednění stropní desky	2 dny	17.06. 19	18.06. 19	133	147	14_tesaři
141		výztuž stropní desky	2 dny	19.06. 19	20.06. 19	134	148	17_železáři
142		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	20.06. 19	20.06. 19	136	143	21_kvalifikovaní pracc
143		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	21.06. 19	21.06. 19	142	144FS+4 dn	12_betonáři
144		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	28.06. 19	28.06. 19	143FS+4 c		12_betonáři
145		odstojkování	1 den	22.07. 19	22.07. 19	143FS+19		01_dělníci - malá četa
146		**2PP_V3**	**25 dny**	**19.06. 19**	**24.07. 19**			
147		bednění stropní desky	2 dny	19.06. 19	20.06. 19	140	154	14_tesaři
148		výztuž stropní desky	2 dny	21.06. 19	24.06. 19	141	155	17_železáři
149		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	24.06. 19	24.06. 19	143	150	21_kvalifikovaní pracc
150		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	25.06. 19	25.06. 19	149	151FS+4 dn	12_betonáři
151		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	02.07. 19	02.07. 19	150FS+4 c		12_betonáři
152		odstojkování	1 den	24.07. 19	24.07. 19	150FS+19		01_dělníci - malá četa
153		**2PP_V4**	**25 dny**	**21.06. 19**	**26.07. 19**			
154		bednění stropní desky	2 dny	21.06. 19	24.06. 19	147	161	14_tesaři
155		výztuž stropní desky	2 dny	25.06. 19	26.06. 19	148	162	17_železáři
156		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	26.06. 19	26.06. 19	150	157	21_kvalifikovaní pracc
157		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	27.06. 19	27.06. 19	156	158FS+4 dn	12_betonáři
158		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	04.07. 19	04.07. 19	157FS+4 c		12_betonáři
159		odstojkování	1 den	26.07. 19	26.07. 19	157FS+19		01_dělníci - malá četa
160		**2PP_V5**	**25 dny**	**25.06. 19**	**30.07. 19**			
161		bednění stropní desky	2 dny	25.06. 19	26.06. 19	154	168	14_tesaři
162		výztuž stropní desky	2 dny	27.06. 19	28.06. 19	155	169	17_železáři
163		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	28.06. 19	28.06. 19	157	164	21_kvalifikovaní pracc
164		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	01.07. 19	01.07. 19	163	165FS+4 dn	12_betonáři
165		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	09.07. 19	09.07. 19	164FS+4 c		12_betonáři
166		odstojkování	1 den	30.07. 19	30.07. 19	164FS+19		01_dělníci - malá četa
167		**2PP_V6**	**25 dny**	**27.06. 19**	**01.08. 19**			
168		bednění stropní desky	2 dny	27.06. 19	28.06. 19	161	175	14_tesaři
169		výztuž stropní desky	2 dny	01.07. 19	02.07. 19	162	176	17_železáři
170		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	02.07. 19	02.07. 19	164	171	21_kvalifikovaní pracc
171		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	03.07. 19	03.07. 19	170	172FS+4 dn	12_betonáři
172		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	11.07. 19	11.07. 19	171FS+4 c		12_betonáři
173		odstojkování	1 den	01.08. 19	01.08. 19	171FS+19		01_dělníci - malá četa
174		**2PP_V7**	**26 dny**	**01.07. 19**	**06.08. 19**			
175		bednění stropní desky	2 dny	01.07. 19	02.07. 19	168	182	14_tesaři
176		výztuž stropní desky	2 dny	03.07. 19	04.07. 19	169	183	17_železáři
177		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	04.07. 19	04.07. 19	171	178	21_kvalifikovaní pracc
178		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	08.07. 19	08.07. 19	177	179FS+4 dn	12_betonáři
179		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	15.07. 19	15.07. 19	178FS+4 c		12_betonáři
180		odstojkování	1 den	06.08. 19	06.08. 19	178FS+20		01_dělníci - malá četa
181		**2PP_V8**	**26 dny**	**03.07. 19**	**08.08. 19**			
182		bednění stropní desky	2 dny	03.07. 19	04.07. 19	175	189	14_tesaři
183		výztuž stropní desky	2 dny	08.07. 19	09.07. 19	176	190	17_železáři
184		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	09.07. 19	09.07. 19	178	185	21_kvalifikovaní pracc
185		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	10.07. 19	10.07. 19	184	186FS+4 dn	12_betonáři
186		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	17.07. 19	17.07. 19	185FS+4 c		01_dělníci - malá četa
187		odstojkování	1 den	08.08. 19	08.08. 19	185FS+20		01_dělníci - malá četa
188		**2PP_V9**	**28 dny**	**08.07. 19**	**14.08. 19**			
189		bednění stropní desky	2 dny	08.07. 19	09.07. 19	182		14_tesaři
190		výztuž stropní desky	2 dny	10.07. 19	11.07. 19	183	196	17_železáři
191		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	11.07. 19	11.07. 19	185	192	21_kvalifikovaní pracc
192		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	12.07. 19	12.07. 19	191	193FS+4 dn	12_betonáři
193		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	19.07. 19	19.07. 19	192FS+4 c	325	01_dělníci - malá četa
194		odstojkování	1 den	14.08. 19	14.08. 19	192FS+22		12_betonáři
195		**1PP_S1**	**8 dny**	**12.07. 19**	**23.07. 19**			
196		výztuž stěn	2 dny	12.07. 19	15.07. 19	190	198;199;20	17_železáři
197		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	15.07. 19	15.07. 19	192		21_kvalifikovaní pracc
198		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	16.07. 19	16.07. 19	196		05_elektrikáři
199		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	16.07. 19	16.07. 19	196	200;204	12_betonáři
200		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	17.07. 19	17.07. 19	199	201FS+3 dn	12_betonáři
201		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	23.07. 19	23.07. 19	200FS+3 c		01_dělníci - malá četa
202		**1PP_S2**	**8 dny**	**16.07. 19**	**25.07. 19**			
203		výztuž stěn	2 dny	16.07. 19	17.07. 19	196	206;210	17_železáři
204		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	17.07. 19	17.07. 19	199	205	21_kvalifikovaní pracc
205		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	18.07. 19	18.07. 19	204		05_elektrikáři
206		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	18.07. 19	18.07. 19	203	207;211	12_betonáři
207		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	19.07. 19	19.07. 19	206	208FS+3 dn	12_betonáři
208		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	25.07. 19	25.07. 19	207FS+3 c		01_dělníci - malá četa
209		**1PP_S3**	**8 dny**	**18.07. 19**	**29.07. 19**			
210		výztuž stěn	2 dny	18.07. 19	19.07. 19	203	213;217	17_železáři
211		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	19.07. 19	19.07. 19	206	212	21_kvalifikovaní pracc
212		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	22.07. 19	22.07. 19	211		05_elektrikáři
213		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	22.07. 19	22.07. 19	210	214;218	12_betonáři
214		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	23.07. 19	23.07. 19	213	215FS+3 dn	12_betonáři
215		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	29.07. 19	29.07. 19	214FS+3 c		01_dělníci - malá četa
216		**1PP_S4**	**8 dny**	**22.07. 19**	**31.07. 19**			
217		výztuž stěn	2 dny	22.07. 19	23.07. 19	210	220;224	17_železáři
218		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	23.07. 19	23.07. 19	213	219	21_kvalifikovaní pracc
219		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	24.07. 19	24.07. 19	218		05_elektrikáři
220		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	24.07. 19	24.07. 19	217	221;225	12_betonáři
221		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	25.07. 19	25.07. 19	220	222FS+3 dn	12_betonáři
222		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	31.07. 19	31.07. 19	221FS+3 c		01_dělníci - malá četa
223		**1PP_S5**	**8 dny**	**24.07. 19**	**02.08. 19**			
224		výztuž stěn	2 dny	24.07. 19	25.07. 19	217	227;231	17_železáři
225		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	25.07. 19	25.07. 19	220	226	21_kvalifikovaní pracc
226		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	26.07. 19	26.07. 19	225		05_elektrikáři
227		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	26.07. 19	26.07. 19	224	228;232	12_betonáři
228		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	29.07. 19	29.07. 19	227	229FS+3 dn	12_betonáři
229		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	02.08. 19	02.08. 19	228FS+3 c		01_dělníci - malá četa
230		**1PP_S6**	**7 dny**	**26.07. 19**	**05.08. 19**			
231		výztuž stěn	2 dny	26.07. 19	29.07. 19	224	234;238	17_železáři
232		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	29.07. 19	29.07. 19	227	233	21_kvalifikovaní pracc
233		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	30.07. 19	30.07. 19	232		05_elektrikáři
234		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	30.07. 19	30.07. 19	231	235	12_betonáři
235		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	31.07. 19	31.07. 19	234	236FS+2 dn	12_betonáři
236		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	05.08. 19	05.08. 19	235FS+2 c		01_dělníci - malá četa
237		**1PP_S7**	**7 dny**	**30.07. 19**	**07.08. 19**			
238		výztuž stěn	1 den	30.07. 19	30.07. 19	231	240;242	17_železáři
239		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	01.08. 19	01.08. 19	240		05_elektrikáři
240		výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	31.07. 19	31.07. 19	238	246;239	17_železáři
241		bednění vnitřních stěn 1.PP	1 den	01.08. 19	01.08. 19	235	243;250	12_betonáři
242		papírové bednění sloupů kruhových	1 den	31.07. 19	31.07. 19	238		21_kvalifikovaní pracc
243		betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových C35/45-XC1	1 den	02.08. 19	02.08. 19	241	244FS+2 dny;249	12_betonáři
244		odbednění vnitřních stěn a jednorázového bednění sloupů kruhových	1 den	07.08. 19	07.08. 19	243FS+2 dny		01_dělníci - malá četa
245		**1PP_S8**	**7 dny**	**01.08. 19**	**09.08. 19**			
246		výztuž stěn	1 den	01.08. 19	01.08. 19	240	248	17_železáři
247		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	05.08. 19	05.08. 19	248		05_elektrikáři
248		výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	02.08. 19	02.08. 19	246	247;254	17_železáři
249		bednění vnitřních stěn 1.PP	1 den	05.08. 19	05.08. 19	243	251;258	12_betonáři
250		papírové bednění sloupů kruhových	1 den	02.08. 19	02.08. 19	241		21_kvalifikovaní pracc
251		betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových C35/45-XC1	1 den	06.08. 19	06.08. 19	249	252FS+2 dny;255;25	12_betonáři
252		odbednění vnitřních stěn a jednorázového bednění sloupů kruhových	1 den	09.08. 19	09.08. 19	251FS+2 dny		01_dělníci - malá četa
253		**1PP_S9**	**7 dny**	**05.08. 19**	**13.08. 19**			
254		výztuž stěn	1 den	05.08. 19	05.08. 19	248	256	17_železáři
255		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	07.08. 19	07.08. 19	251		05_elektrikáři
256		výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	06.08. 19	06.08. 19	254	262	17_železáři
257		bednění vnitřních stěn 1.PP	1 den	07.08. 19	07.08. 19	251	259;263	12_betonáři
258		papírové bednění sloupů kruhových	1 den	06.08. 19	06.08. 19	249	269	21_kvalifikovaní pracc
259		betonáž vnitřních stěn C25/30-XC1 a sloupů kruhových C35/45-XC1	1 den	08.08. 19	08.08. 19	257	260FS+2 dny	12_betonáři
260		odbednění vnitřních stěn a jednorázového bednění sloupů kruhových	1 den	13.08. 19	13.08. 19	259FS+2 dny		01_dělníci - malá četa
261		**1PP_S10**	**8 dny**	**07.08. 19**	**16.08. 19**			
262		výztuž stěn	2 dny	07.08. 19	08.08. 19	256	264;265;27	17_železáři
263		těsnící plechy pro řízené pracovní spáry	1 den	08.08. 19	08.08. 19	257		21_kvalifikovaní pracc
264		potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	09.08. 19	09.08. 19	262		05_elektrikáři
265		bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	09.08. 19	09.08. 19	262	266;271	12_betonáři
266		betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	12.08. 19	12.08. 19	265	267FS+3 dn	12_betonáři
267		odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	16.08. 19	16.08. 19	266FS+3 c		12_betonáři
268		**1PP_V1**	**26 dny**	**07.08. 19**	**11.09. 19**			
269		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	07.08. 19	08.08. 19	258	276	14_tesaři
270		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	09.08. 19	12.08. 19	262	272;277	17_železáři
271		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	12.08. 19	12.08. 19	265		21_kvalifikovaní pracc
272		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	13.08. 19	13.08. 19	270	273FS+4 dn	12_betonáři
273		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	20.08. 19	20.08. 19	272FS+4 c		12_betonáři
274		odstojkování	1 den	11.09. 19	11.09. 19	272FS+20		01_dělníci - malá četa
275		**1PP_V2**	**26 dny**	**09.08. 19**	**13.09. 19**			
276		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	09.08. 19	12.08. 19	269	283	14_tesaři
277		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	13.08. 19	14.08. 19	270	279;284	17_železáři
278		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	14.08. 19	14.08. 19	272		21_kvalifikovaní pracc
279		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	15.08. 19	15.08. 19	277	280FS+4 dn	12_betonáři
280		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	22.08. 19	22.08. 19	279FS+4 c		12_betonáři
281		odstojkování	1 den	13.09. 19	13.09. 19	279FS+20		01_dělníci - malá četa
282		**1PP_V3**	**26 dny**	**13.08. 19**	**17.09. 19**			
283		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	13.08. 19	14.08. 19	276	290	14_tesaři
284		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	15.08. 19	16.08. 19	277	286;291	17_železáři
285		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	16.08. 19	16.08. 19	279		21_kvalifikovaní pracc
286		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	19.08. 19	19.08. 19	284	287FS+4 dn	12_betonáři
287		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	26.08. 19	26.08. 19	286FS+4 c		12_betonáři
288		odstojkování	1 den	17.09. 19	17.09. 19	286FS+20		01_dělníci - malá četa
289		**1PP_V4**	**26 dny**	**15.08. 19**	**19.09. 19**			
290		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	15.08. 19	16.08. 19	283	297	14_tesaři
291		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	19.08. 19	20.08. 19	284	293;298	17_železáři
292		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	20.08. 19	20.08. 19	286		21_kvalifikovaní pracc
293		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	21.08. 19	21.08. 19	291	294FS+4 dn	12_betonáři
294		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	28.08. 19	28.08. 19	293FS+4 c		12_betonáři
295		odstojkování	1 den	19.09. 19	19.09. 19	293FS+20		01_dělníci - malá četa
296		**1PP_V5**	**26 dny**	**19.08. 19**	**23.09. 19**			
297		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	19.08. 19	20.08. 19	290	304	14_tesaři
298		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	21.08. 19	22.08. 19	291	300;305	17_železáři
299		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	22.08. 19	22.08. 19	293		21_kvalifikovaní pracc
300		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	23.08. 19	23.08. 19	298	301FS+4 dn	12_betonáři
301		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	30.08. 19	30.08. 19	300FS+4 c		12_betonáři
302		odstojkování	1 den	23.09. 19	23.09. 19	300FS+20		01_dělníci - malá četa
303		**1PP_V6**	**26 dny**	**21.08. 19**	**25.09. 19**			
304		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	21.08. 19	22.08. 19	297	311	14_tesaři
305		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	23.08. 19	26.08. 19	298	307;312	17_železáři
306		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	26.08. 19	26.08. 19	300		21_kvalifikovaní pracc
307		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	27.08. 19	27.08. 19	305	308FS+4 dn	12_betonáři
308		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	03.09. 19	03.09. 19	307FS+4 c		12_betonáři
309		odstojkování	1 den	25.09. 19	25.09. 19	307FS+20		01_dělníci - malá četa
310		**1PP_V7**	**26 dny**	**23.08. 19**	**27.09. 19**			
311		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	23.08. 19	26.08. 19	304	318	14_tesaři
312		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	27.08. 19	28.08. 19	305	314;319	17_železáři
313		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	28.08. 19	28.08. 19	307		21_kvalifikovaní pracc
314		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	29.08. 19	29.08. 19	312	315FS+4 dn	12_betonáři
315		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	05.09. 19	05.09. 19	314FS+4 c		12_betonáři
316		odstojkování	1 den	27.09. 19	27.09. 19	314FS+20		01_dělníci - malá četa
317		**1PP_V8**	**26 dny**	**27.08. 19**	**01.10. 19**			
318		bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	27.08. 19	28.08. 19	311		14_tesaři
319		výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	29.08. 19	30.08. 19	312	321	17_železáři
320		vložení těsnících plechů pro řízené pracovní spáry	1 den	30.08. 19	30.08. 19	314		21_kvalifikovaní pracc
321		betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	02.09. 19	02.09. 19	319	322FS+4 dn	12_betonáři
322		odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	09.09. 19	09.09. 19	321FS+4 c	326	12_betonáři
323		odstojkování	1 den	01.10. 19	01.10. 19	321FS+20		01_dělníci - malá četa
324		**Zásyp kolem objektů**	**42 dny**	**22.07. 19**	**17.09. 19**			
325		zásyp kolem objektů se zhutněním - 2.PP	5 dny	22.07. 19	26.07. 19	193		
326		zásyp kolem objektů se zhutněním - 1.PP	6 dny	10.09. 19	17.09. 19	322		

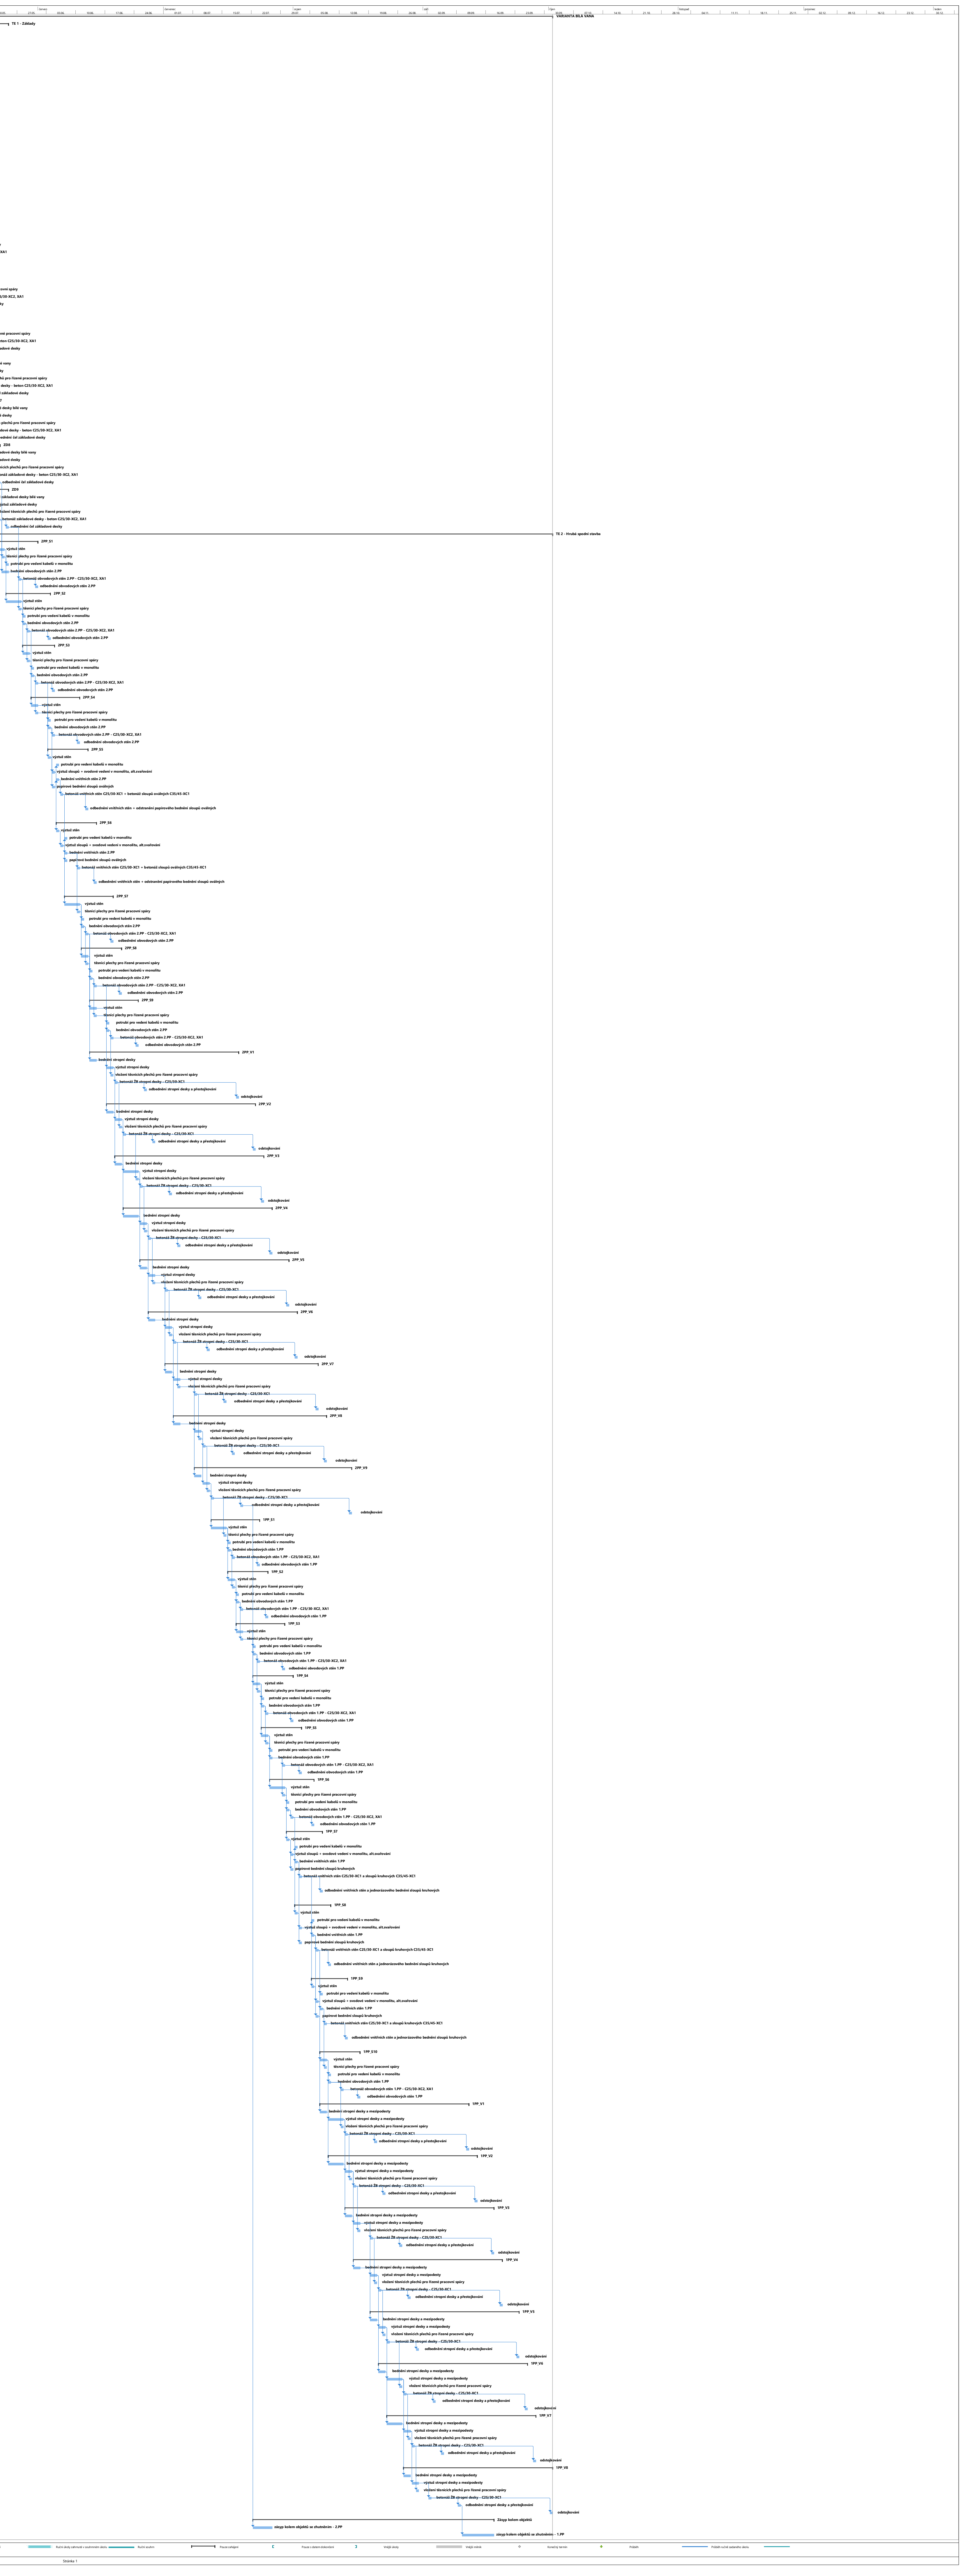

Projekt: harmonogram-var-1.m
Datum: 06.01. 19

Úkol | Rozdělení | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh | Průběh ručně zadaného úkolu
