VARIANTA č. 2 - ČERNÁ VANA

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Názvy zdrojů
1	**VARIANTA č. 2 - ČERNÁ VANA**	**106 dny**	**04.04. 19**	**05.09. 19**			
2	**TE 1 - Základy**	**29 dny**	**04.04. 19**	**20.05. 19**			
3	**Podkladní beton**	**23 dny**	**04.04. 19**	**10.05. 19**			
4	bednění čel podkladního betonu	1 den	04.04. 19	04.04. 19		5	12_betonáři
5	betonáž podkladního betonu - C12/15 tl. 150 mm	1 den	05.04. 19	05.04. 19	4	6	12_betonáři
6	odbednění čel podkladního betonu u objektu G, bednění u objektu F	1 den	08.04. 19	08.04. 19	5	7	12_betonáři
7	separační PE fólie+ betonáž podkladního betonu - C12/15 tl. 150 mm	1 den	09.04. 19	09.04. 19	6	8	12_betonáři
8	separační PE fólie odbednění čel podkladové desky	1 den	10.04. 19	10.04. 19	7	9	12_betonáři
9	příprava podkladu - objekt G + F, aplikace základního nátěru	2 dny	11.04. 19	12.04. 19	8	10SS+1 den	01_dělníci - malá če
10	hydroizolace asfaltovými modif.pásy samolepícími	17 dny	12.04. 19	10.05. 19	9SS+1 der	12SS+3 dny	22_izolatéři (hydroi
11	**ZD1**	**4 dny**	**17.04. 19**	**24.04. 19**			
12	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	17.04. 19	18.04. 19	10SS+3 dr	13;16	17_železáři
13	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	23.04. 19	23.04. 19	12	14	12_betonáři
14	odbednění čel základové desky	1 den	24.04. 19	24.04. 19	13		12_betonáři
15	**ZD2**	**4 dny**	**23.04. 19**	**26.04. 19**			
16	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	23.04. 19	24.04. 19	12	17;20	17_železáři
17	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	25.04. 19	25.04. 19	16	18	12_betonáři
18	odbednění čel základové desky	1 den	26.04. 19	26.04. 19	17		12_betonáři
19	**ZD3**	**4 dny**	**25.04. 19**	**30.04. 19**			
20	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	25.04. 19	26.04. 19	16	21;24	17_železáři
21	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	29.04. 19	29.04. 19	20	22	12_betonáři
22	odbednění čel základové desky	1 den	30.04. 19	30.04. 19	21		12_betonáři
23	**ZD4**	**4 dny**	**29.04. 19**	**03.05. 19**			
24	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	29.04. 19	30.04. 19	20	25;28	17_železáři
25	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	02.05. 19	02.05. 19	24	26	12_betonáři
26	odbednění čel základové desky	1 den	03.05. 19	03.05. 19	25		12_betonáři
27	**ZD5**	**4 dny**	**02.05. 19**	**07.05. 19**			
28	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	02.05. 19	03.05. 19	24	29;32	17_železáři
29	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	06.05. 19	06.05. 19	28	30	12_betonáři
30	odbednění čel základové desky	1 den	07.05. 19	07.05. 19	29		12_betonáři
31	**ZD6**	**4 dny**	**06.05. 19**	**10.05. 19**			
32	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	06.05. 19	07.05. 19	28	33;36	17_železáři
33	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	09.05. 19	09.05. 19	32	34	12_betonáři
34	odbednění čel základové desky	1 den	10.05. 19	10.05. 19	33		12_betonáři
35	**ZD7**	**4 dny**	**09.05. 19**	**14.05. 19**			
36	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	09.05. 19	10.05. 19	32	37;40	17_železáři
37	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	13.05. 19	13.05. 19	36	38	12_betonáři
38	odbednění čel základové desky	1 den	14.05. 19	14.05. 19	37		12_betonáři
39	**ZD8**	**4 dny**	**13.05. 19**	**16.05. 19**			
40	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	13.05. 19	14.05. 19	36	41;44	17_železáři
41	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	15.05. 19	15.05. 19	40	42	12_betonáři
42	odbednění čel základové desky	1 den	16.05. 19	16.05. 19	41		12_betonáři
43	**ZD9**	**4 dny**	**15.05. 19**	**20.05. 19**			
44	bednění čel + výztuž základové desky	2 dny	15.05. 19	16.05. 19	40	45;49	17_železáři
45	betonáž základové desky - beton C25/30-XC2, XA1	1 den	17.05. 19	17.05. 19	44	46;50;51	12_betonáři
46	odbednění čel základové desky	1 den	20.05. 19	20.05. 19	45		12_betonáři
47	**TE 2 - Hrubá spodní stavba**	**79 dny**	**17.05. 19**	**05.09. 19**			
48	**2PP_S1**	**6 dny**	**17.05. 19**	**24.05. 19**			
49	výztuž stěn	1 den	17.05. 19	17.05. 19	44	55	17_železáři
50	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	20.05. 19	20.05. 19	45		05_elektrikáři
51	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	20.05. 19	20.05. 19	45	52;58	14_tesaři
52	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	21.05. 19	21.05. 19	51	53FS+2 dny	12_betonáři
53	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	24.05. 19	24.05. 19	52FS+2 dr		01_dělníci - malá če
54	**2PP_S2**	**6 dny**	**20.05. 19**	**27.05. 19**			
55	výztuž stěn	1 den	20.05. 19	20.05. 19	49	56	17_železáři
56	výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	21.05. 19	21.05. 19	55	57;63	17_železáři
57	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	22.05. 19	22.05. 19	56		05_elektrikáři
58	bednění vnitřních stěn 2.PP	1 den	21.05. 19	21.05. 19	51		14_tesaři
59	papírové bednění sloupů oválných	1 den	22.05. 19	22.05. 19	52	60	12_betonáři
60	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	23.05. 19	23.05. 19	59	61FS+1 den	12_betonáři
61	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	27.05. 19	27.05. 19	60FS+1 de	107	01_dělníci - malá če
62	**2PP_S3**	**6 dny**	**22.05. 19**	**29.05. 19**			
63	výztuž stěn	1 den	22.05. 19	22.05. 19	56	64;65;69	17_železáři
64	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	23.05. 19	23.05. 19	63		05_elektrikáři
65	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	23.05. 19	23.05. 19	63	66	14_tesaři
66	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	24.05. 19	24.05. 19	65	67FS+2 dny	12_betonáři
67	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	29.05. 19	29.05. 19	66FS+2 dr		01_dělníci - malá če
68	**2PP_S4**	**6 dny**	**23.05. 19**	**30.05. 19**			
69	výztuž stěn	1 den	23.05. 19	23.05. 19	63	70;71;75	17_železáři
70	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	24.05. 19	24.05. 19	69		05_elektrikáři
71	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	24.05. 19	24.05. 19	69	72	14_tesaři
72	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	27.05. 19	27.05. 19	71	73FS+2 dny	12_betonáři
73	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	30.05. 19	30.05. 19	72FS+2 dr	108	01_dělníci - malá če
74	**2PP_S5**	**7 dny**	**24.05. 19**	**03.06. 19**			
75	výztuž stěn	1 den	24.05. 19	24.05. 19	69	76;77;78	17_železáři
76	výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	27.05. 19	27.05. 19	75	83	17_železáři
77	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	27.05. 19	27.05. 19	75		05_elektrikáři
78	bednění vnitřních stěn 2.PP	1 den	27.05. 19	27.05. 19	75		14_tesaři
79	papírové bednění sloupů oválných	1 den	28.05. 19	28.05. 19	72	80	12_betonáři
80	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	29.05. 19	29.05. 19	79	81FS+2 dny	12_betonáři
81	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	03.06. 19	03.06. 19	80FS+2 dr		01_dělníci - malá če
82	**2PP_S6**	**6 dny**	**28.05. 19**	**04.06. 19**			
83	výztuž stěn	1 den	28.05. 19	28.05. 19	76	84;85;89	17_železáři
84	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	29.05. 19	29.05. 19	83	90	05_elektrikáři
85	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	29.05. 19	29.05. 19	83	86;91	14_tesaři
86	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	30.05. 19	30.05. 19	85	87FS+2 dny	12_betonáři
87	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	04.06. 19	04.06. 19	86FS+2 dr		01_dělníci - malá če
88	**2PP_S7**	**6 dny**	**29.05. 19**	**05.06. 19**			
89	výztuž stěn	1 den	29.05. 19	29.05. 19	83	95	17_železáři
90	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	30.05. 19	30.05. 19	84	96	05_elektrikáři
91	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	30.05. 19	30.05. 19	85	92;97	14_tesaři
92	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	31.05. 19	31.05. 19	91	93FS+2 dny	12_betonáři
93	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	05.06. 19	05.06. 19	92FS+2 dr		12_betonáři
94	**2PP_S8**	**7 dny**	**30.05. 19**	**07.06. 19**			
95	výztuž stěn	1 den	30.05. 19	30.05. 19	89	101	17_železáři
96	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	31.05. 19	31.05. 19	90	102	05_elektrikáři
97	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	31.05. 19	31.05. 19	91	98;103	14_tesaři
98	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	03.06. 19	03.06. 19	97	99FS+3 dny	12_betonáři
99	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	07.06. 19	07.06. 19	98FS+3 dr		12_betonáři
100	**2PP_S9**	**8 dny**	**31.05. 19**	**11.06. 19**			
101	výztuž stěn	1 den	31.05. 19	31.05. 19	95	109	17_železáři
102	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	03.06. 19	03.06. 19	96		05_elektrikáři
103	bednění obvodových stěn 2.PP	1 den	03.06. 19	03.06. 19	97	104;114	14_tesaři
104	betonáž obvodových stěn 2.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	04.06. 19	04.06. 19	103	105FS+4 dn	12_betonáři
105	odbednění obvodových stěn 2.PP	1 den	11.06. 19	11.06. 19	104FS+4 c		12_betonáři
106	**2PP_V1**	**29 dny**	**28.05. 19**	**08.07. 19**			
107	bednění stropní desky - část 1	1 den	28.05. 19	28.05. 19	61		01_dělníci - malá če
108	bednění stropní desky - část 2	1 den	31.05. 19	31.05. 19	73		01_dělníci - malá če
109	výztuž stropní desky	3 dny	03.06. 19	05.06. 19	101	110;115	17_železáři
110	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	06.06. 19	06.06. 19	109	111FS+4 dn	12_betonáři
111	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	13.06. 19	13.06. 19	110FS+4 c		12_betonáři
112	odstojkování	1 den	08.07. 19	08.07. 19	110FS+20		21_kvalifikovaní pra
113	**2PP_V2**	**25 dny**	**04.06. 19**	**09.07. 19**			
114	bednění stropní desky	2 dny	04.06. 19	05.06. 19	103	120	14_tesaři
115	výztuž stropní desky	2 dny	06.06. 19	07.06. 19	109	116;121	17_železáři
116	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	10.06. 19	10.06. 19	115	117FS+4 dn	12_betonáři
117	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	17.06. 19	17.06. 19	116FS+4 c		12_betonáři
118	odstojkování	1 den	09.07. 19	09.07. 19	116FS+19		21_kvalifikovaní pra
119	**2PP_V3**	**25 dny**	**06.06. 19**	**11.07. 19**			
120	bednění stropní desky	2 dny	06.06. 19	07.06. 19	114	126	14_tesaři
121	výztuž stropní desky	2 dny	10.06. 19	11.06. 19	115	122;127	17_železáři
122	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	12.06. 19	12.06. 19	121	123FS+4 dn	12_betonáři
123	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	19.06. 19	19.06. 19	122FS+4 c		12_betonáři
124	odstojkování	1 den	11.07. 19	11.07. 19	122FS+19		21_kvalifikovaní pra
125	**2PP_V4**	**25 dny**	**10.06. 19**	**15.07. 19**			
126	bednění stropní desky	2 dny	10.06. 19	11.06. 19	120	132	14_tesaři
127	výztuž stropní desky	2 dny	12.06. 19	13.06. 19	121	128;133	17_železáři
128	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	14.06. 19	14.06. 19	127	129FS+4 dn	12_betonáři
129	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	21.06. 19	21.06. 19	128FS+4 c		12_betonáři
130	odstojkování	1 den	15.07. 19	15.07. 19	128FS+19		21_kvalifikovaní pra
131	**2PP_V5**	**25 dny**	**12.06. 19**	**17.07. 19**			
132	bednění stropní desky	2 dny	12.06. 19	13.06. 19	126	138	14_tesaři
133	výztuž stropní desky	2 dny	14.06. 19	17.06. 19	127	134;139	17_železáři
134	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	18.06. 19	18.06. 19	133	135FS+4 dn	12_betonáři
135	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	25.06. 19	25.06. 19	134FS+4 c		12_betonáři
136	odstojkování	1 den	17.07. 19	17.07. 19	134FS+19		21_kvalifikovaní pra
137	**2PP_V6**	**25 dny**	**14.06. 19**	**19.07. 19**			
138	bednění stropní desky	2 dny	14.06. 19	17.06. 19	132	144	14_tesaři
139	výztuž stropní desky	2 dny	18.06. 19	19.06. 19	133	140;145	17_železáři
140	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	20.06. 19	20.06. 19	139	141FS+4 dn	12_betonáři
141	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	27.06. 19	27.06. 19	140FS+4 c		12_betonáři
142	odstojkování	1 den	19.07. 19	19.07. 19	140FS+19		21_kvalifikovaní pra
143	**2PP_V7**	**25 dny**	**18.06. 19**	**23.07. 19**			
144	bednění stropní desky	2 dny	18.06. 19	19.06. 19	138	150	14_tesaři
145	výztuž stropní desky	2 dny	20.06. 19	21.06. 19	139	146;151	17_železáři
146	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	24.06. 19	24.06. 19	145	147FS+5 dn	12_betonáři
147	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	02.07. 19	02.07. 19	146FS+5 c		12_betonáři
148	odstojkování	1 den	23.07. 19	23.07. 19	146FS+19		21_kvalifikovaní pra
149	**2PP_V8**	**25 dny**	**20.06. 19**	**25.07. 19**			
150	bednění stropní desky	2 dny	20.06. 19	21.06. 19	144	156	14_tesaři
151	výztuž stropní desky	2 dny	24.06. 19	25.06. 19	145	152;157	17_železáři
152	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	26.06. 19	26.06. 19	151	153FS+4 dn	12_betonáři
153	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	03.07. 19	03.07. 19	152FS+4 c		01_dělníci - malá če
154	odstojkování	1 den	25.07. 19	25.07. 19	152FS+19		01_dělníci - malá če
155	**2PP_V9**	**25 dny**	**24.06. 19**	**29.07. 19**			
156	bednění stropní desky	3 dny	24.06. 19	26.06. 19	150	164	14_tesaři
157	výztuž stropní desky	2 dny	26.06. 19	27.06. 19	151	158;162;16	17_železáři
158	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	28.06. 19	28.06. 19	157	159FS+5 dn	12_betonáři
159	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	09.07. 19	09.07. 19	158FS+5 c	274	01_dělníci - malá če
160	odstojkování	1 den	29.07. 19	29.07. 19	158FS+19		01_dělníci - malá če
161	**1PP_S1**	**6 dny**	**27.06. 19**	**04.07. 19**			
162	výztuž stěn	1 den	28.06. 19	28.06. 19	157	168	17_železáři
163	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	28.06. 19	28.06. 19	157		05_elektrikáři
164	bednění obvodových stěn 1.PP	2 dny	27.06. 19	28.06. 19	156	165;170	14_tesaři
165	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	01.07. 19	01.07. 19	164	166FS+2 dn	12_betonáři
166	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	04.07. 19	04.07. 19	165FS+2 c		01_dělníci - malá če
167	**1PP_S2**	**5 dny**	**01.07. 19**	**08.07. 19**			
168	výztuž stěn	1 den	01.07. 19	01.07. 19	162	169;174	17_železáři
169	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	02.07. 19	02.07. 19	168		05_elektrikáři
170	bednění obvodových stěn 1.PP	2 dny	01.07. 19	02.07. 19	164	171	14_tesaři
171	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	03.07. 19	03.07. 19	170	172FS+1 de	12_betonáři
172	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	08.07. 19	08.07. 19	171FS+1 c		01_dělníci - malá če
173	**1PP_S3**	**6 dny**	**02.07. 19**	**10.07. 19**			
174	výztuž stěn	1 den	02.07. 19	02.07. 19	168	175;176;18	17_železáři
175	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	03.07. 19	03.07. 19	174		05_elektrikáři
176	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	03.07. 19	03.07. 19	174	177	14_tesaři
177	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	04.07. 19	04.07. 19	176	178FS+2 dn	12_betonáři
178	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	10.07. 19	10.07. 19	177FS+2 c		01_dělníci - malá če
179	**1PP_S4**	**6 dny**	**03.07. 19**	**11.07. 19**			
180	výztuž stěn	1 den	03.07. 19	03.07. 19	174	181;182;18	17_železáři
181	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	04.07. 19	04.07. 19	180		05_elektrikáři
182	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	04.07. 19	04.07. 19	180	183	14_tesaři
183	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	08.07. 19	08.07. 19	182	184FS+2 dn	12_betonáři
184	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	11.07. 19	11.07. 19	183FS+2 c		01_dělníci - malá če
185	**1PP_S5**	**6 dny**	**04.07. 19**	**12.07. 19**			
186	výztuž stěn	1 den	04.07. 19	04.07. 19	180	187;188;19	17_železáři
187	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	08.07. 19	08.07. 19	186		05_elektrikáři
188	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	08.07. 19	08.07. 19	186	189	14_tesaři
189	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	09.07. 19	09.07. 19	188	190FS+2 dn	12_betonáři
190	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	12.07. 19	12.07. 19	189FS+2 c		01_dělníci - malá če
191	**1PP_S6**	**7 dny**	**08.07. 19**	**16.07. 19**			
192	výztuž stěn	1 den	08.07. 19	08.07. 19	186	193;194;19	17_železáři
193	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	09.07. 19	09.07. 19	192		05_elektrikáři
194	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	09.07. 19	09.07. 19	192	195	14_tesaři
195	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	10.07. 19	10.07. 19	194	196FS+3 dn	12_betonáři
196	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	16.07. 19	16.07. 19	195FS+3 c		01_dělníci - malá če
197	**1PP_S7**	**8 dny**	**09.07. 19**	**18.07. 19**			
198	výztuž stěn	1 den	09.07. 19	09.07. 19	192	199;200;20	17_železáři
199	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	10.07. 19	10.07. 19	198		05_elektrikáři
200	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	10.07. 19	10.07. 19	198	201	14_tesaři
201	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	11.07. 19	11.07. 19	200	202FS+4 dn	12_betonáři
202	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	18.07. 19	18.07. 19	201FS+4 c		01_dělníci - malá če
203	**1PP_S8**	**8 dny**	**10.07. 19**	**19.07. 19**			
204	výztuž stěn	1 den	10.07. 19	10.07. 19	198	205;206;21	17_železáři
205	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	11.07. 19	11.07. 19	204		05_elektrikáři
206	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	11.07. 19	11.07. 19	204	207	14_tesaři
207	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	12.07. 19	12.07. 19	206	208FS+4 dn	12_betonáři
208	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	19.07. 19	19.07. 19	207FS+4 c		01_dělníci - malá če
209	**1PP_S9**	**7 dny**	**11.07. 19**	**19.07. 19**			
210	výztuž stěn	1 den	11.07. 19	11.07. 19	204	212;213;21	17_železáři
211	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	12.07. 19	12.07. 19	210		05_elektrikáři
212	výztuž sloupů + svodové vedení v monolitu, alt.svařování	1 den	12.07. 19	12.07. 19	210	218	17_železáři
213	bednění vnitřních stěn 1.PP	1 den	12.07. 19	12.07. 19	210	214;224	14_tesaři
214	papírové bednění sloupů oválných	1 den	15.07. 19	15.07. 19	213	215	12_betonáři
215	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	16.07. 19	16.07. 19	214	216FS+2 dn	12_betonáři
216	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	19.07. 19	19.07. 19	215FS+2 c		12_betonáři
217	**1PP_S10**	**7 dny**	**15.07. 19**	**23.07. 19**			
218	výztuž stěn	1 den	15.07. 19	15.07. 19	212	219;220;22	17_železáři
219	potrubí pro vedení kabelů v monolitu	1 den	16.07. 19	16.07. 19	218		05_elektrikáři
220	bednění obvodových stěn 1.PP	1 den	16.07. 19	16.07. 19	218	221;230	14_tesaři
221	betonáž obvodových stěn 1.PP - C25/30-XC2, XA1	1 den	17.07. 19	17.07. 19	220	222FS+3 dn	12_betonáři
222	odbednění obvodových stěn 1.PP	1 den	23.07. 19	23.07. 19	221FS+3 c		12_betonáři
223	**1PP_V1**	**25 dny**	**15.07. 19**	**16.08. 19**			
224	bednění stropní desky a mezipodesty	1 den	15.07. 19	15.07. 19	213		14_tesaři;01_dělníc
225	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	16.07. 19	17.07. 19	218	226;231	17_železáři
226	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	18.07. 19	18.07. 19	225	227FS+4 dn	12_betonáři
227	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	25.07. 19	25.07. 19	226FS+4 c		12_betonáři
228	odstojkování	1 den	16.08. 19	16.08. 19	226FS+20		01_dělníci - malá če
229	**1PP_V2**	**25 dny**	**17.07. 19**	**20.08. 19**			
230	bednění stropní desky a mezipodesty	1 den	17.07. 19	17.07. 19	220	236	14_tesaři;01_dělníc
231	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	18.07. 19	19.07. 19	225	232;237	17_železáři
232	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	22.07. 19	22.07. 19	231	233FS+4 dn	12_betonáři
233	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	29.07. 19	29.07. 19	232FS+4 c		12_betonáři
234	odstojkování	1 den	20.08. 19	20.08. 19	232FS+20		01_dělníci - malá če
235	**1PP_V3**	**26 dny**	**18.07. 19**	**22.08. 19**			
236	bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	18.07. 19	19.07. 19	230	242	14_tesaři
237	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	22.07. 19	23.07. 19	231	238;243	17_železáři
238	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	24.07. 19	24.07. 19	237	239FS+4 dn	12_betonáři
239	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	31.07. 19	31.07. 19	238FS+4 c		12_betonáři
240	odstojkování	1 den	22.08. 19	22.08. 19	238FS+20		01_dělníci - malá če
241	**1PP_V4**	**26 dny**	**22.07. 19**	**26.08. 19**			
242	bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	22.07. 19	23.07. 19	236	248	14_tesaři
243	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	24.07. 19	25.07. 19	237	244;249	17_železáři
244	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	26.07. 19	26.07. 19	243	245FS+4 dn	12_betonáři
245	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	02.08. 19	02.08. 19	244FS+4 c		12_betonáři
246	odstojkování	1 den	26.08. 19	26.08. 19	244FS+20		01_dělníci - malá če
247	**1PP_V5**	**26 dny**	**24.07. 19**	**28.08. 19**			
248	bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	24.07. 19	25.07. 19	242	254	14_tesaři
249	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	26.07. 19	29.07. 19	243	250;255	17_železáři
250	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	30.07. 19	30.07. 19	249	251FS+4 dn	12_betonáři
251	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	06.08. 19	06.08. 19	250FS+4 c		12_betonáři
252	odstojkování	1 den	28.08. 19	28.08. 19	250FS+20		01_dělníci - malá če
253	**1PP_V6**	**10 dny**	**26.07. 19**	**08.08. 19**			
254	bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	26.07. 19	29.07. 19	248	260	14_tesaři
255	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	30.07. 19	31.07. 19	249	256;261	17_železáři
256	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	01.08. 19	01.08. 19	255	257FS+4 dn	12_betonáři
257	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	08.08. 19	08.08. 19	256FS+4 c		12_betonáři
258	odstojkování	1 den	08.08. 19	08.08. 19	256FS+4 c		01_dělníci - malá če
259	**1PP_V7**	**26 dny**	**30.07. 19**	**03.09. 19**			
260	bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	30.07. 19	31.07. 19	254	266	14_tesaři
261	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	01.08. 19	02.08. 19	255	262;267	17_železáři
262	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	05.08. 19	05.08. 19	261	263FS+4 dn	12_betonáři
263	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	12.08. 19	12.08. 19	262FS+3 c		12_betonáři
264	odstojkování	1 den	03.09. 19	03.09. 19	262FS+20		01_dělníci - malá če
265	**1PP_V8**	**26 dny**	**01.08. 19**	**05.09. 19**			
266	bednění stropní desky a mezipodesty	2 dny	01.08. 19	02.08. 19	260		14_tesaři
267	výztuž stropní desky a mezipodesty	2 dny	05.08. 19	06.08. 19	261	268	17_železáři
268	betonáž ŽB stropní desky - C25/30-XC1	1 den	07.08. 19	07.08. 19	267	269FS+4 dn	12_betonáři
269	odbednění stropní desky a přestojkování	1 den	14.08. 19	14.08. 19	268FS+4 c	277	12_betonáři
270	odstojkování	1 den	05.09. 19	05.09. 19	268FS+20		01_dělníci - malá če
271	**Hydroizolace**	**43 dny**	**24.06. 19**	**22.08. 19**			
272	hydroizolace asfaltovými pásy tavením - vrstvy, vč.přípravy podkladu - 2.PP	9 dny	24.06. 19	08.07. 19	273SF		22_izolatéři (hydroizolace,
273	nopová fólie + geotextilie	2 dny	08.07. 19	10.07. 19	274SF	272SF	22_izolatéři (hydroi
274	zásyp kolem objektů se zhutněním - 2.PP	5 dny	10.07. 19	16.07. 19	159	273SF	09_řidič nakladače;
275	hydroizolace asfaltovými pásy tavením - vrstvy, vč.přípravy podkladu - 1.PP	7 dny	05.08. 19	14.08. 19	276SF		22_izolatéři (hydroizolace,
276	nopová fólie + geotextilie	1 den	14.08. 19	15.08. 19	277SF	275SF	22_izolatéři (hydroi
277	zásyp kolem objektů se zhutněním - 1.PP	6 dny	15.08. 19	22.08. 19	269	276SF	09_řidič nakladače

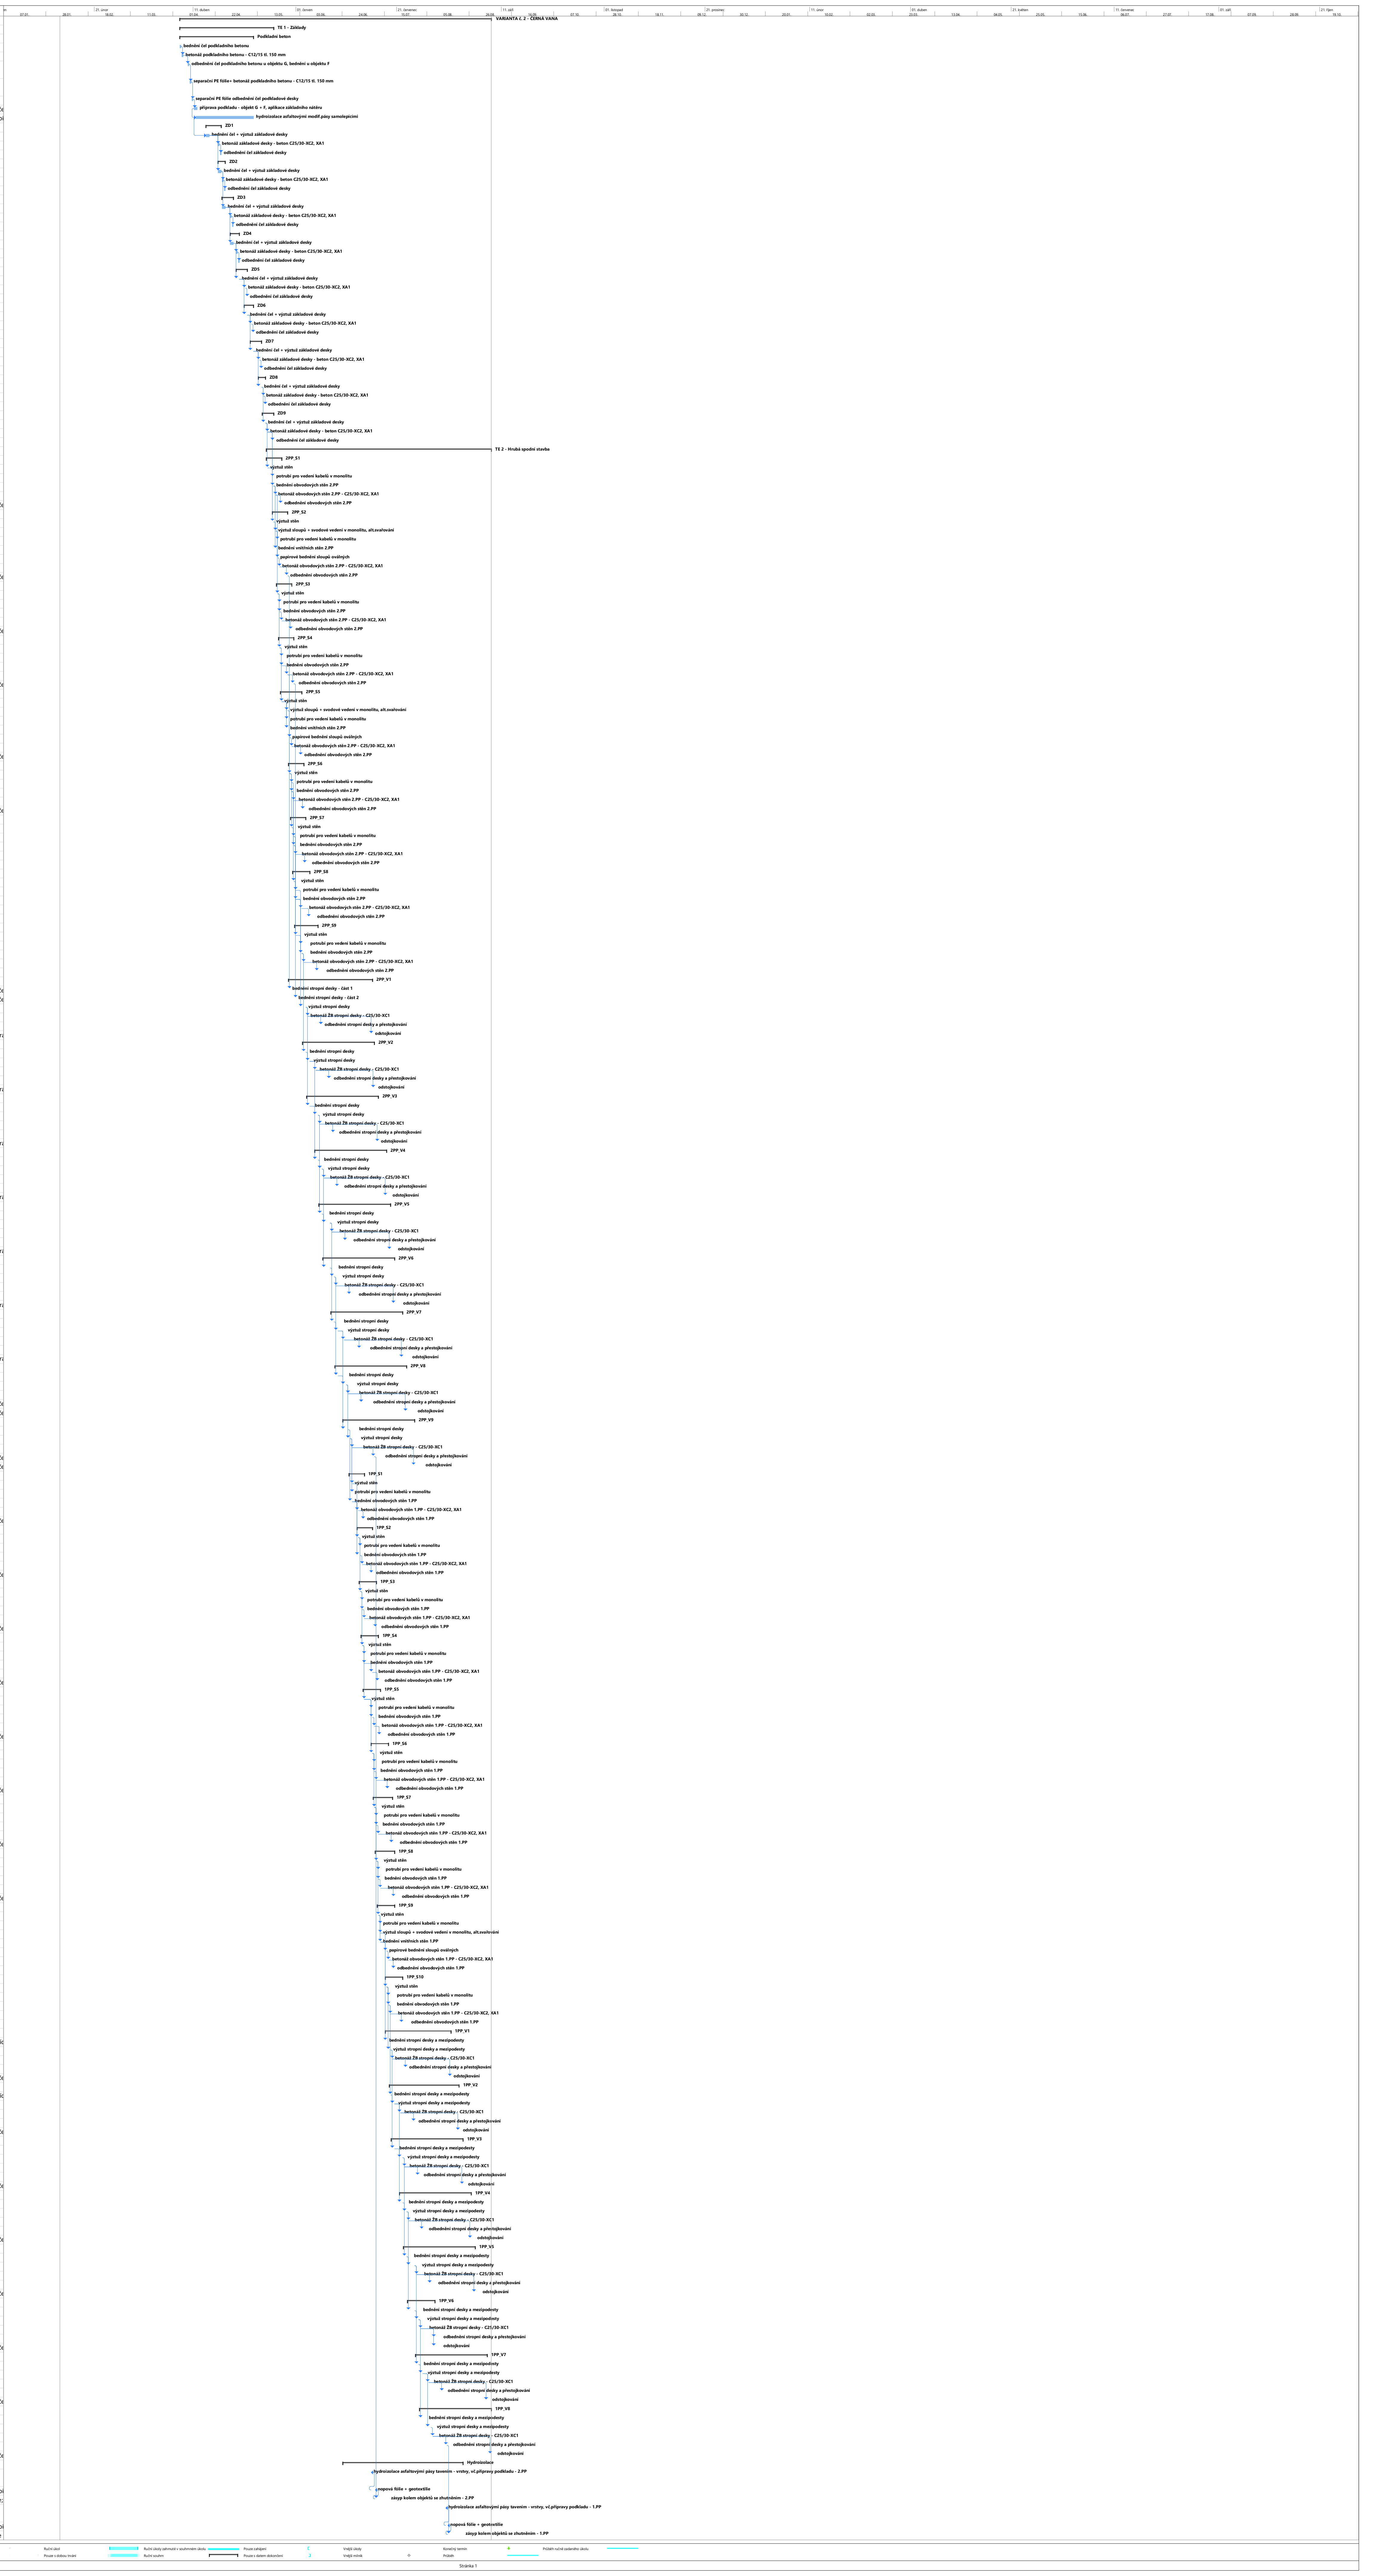

Projekt: harmonogram-var-2.m
Datum: 06.01. 19

Úkol, Rozdělení, Milník, Souhrnný, Souhrn projektu, Neaktivní úkol, Neaktivní milník, Neaktivní souhrn, Ruční úkol, Pouze s dobou trvání, Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu, Ruční souhrn, Pouze zahájení, Pouze s datem dokončení, Vnější úkoly, Vnější milník, Konečný termín, Průběh, Průběh ručně zadaného úkolu
