ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předch	Následn
1		**Stavba Jindřišská 28**	**296 dny**	**15.04. 20**	**16.06. 21**		
2		**Přípravné práce**	**6 dny**	**15.04. 20**	**22.04. 20**		
3		Převzetí staveniště	1 den	15.04. 20	15.04. 20		4
4		Vytyčení staveniště	1 den	16.04. 20	16.04. 20	3	5
5		Staveništní komunikace	1 den	17.04. 20	17.04. 20	4	6
6		Zřízení zařízení staveniště	2 dny	20.04. 20	21.04. 20	5	7SS+1 de
7		Napojení ZS na vodu - provizorní	1 den	21.04. 20	21.04. 20	6SS+1	8
8		Napojení ZS na el. sít - provizorní	1 den	22.04. 20	22.04. 20	7	10
9		Zemní práce	49 dny	23.04. 20	02.07. 20		
10		Vytěžení zák. pasu stav. objektu	2 dny	23.04. 20	24.04. 20	8	11
11		Vytyčení stavební jámy	1 den	27.04. 20	27.04. 20	10	12
12		Osazení zápor	3 dny	28.04. 20	30.04. 20	11	13
13		Vytěžení jámy do úrovně -1,25 m	7 dny	04.05. 20	13.05. 20	12	14
14		Osazování pažin, napnutí kotev	2 dny	14.05. 20	15.05. 20	13	15
15		Vytěžení jámy do úrovně -2,75 m	9 dny	18.05. 20	28.05. 20	14	16
16		Osazování pažin, napnutí kotev	2 dny	29.05. 20	01.06. 20	15	17
17		Vytěžení jámy do úrovně -4,25 m	9 dny	02.06. 20	12.06. 20	16	18;19FF
18		Osazování pažin, napnutí kotev	2 dny	15.06. 20	16.06. 20	17	29
19		Vytýčení rozvodů IS	1 den	12.06. 20	12.06. 20	17FF	20
20		Rozebrání chodníku, výkop pro přípojky	2 dny	15.06. 20	16.06. 20	19	21
21		Pažení výkopku	1 den	17.06. 20	17.06. 20	20	22
22		Přípojka jednotné kanalizace	1 den	22.06. 20	22.06. 20	21;30	23
23		Přípojka vodovodu	1 den	23.06. 20	23.06. 20	22	24
24		Přípojka ESI	2 dny	24.06. 20	25.06. 20	23	25
25		Přípojka ESL	2 dny	26.06. 20	29.06. 20	24	26
26		Přípojka plyn	2 dny	30.06. 20	01.07. 20	25	27
27		Předláždění chodníku - Jindřišská ulice	1 den	02.07. 20	02.07. 20	26	38
28		Zakládání	20 dny	17.06. 20	15.07. 20		
29		Podsyp z kameniva	2 dny	17.06. 20	18.06. 20	18	31;30
30		Montáž jeřábu	1 den	19.06. 20	19.06. 20	29	32;22
31		Vytýčení základů	1 den	19.06. 20	19.06. 20	29	32
32		Vyztužení podkl. desky	2 dny	22.06. 20	23.06. 20	31;30	33
33		Bednění podkl. desky	1 den	24.06. 20	24.06. 20	32	34
34		Betonáž podkl. desky	1 den	25.06. 20	25.06. 20	33	35FS+3 u
35		Odbednění podkl. desky	1 den	29.06. 20	29.06. 20	34FS+	37
36		Vytýčení základ. desky	1 den	26.06. 20	26.06. 20	34	37
37		Vyztužení základ. desky	5 dny	30.06. 20	07.07. 20	36;35	38FS-1 d
38		Bednění základ. desky	2 dny	07.07. 20	08.07. 20	37FS-	39
39		Betonáž základ. desky	1 den	09.07. 20	09.07. 20	38	40FS+5 u
40		Odbednění základ. desky	1 den	15.07. 20	15.07. 20	39FS+	44
41		**Hrubá spodní stavba**	**39 dny**	**10.07. 20**	**02.09. 20**		
42		**1.PP**	**39 dny**	**10.07. 20**	**02.09. 20**		
43		Výztuž svislých kcí	6 dny	10.07. 20	17.07. 20	39	44FS-2 d
44		Bednění svislých kcí	4 dny	16.07. 20	21.07. 20	40;43	45
45		Betonáž svislých kcí	1 den	22.07. 20	22.07. 20	44	46;47FS-
46		Podpěrná konstr. stropů	3 dny	23.07. 20	27.07. 20	45	47;48
47		Odbednění svislých kcí	1 den	28.07. 20	28.07. 20	46;45	48
48		Bednění vodorovných kcí	2 dny	29.07. 20	30.07. 20	47;46	49SS+1 d
49		Výztuž vodorovných kcí	3 dny	30.07. 20	03.08. 20	48SS+	50
50		Betonáž vodorovných kcí	1 den	04.08. 20	04.08. 20	49	51FS+6 u
51		Odbednění vodorovných kcí	1 den	14.08. 20	14.08. 20	50FS+	58
52		Odstr. podp kcí stropů	1 den	02.09. 20	02.09. 20	50FS+	77
53		**Hrubá vrchní stavba**	**109 dny**	**05.08. 20**	**12.01. 21**		
54		**1.NP**	**60 dny**	**05.08. 20**	**29.10. 20**		
55		Výztuž svislých kcí	5 dny	05.08. 20	11.08. 20	50	56FS-1 d
56		Bednění svislých kcí	3 dny	11.08. 20	13.08. 20	55FS-	51;57
57		Betonáž svislých kcí	1 den	14.08. 20	14.08. 20	56	58;59FS-
58		Podpěrná konstr. stropů	3 dny	17.08. 20	19.08. 20	57;51	59
59		Odbednění svislých kcí	1 den	20.08. 20	20.08. 20	58;57	60
60		Bednění vodorovných kcí	2 dny	21.08. 20	24.08. 20	59	61FS-1 d
61		Výztuž vodorovných kcí	3 dny	24.08. 20	26.08. 20	60FS-	62
62		Betonáž vodorovných kcí	1 den	27.08. 20	27.08. 20	61	63FS+6 u
63		Odbednění vodorovných kcí	1 den	07.09. 20	07.09. 20	62FS+	75
64		Bednění schodiště	1 den	21.09. 20	21.09. 20	79	65
65		Výztuž schodiště	1 den	25.09. 20	25.09. 20	64;88	66
66		Betonáž schodiště	1 den	29.09. 20	29.09. 20	65;79	93;67FS-
67		Odbednění schodiště	1 den	12.10. 20	12.10. 20	66FS+	83
68		Odstr. podp kcí stropů	1 den	09.10. 20	09.10. 20	93	107
69		Odstr. podp kcí schod.	1 den	29.10. 20	29.10. 20	66FS+	110
70		Zásyp budovy	1 den	25.09. 20	25.09. 20	62FS+	80
71		**2.NP**	**53 dny**	**28.08. 20**	**12.11. 20**		
72		Výztuž svislých kcí	4 dny	28.08. 20	02.09. 20	62	73FS-1 d
73		Bednění svislých kcí	3 dny	02.09. 20	04.09. 20	72FS-	74;63
74		Betonáž svislých kcí	1 den	07.09. 20	07.09. 20	73	75;76FS-
75		Podpěrná konstr. stropů	3 dny	08.09. 20	10.09. 20	74;63	76
76		Odbednění svislých kcí	1 den	11.09. 20	11.09. 20	74FS+	77
77		Bednění vodorovných kcí	2 dny	14.09. 20	15.09. 20	76;52	78FS-1 d
78		Výztuž vodorovných kcí	3 dny	15.09. 20	17.09. 20	77FS-	79
79		Betonáž vodorovných kcí	1 den	18.09. 20	18.09. 20	78	64;66FS-
80		Odbednění vodorovných kcí	1 den	30.09. 20	30.09. 20	79FS+	93
81		Bednění schodiště	1 den	09.10. 20	09.10. 20	93	82;67
82		Výztuž schodiště	1 den	13.10. 20	13.10. 20	81;94	83
83		Betonáž schodiště	1 den	14.10. 20	14.10. 20	82;79	109;84FS
84		Odbednění schodiště	1 den	03.11. 20	03.11. 20	83FS+	86
85		Odstr. Podp kcí stropů	1 den	19.10. 20	19.10. 20	79FS+	106
86		Odstr. podp kcí schod.	1 den	12.11. 20	12.11. 20	83FS+	102
87		**3.NP**	**41 dny**	**21.09. 20**	**19.11. 20**		
88		Výztuž svislých kcí	4 dny	21.09. 20	24.09. 20	79	89FS-1 d
89		Bednění svislých kcí	3 dny	24.09. 20	29.09. 20	88FS-	90;80
90		Betonáž svislých kcí	1 den	30.09. 20	30.09. 20	89	91;92FS-
91		Podpěrná konstr. stropů	3 dny	01.10. 20	05.10. 20	90	92
92		Odbednění svislých kcí	1 den	06.10. 20	06.10. 20	90FS+	93
93		Bednění vodorovných kcí	2 dny	07.10. 20	08.10. 20	92;66	94FS-1 d
94		Výztuž vodorovných kcí	3 dny	08.10. 20	12.10. 20	93FS-	95;82
95		Betonáž vodorovných kcí	1 den	13.10. 20	13.10. 20	94	104;96FS
96		Odbednění vodorovných kcí	1 den	22.10. 20	22.10. 20	95FS+	109
97		Bednění schodiště	1 den	14.10. 20	14.10. 20	95	105
98		Výztuž schodiště	1 den	20.10. 20	20.10. 20	104	110;99
99		Betonáž schodiště	1 den	21.10. 20	21.10. 20	98;95	102FS+2
100		Odbednění schodiště	1 den	04.11. 20	04.11. 20	99FS+	101
101		Odstr. podp kcí stropů	1 den	11.11. 20	11.11. 20	95FS+	102
102		Odstr. podp kcí schod.	1 den	19.11. 20	19.11. 20	99FS+	117
103		**4.NP**	**42 dny**	**14.10. 20**	**14.12. 20**		
104		Výztuž svislých kcí	4 dny	14.10. 20	19.10. 20	95	105FS-1
105		Bednění svislých kcí	3 dny	19.10. 20	21.10. 20	104FS	106;96
106		Betonáž svislých kcí	1 den	22.10. 20	22.10. 20	105;8	107;108
107		Podpěrná konstr. stropů	3 dny	23.10. 20	27.10. 20	106;6	108
108		Odbednění svislých kcí	1 den	29.10. 20	29.10. 20	106FS	109
109		Bednění vodorovných kcí	2 dny	30.10. 20	02.11. 20	108;8	110FS-1
110		Výztuž vodorovných kcí	3 dny	02.11. 20	04.11. 20	109FS	111
111		Betonáž vodorovných kcí	1 den	05.11. 20	05.11. 20	110	120;112
112		Odbednění vodorovných kcí	1 den	12.11. 20	12.11. 20	111FS	123;115
113		Bednění schodiště	1 den	09.11. 20	09.11. 20	111FS	114
114		Výztuž schodiště	1 den	11.11. 20	11.11. 20	120;1	115
115		Betonáž schodiště	1 den	13.11. 20	13.11. 20	114;1	125;118
116		Odbednění schodiště	1 den	24.11. 20	24.11. 20	125;1	117
117		Odstr. podp kcí stropů	1 den	26.11. 20	26.11. 20	111FS	118
118		Odstr. podp kcí schod.	1 den	14.12. 20	14.12. 20	115FS	134
119		**5.NP**	**38 dny**	**06.11. 20**	**04.01. 21**		
120		Výztuž svislých kcí	3 dny	06.11. 20	10.11. 20	111	121FS-1
121		Bednění svislých kcí	2 dny	10.11. 20	11.11. 20	120FS	122;179
122		Betonáž svislých kcí	1 den	12.11. 20	12.11. 20	121	123;124
123		Podpěrná konstr. stropů	3 dny	13.11. 20	18.11. 20	122;1	124
124		Odbednění svislých kcí	1 den	19.11. 20	19.11. 20	123;1	125
125		Bednění vodorovných kcí	2 dny	20.11. 20	23.11. 20	124;1	126;116
126		Výztuž vodorovných kcí	3 dny	24.11. 20	26.11. 20	125	127
127		Betonáž vodorovných kcí	1 den	27.11. 20	27.11. 20	126	136;128
128		Odbednění vodorovných kcí	1 den	04.12. 20	04.12. 20	127FS	141;270
129		Bednění schodiště	1 den	30.11. 20	30.11. 20	127	130
130		Výztuž schodiště	1 den	02.12. 20	02.12. 20	129;1	131
131		Betonáž schodiště	1 den	03.12. 20	03.12. 20	130	141;134
132		Odbednění schodiště	1 den	14.12. 20	14.12. 20	131FS	133
133		Odstr. podp kcí stropů	1 den	28.12. 20	28.12. 20	127FS	134
134		Odstr. podp kcí schod.	1 den	04.01. 21	04.01. 21	131FS	145
135		**6.NP**	**29 dny**	**30.11. 20**	**12.01. 21**		
136		Výztuž svislých kcí	2 dny	30.11. 20	01.12. 20	127	137;130
137		Bednění svislých kcí	2 dny	02.12. 20	03.12. 20	136	138
138		Betonáž svislých kcí	1 den	04.12. 20	04.12. 20	137	139;140
139		Podpěrná konstr. stropů	2 dny	07.12. 20	08.12. 20	138	140
140		Odbednění svislých kcí	1 den	09.12. 20	09.12. 20	138FS	141
141		Bednění vodorovných kcí	1 den	10.12. 20	10.12. 20	140;1	142
142		Výztuž vodorovných kcí	1 den	11.12. 20	11.12. 20	141	143
143		Betonáž vodorovných kcí	1 den	14.12. 20	14.12. 20	142	147;144
144		Odbednění vodorovných kcí	1 den	21.12. 20	21.12. 20	143FS	150;270
145		Odstr. podp. kcí stropů	1 den	12.01. 21	12.01. 21	134;1	274
146		**Střecha**	**6 dny**	**15.12. 20**	**22.12. 20**		
147		Výztuž svislých kcí	1 den	15.12. 20	15.12. 20	143	148
148		Bednění svislých kcí	1 den	16.12. 20	16.12. 20	147	149
149		Betonáž svislých kcí	1 den	17.12. 20	17.12. 20	148	150FS+3

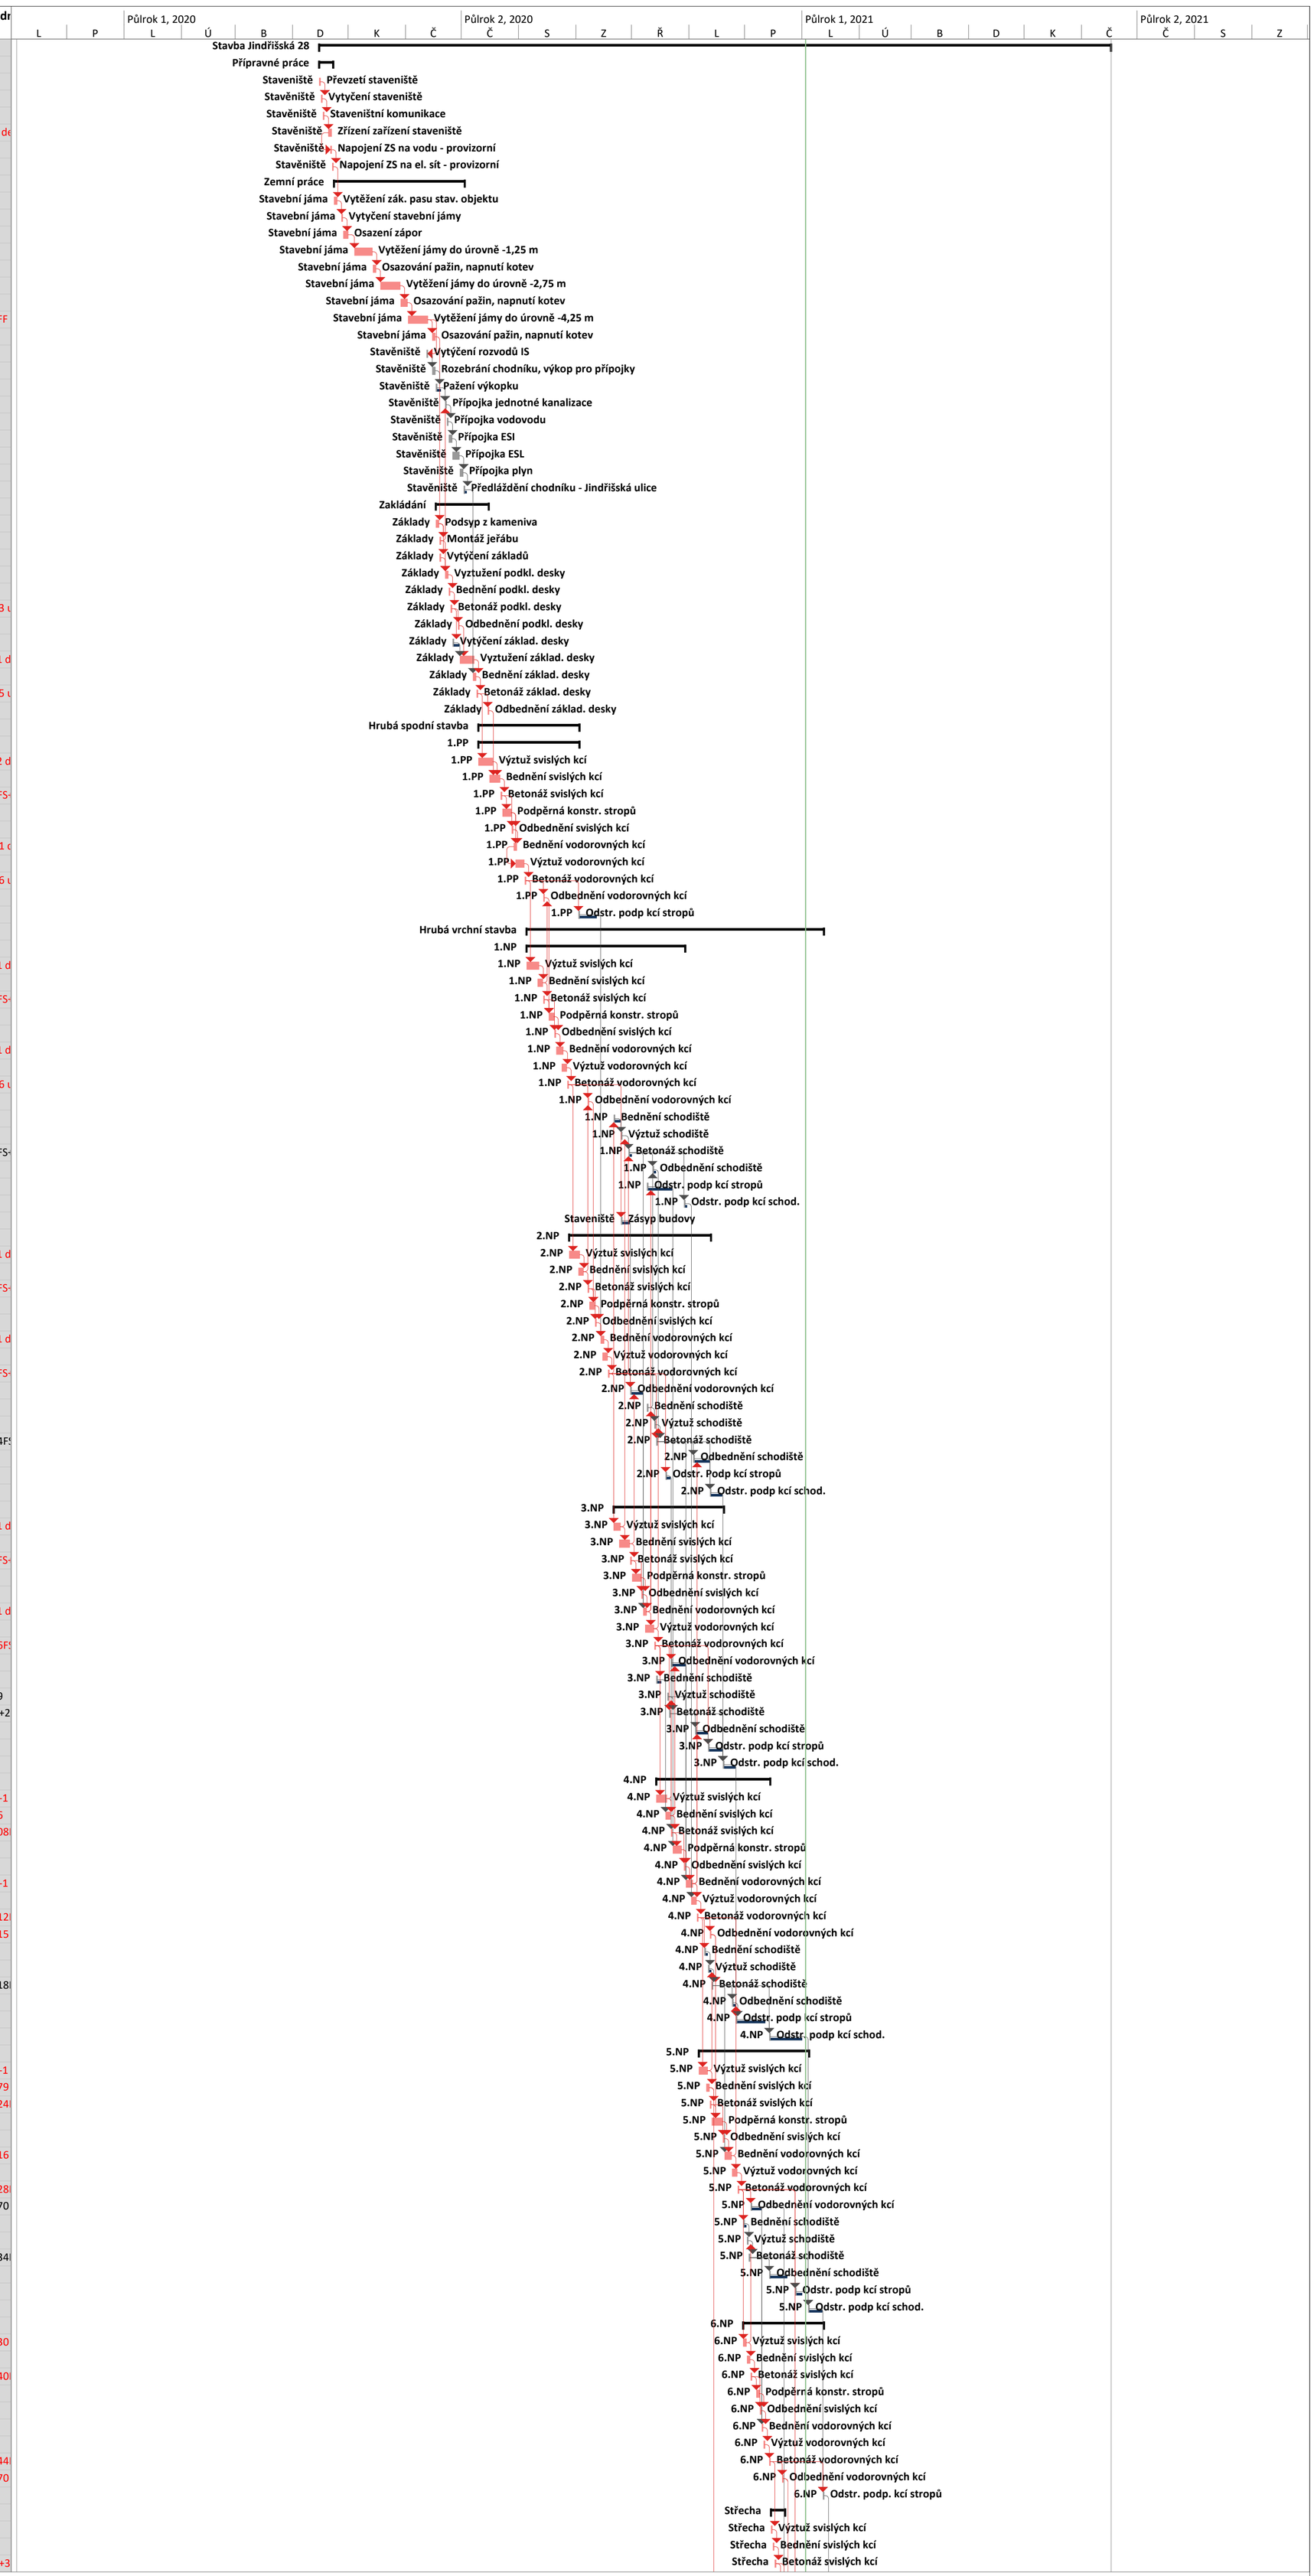

Projekt: Jindřišská 28
Datum: 28.11.2020
Autor: Bc. Sergey Yuzhakov

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník	Souhrnný úkol řídícího předchůdce	Průběh
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín	Normální úkol předchůdce	Průběh ručně zadaného úkolu
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Milník předchůdce	Normální úkol řídícího předchůdce	Časová rezerva
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Milník řídícího předchůdce	Kritický	
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	Souhrnný úkol předchůdce	Kritické rozdělení	

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předch	Následn
150		Odbednění svislých kcí	1 den	22.12. 20	22.12. 20	144;1	154
151		Vyzdění šachet	3 dny	18.12. 20	22.12. 20	149	154
152		**Zastřešení**	**30 dny**	**23.12. 20**	**05.02. 21**		
153		**Střecha nad 6.NP**	**25 dny**	**23.12. 20**	**29.01. 21**		
154		Spádová vrstva betonu	1 den	23.12. 20	23.12. 20	150;1	155;156
155		Montáž zámečnických prvků	1 den	28.12. 20	28.12. 20	154	160
156		Hydroizolační vrstva	2 dny	07.01. 21	08.01. 21	154FS	157;196
157		Spádový XPS	2 dny	11.01. 21	12.01. 21	156	158FS-1
158		Nadstřešní prvky ZTI	2 dny	12.01. 21	13.01. 21	157FS	159FS-1
159		Zatěžovací vrstva	4 dny	13.01. 21	18.01. 21	157;1	160;163
160		Montáž oplechování atiky	4 dny	26.01. 21	29.01. 21	159;3	173
161		**Střecha nad 4.NP**	**21 dny**	**28.12. 20**	**26.01. 21**		
162		Parozábrana	1 den	28.12. 20	28.12. 20	127FS	168;258
163		Tepelná izolace	1 den	19.01. 21	19.01. 21	159	164
164		Hydroizolační vrstva	1 den	20.01. 21	20.01. 21	163	165
165		Montáž dlažby na terčích	2 dny	21.01. 21	22.01. 21	164	166;173
166		Zatěžovací vrstva	2 dny	25.01. 21	26.01. 21	165	169
167		**Střecha nad 5.NP**	**28 dny**	**29.12. 20**	**05.02. 21**		
168		Parozábrana	1 den	29.12. 20	29.12. 20	162	156
169		Tepelná izolace	2 dny	27.01. 21	28.01. 21	166	170
170		Hydroizolační vrstva	2 dny	29.01. 21	01.02. 21	169	171
171		Montáž dlažby na terčích	1 den	02.02. 21	02.02. 21	170	172
172		Zatěžovací vrstva	2 dny	03.02. 21	04.02. 21	171	174FS-1
173		Montáž oplechování	2 dny	01.02. 21	02.02. 21	165;1	174
174		Montáž oplechování	2 dny	04.02. 21	05.02. 21	172FS	398
175		**Hrubé vnitřní práce**	**91 dny**	**12.11. 20**	**24.03. 21**		
176		Demontáž jeřábu	1 den	19.01. 21	19.01. 21	159	177
177		Montáž stav. výtahu	1 den	20.01. 21	20.01. 21	176	389
178		**1.PP**	**68 dny**	**12.11. 20**	**19.02. 21**		
179		Lež. rozvody KAN	3 dny	12.11. 20	16.11. 20	121	180
180		Lež. rozvody VOD	6 dny	18.11. 20	25.11. 20	179	181
181		Lež. rozvody VZT	4 dny	26.11. 20	01.12. 20	180	182
182		Lež. rozvody plynu	1 den	02.12. 20	02.12. 20	181	183
183		Stoupací rozvody plynu	1 den	03.12. 20	03.12. 20	182	184;190
184		Stoup. rozvody KAN	2 dny	04.12. 20	07.12. 20	183	185;191
185		Stoup. rozvody VZT	2 dny	08.12. 20	09.12. 20	184	186;192
186		Stoup. rozvody VOD	2 dny	10.12. 20	11.12. 20	185	193
187		Hrubé rozvody ESI	3 dny	12.02. 21	16.02. 21	200FS	188;202
188		Hrubé rozvody ESL	3 dny	17.02. 21	19.02. 21	187	203
189		**1.NP**	**58 dny**	**04.12. 20**	**26.02. 21**		
190		Lež. rozvody plynu	1 den	04.12. 20	04.12. 20	183	191
191		Stoup. rozvody KAN	2 dny	08.12. 20	09.12. 20	190;1	206
192		Stoup. rozvody VZT	2 dny	10.12. 20	11.12. 20	185	207
193		Stoup. rozvody VOD	2 dny	14.12. 20	15.12. 20	186	194;208
194		Stoup. rozvody ÚT	2 dny	16.12. 20	17.12. 20	193	209;195
195		Okna	2 dny	21.12. 20	22.12. 20	194FS	210;196
196		Přizdívky YTONG	2 dny	07.01. 21	08.01. 21	195;1	197FS+5
197		Rastry SDK	1 den	18.01. 21	18.01. 21	196FS	198;212
198		Lež. rozvody VZT	3 dny	19.01. 21	21.01. 21	197	199FS+8
199		Tep. izolace podlah	1 den	03.02. 21	03.02. 21	198FS	200FS+1
200		Podlahy - anhydrit	1 den	05.02. 21	05.02. 21	199FS	201FS+7
201		Lež. rozvody KAN	3 dny	15.02. 21	17.02. 21	200FS	217
202		Hrubé rozvody ESI	3 dny	17.02. 21	19.02. 21	187	218;203
203		Hrubé rozvody ESL	3 dny	22.02. 21	24.02. 21	188;2	219;204
204		Lež. rozvody VOD	3 dny	24.02. 21	26.02. 21	203FS	220;292
205		**2.NP**	**58 dny**	**10.12. 20**	**04.03. 21**		
206		Stoup. rozvody KAN	2 dny	10.12. 20	11.12. 20	191	222
207		Stoup. rozvody VZT	2 dny	14.12. 20	15.12. 20	192	223
208		Stoup. rozvody VOD	2 dny	16.12. 20	17.12. 20	193	224
209		Stoup. rozvody ÚT	2 dny	18.12. 20	21.12. 20	194	225
210		Okna	3 dny	23.12. 20	29.12. 20	195	226
211		Přizdívky YTONG, zdění příček	4 dny	11.01. 21	14.01. 21	196	227
212		Rastry SDK	3 dny	19.01. 21	21.01. 21	197	228
213		Lež. rozvody VZT	3 dny	22.01. 21	26.01. 21	198	214FS+2
214		Lež. rozvody ÚT	2 dny	29.01. 21	01.02. 21	213FS	230
215		Tep. izolace podlah	1 den	04.02. 21	04.02. 21	199	231
216		Podlahy - anhydrit	1 den	08.02. 21	08.02. 21	200	232
217		Lež. rozvody KAN	3 dny	18.02. 21	22.02. 21	201	233
218		Hrubé rozvody ESI	3 dny	22.02. 21	24.02. 21	202	234
219		Hrubé rozvody ESL	3 dny	25.02. 21	01.03. 21	203	235
220		Lež. rozvody VOD	4 dny	01.03. 21	04.03. 21	204	236
221		**3.NP**	**60 dny**	**14.12. 20**	**10.03. 21**		
222		Stoup. rozvody KAN	2 dny	14.12. 20	15.12. 20	206	238
223		Stoup. rozvody VZT	2 dny	16.12. 20	17.12. 20	207	239
224		Stoup. rozvody VOD	2 dny	18.12. 20	21.12. 20	208	240
225		Stoup. rozvody ÚT	2 dny	22.12. 20	23.12. 20	209	241
226		Okna	3 dny	30.12. 20	04.01. 21	210	242
227		Přizdívky YTONG, zdění příček	4 dny	15.01. 21	20.01. 21	211	243
228		Rastry SDK	3 dny	22.01. 21	26.01. 21	212	244
229		Lež. rozvody VZT	3 dny	27.01. 21	29.01. 21	213	245
230		Lež. rozvody ÚT	2 dny	02.02. 21	03.02. 21	214	246
231		Tep. izolace podlah	1 den	05.02. 21	05.02. 21	215	247
232		Podlahy - anhydrit	1 den	09.02. 21	09.02. 21	216	248
233		Lež. rozvody KAN	3 dny	23.02. 21	25.02. 21	217	249
234		Hrubé rozvody ESI	3 dny	25.02. 21	01.03. 21	218	250
235		Hrubé rozvody ESL	3 dny	02.03. 21	04.03. 21	219	251
236		Lež. rozvody VOD	4 dny	05.03. 21	10.03. 21	220	252
237		**4.NP**	**62 dny**	**16.12. 20**	**16.03. 21**		
238		Stoup. rozvody KAN	2 dny	16.12. 20	17.12. 20	222	254
239		Stoup. rozvody VZT	2 dny	18.12. 20	21.12. 20	223	255
240		Stoup. rozvody VOD	2 dny	22.12. 20	23.12. 20	224	256
241		Stoup. rozvody ÚT	2 dny	28.12. 20	29.12. 20	225	257
242		Okna	3 dny	05.01. 21	07.01. 21	226	258
243		Přizdívky YTONG, zdění příček	4 dny	21.01. 21	26.01. 21	227	259
244		Rastry SDK	3 dny	27.01. 21	29.01. 21	228	260
245		Lež. rozvody VZT	3 dny	01.02. 21	03.02. 21	229	261
246		Lež. rozvody ÚT	2 dny	04.02. 21	05.02. 21	230	247
247		Tep. izolace podlah	1 den	08.02. 21	08.02. 21	231;2	262
248		Podlahy - anhydrit	1 den	10.02. 21	10.02. 21	232	264
249		Lež. rozvody KAN	3 dny	26.02. 21	02.03. 21	233	265
250		Hrubé rozvody ESI	3 dny	02.03. 21	04.03. 21	234	266
251		Hrubé rozvody ESL	3 dny	05.03. 21	09.03. 21	235	267
252		Lež. rozvody VOD	4 dny	11.03. 21	16.03. 21	236	268
253		**5.NP**	**63 dny**	**18.12. 20**	**19.03. 21**		
254		Stoup. rozvody KAN	2 dny	18.12. 20	21.12. 20	238	270
255		Stoup. rozvody VZT	2 dny	22.12. 20	23.12. 20	239	271
256		Stoup. rozvody VOD	2 dny	28.12. 20	29.12. 20	240	272
257		Stoup. rozvody ÚT	2 dny	30.12. 20	31.12. 20	241	273
258		Okna	3 dny	08.01. 21	12.01. 21	242;1	274
259		Přizdívky YTONG	3 dny	27.01. 21	29.01. 21	243	275
260		Rastry SDK	2 dny	01.02. 21	02.02. 21	244	276
261		Lež. rozvody VZT	1 den	04.02. 21	04.02. 21	245	277
262		Tepelná izolace podlah	1 den	09.02. 21	09.02. 21	247	263;278
263		Rozvody podlahového topení	1 den	10.02. 21	10.02. 21	262	264;279
264		Podlahy - anhydrit	1 den	11.02. 21	11.02. 21	263;2	280
265		Lež. rozvody KAN	3 dny	03.03. 21	05.03. 21	249	281
266		Hrubé rozvody ESI	3 dny	05.03. 21	09.03. 21	250	282
267		Hrubé rozvody ESL	3 dny	10.03. 21	12.03. 21	251	283
268		Lež. rozvody VOD	3 dny	17.03. 21	19.03. 21	252	284
269		**6.NP**	**64 dny**	**22.12. 20**	**24.03. 21**		
270		Stoup. rozvody KAN	2 dny	22.12. 20	23.12. 20	254;1	271
271		Stoup. rozvody VZT	2 dny	28.12. 20	29.12. 20	255;2	272
272		Stoup. rozvody VOD	2 dny	30.12. 20	31.12. 20	256;2	273
273		Stoup. rozvody ÚT	2 dny	04.01. 21	05.01. 21	257;2	274
274		Okna	2 dny	13.01. 21	14.01. 21	258;2	275
275		Přizdívky YTONG	2 dny	01.02. 21	02.02. 21	259;2	276;395
276		Rastry SDK	2 dny	03.02. 21	04.02. 21	260;2	277
277		Lež. rozvody VZT	1 den	05.02. 21	05.02. 21	261;2	278
278		Tepelná izolace podlah	1 den	10.02. 21	10.02. 21	262;2	280
279		Rozvody podlahového topení	1 den	11.02. 21	11.02. 21	263	280
280		Podlahy - anhydrit	1 den	12.02. 21	12.02. 21	264;2	281
281		Lež. rozvody KAN	3 dny	08.03. 21	10.03. 21	265;2	282FS-1
282		Hrubé rozvody ESI	3 dny	10.03. 21	12.03. 21	266;2	283FS-1
283		Hrubé rozvody ESL	3 dny	15.03. 21	17.03. 21	267;2	284
284		Lež. rozvody VOD	3 dny	22.03. 21	24.03. 21	268;2	323
285		**Kompletace rozvodů instalací a vnitřních prací**	**40 dny**	**26.02. 21**	**23.04. 21**		
286		Silo - omítky - montáž	1 den	26.02. 21	26.02. 21	399	292
287		**1.PP**	**10 dny**	**05.03. 21**	**18.03. 21**		
288		Stěny - bet. stěrka	3 dny	05.03. 21	09.03. 21	292	289
289		Podlahy - stěrka se vsypem	2 dny	10.03. 21	11.03. 21	288	290
290		Technologie - automatický parkovací systém	5 dny	12.03. 21	18.03. 21	289	297
291		**1.NP**	**37 dny**	**01.03. 21**	**21.04. 21**		
292		Omítky	4 dny	01.03. 21	04.03. 21	204;2	293FS+3
293		Záklopy SDK stěn, SDK podhledy	3 dny	10.03. 21	12.03. 21	292FS	294;300
294		Keramické obklady	2 dny	19.03. 21	22.03. 21	292FS	295FS+4
295		Malby	2 dny	29.03. 21	30.03. 21	294FS	296FS+2
296		Zám. výrobky int.	3 dny	05.04. 21	07.04. 21	295FS	303;297
297		Technologie - osobní výtah	11 dny	07.04. 21	21.04. 21	296SS	327
298		**2.NP**	**26 dny**	**05.03. 21**	**12.04. 21**		

Projekt: Jindřišská 28
Datum: 28.11.2020
Autor: Bc. Sergey Yuzhakov

Úkol · Rozdělení · Milník · Souhrnný · Souhrn projektu · Neaktivní úkol · Neaktivní milník · Neaktivní souhrn · Ruční úkol · Pouze s dobou trvání · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Ruční souhrn · Pouze zahájení · Pouze s datem dokončení · Vnější úkoly · Vnější milník · Konečný termín · Milník předchůdce · Milník řídícího předchůdce · Souhrnný úkol předchůdce · Souhrnný úkol řídícího předchůdce · Normální úkol předchůdce · Normální úkol řídícího předchůdce · Kritický · Kritické rozdělení · Průběh · Průběh ručně zadaného úkolu · Časová rezerva

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předch	Následn
299		Omítky	5 dny	05.03. 21	11.03. 21	292	305;300
300		Záklopy SDK stěn	5 dny	15.03. 21	19.03. 21	293;2	306
301		Keramické obklady	5 dny	23.03. 21	29.03. 21	294	307
302		Malby	4 dny	31.03. 21	06.04. 21	295	308
303		Zám. výrobky int.	3 dny	08.04. 21	12.04. 21	296	309
304		**3.NP**	**24 dny**	**12.03. 21**	**15.04. 21**		
305		Omítky	6 dny	12.03. 21	19.03. 21	299	311
306		Záklopy SDK stěn	6 dny	22.03. 21	29.03. 21	300	312
307		Keramické obklady	5 dny	30.03. 21	06.04. 21	301	313
308		Malby	4 dny	07.04. 21	12.04. 21	302	314
309		Zám. výrobky int.	3 dny	13.04. 21	15.04. 21	303	315
310		**4.NP**	**21 dny**	**22.03. 21**	**20.04. 21**		
311		Omítky	6 dny	22.03. 21	29.03. 21	305	317
312		Záklopy SDK stěn	6 dny	30.03. 21	07.04. 21	306	318
313		Keramické obklady	3 dny	07.04. 21	09.04. 21	307	319
314		Malby	4 dny	13.04. 21	16.04. 21	308	320
315		Zám. výrobky int.	3 dny	16.04. 21	20.04. 21	309	321
316		**5.NP**	**16 dny**	**30.03. 21**	**21.04. 21**		
317		Omítky	3 dny	30.03. 21	01.04. 21	311	323
318		Záklopy SDK stěn	3 dny	08.04. 21	12.04. 21	312	324
319		Keramické obklady	3 dny	12.04. 21	14.04. 21	313	325
320		Malby	3 dny	19.04. 21	21.04. 21	314	326
321		Zám. výrobky int.	1 den	21.04. 21	21.04. 21	315	297FF
322		**6.NP**	**15 dny**	**05.04. 21**	**23.04. 21**		
323		Omítky	3 dny	05.04. 21	07.04. 21	317;2	328
324		Záklopy SDK stěn	3 dny	13.04. 21	15.04. 21	318	325
325		Keramické obklady	3 dny	16.04. 21	20.04. 21	319;3	326
326		Malby	2 dny	22.04. 21	23.04. 21	320;3	381
327		Demontáž stavebního výtahu	1 den	22.04. 21	22.04. 21	297	413
328		Silo - omítky - demontáž	1 den	08.04. 21	08.04. 21	323	403;400
329		**Kompletace rozvodů instalací, vnitřních prací**	**41 dny**	**12.04. 21**	**07.06. 21**		
330		**1.PP**	**27 dny**	**12.04. 21**	**18.05. 21**		
331		Kompletace VZT	2 dny	12.04. 21	13.04. 21	338SS	332
332		Kompletace - ESI	3 dny	14.04. 21	16.04. 21	331	333FS+3
333		Kompletace - plyn	1 den	22.04. 21	22.04. 21	332FS	334FS+1
334		Kompletace - ESL	2 dny	26.04. 21	27.04. 21	333FS	342;335
335		Závěrečný úklid	1 den	18.05. 21	18.05. 21	334FS	343
336		**1.NP**	**41 dny**	**12.04. 21**	**07.06. 21**		
337		Dveře vnitřní	2 dny	12.05. 21	13.05. 21	350;3	351
338		Kompletace ZTI	3 dny	12.04. 21	14.04. 21	295FS	339FS-1
339		Kompletace VZT	3 dny	14.04. 21	16.04. 21	338FS	347
340		Kompletace - ESI	4 dny	19.04. 21	22.04. 21	332	348
341		Kompletace - plyn	1 den	23.04. 21	23.04. 21	333	337
342		Kompletace - ESL	3 dny	28.04. 21	30.04. 21	334	349
343		Závěrečný úklid	2 dny	19.05. 21	20.05. 21	335	352
344		Podlah. stěrka schd.	1 den	07.06. 21	07.06. 21	362;3	475
345		**2.NP**	**33 dny**	**15.04. 21**	**31.05. 21**		
346		Kompletace ZTI	3 dny	15.04. 21	19.04. 21	338	355
347		Kompletace VZT	3 dny	19.04. 21	21.04. 21	339	356
348		Kompletace - ESI	4 dny	23.04. 21	28.04. 21	340	357
349		Kompletace - ESL	3 dny	03.05. 21	05.05. 21	342	350;358
350		Dřevěná podlaha	4 dny	06.05. 21	11.05. 21	349	337;359
351		Dveře vnitřní	3 dny	14.05. 21	18.05. 21	337	360
352		Závěrečný úklid	2 dny	21.05. 21	24.05. 21	343	361;353
353		Podlah. stěrka schd.	1 den	31.05. 21	31.05. 21	352FS	362
354		**3.NP**	**31 dny**	**20.04. 21**	**01.06. 21**		
355		Kompletace ZTI	3 dny	20.04. 21	22.04. 21	346	364
356		Kompletace VZT	3 dny	22.04. 21	26.04. 21	347	365
357		Kompletace - ESI	4 dny	29.04. 21	04.05. 21	348	366
358		Kompletace - ESL	3 dny	06.05. 21	10.05. 21	349	367
359		Dřevěná podlaha	4 dny	12.05. 21	17.05. 21	350	368
360		Dveře vnitřní	3 dny	19.05. 21	21.05. 21	351	369
361		Závěrečný úklid	2 dny	25.05. 21	26.05. 21	352	370
362		Podlah. stěrka schd.	1 den	01.06. 21	01.06. 21	353	371;344
363		**4.NP**	**31 dny**	**23.04. 21**	**04.06. 21**		
364		Kompletace ZTI	3 dny	23.04. 21	27.04. 21	355	373
365		Kompletace VZT	3 dny	27.04. 21	29.04. 21	356	374
366		Kompletace - ESI	4 dny	05.05. 21	10.05. 21	357	375
367		Kompletace - ESL	3 dny	11.05. 21	13.05. 21	358	376
368		Dřevěná podlaha	4 dny	18.05. 21	21.05. 21	359	377
369		Dveře vnitřní	3 dny	24.05. 21	26.05. 21	360	378
370		Závěrečný úklid	2 dny	27.05. 21	28.05. 21	361	379
371		Podlah. stěrka schd.	1 den	04.06. 21	04.06. 21	362;3	344
372		**5.NP**	**25 dny**	**28.04. 21**	**01.06. 21**		
373		Kompletace ZTI	2 dny	28.04. 21	29.04. 21	364	381
374		Kompletace VZT	2 dny	30.04. 21	03.05. 21	365	382
375		Kompletace - ESI	3 dny	11.05. 21	13.05. 21	366	383
376		Kompletace - ESL	3 dny	14.05. 21	18.05. 21	367	384
377		Dřevěná podlaha	3 dny	24.05. 21	26.05. 21	368	385
378		Dveře vnitřní	2 dny	27.05. 21	28.05. 21	369	386
379		Závěrečný úklid	2 dny	31.05. 21	01.06. 21	370	387
380		**6.NP**	**25 dny**	**30.04. 21**	**03.06. 21**		
381		Kompletace ZTI	2 dny	30.04. 21	03.05. 21	373;3	382FS-1
382		Kompletace VZT	2 dny	04.05. 21	05.05. 21	374;3	383
383		Kompletace - ESI	3 dny	14.05. 21	18.05. 21	375;3	384FS-1
384		Kompletace - ESL	3 dny	19.05. 21	21.05. 21	376;3	385
385		Dřevěná podlaha	2 dny	27.05. 21	28.05. 21	377;3	386
386		Dveře vnitřní	1 den	31.05. 21	31.05. 21	378;3	387
387		Závěrečný úklid	2 dny	02.06. 21	03.06. 21	379;3	371;344
388		**Fasáda**	**56 dny**	**21.01. 21**	**09.04. 21**		
389		Silo - malta - montáž	1 den	21.01. 21	21.01. 21	177	390
390		Lešení fasádní - montáž	2 dny	22.01. 21	25.01. 21	389	391;160
391		Kot. hromosvodu na fasádu	1 den	26.01. 21	26.01. 21	390	392
392		Provedení tep. izolace stěn	4 dny	27.01. 21	01.02. 21	391	393
393		Montáž vodicích lišt pro žaluzie	1 den	02.02. 21	02.02. 21	392	394
394		Zámečnické výrobky vnější	2 dny	03.02. 21	04.02. 21	393	395SS
395		Obezdění fasády	13 dny	03.02. 21	19.02. 21	275;3	396FF+1
396		Klempířské prvky	4 dny	17.02. 21	22.02. 21	395FF	397FF
397		Montáž vnějších žaluzie	1 den	22.02. 21	22.02. 21	396FF	398
398		Demontáž lešení	2 dny	23.02. 21	24.02. 21	397;1	399
399		Silo - malta - demontáž	1 den	25.02. 21	25.02. 21	398	286
400		Zařízení staveniště - částečná demontáž	1 den	09.04. 21	09.04. 21	328	412
401		**Dostavba dvoupodlažní nepodsklepené části**	**48 dny**	**09.04. 21**	**15.06. 21**		
402		**Zakládání přístavby**	**10 dny**	**09.04. 21**	**22.04. 21**		
403		Vytyčení stavební jámy	1 den	09.04. 21	09.04. 21	328	404
404		Hloubení jámy, rýh	1 den	12.04. 21	12.04. 21	403	405
405		Vyztužení, betonáž zákl. pasů	1 den	13.04. 21	13.04. 21	404	406
406		Podsyp z kameniva, podkl. beton	1 den	14.04. 21	14.04. 21	405	407FS+1
407		Hydroizolační vrstva	1 den	16.04. 21	16.04. 21	406FS	408
408		Vyztužení základ. desky	1 den	19.04. 21	19.04. 21	407	409
409		Bednění, betonáž základ. desky	1 den	20.04. 21	20.04. 21	408	410FS+1
410		Odbednění základ. desky	1 den	22.04. 21	22.04. 21	409FS	412
411		**1.NP Přístavby**	**37 dny**	**23.04. 21**	**14.06. 21**		
412		Zdění stěn	2 dny	23.04. 21	26.04. 21	410;4	413
413		Věnec	1 den	27.04. 21	27.04. 21	412;3	414
414		Odbednění věnce	1 den	28.04. 21	28.04. 21	413	415
415		Ocelobetonový strop	2 dny	29.04. 21	30.04. 21	414	432FS+5
416		Okna	1 den	17.05. 21	17.05. 21	435FS	436
417		Tep. izolace podlah	1 den	19.05. 21	19.05. 21	437SS	418;438
418		Rozvody podlahového topení	1 den	20.05. 21	20.05. 21	417	419
419		Podlahy - anhydrit	1 den	21.05. 21	21.05. 21	418	439;420
420		Hrubé rozvody ESI	1 den	26.05. 21	26.05. 21	419FS	421;440
421		Hrubé rozvody ESL	1 den	27.05. 21	27.05. 21	420	441;422
422		Omítky	2 dny	28.05. 21	31.05. 21	421	423FS+1
423		Lež. rozvody VZT	1 den	02.06. 21	02.06. 21	422FS	424;443
424		SDK podhledy	1 den	03.06. 21	03.06. 21	423	425
425		Malby	1 den	04.06. 21	04.06. 21	424;4	445;426
426		Kompletace VZT	1 den	07.06. 21	07.06. 21	425	427;446
427		Kompletace - ESI	1 den	08.06. 21	08.06. 21	426	428;447
428		Kompletace - ESL	1 den	09.06. 21	09.06. 21	427	429;448
429		Keramická dlažba	2 dny	10.06. 21	11.06. 21	428	430
430		Závěrečný úklid	1 den	14.06. 21	14.06. 21	429	450
431		**2.NP Přístavby**	**29 dny**	**06.05. 21**	**15.06. 21**		
432		Zdění stěn	2 dny	06.05. 21	07.05. 21	415FS	433
433		Věnec	1 den	10.05. 21	10.05. 21	432	434
434		Odbednění věnce	1 den	11.05. 21	11.05. 21	433	435
435		Ocelobetonový strop - montáž	2 dny	12.05. 21	13.05. 21	434	452FS+3
436		Okna	1 den	18.05. 21	18.05. 21	416	437;460
437		Lež. rozvody ÚT	1 den	19.05. 21	19.05. 21	436	417SS
438		Tep. izolace podlah	1 den	20.05. 21	20.05. 21	417	439
439		Podlahy - anhydrit	1 den	24.05. 21	24.05. 21	419;4	440FS+2
440		Hrubé rozvody ESI	1 den	27.05. 21	27.05. 21	420;4	441
441		Hrubé rozvody ESL	1 den	28.05. 21	28.05. 21	421;4	442
442		Omítky	2 dny	01.06. 21	02.06. 21	422;4	445FS+3
443		Lež. rozvody VZT	1 den	03.06. 21	03.06. 21	442;4	444
444		SDK podhledy	1 den	04.06. 21	04.06. 21	443	445
445		Malby	1 den	07.06. 21	07.06. 21	442FS	446
446		Kompletace VZT	1 den	08.06. 21	08.06. 21	426;4	447
447		Kompletace - ESI	1 den	09.06. 21	09.06. 21	427;4	448

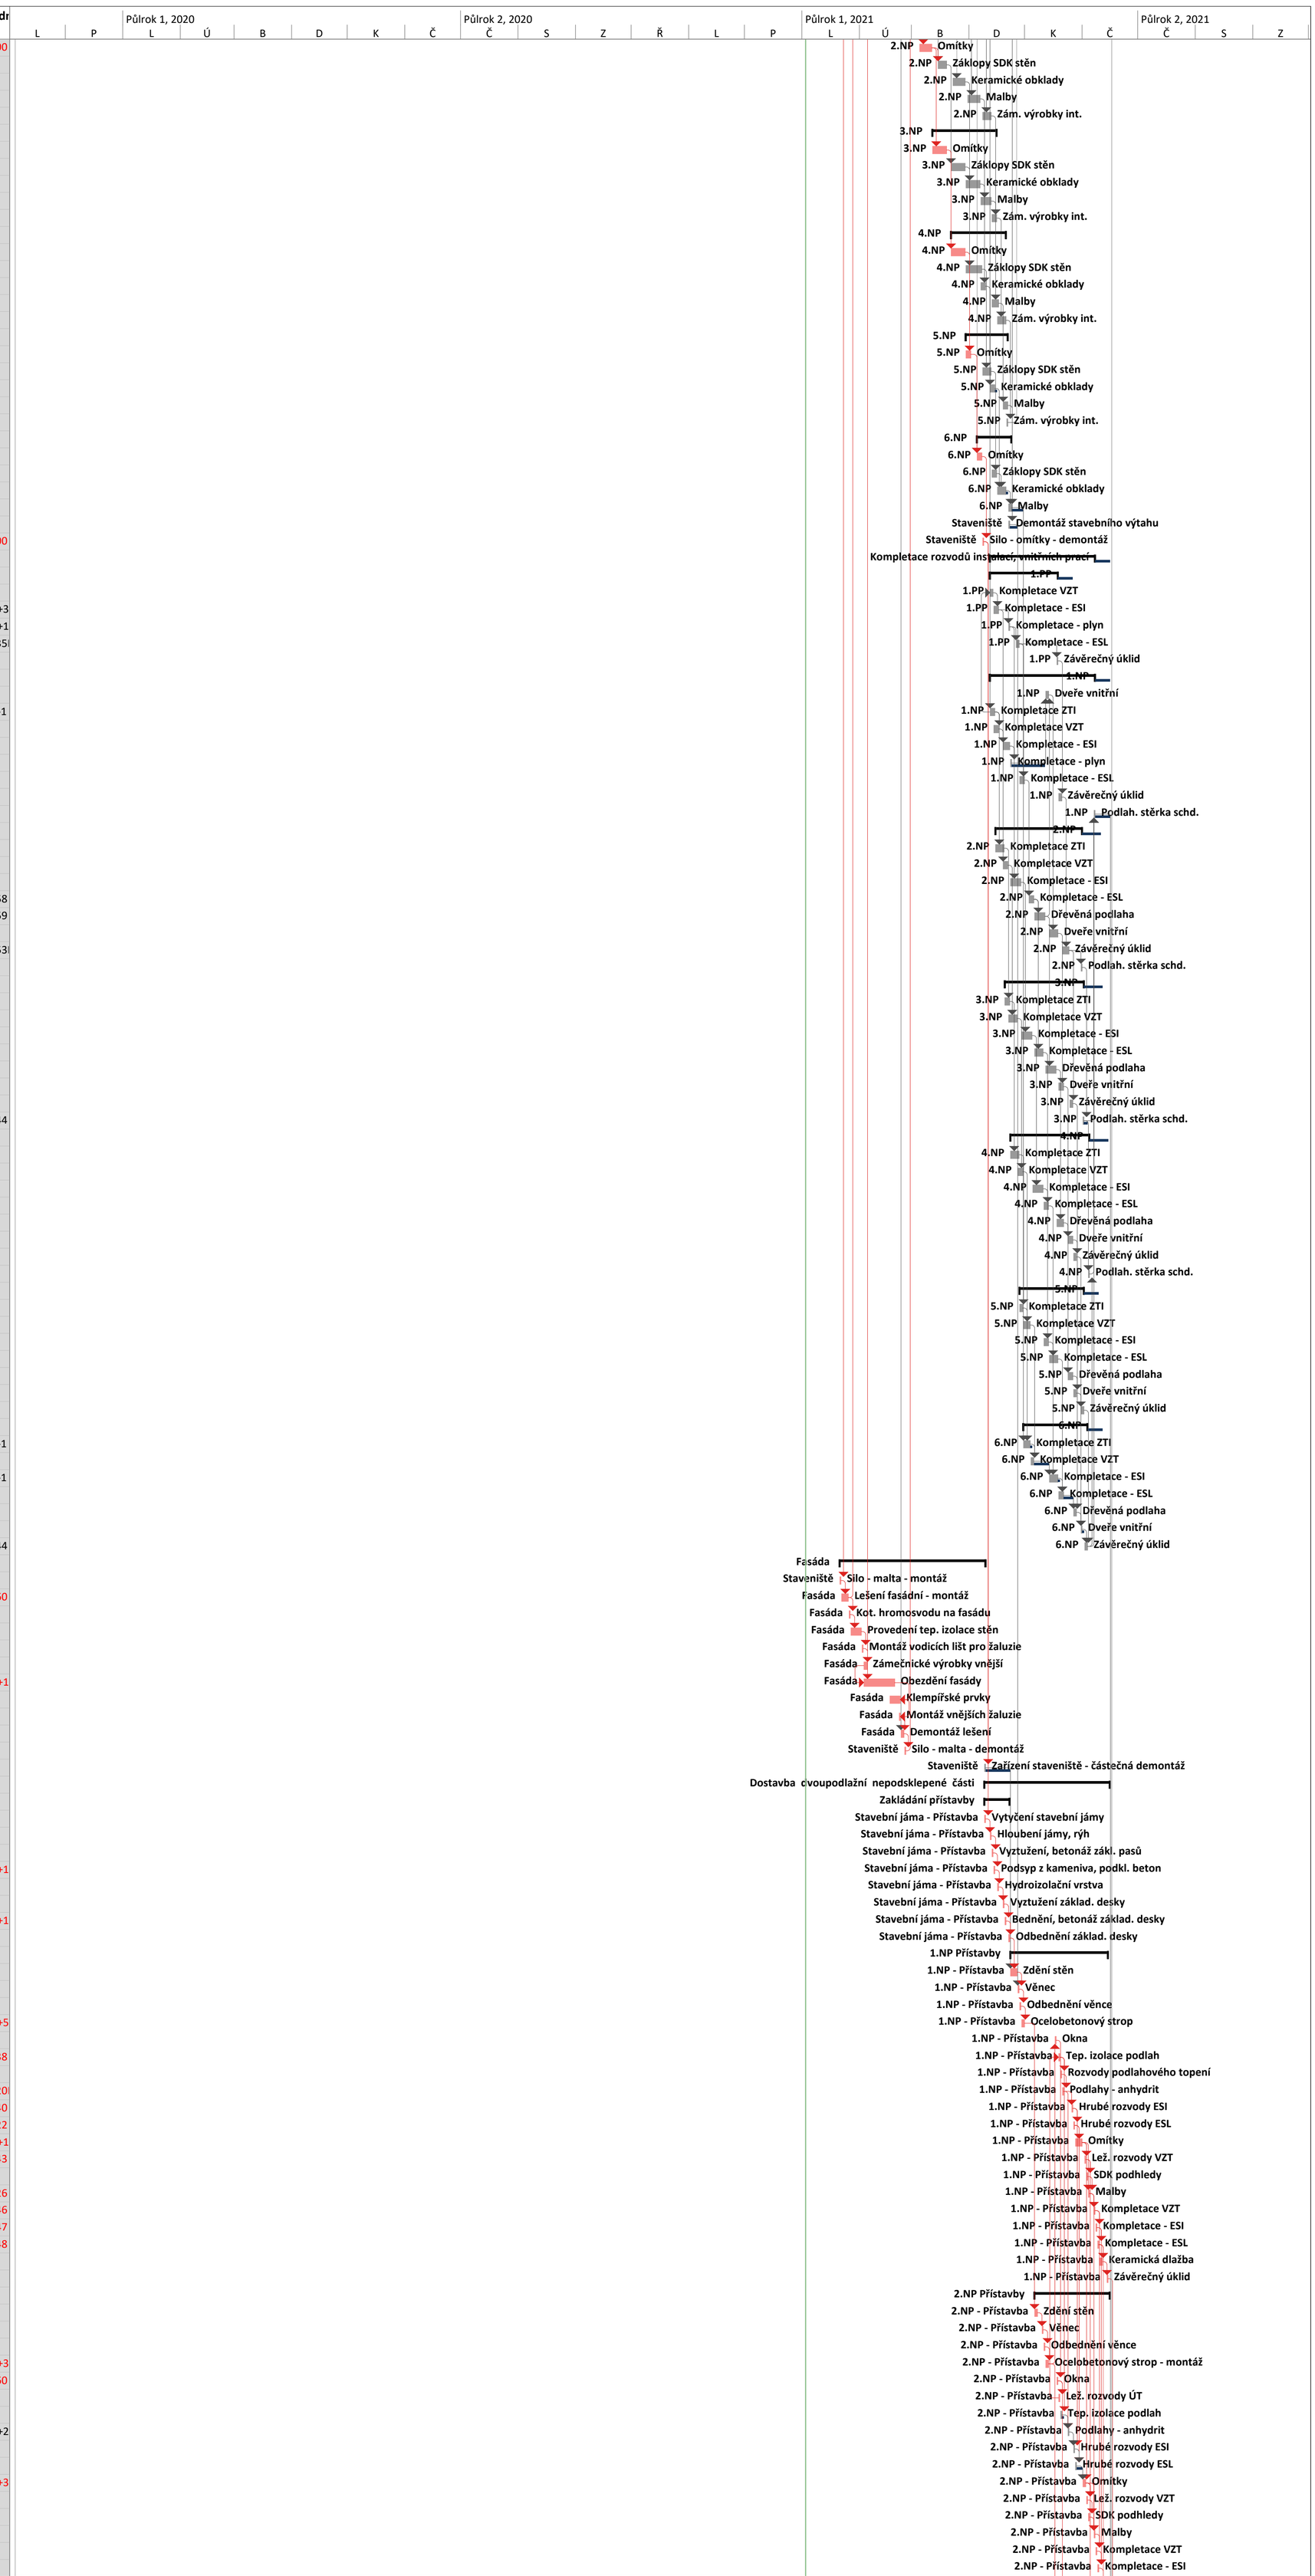

Projekt: Jindřišská 28
Datum: 28.11.2020
Autor: Bc. Sergey Yuzhakov

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		Souhrnný úkol řídícího předchůdce		Průběh			
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		Normální úkol předchůdce		Průběh ručně zadaného úkolu			
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Milník předchůdce		Normální úkol řídícího předchůdce		Časová rezerva			
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Milník řídícího předchůdce		Kritický					
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		Souhrnný úkol předchůdce		Kritické rozdělení					

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předch	Následn
448		Kompletace - ESL	1 den	10.06. 21	10.06. 21	428;4	449
449		Dřevěná podlaha	2 dny	11.06. 21	14.06. 21	448	450
450		Závěrečný úklid	1 den	15.06. 21	15.06. 21	449;4	475
451		**Střecha přístavby**	**9 dny**	**17.05. 21**	**27.05. 21**		
452		Vyzdění atiky	1 den	17.05. 21	17.05. 21	435FS	453FS+1
453		Natavení parozábrany	1 den	19.05. 21	19.05. 21	452FS	454
454		Tepelná izolace	1 den	20.05. 21	20.05. 21	453	455
455		Hydroizolační vrstva	1 den	21.05. 21	21.05. 21	454	456
456		Dlažba na terčích, zatěžovací vrstva	1 den	24.05. 21	24.05. 21	455	457FS+1
457		Montáž oplechování	1 den	26.05. 21	26.05. 21	456FS	458
458		Zámečnické výrobky vnější	1 den	27.05. 21	27.05. 21	457	465
459		**Vnější práce**	**16 dny**	**19.05. 21**	**09.06. 21**		
460		Lešení fasádní - montáž	1 den	19.05. 21	19.05. 21	436	461
461		Tep. izolace stěn	1 den	20.05. 21	20.05. 21	460	462
462		Obezdění fasády	2 dny	21.05. 21	24.05. 21	461	463
463		Klempířské prvky	1 den	25.05. 21	25.05. 21	462	464
464		Vnější žaluzie	1 den	26.05. 21	26.05. 21	463	465
465		Demontáž lešení	1 den	28.05. 21	28.05. 21	464;4	467;466
466		Předláždění chodníků - ulice	1 den	31.05. 21	31.05. 21	465	475
467		Zřízení rozvodů ESI	1 den	31.05. 21	31.05. 21	465;4	468
468		Úprava terénu - Areál	2 dny	01.06. 21	02.06. 21	467	470;469
469		Demontáž ZS	1 den	02.06. 21	02.06. 21	468FF	470
470		Rozprostření ornice, zatravnění - Areál	2 dny	03.06. 21	04.06. 21	468;4	471
471		Osázení stromů a keřů	2 dny	07.06. 21	08.06. 21	470	472FF;47
472		Montáž veřejného osvětlení	1 den	08.06. 21	08.06. 21	471FF	475
473		Zadláždění chodníku - Areál	1 den	09.06. 21	09.06. 21	471	475
474		**Zařízení staveniště - demontáž**	**1 den**	**16.06. 21**	**16.06. 21**		
475		Předání stavby	1 den	16.06. 21	16.06. 21	472;4	

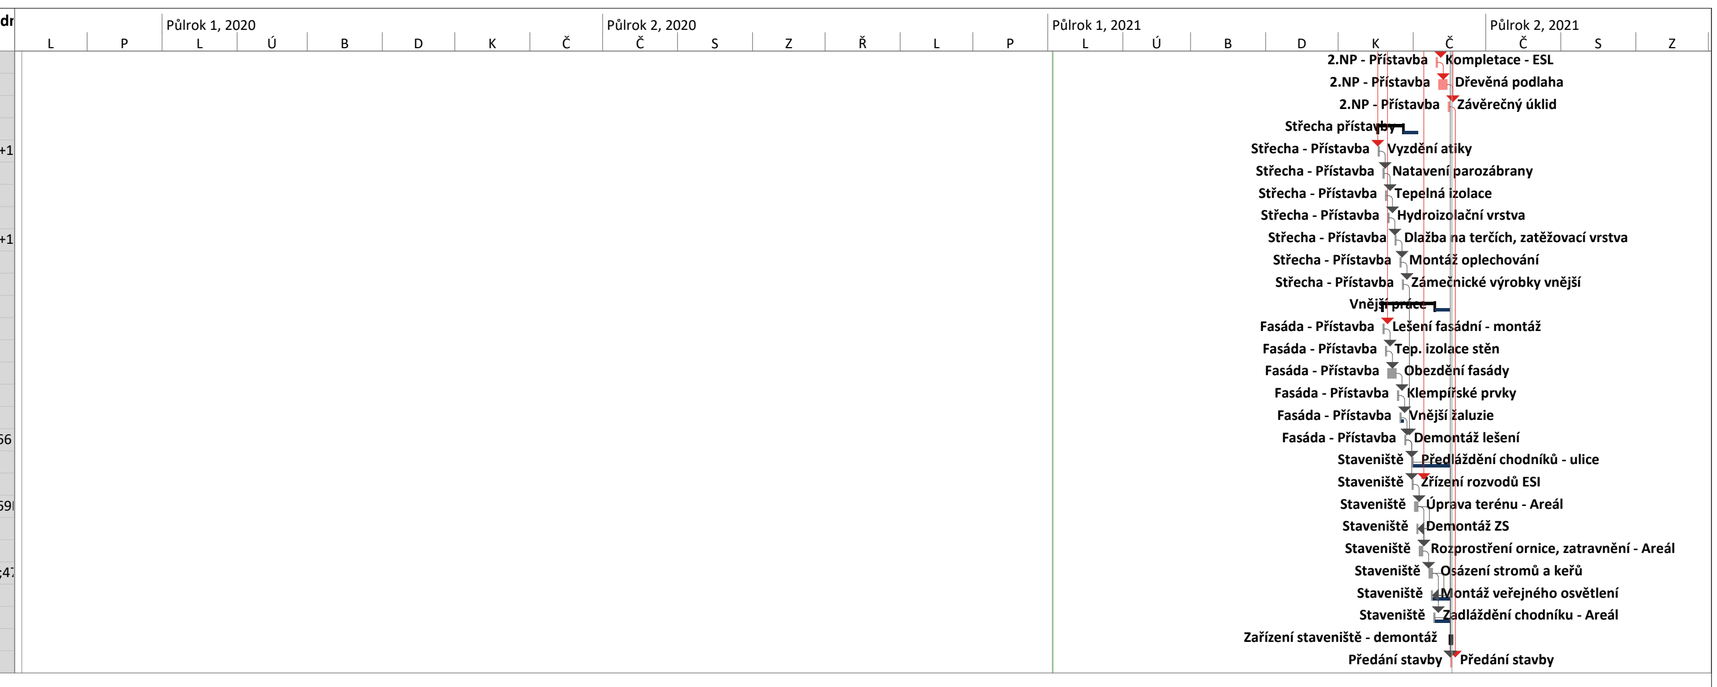

Projekt: Jindřišská 28
Datum: 28.11.2020
Autor: Bc. Sergey Yuzhakov

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník	Souhrnný úkol řídícího předchůdce	Průběh		
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín	Normální úkol předchůdce	Průběh ručně zadaného úkolu		
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Milník předchůdce	Normální úkol řídícího předchůdce	Časová rezerva		
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Milník řídícího předchůdce	Kritický			
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	Souhrnný úkol předchůdce	Kritické rozdělení			
