ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1	**SO 127 – Bytový dům C2**	**311 dny**	**01.03. 20**	**05.01. 21**		
2	*TE 00 – Přípravné a zemní práce*	***12 dny***	*01.03. 20*	*12.03. 20*		
3	Zahájení TE 00	**0 dny**	01.03. 20	01.03. 20		
4	Převzetí staveniště	**1 den**	01.03. 20	01.03. 20	3	Management
5	Vytyčení staveniště	**1 den**	01.03. 20	01.03. 20	3;4SS	Geodet
6	Vytyčení stavebních jam a rýh	**1 den**	09.03. 20	09.03. 20	12;13;5SS	Geodet
7	Výkopové práce	**3 dny**	10.03. 20	12.03. 20	6	Zemní práce
8	Dokončení TE 00	**0 dny**	12.03. 20	12.03. 20	7	
9	**SO 303 – Hrubé terénní úpravy**	**7 dny**	**01.03. 20**	**08.03. 20**		
10	Zahájení SO 303	0 dny	01.03. 20	01.03. 20	5	
11	Sejmutí orné půdy (200 mm)	3 dny	02.03. 20	04.03. 20	10SS;5	Zemní práce[2]
12	Výkopové práce	4 dny	05.03. 20	08.03. 20	11	Zemní práce[3]
13	Dokončení SO 303	0 dny	08.03. 20	08.03. 20	12FF	
14	**IO 102 – Stoky v řešeném území – Splašková kanalizace**	**4 dny**	**08.03. 20**	**12.03. 20**		
15	Zahájení IO 102	0 dny	08.03. 20	08.03. 20	12;13	
16	Přípojka kanalizace splaškové	4 dny	09.03. 20	12.03. 20	12;15SS	Profesanti ZTI[2];D
17	Dokončení IO 102	0 dny	12.03. 20	12.03. 20	16FF	
18	**IO 202 – Stoky v řešeném území – Dešťová kanalizace**	**4 dny**	**12.03. 20**	**16.03. 20**		
19	Zahájení IO 202	0 dny	12.03. 20	12.03. 20	16;17	
20	Přípojka kanalizace dešťové	4 dny	13.03. 20	16.03. 20	16;17;19SS	Profesanti ZTI[2];D
21	Dokončení IO 202	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	20FF	
22	**IO 302 – Nový vodovodní řád**	**3 dny**	**16.03. 20**	**19.03. 20**		
23	Zahájení IO 302	0 dny	16.03. 20	16.03. 20	21;20	
24	Přípojka vody pitné	3 dny	17.03. 20	19.03. 20	21;20;23SS	Profesanti ZTI[2];D
25	Dokončení IO 302	0 dny	19.03. 20	19.03. 20	24FF	
26	**IO 402 – Nový plynovodní STL řád**	**4 dny**	**19.03. 20**	**23.03. 20**		
27	Zahájení IO 402	0 dny	19.03. 20	19.03. 20	24;25	
28	Přípoja STL plynu	4 dny	20.03. 20	23.03. 20	24;25;27SS	Profesanti ZTI[2];D
29	Dokončení IO 402	0 dny	23.03. 20	23.03. 20	28FF	
30	**SO 305 – Opěrné stěny**	**17 dny**	**12.03. 20**	**29.03. 20**		
31	Zahájení SO 305	0 dny	12.03. 20	12.03. 20	7;8	
32	Výkopové práce	2 dny	13.03. 20	14.03. 20	7;8;31SS	Zemní práce
33	Armování základových pasů OS	1 den	16.03. 20	16.03. 20	32;43	Železáři[5]
34	Základová pasy OS	1 den	17.03. 20	17.03. 20	33	Betonáři[3]
35	Armování OS	3 dny	18.03. 20	20.03. 20	34	Železáři[5]
36	Bednění OS	2 dny	19.03. 20	20.03. 20	35SS+1 den	Tesaři[5]
37	Betonáž OS	1 den	21.03. 20	21.03. 20	35;36	Betonáři[3]
38	Odbednění OS	2 dny	24.03. 20	25.03. 20	37FS+2 dny	Tesaři[5]
39	Svislá hydroizolace OS	3 dny	27.03. 20	29.03. 20	38;37FS+5 dny	Izolatéři[2]
40	Dokončení SO 305	0 dny	29.03. 20	29.03. 20	39FF	
41	*TE 01 – Základy*	***65 dny***	*14.03. 20*	*18.05. 20*		
42	Zahájení TE 01	**0 dny**	14.03. 20	14.03. 20	32	
43	Výstavba stavebního věžového jeřábu – 1.1.	**1 den**	15.03. 20	15.03. 20	42SS;32	Odborná firma
44	Betonáž základovýh pasů – PB	**1 den**	30.03. 20	30.03. 20	43;39;40	Betonáři
45	Bednění základových ŽB patek	**1 den**	02.04. 20	02.04. 20	44FS+2 dny	Tesaři
46	Armování základových ŽB patek	**2 dny**	02.04. 20	03.04. 20	45SS	Železáři[3]
47	Betonáž – základové ŽB patky	**1 den**	04.04. 20	04.04. 20	45;46	Betonáři
48	Odbednění základových ŽB patek	**1 den**	07.04. 20	07.04. 20	47FS+2 dny	Tesaři
49	Bednění základových ŽB pasů	**5 dny**	03.04. 20	07.04. 20	45	Tesaři[5]
50	Armování základových ŽB pasů	**5 dny**	04.04. 20	08.04. 20	49SS;46	Železáři[5]
51	Betonáž – základové ŽB pasy	**5 dny**	09.04. 20	13.04. 20	49;50;47SS	Betonáři[3]
52	Odbednění základových ŽB pasů	**3 dny**	13.04. 20	15.04. 20	51FS-1 den	Tesaři[5]
53	Zásyp se zhutněním – mezi základy	**10 dny**	15.04. 20	24.04. 20	52FS-1 den;48	Zemní práce[3]
54	Ležatá kanalizace	**5 dny**	20.04. 20	24.04. 20	53FF;16;17;20;21	Profesanti ZTI
55	Podkladní beton pod ŽB desku	**1 den**	25.04. 20	25.04. 20	53;54	Betonáři
56	Vodorovná hydroizolace	**4 dny**	27.04. 20	30.04. 20	55FS+1 den	Izolatéři[3]
57	Bednění základové ŽB desky	**1 den**	01.05. 20	01.05. 20	56	Tesaři
58	Armování základové ŽB desky	**5 dny**	01.05. 20	05.05. 20	57SS	Železáři[5]
59	Betonáž – základová ŽB deska	**1 den**	06.05. 20	06.05. 20	58	Betonáři[3]
60	Odbednění základových desek	**1 den**	09.05. 20	09.05. 20	59FS+2 dny	Tesaři
61	Bednění základových ŽB zdí	**2 dny**	09.05. 20	10.05. 20	59FS+2 dny	Tesaři[3]
62	Armování základových ŽB zdí	**2 dny**	09.05. 20	10.05. 20	61SS	Železáři[2]
63	Betonáž – základové ŽB zdi	**1 den**	11.05. 20	11.05. 20	61;62	Betonáři
64	Odbednění základových zdí – oboustranné	**2 dny**	14.05. 20	15.05. 20	63FS+2 dny;60	Tesaři[3]
65	Svislá hydroizolace	**3 dny**	16.05. 20	18.05. 20	60;64	Izolatéři[3]
66	Podklad ze štěrkodrti	**2 dny**	25.04. 20	26.04. 20	53	Zemní práce
67	Podklad z KSC	**2 dny**	27.04. 20	28.04. 20	66	Zemní práce
68	Dokončení TE 01	**0 dny**	18.05. 20	18.05. 20	65FF	
69	*TE 02 – Hrubá spodní stavba*	***60 dny***	*18.05. 20*	*17.07. 20*		
70	Zahájení TE 02	**0 dny**	18.05. 20	18.05. 20	65;24;25;28;29;68	
71	Bednění ŽB stěny	**2 dny**	19.05. 20	20.05. 20	65;70SS	Tesaři[3]
72	Armování ŽB stěny	**2 dny**	19.05. 20	20.05. 20	71SS	Železáři[3]
73	Betonáž – nosné ŽB stěny	**1 den**	21.05. 20	21.05. 20	72;71	Betonáři[2]
74	Odbednění nosné stěny – oboustranné	**2 dny**	24.05. 20	25.05. 20	73FS+2 dny	Tesaři[3]
75	Bednění ŽB sloupy	**1 den**	19.05. 20	19.05. 20	65	Tesaři[2]
76	Armování ŽB sloupy	**2 dny**	19.05. 20	20.05. 20	75SS	Železáři[2]
77	Betonáž – ŽB sloupy	**1 den**	21.05. 20	21.05. 20	76;75	Betonáři
78	Odbednění sloupů	**1 den**	24.05. 20	24.05. 20	77FS+2 dny	Tesaři
79	Zdivo nosné	**9 dny**	19.05. 20	27.05. 20	65	Zedníci[3]
80	Ocelové zárubně a křídla – protipožární	**2 dny**	21.05. 20	22.05. 20	79SS+2 dny	Odborná firma
81	Montáž prefabrikovaných schodišťových ramen	**2 dny**	28.05. 20	29.05. 20	74;79	Betonáři;Železáři
82	Bednění ŽB průvlaků	**1 den**	30.05. 20	30.05. 20	74;79;80;78;81	Tesaři[2]
83	Armování ŽB průvlaků	**2 dny**	30.05. 20	31.05. 20	82SS	Železáři[3]
84	Bednění ŽB stropu	**9 dny**	31.05. 20	08.06. 20	82	Tesaři[5]
85	Armování ŽB stropu	**13 dny**	02.06. 20	14.06. 20	84SS+2 dny;83	Železáři[5]
86	Betonáž – ŽB průvlak	**1 den**	15.06. 20	15.06. 20	85	Betonáři
87	Betonáž – ŽB strop	**2 dny**	15.06. 20	16.06. 20	86SS	Betonáři[3]
88	Odbednění průvlků	**1 den**	24.06. 20	24.06. 20	87FS+7 dny	Tesaři
89	Odbednění stropu	**6 dny**	24.06. 20	29.06. 20	87FS+7 dny	Tesaři[4]
90	Odstranění podpěrných konstrukcí stropu	**3 dny**	15.07. 20	17.07. 20	86FS+28 dny;87FS+	Dělníci[4]
91	Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků	**1 den**	15.07. 20	15.07. 20	86FS+28 dny;87FS+	Dělníci
92	Dokončení TE 02	**0 dny**	17.07. 20	17.07. 20	91FF;90FF	
93	*TE 03 – Hrubá vrchní stavba*	***54 dny***	*17.06. 20*	*10.08. 20*		
94	Zahájení TE 03	**0 dny**	17.06. 20	17.06. 20	87FS+1 den	
95	Zabezpečovací konstrukce – zábradlí	**1 den**	18.06. 20	18.06. 20	87FS+1 den;94SS	Dělníci
96	Zdivo nosné	**9 dny**	19.06. 20	27.06. 20	95;87FS+2 dny	Zedníci[3]
97	Ocelové zárubně a křídla – protipožární	**2 dny**	21.06. 20	22.06. 20	96SS+2 dny	Odborná firma
98	Bednění ŽB průvlaků	**2 dny**	28.06. 20	29.06. 20	96;97;88	Tesaři
99	Armování ŽB průvlaků	**2 dny**	28.06. 20	29.06. 20	98SS	Železáři[3]
100	Bednění ŽB stropu	**7 dny**	30.06. 20	06.07. 20	96;89;98	Tesaři[5]
101	Armování ŽB stropu	**6 dny**	02.07. 20	07.07. 20	99;100SS+2 dny	Železáři[5]
102	Betonáž – ŽB průvlak	**1 den**	08.07. 20	08.07. 20	101;100	Betonáři
103	Betonáž – ŽB strop	**2 dny**	08.07. 20	09.07. 20	102SS;100	Betonáři[3]
104	Odbednění průvlků	**1 den**	17.07. 20	17.07. 20	103FS+7 dny	Tesaři[2]
105	Odbednění stropu	**6 dny**	17.07. 20	22.07. 20	103FS+7 dny	Tesaři[3]
106	Odstranění podpěrných konstrukcí průvlaků	**1 den**	07.08. 20	07.08. 20	103FS+28 dny;102	Dělníci
107	Odstranění podpěrných konstrukcí stropu	**4 dny**	07.08. 20	10.08. 20	103FS+28 dny;102	Dělníci[2]
108	Dokončení TE 03	**0 dny**	10.08. 20	10.08. 20	107FF;106FF	
109	*TE 04 a – Zastřešení – vegetační*	***16 dny***	*23.06. 20*	*09.07. 20*		
110	Zahájení TE 04 a	**0 dny**	23.06. 20	23.06. 20	87FS+7 dny	
111	Hydroizolace střešní kce	**7 dny**	24.06. 20	30.06. 20	110SS;87FS+7 dny	Izolatéři[3]
112	Střešní vpusti	**1 den**	24.06. 20	24.06. 20	111SS	Profesanti ZTI
113	Skladba střešní kce	**8 dny**	01.07. 20	08.07. 20	111;112	Izolatéři[3]
114	Oplechování atiky	**1 den**	09.07. 20	09.07. 20	113	Klempíři
115	Dokončení TE 04 a	**0 dny**	09.07. 20	09.07. 20	114FF	
116	*TE 04 b – Zastřešení – bez provozu*	***18 dny***	*16.07. 20*	*03.08. 20*		
117	Zahájení TE 04 b	**0 dny**	16.07. 20	16.07. 20	103FS+7 dny	
118	Zabezpečovací konstrukce – zábradlí	**1 den**	17.07. 20	17.07. 20	103FS+7 dny;117SS	Dělníci
119	Parotěsná vrstva střešní kce	**4 dny**	18.07. 20	21.07. 20	118	Izolatéři[3]
120	Střešní vpusti a prostupy	**2 dny**	18.07. 20	19.07. 20	118	Profesanti VZT;Pro
121	Skladba střešní kce	**4 dny**	22.07. 20	25.07. 20	119;120	Izolatéři[3]
122	Střešní okna	**2 dny**	18.07. 20	19.07. 20	118	Okenáři
123	Hydroizolace střešní kce	**7 dny**	26.07. 20	01.08. 20	121;122	Izolatéři[3]
124	Střešní kce – komunikace	**1 den**	02.08. 20	02.08. 20	123	Dělníci
125	Oplechování atiky a kcí	**2 dny**	02.08. 20	03.08. 20	123	Klempíři[2]
126	Dokončení TE 04 b	**0 dny**	03.08. 20	03.08. 20	125FF	
127	*TE 05 – Příčky a hrubé instalace*	***54 dny***	*17.07. 20*	*09.09. 20*		
128	Zahájení TE 05	**0 dny**	17.07. 20	17.07. 20	90	
129	**1.PP**	**23 dny**	**18.07. 20**	**09.08. 20**		
130	Příčky	**6 dny**	18.07. 20	23.07. 20	90;92;91;128SS	Zedníci[3]
131	Ocelové zárubně a křídla	**3 dny**	20.07. 20	22.07. 20	130SS+2 dny	Dodavatel dveří
132	Rozvody vody	**8 dny**	24.07. 20	31.07. 20	130	Profesanti ZTI[3]
133	Předstěnové konstrukce	**2 dny**	24.07. 20	25.07. 20	130	Profesanti ZTI
134	Rozvody kanalizace	**4 dny**	01.08. 20	04.08. 20	132;133	Profesanti ZTI[2]
135	Rozvody plynu	**2 dny**	01.08. 20	02.08. 20	132;133	Profesanti ZTI
136	Rozvody ÚT	**10 dny**	24.07. 20	02.08. 20	130	Topenáři[3]
137	Rozvody VZT	**7 dny**	24.07. 20	30.07. 20	130	Profesanti VZT[2]
138	Rozvodné skříně bytové	**1 den**	24.07. 20	24.07. 20	130	Elektrikáři
139	Rozvody SIL	**12 dny**	24.07. 20	04.08. 20	130;138FF	Elektrikáři[4]
140	Rozvody SLA	**9 dny**	24.07. 20	01.08. 20	130	Elektrikáři SLA[3]
141	Rozvody MaR	**3 dny**	05.08. 20	07.08. 20	139	Profesanti MaR;Ele
142	Přizdívky a šachetní příčky	**5 dny**	05.08. 20	09.08. 20	134;133;132	Zedníci[2]
143	Tepelná izolace rozvodů	**3 dny**	05.08. 20	07.08. 20	134;132;136;137	Profesanti VZT;Pro
144	Okenní výplně	**7 dny**	24.07. 20	30.07. 20	130	Okenáři[2]
145	**1.NP**	**30 dny**	**11.08. 20**	**09.09. 20**		
146	Příčky	**6 dny**	11.08. 20	16.08. 20	107;106;108	Zedníci[3]
147	Rozvody vody	**12 dny**	17.08. 20	28.08. 20	146	Profesanti ZTI[3]
148	Předstěnové konstrukce	**3 dny**	17.08. 20	19.08. 20	146	Profesanti ZTI
149	Rozvody kanalizace	**6 dny**	29.08. 20	03.09. 20	147;148;112	Profesanti ZTI[2]
150	Rozvody ÚT	**12 dny**	29.08. 20	09.09. 20	147;148	Topenáři[3]
151	Rozvody VZT	**5 dny**	17.08. 20	21.08. 20	146	Profesanti VZT[2]
152	Rozvodné skříně bytové	**1 den**	17.08. 20	17.08. 20	146	Elektrikáři

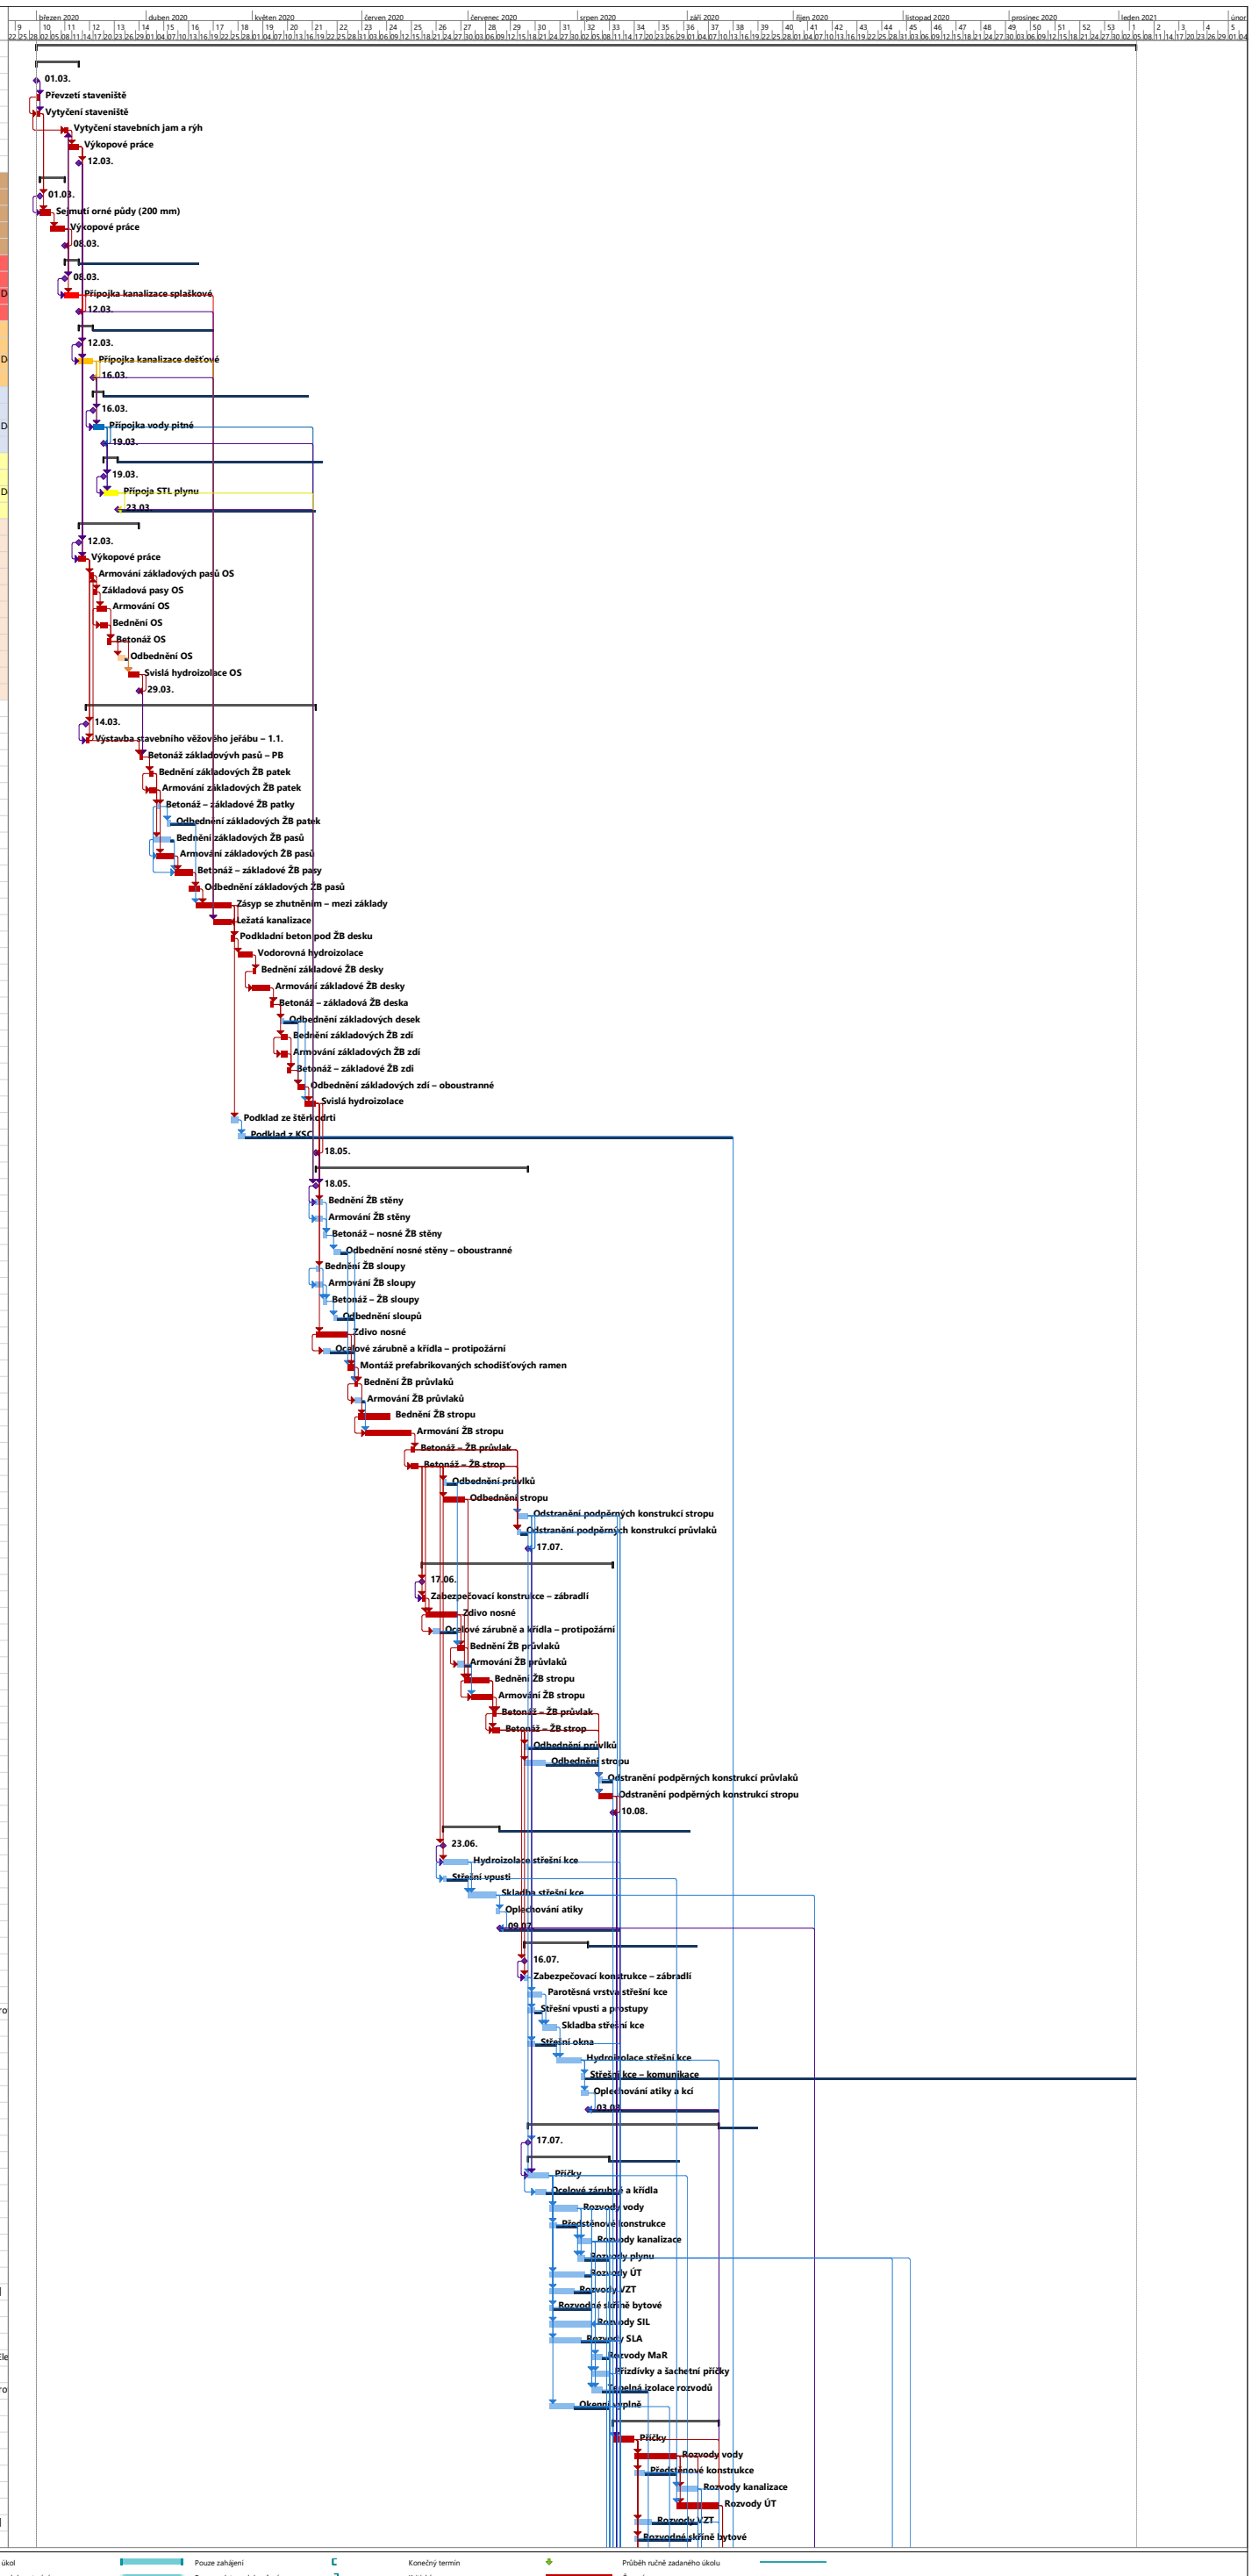

Projekt: STP_4.. Příloha č.23 - Va

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Kritický	Časová rezerva
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Kritické rozdělení	
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník	Průběh	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
153	Rozvody SIL	**16 dny**	17.08. 20	01.09. 20	146;152FF	Elektrikáři[4]
154	Rozvody SLA	**11 dny**	17.08. 20	27.08. 20	146	Elektrikáři SLA[3]
155	Rozvody MaR	**1 den**	02.09. 20	02.09. 20	153	Profesanti MaR
156	Přizdívky a šachetní příčky	**5 dny**	04.09. 20	08.09. 20	147;148;149	Zedníci[2]
157	Tepelná izolace rozvodů	**4 dny**	04.09. 20	07.09. 20	147;149;151	Profesanti VZT;Pro
158	Okenní výplně	**10 dny**	17.08. 20	26.08. 20	146	Okenáři[2]
159	Demontáž stavebního věžového jeřábu – 1.1.	**1 den**	27.08. 20	27.08. 20	158;144	Odborná firma
160	Dokončení TE 05	**0 dny**	09.09. 20	09.09. 20	159FF;150	
161	*TE 06 – Vnitřní omítky a hrubé vrstvy podlah*	***56 dny***	*09.08. 20*	*04.10. 20*		
162	Zahájení TE 06	**0 dny**	09.08. 20	09.08. 20	132;141;142	
163	**1.PP**	**21 dny**	**10.08. 20**	**30.08. 20**		
164	Montáž pomocného lešení	**1 den**	10.08. 20	10.08. 20	132;134;135;136;1	Dělníci
165	Omítky vnitřní	**8 dny**	13.08. 20	20.08. 20	132;134;135;136;1	Omítkáři[3]
166	Izolace podlah	**5 dny**	21.08. 20	25.08. 20	165;143	Podlaháři[2]
167	Roznášecí vrstva podlah	**5 dny**	26.08. 20	30.08. 20	166	Podlaháři[2]
168	Izolace stropů	**3 dny**	10.08. 20	12.08. 20	132;134;135;136;1	Dělníci[2]
169	Demontáž pomocného lešení	**1 den**	18.08. 20	18.08. 20	168;165FS-3 dny	Dělníci
170	**1.NP**	**25 dny**	**10.09. 20**	**04.10. 20**		
171	Omítky vnitřní	**11 dny**	10.09. 20	20.09. 20	146FS+20 dny;147	Omítkáři[3]
172	Izolace podlah	**7 dny**	21.09. 20	27.09. 20	171;157;166	Podlaháři[2]
173	Roznášecí vrstva podlah	**7 dny**	28.09. 20	04.10. 20	172;167	Podlaháři[2]
174	Dokončení TE 06	**0 dny**	04.10. 20	04.10. 20	173FF	
175	*TE 07 – Povrchy a technologie*	***103 dny***	*12.08. 20*	*23.11. 20*		
176	Zahájení TE 07	**0 dny**	12.08. 20	12.08. 20	90;91;140;134;168	
177	**1.PP**	**65 dny**	**13.08. 20**	**16.10. 20**		
178	Vnitřní tepelná izolace	**2 dny**	13.08. 20	14.08. 20	176SS;90;91;140;1	Fasádníci[2]
179	Štuková omítka	**3 dny**	15.08. 20	17.08. 20	178	Fasádníci[2]
180	Sekční vrata	**1 den**	15.08. 20	15.08. 20	178;168	Odborná firma[2]
181	Podhledy	**13 dny**	01.09. 20	13.09. 20	165;167FS+1 den;1	Sádrokartonáři
182	Nášlapná vrstva podlah – dlažba	**9 dny**	30.09. 20	08.10. 20	165FS+7 dny;167F	Obkladači[3]
183	Nášlapná vrstva podlah – laminát	**8 dny**	30.09. 20	07.10. 20	165FS+7 dny;167F	Podlaháři[2]
184	Nášlapná vrstva – epoxidový nátěr	**2 dny**	01.09. 20	02.09. 20	168;167FS+1 den;1	Odborná firma
185	Obklady	**8 dny**	09.10. 20	16.10. 20	182;181;165FS+7 c	Obkladači[2]
186	Kotelna	**2 dny**	03.09. 20	04.09. 20	184;167	Profesanti ZTI;Prof
187	Hlavní rozvodné skříně SIL a SLA	**1 den**	03.09. 20	03.09. 20	167;184	Elektrikáři
188	**1.NP**	**49 dny**	**06.10. 20**	**23.11. 20**		
189	Podhledy	**16 dny**	06.10. 20	21.10. 20	173FS+1 den;174;1	Sádrokartonáři
190	Nášlapná vrstva podlah – dlažba	**12 dny**	04.11. 20	15.11. 20	173FS+30 dny;171	Obkladači[3]
191	Nášlapná vrstva podlah – laminát	**12 dny**	04.11. 20	15.11. 20	173FS+30 dny;171	Podlaháři[2]
192	Obklady	**8 dny**	16.11. 20	23.11. 20	171FS+7 dny;190;1	Obkladači[3]
193	Dokončení TE 07	**0 dny**	16.10. 20	23.11. 20	192FF	
194	*TE 08 – Finální vnitřní práce a kompletace rozvodů*	***81 dny***	*09.10. 20*	*28.12. 20*		
195	Zahájení TE 08	**0 dny**	16.10. 20	16.10. 20	185	
196	**1.PP**	**34 dny**	**09.10. 20**	**11.11. 20**		
197	Malba vniřní	**10 dny**	17.10. 20	26.10. 20	181;185;179;182;1	Malíři[4]
198	Obložkové zárubně a křídla	**7 dny**	27.10. 20	02.11. 20	197	Dodavatel dveří[2]
199	Dokončovací práce podlah	**4 dny**	27.10. 20	30.10. 20	197	Podlaháři
200	Truhlářské práce	**1 den**	27.10. 20	27.10. 20	197	Truhláři
201	Zařizovací předměty	**10 dny**	17.10. 20	26.10. 20	185;182	Profesanti ZTI
202	Koncové prvky ZTI	**2 dny**	17.10. 20	18.10. 20	185;182;186	Profesanti ZTI
203	Tepelná izolace koncových rozvodů	**1 den**	27.10. 20	27.10. 20	202;197	Profesanti VZT;Pro
204	Otopná tělesa	**2 dny**	27.10. 20	28.10. 20	182;183;186;197	Topenáři
205	Koncové prvky VZT	**2 dny**	27.10. 20	28.10. 20	181;197	Profesanti VZT
206	Zrcadla	**2 dny**	17.10. 20	18.10. 20	185	Odborná firma
207	Zámečnické konstrukce	**9 dny**	09.10. 20	17.10. 20	165;182	Zámečníci
208	Nátěry plynovodního potrubí	**1 den**	29.10. 20	29.10. 20	135;202;204	Profesanti ZTI
209	Koncové prvky SIL	**3 dny**	27.10. 20	29.10. 20	197;187	Elektrikáři[2]
210	Koncové prvky SLA	**1 den**	27.10. 20	27.10. 20	197;187	Elektrikáři SLA
211	Koncové prvky MaR	**1 den**	27.10. 20	27.10. 20	197;187	Profesanti MaR
212	Úklid	**9 dny**	03.11. 20	11.11. 20	135;197;201;207;2	Uklízeči/ky
213	**1.NP**	**43 dny**	**16.11. 20**	**28.12. 20**		
214	Malba vniřní	**15 dny**	24.11. 20	08.12. 20	189;192;171FS+20	Malíři[4]
215	Obložkové zárubně a křídla	**9 dny**	09.12. 20	17.12. 20	214;198	Dodavatel dveří[2]
216	Dokončovací práce podlah	**6 dny**	09.12. 20	14.12. 20	214;199	Podlaháři
217	Truhlářské práce	**4 dny**	09.12. 20	12.12. 20	214;200;197	Truhláři
218	Zařizovací předměty	**15 dny**	24.11. 20	08.12. 20	190;192;201	Profesanti ZTI
219	Koncové prvky ZTI	**2 dny**	24.11. 20	25.11. 20	190;192;202	Profesanti ZTI
220	Tepelná izolace koncových rozvodů	**1 den**	09.12. 20	09.12. 20	219;203;214	Profesanti VZT;Pro
221	Otopná tělesa	**2 dny**	09.12. 20	10.12. 20	214;186;204	Topenáři
222	Koncové prvky VZT	**2 dny**	09.12. 20	10.12. 20	214;189	Profesanti VZT
223	Zrcadla	**2 dny**	24.11. 20	25.11. 20	192;206	Odborná firma
224	Zámečnické konstrukce	**5 dny**	16.11. 20	20.11. 20	171;190;207	Zámečníci
225	Koncové prvky SIL	**5 dny**	09.12. 20	13.12. 20	214;209	Elektrikáři[2]
226	Koncové prvky SLA	**2 dny**	09.12. 20	10.12. 20	214;210	Elektrikáři SLA
227	Koncové prvky MaR	**1 den**	09.12. 20	09.12. 20	214;211	Profesanti MaR
228	Úklid	**11 dny**	18.12. 20	28.12. 20	214;215;218;219;2	Uklízeči/ky
229	Dokončení TE 08	**0 dny**	28.12. 20	28.12. 20	228FF	
230	*TE 09 – Fasádní úpravy*	***18 dny***	*26.08. 20*	*13.09. 20*		
231	Zahájení TE 09	**0 dny**	26.08. 20	26.08. 20	158	
232	Montáž lešení	**5 dny**	27.08. 20	31.08. 20	158;231SS	Odborná firma[5]
233	Kontaktní zateplení	**5 dny**	29.08. 20	02.09. 20	232SS+2 dny	Fasádníci[5]
234	Oplechování parapetů	**2 dny**	29.08. 20	30.08. 20	232SS+2 dny	Klempíři[2]
235	Zámečnické konstrukce – zábradlí	**1 den**	29.08. 20	29.08. 20	232SS+2 dny	Zámečníci
236	Bleskosvod	**3 dny**	29.08. 20	31.08. 20	232SS+2 dny	Elektrikáři[2]
237	Omítky vnější	**7 dny**	03.09. 20	09.09. 20	233;236	Fasádníci[5]
238	Demontáž lešení	**4 dny**	10.09. 20	13.09. 20	237;233;234;235;2	Odborná firma[5]
239	Dokončení TE 09	**0 dny**	13.09. 20	13.09. 20	238FF	
240	*TE 10 – Vnější úpravy*	***29 dny***	*13.09. 20*	*12.10. 20*		
241	Zahájení TE 10	**0 dny**	13.09. 20	13.09. 20	238;239	
242	Obsyp objektu	**3 dny**	14.09. 20	16.09. 20	238;241SS	Zemní práce[2]
243	Dřevěné terasy	**10 dny**	14.09. 20	23.09. 20	238	Odborná firma[2]
244	Pletivo	**2 dny**	17.09. 20	18.09. 20	242	Dělníci;Zemní prác
245	Okapový chodník	**3 dny**	10.10. 20	12.10. 20	238;265	Dělníci;Zemní prác
246	Dlažba vnitřní	**6 dny**	14.09. 20	19.09. 20	238;67;180	Dláždiči[2]
247	Dokončení TE 10	**0 dny**	12.10. 20	12.10. 20	245FF	
248	**SO 402 – Veřejné osvětlení**	**5 dny**	**10.08. 20**	**15.08. 20**		
249	Zahájení SO 402	0 dny	10.08. 20	10.08. 20	108	
250	Rozvody SIL pro VO	4 dny	11.08. 20	14.08. 20	108;249SS	Elektrikáři[2];Zemn
251	Stožáry VO	1 den	15.08. 20	15.08. 20	250	Elektrikáři
252	Dokončení SO 402	0 dny	15.08. 20	15.08. 20	251FF	
253	**SO 201 – Komunikace v řešeném území**	**17 dny**	**19.09. 20**	**06.10. 20**		
254	Zahájení SO 201	0 dny	19.09. 20	19.09. 20	246;238;252	
255	Úprava pláně	4 dny	20.09. 20	23.09. 20	246;254SS;250;24	Zemní práce[2]
256	Drenáž	2 dny	24.09. 20	25.09. 20	255	Dělníci
257	Obrubníky	2 dny	26.09. 20	27.09. 20	256	Dělníci
258	Štěrkodrť	2 dny	28.09. 20	29.09. 20	257	Dělníci[2]
259	Cementová stabilizace	3 dny	29.09. 20	01.10. 20	258SS+1 den	Zemní práce
260	Betonová dlažba	7 dny	30.09. 20	06.10. 20	259SS+1 den	Dláždiči[3]
261	Mlatová cesta	1 den	28.09. 20	28.09. 20	255;257	Zemní práce
262	Dokončení SO 201	0 dny	06.10. 20	06.10. 20	260FF	
263	**SO 304 – Konečné terénní a sadové úpravy**	**10 dny**	**06.10. 20**	**16.10. 20**		
264	Zahájení SO 304	0 dny	06.10. 20	06.10. 20	260;238;262	
265	Zásyp OS + rozprostření ornice	3 dny	07.10. 20	09.10. 20	260;264SS;113;23	Zemní práce
266	Zatravnění	4 dny	13.10. 20	16.10. 20	265;243;245;238	Zahrádkáři[2]
267	Výsadba dřevin a rostlin	2 dny	07.10. 20	08.10. 20	260;261	Zahrádkáři
268	Dokončení SO 304	0 dny	16.10. 20	16.10. 20	266FF	
269	**SO 203 – Dopravní značení**	**2 dny**	**19.09. 20**	**21.09. 20**		
270	Zahájení SO 203	0 dny	19.09. 20	19.09. 20	246	
271	Dopravní značení	2 dny	20.09. 20	21.09. 20	246;270SS	Odborná firma
272	Dokončení SO 203	0 dny	21.09. 20	21.09. 20	271FF	
273	**SO 401 – Drobná architektura**	**2 dny**	**04.10. 20**	**06.10. 20**		
274	Zahájení SO 401	0 dny	04.10. 20	04.10. 20	260FF-2 dny	
275	Drobná architektura	2 dny	05.10. 20	06.10. 20	260FF;274SS	
276	Dokončení SO 401	0 dny	06.10. 20	06.10. 20	275FF	
277	*TE 11 – Kontrola kvality a předání stavby*	***26 dny***	*10.12. 20*	*05.01. 21*		
278	Zahájení TE 11	**0 dny**	10.12. 20	10.12. 20	221	
279	Kolaudace	**1 den**	11.12. 20	11.12. 20	278SS;221;227;23	Management
280	Předání stavby	**1 den**	05.01. 21	05.01. 21	228FS+7 dny;262;2	Management
281	Odstraňování VaN	**1 den**	05.01. 21	05.01. 21	280SS	Management
282	Dokončení TE 11	**0 dny**	05.01. 21	05.01. 21	281FF	

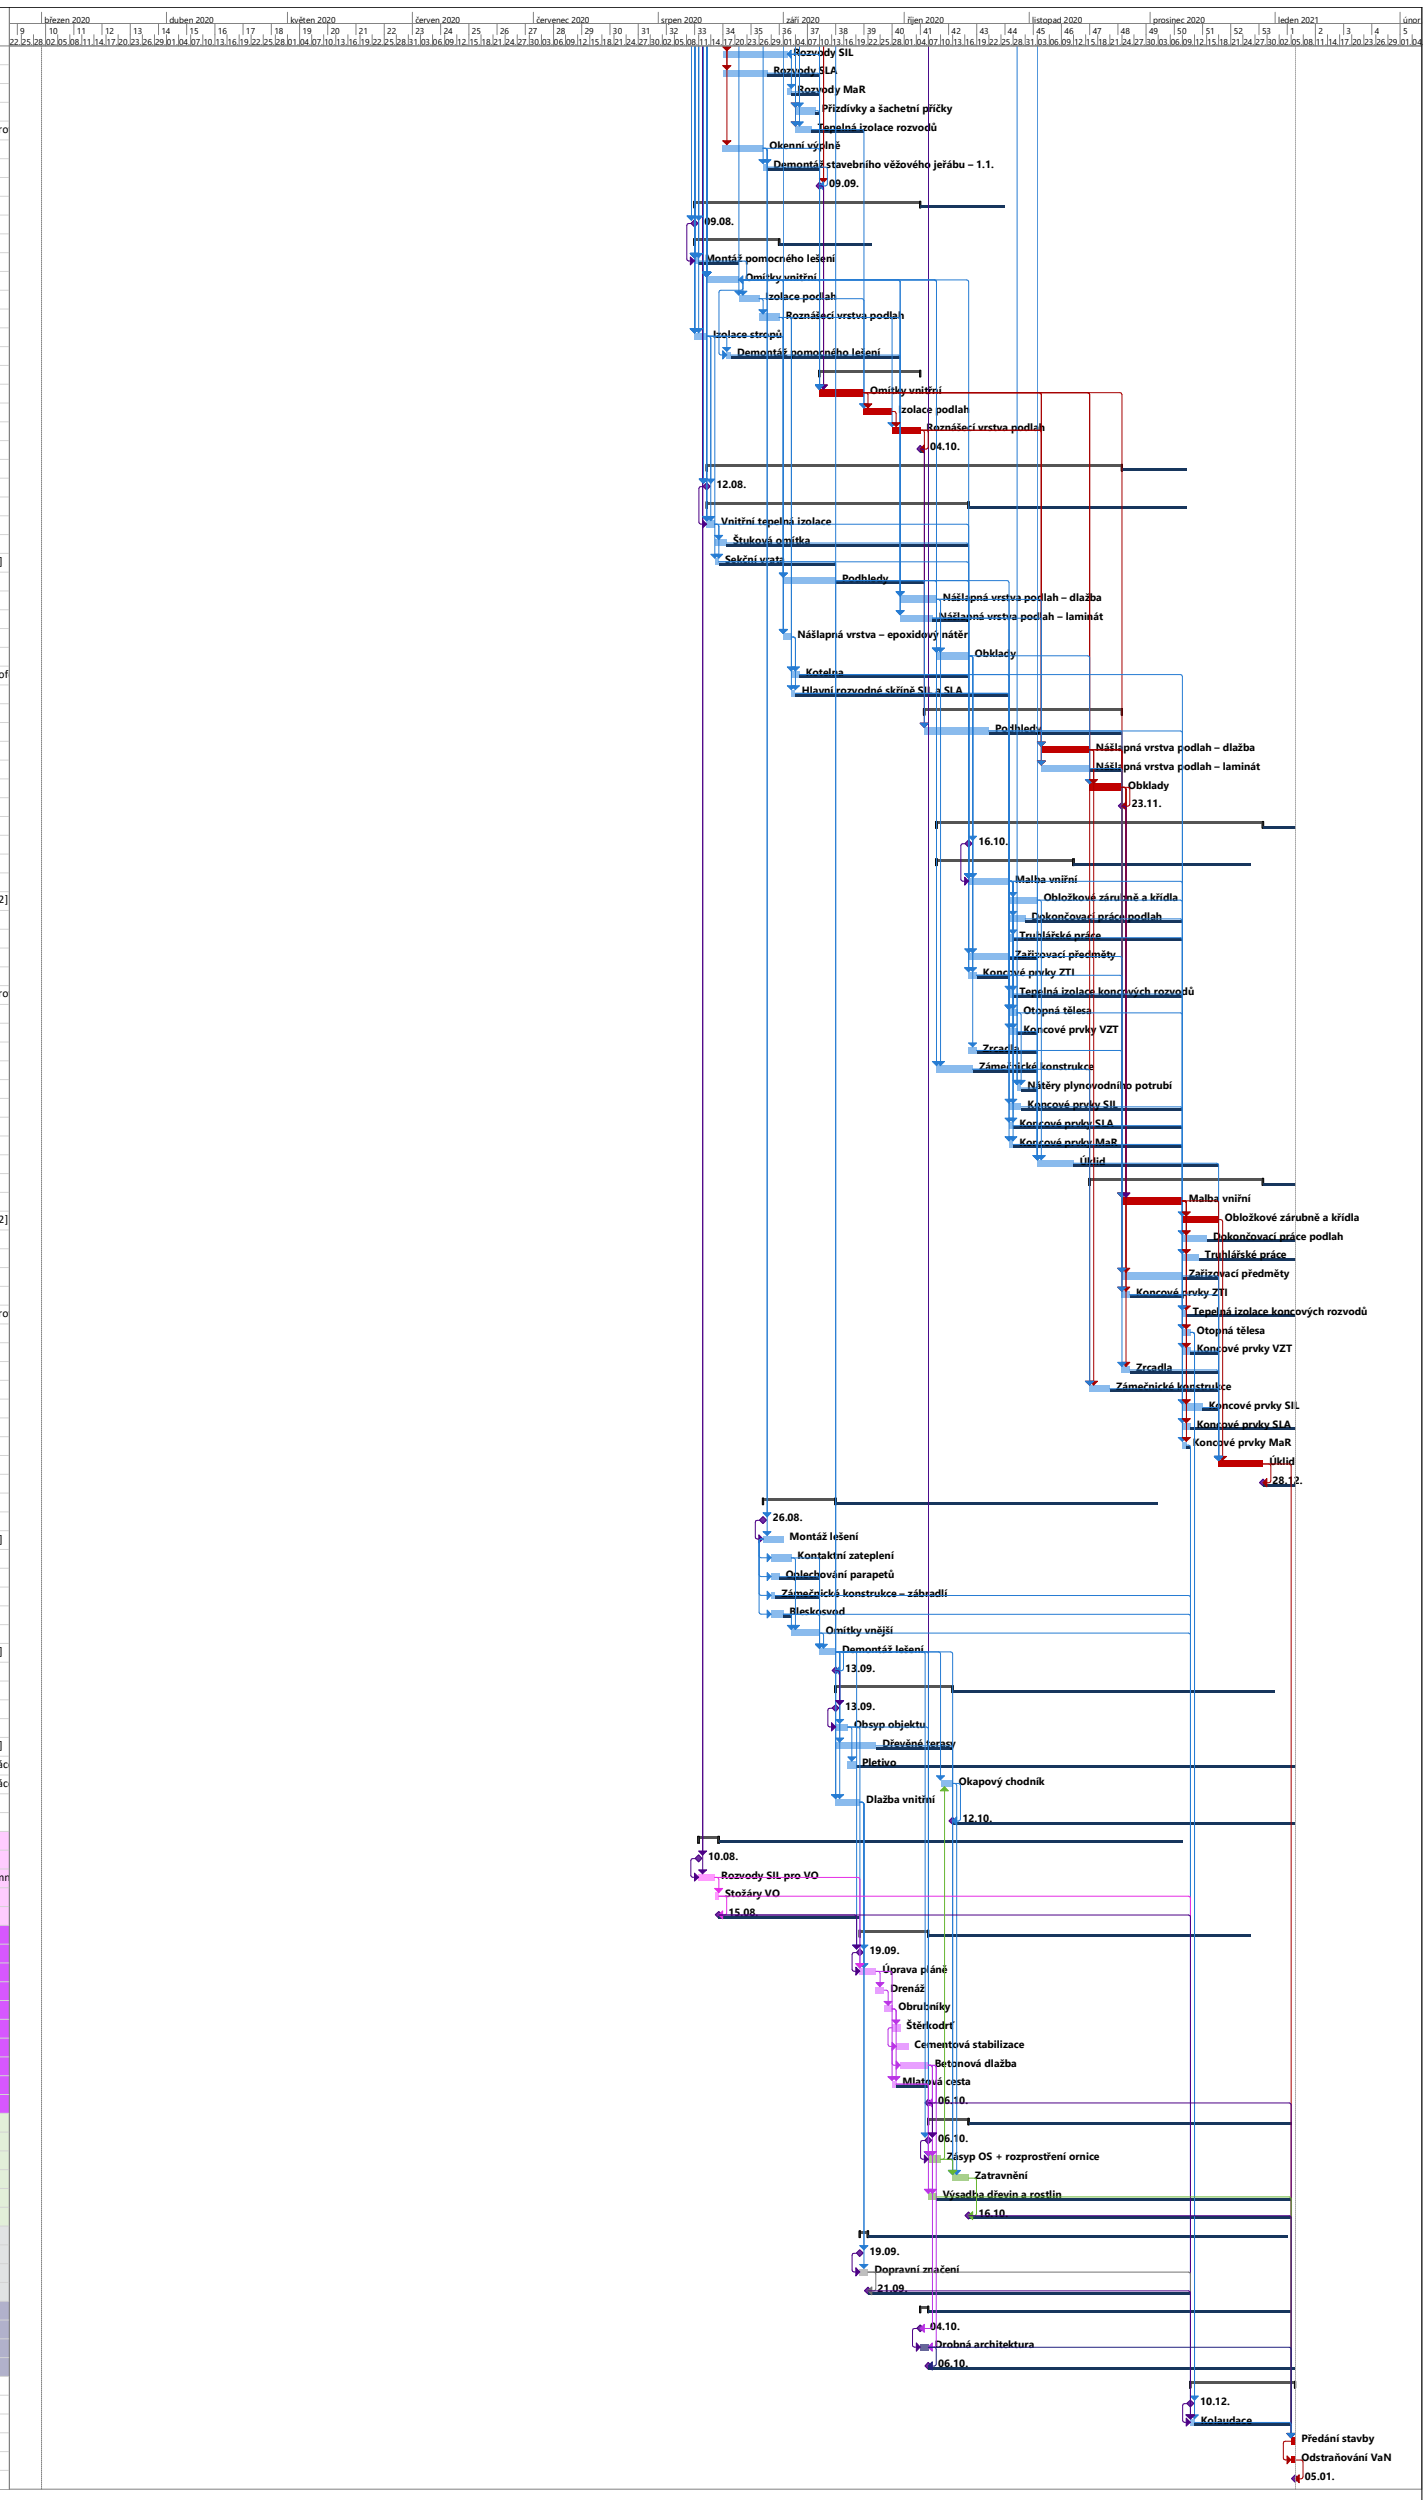

Projekt: STP_4.. Příloha č.23 - Va

Úkol	Souhrn projektu	Ruční úkol	Pouze zahájení	Konečný termín	Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	Neaktivní úkol	Pouze s dobou trvání	Pouze s datem dokončení	Kritický	Časová rezerva
Milník	Neaktivní milník	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější úkoly	Kritické rozdělení	
Souhrnný	Neaktivní souhrn	Ruční souhrn	Vnější milník	Průběh	
