ID	Milník č.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1		**Novostavba prodejního a servisního objektu prémiových automobilek s názvem Castor a Pollux, Čestlice**	**546 dny?**	**02.01. 19**	**30.06. 20**	
2		**Hrubá stavba**	**241 dny**	**02.01. 19**	**30.08. 19**	
3		Koordinační a přípravné práce, objednávání materiálu	41 dny	02.01. 19	11.02. 19	
4		Den podpisu smlouvy	0 dny	04.02. 19	04.02. 19	
5		Den zahájení - převzetí staveniště	0 dny	05.02. 19	05.02. 19	
6		Oplocení staveniště a budování zařízení staveniště	7 dny	06.02. 19	12.02. 19	5FS+1 den
7		Zahájení realizace	0 dny	18.02. 19	18.02. 19	
8		Zemní práce	87 dny	26.02. 19	23.05. 19	
9		Pilotové založení	27 dny	07.03. 19	02.04. 19	
10		Zakládání - zádkladová deska (bílá vana)	46 dny	19.03. 19	03.05. 19	
11		Železobetonové monolitické konstrukce 1.PP	28 dny	16.04. 19	13.05. 19	10FS-18 dny
12		Prefa konstrukce 1.PP (sloupy, průvlaky, stropní panely)	14 dny	30.04. 19	13.05. 19	11SS+14 dny
13		Železobetonové monolitické konstrukce 1.NP	77 dny	14.05. 19	29.07. 19	
14		Prefa konstrukce 1.NP (sloupy, průvlaky, stropní panely)	77 dny	14.05. 19	29.07. 19	
15		Prefa konstrukce 2.NP (sloupy, průvlaky, stropní panely) - část JLR	20 dny	24.05. 19	12.06. 19	8
16		Železobetonové monolitické konstrukce 2.NP	56 dny	04.06. 19	29.07. 19	
17		Prefa konstrukce 3.NP (sloupy, průvlaky, stropní panely)	28 dny	02.07. 19	29.07. 19	
18		Železobetonové monolitické konstrukce 3.NP	28 dny	02.07. 19	29.07. 19	
19		Prefa konstrukce 4.NP (sloupy, průvlaky, stropní panely)	28 dny	02.07. 19	29.07. 19	
20		Železobetonové monolitické konstrukce 4.NP	28 dny	02.07. 19	29.07. 19	
21		Zámečnické konstrukce - rampa	117 dny	06.08. 19	30.11. 19	
22		Svislé konstrukce (vyzdívky, příčky)	201 dny	14.07. 19	30.01. 20	
23		Soklové detaily	89 dny	03.10. 19	30.12. 19	
24		Vodovod areálový - pitná a užitková voda	108 dny	15.07. 19	30.10. 19	
25		Kanalizace areálová - dešťová a splašková	316 dny	06.05. 19	16.03. 20	
26		**Opce 1 - obvodový a střešní plášť**	**442 dny**	**28.02. 19**	**14.05. 20**	
27		Objednání opce 1	0 dny	28.02. 19	28.02. 19	
28		Povlakové krytiny	262 dny	30.07. 19	16.04. 20	
29		Konstrukce klempířské	175 dny	25.10. 19	16.04. 20	
30		Lehký obvodový plášť - showroom JLR	136 dny	15.07. 19	27.11. 19	
31		Uzavření objektu	0 dny	30.11. 19	30.11. 19	
32		Lehký obvodový plášť - showroom VOLVO	301 dny	21.06. 19	16.04. 20	

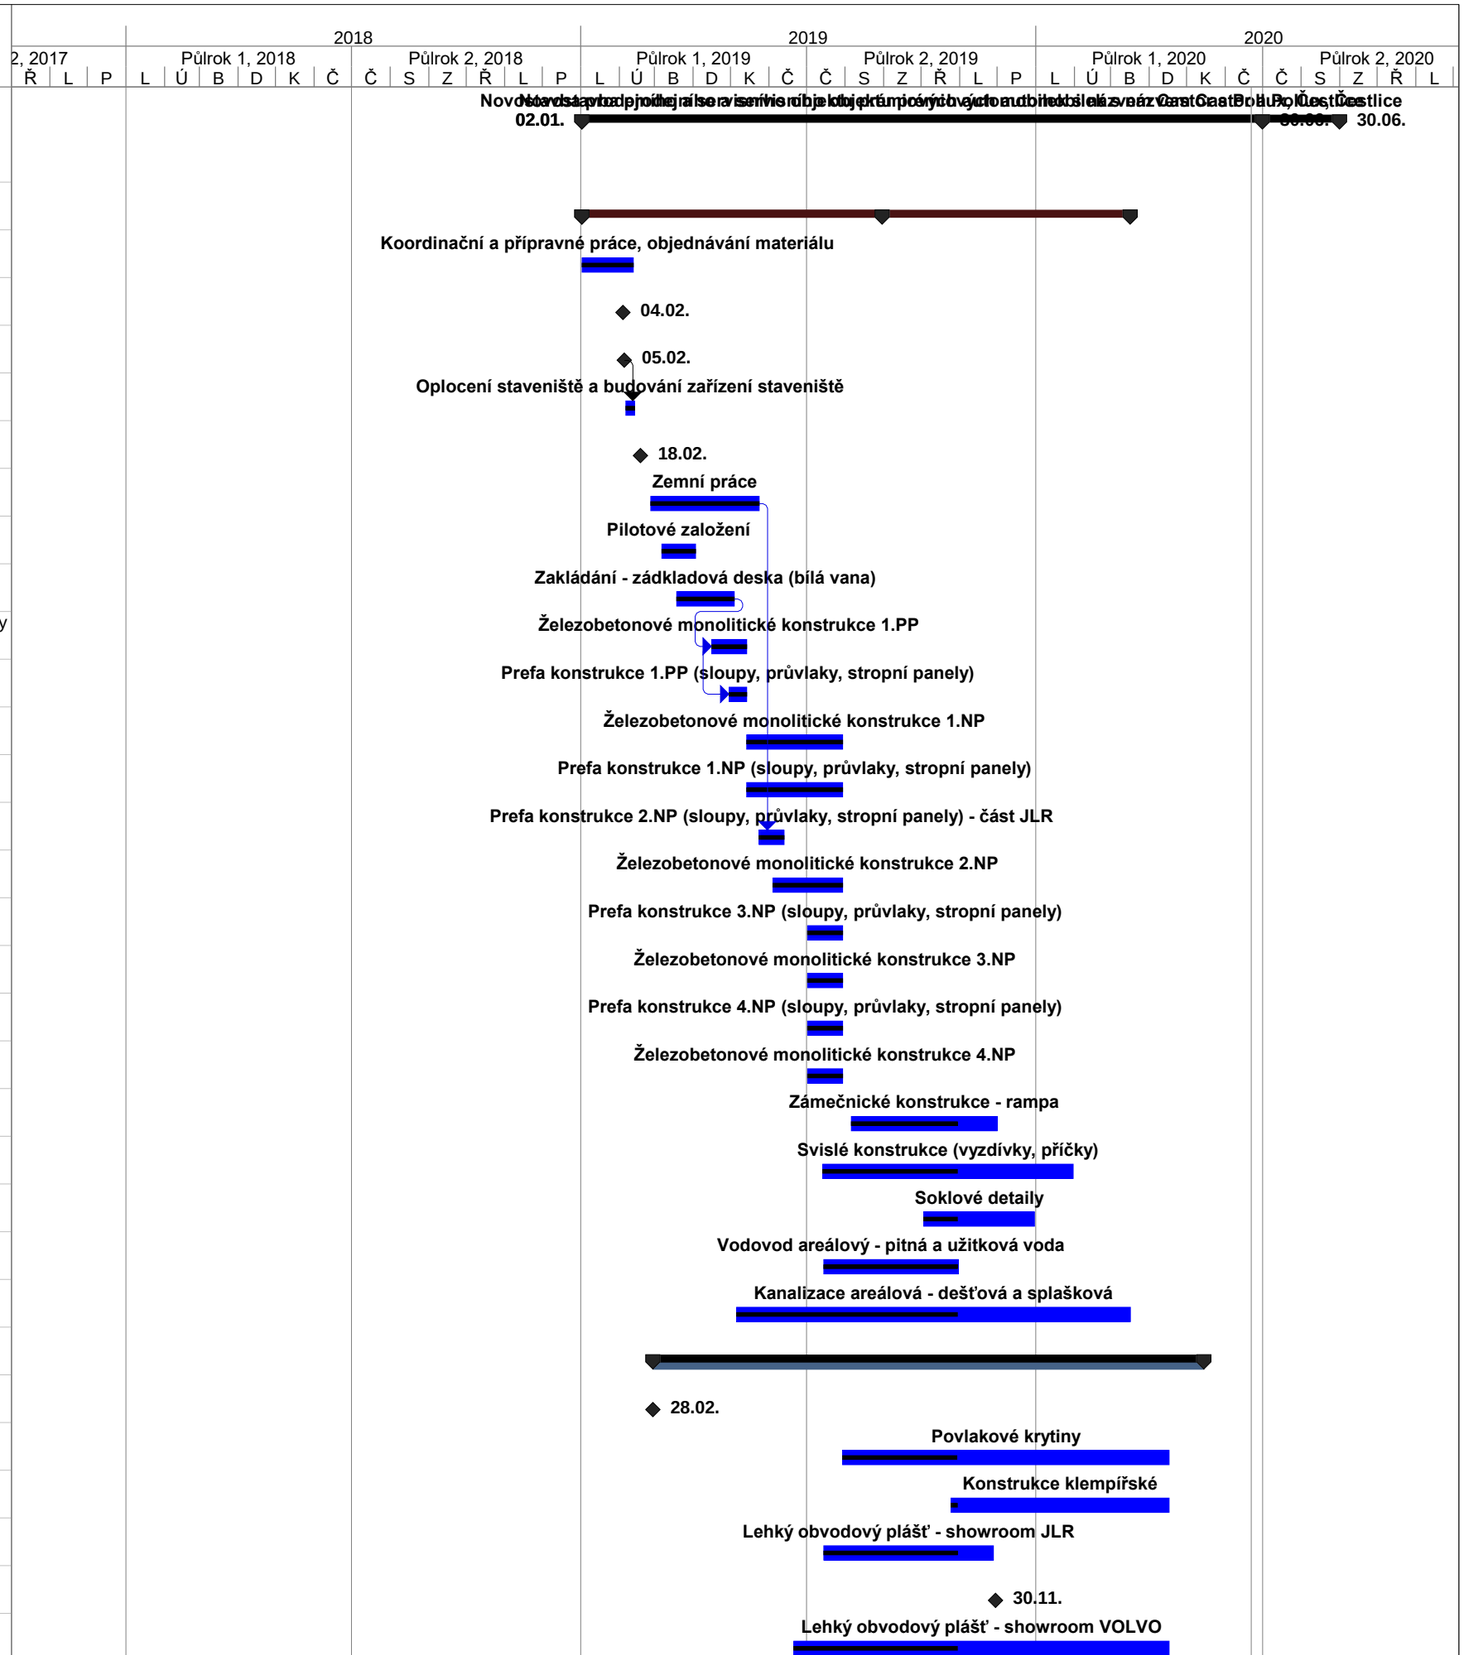

ID	Milník č.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
33		Dokončení obvodového a střešního pláště	0 dny	28.02. 19	28.02. 19	
34		Areálová komunikace JLR	92 dny	25.09. 19	25.12. 19	
35		Areálová komunikace VOLVO	130 dny	06.01. 20	14.05. 20	
36		Uzavření koncepce řešení změn opce 2	0 dny	15.03. 19	15.03. 19	
37		Uzavření koncepce řešení změn opce 2 vč. ceny	0 dny	31.03. 19	31.03. 19	
38		Objednání opce 2	0 dny	30.04. 19	30.04. 19	
39		**Opce 2 - Showroom JLR (osa 1 - 5)**	**211 dny**	**04.06. 19**	**31.12. 19**	
40		Úpravy povrchů	139 dny	28.07. 19	13.12. 19	
41		Izolace tepelné	109 dny	11.08. 19	27.11. 19	
42		Ostatní konstrukce	98 dny	07.09. 19	13.12. 19	
43		Konstrukce suché výstavby	85 dny	07.09. 19	30.11. 19	
44		Ostatní zámečnické konstrukce	142 dny	04.08. 19	23.12. 19	
45		Podlahová krytina	57 dny	18.10. 19	13.12. 19	
46		Obklady	57 dny	18.10. 19	13.12. 19	
47		Nátěry a malby	5 dny	16.12. 19	20.12. 19	
48		Dokončovací práce	5 dny	27.12. 19	31.12. 19	
49		Zdravotně technické instalace	98 dny	05.08. 19	29.12. 19	
50		Plynová zařízení	147 dny	05.08. 19	29.12. 19	
51		Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	98 dny	05.08. 19	29.12. 19	
52		Zařízení vzduchotechniky, odvod tepla a kouře	98 dny	05.08. 19	29.12. 19	
53		Zařízení silnoproudé elektrotechniky a uzemnění, slaboproudé systémy, měření a regulace	98 dny	05.08. 19	29.12. 19	
54		Dokončení showroomu JLR pro audit inspektora	0 dny	31.12. 19	31.12. 19	
55		**Opce 2 - Showroom VOLVO a servisní část (osa 5 - 19)**	**361 dny**	**04.06. 19**	**29.05. 20**	
56		Úpravy povrchů	189 dny	24.08. 19	28.02. 20	
57		Izolace tepelné	164 dny	18.09. 19	28.02. 20	
58		Ostatní konstrukce	75 dny	23.11. 19	05.02. 20	
59		Konstrukce suché výstavby	98 dny	23.11. 19	28.02. 20	
60		Konstrukce rampy a patra (hlavní objekt)	151 dny	02.07. 19	29.11. 19	
61		Ostatní zámečnické konstrukce	281 dny	04.08. 19	10.05. 20	
62		Podlahová krytina	77 dny	09.02. 20	25.04. 20	
63		Obklady	77 dny	09.02. 20	25.04. 20	
64		Nátěry a malby	30 dny	16.04. 20	15.05. 20	

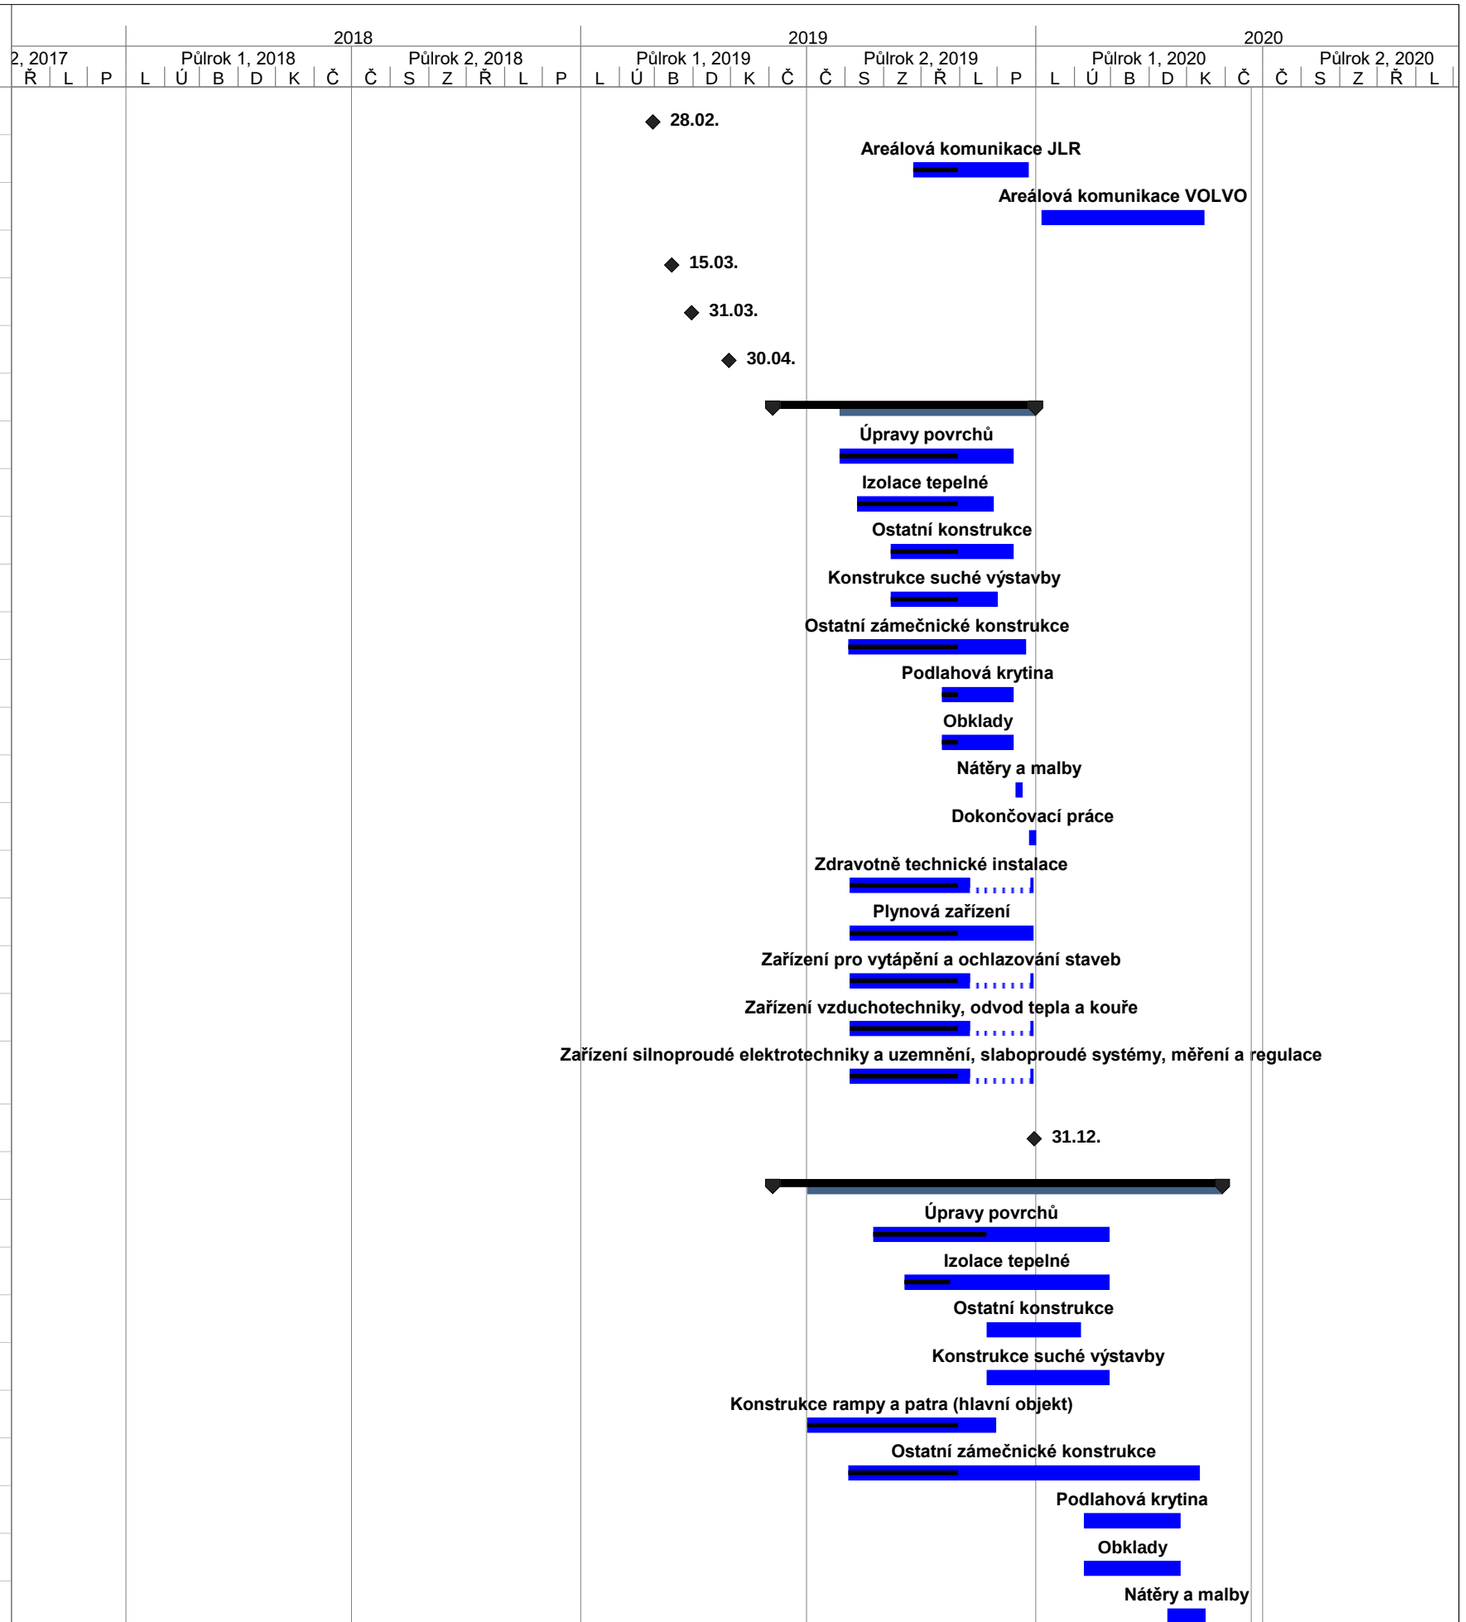
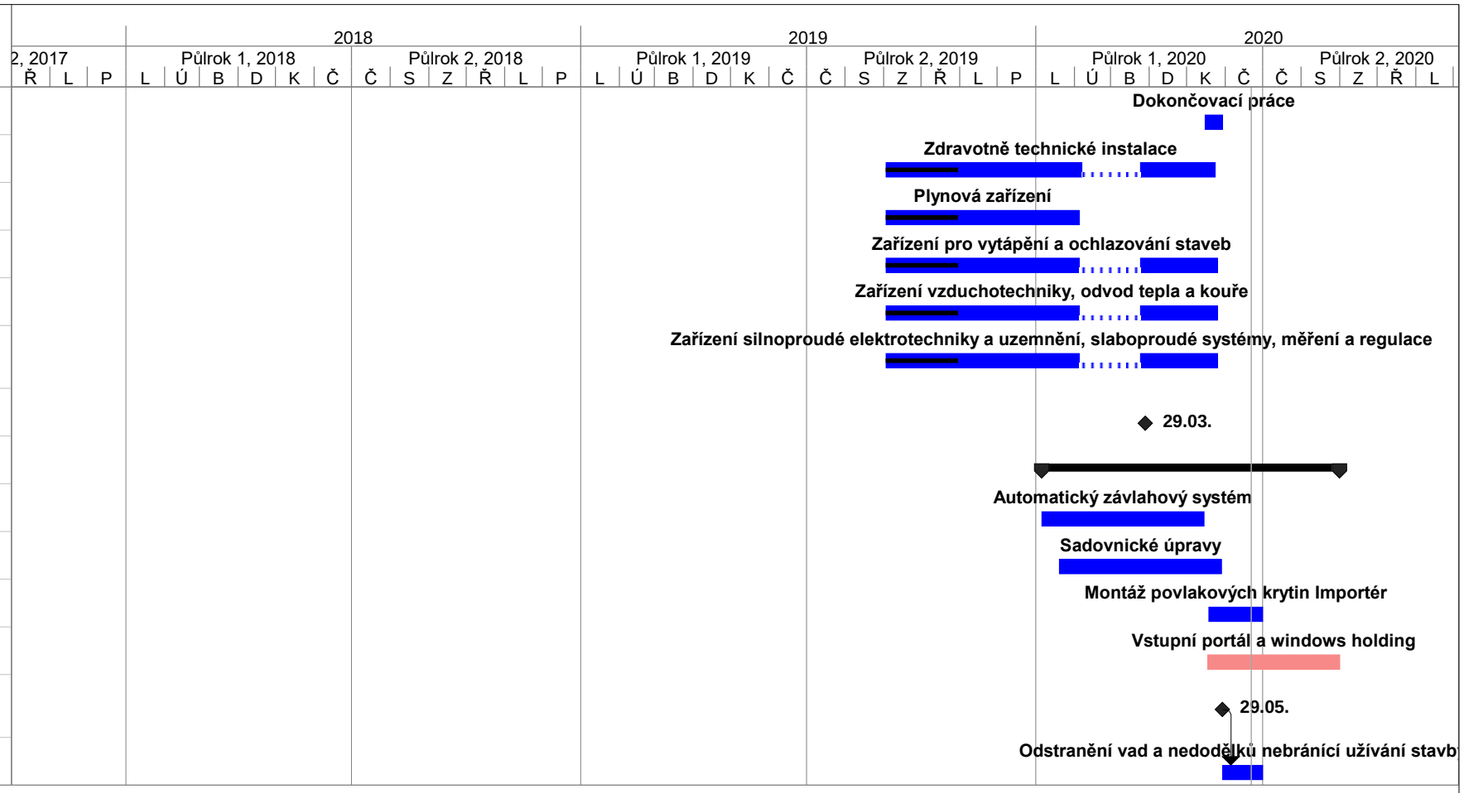
ID	Milník č.	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
65		Dokončovací práce	14 dny	16.05. 20	29.05. 20	
66		Zdravotně technické instalace	217 dny	03.09. 19	23.05. 20	
67		Plynová zařízení	155 dny	03.09. 19	04.02. 20	
68		Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	217 dny	03.09. 19	25.05. 20	
69		Zařízení vzduchotechniky, odvod tepla a kouře	217 dny	03.09. 19	25.05. 20	
70		Zařízení silnoproudé elektrotechniky a uzemnění, slaboproudé systémy, měření a regulace	217 dny	03.09. 19	25.05. 20	
71		Příprava pro montáž Technologie (SO90.01 D1.4.12)	0 dny	29.03. 20	29.03. 20	
72		**Opce 2 - Automatický závlahový systém a sadovnické úpravy**	**239 dny?**	**06.01. 20**	**31.08. 20**	
73		Automatický závlahový systém	130 dny	06.01. 20	14.05. 20	
74		Sadovnické úpravy	130 dny	20.01. 20	28.05. 20	
75		Montáž povlakových krytin Importér	43 dny?	19.05. 20	30.06. 20	
76		Vstupní portál a windows holding	106 dny?	18.05. 20	31.08. 20	
77		Den dokončení - předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránící užívání stavby	0 dny	29.05. 20	29.05. 20	
78		Odstranění vad a nedodělků nebránící užívání stavby	32 dny	30.05. 20	30.06. 20	77
