ID	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	**BD Bohdalec**	**321 dny**	**1.3. 17 13.6. 18**			
2	**Práce na ZS**	**11 dny**	**1.3. 17 15.3. 17**			
3	převzetí staveniště	1 den	1.3. 17 1.3. 17			4
4	vytýčení stavby, oplocení	2 dny	2.3. 17 3.3. 17	3		10
5	el. Rozvaděč	2 dny	8.3. 17 9.3. 17	10		11
6	zařízení staveniště	1 den	8.3. 17 8.3. 17	10		7
7	vodní přípojka	4 dny	9.3. 17 14.3. 17	6		8FF+1 den
8	kanalizační přípojka	2 dny	14.3. 17 15.3. 17	7FF+1 den		13
9	**Stavební jáma**	**54 dny**	**6.3. 17 24.5. 17**			
10	sejmutí ornice + uložení	2 dny	6.3. 17 7.3. 17	4		6;5
11	srovnání terénu	1 den	10.3. 17 10.3. 17	5		12
12	zajištění stavební jámy 1.PP	16 dny	13.3. 17 3.4. 17	11		13SS+4 dny
13	výkop 1.PP + piloty	12 dny	17.3. 17 3.4. 17	12SS+4 dny;8		14FS-1 den
14	zajištění stavební jámy 2-4PP	34 dny	3.4. 17 24.5. 17	13FS-1 den		15SS+4 dny;24
15	výkop 2-4PP + piloty	27 dny	7.4. 17 19.5. 17	14SS+4 dny		21FS-5 dny;32;17SS+1 den
16	**základy**	**49 dny**	**10.4. 17 21.6. 17**			
17	1.PP rozvod kanalizace + začištění spáry	2 dny	10.4. 17 11.4. 17	15SS+1 den		18FS+2 dny
18	1.PP podkladní beton	3 dny	18.4. 17 20.4. 17	17FS+2 dny		19FS+6 dny
19	1.PP hydroizolace	4 dny	2.5. 17 5.5. 17	18FS+6 dny		20
20	1.PP základová deska	8 dny	9.5. 17 18.5. 17	19		30FS+1 den
21	ležaté rozvody kanalizace 3.PP	1 den	15.5. 17 15.5. 17	15FS-5 dny		22
22	rovnání základové spáry 3.PP	1 den	16.5. 17 16.5. 17	21		23FS+1 den
23	podkladní betony 3.PP	3 dny	18.5. 17 22.5. 17	22FS+1 den		
24	ležaté rozvody kanalizace 4.PP	2 dny	25.5. 17 26.5. 17	14		25
25	rovnání základové spáry 4.PP	1 den	29.5. 17 29.5. 17	24		26
26	podkladní betony 4.PP	3 dny	30.5. 17 1.6. 17	25		27FS+1 den
27	hydroizolace	4 dny	5.6. 17 8.6. 17	26FS+1 den		28FS-1 den
28	4.PP základová deska	10 dny	8.6. 17 21.6. 17	27FS-1 den		33
29	**Hrubá spodní stavba**	**128 dny**	**22.5. 17 21.11. 17**			
30	stavba jeřábu	1 den	22.5. 17 22.5. 17	20FS+1 den		33
31	**4.PP**	**52 dny**	**22.5. 17 3.8. 17**			
32	přečerpávací nádrž a potrubí	18 dny	22.5. 17 14.6. 17	15		215
33	hydroizolace	7 dny	22.6. 17 30.6. 17	28;30		34FS-3 dny
34	monolit svislé kce	11 dny	28.6. 17 14.7. 17	33FS-3 dny		35
35	monolit vodorovné kce	14 dny	17.7. 17 3.8. 17	34		67FF+1 den;75FS+28 dny;82FS+7 dny;74;37
36	**3.PP**	**23 dny**	**4.8. 17 5.9. 17**			
37	hydroizolace	7 dny	4.8. 17 14.8. 17	35		38FS-3 dny
38	monolit svislé kce	11 dny	10.8. 17 24.8. 17	37FS-3 dny		69FF-1 den;85FS+28 dny;84;39
39	monolit vodorovné kce	8 dny	25.8. 17 5.9. 17	38		69FF-1 den;85FS+28 dny;84;41
40	**2.PP**	**23 dny**	**6.9. 17 9.10. 17**			
41	hydroizolace	6 dny	6.9. 17 13.9. 17	39		42FS-1 den
42	monolit svislé kce	10 dny	13.9. 17 26.9. 17	41FS-1 den		43
43	monolit vodorovné kce	8 dny	27.9. 17 9.10. 17	68;42		70FS-1 den;95FS+2 dny;94;45
44	**1.PP**	**30 dny**	**10.10. 17 21.11. 17**			
45	hydroizolace	5 dny	10.10. 17 16.10. 17	43		46FS-3 dny
46	monolit svislé kce	12 dny	12.10. 17 27.10. 17	45FS-3 dny		71FS+3 dny;105FS+3 dny;47
47	monolit vodorovné kce obytná část	8 dny	30.10. 17 8.11. 17	46		71FS+3 dny;105FS+3 dny;51;48
48	monolit vodorovné kce garáž	8 dny	9.11. 17 21.11. 17	47		
49	**Hrubá vrchní stavba**	**150 dny**	**12.7. 17 13.2. 18**			
50	**1.NP**	**28 dny**	**9.11. 17 19.12. 17**			
51	monolit svislé kce	5 dny	9.11. 17 15.11. 17	47		52;53
52	zdění nosných stěn	5 dny	16.11. 17 23.11. 17	51		120;53
53	monolit vodorovné kce	8 dny	24.11. 17 5.12. 17	70;52;51		56;114;115;116;212FS+40 dny
54	monolit venků nad garáží	7 dny	11.12. 17 19.12. 17	56		221
55	**2.NP**	**16 dny**	**6.12. 17 29.12. 17**			
56	monolit svislé kce	3 dny	6.12. 17 8.12. 17	53		58;57;54
57	zdění nosných stěn	5 dny	11.12. 17 15.12. 17	56		58
58	monolit vodorovné kce	8 dny	18.12. 17 29.12. 17	56;57		124FS+10 dny;125FS+11 dny;123;130FS+10 dny;220;60
59	**3.NP**	**13 dny**	**2.1. 18 18.1. 18**			
60	monolit svislé kce	3 dny	2.1. 18 4.1. 18	58		62;61
61	zdění nosných stěn	2 dny	5.1. 18 8.1. 18	60		62
62	monolit vodorovné kce	8 dny	9.1. 18 18.1. 18	60;61		64;132;133FS+15 dny;134FS+16 dny
63	**Střecha**	**18 dny**	**19.1. 18 13.2. 18**			
64	monolit	8 dny	19.1. 18 30.1. 18	62		65
65	zateplení + hydroizolace	10 dny	31.1. 18 13.2. 18	64		138;139
66	**Opěrné stěny**	**105 dny**	**12.7. 17 7.12. 17**			
67	monolit stěn č. 1 a 4	18 dny	12.7. 17 4.8. 17	35FF+1 den		68FS+5 dny
68	zásyp opěrných stěn č. 1 a 4	5 dny	14.8. 17 18.8. 17	67FS+5 dny		226;43
69	monolit stěn č.2 a 3	9 dny	23.8. 17 4.9. 17	38FF-1 den;39FF-1 den		70FS+20 dny
70	zásyp opěrných stěn č. 2, 3 a 5	5 dny	9.10. 17 13.10. 17	43FS-1 den;69FS+20 dny		226;53
71	monolit stěny č. 6	8 dny	14.11. 17 24.11. 17	46FS+3 dny;47FS+3 dny		72FS+7 dny
72	zásyp opěrné stěny č. 6	2 dny	6.12. 17 7.12. 17	71FS+7 dny		226
73	**Hrubé vnitřní práce**	**153 dny**	**15.8. 17 22.3. 18**			
74	**4.PP**	**68 dny**	**15.8. 17 20.11. 17**	**35**		**142**
75	vyzdění stěn	3 dny	13.9. 17 15.9. 17	35FS+28 dny		76;77;83
76	vyzdění příček	5 dny	18.9. 17 22.9. 17	75		81FS-1 den;83FS-1 den
77	montáž fasádních výplní	2 dny	18.9. 17 19.9. 17	75		78
78	sádrová omítka	10 dny	30.10. 17 10.11. 17	80;77;83;82;81		79FS+1 den;143;144FS+20 dny
79	hrubá skladba podlahy	4 dny	14.11. 17 20.11. 17	78FS+1 den		145FS+28 dny;146FS+28 dny;149FS+35 dny
80	**TZB a elektro**	**53 dny**	**15.8. 17 27.10. 17**			**78**
81	rozvody ZTI	25 dny	22.9. 17 27.10. 17	76FS-1 den		91;78
82	rozvody VZT	6 dny	15.8. 17 22.8. 17	35FS+7 dny		92;78
83	rozvod elektro	17 dny	22.9. 17 17.10. 17	75;76FS-1 den		93;78
84	**3.PP**	**74 dny**	**6.9. 17 20.12. 17**	**38;39**		**152**
85	vyzdění stěn	3 dny	17.10. 17 19.10. 17	38FS+28 dny;39FS+28 dny		86;87
86	vyzdění příček	7 dny	20.10. 17 30.10. 17	85		93
87	montáž fasádních výplní	3 dny	20.10. 17 24.10. 17	85		88
88	sádrová omítka	10 dny	29.11. 17 12.12. 17	90;91;92;93;87		89FS+1 den;153;154FS+20 dny
89	hrubá skladba podlahy	5 dny	14.12. 17 20.12. 17	88FS+1 den		155FS+28 dny;156FS+28 dny;159FS+35 dny
90	**TZB a elektro**	**58 dny**	**6.9. 17 28.11. 17**			**88**
91	rozvody ZTI	21 dny	30.10. 17 28.11. 17	81		88;101
92	rozvody VZT	6 dny	6.9. 17 13.9. 17	82		102;88
93	rozvod elektro	15 dny	31.10. 17 21.11. 17	83;86		103;88
94	**2.PP**	**72 dny**	**10.10. 17 23.1. 18**	**43**		**162**
95	vyzdění stěn	3 dny	12.10. 17 16.10. 17	43FS+2 dny		97;96;103
96	vyzdění příček	6 dny	17.10. 17 24.10. 17	95		101FF+4 dny;103
97	montáž fasádních výplní	4 dny	17.10. 17 20.10. 17	95		98
98	sádrová omítka	10 dny	3.1. 18 16.1. 18	100;102;103;101;97		99;163;164FS+10 dny
99	hrubá skladba podlahy	5 dny	17.1. 18 23.1. 18	98		165FS+20 dny;166FS+28 dny;169FS+25 dny
100	**TZB a elektro**	**57 dny**	**10.10. 17 2.1. 18**			**98**
101	rozvody ZTI	22 dny	29.11. 17 2.1. 18	96FF+4 dny;91		98;111
102	rozvody VZT	6 dny	10.10. 17 17.10. 17	92		112;98
103	rozvod elektro	11 dny	22.11. 17 6.12. 17	93;95;96		113;98
104	**1.PP**	**87 dny**	**18.10. 17 21.2. 18**			**172**
105	vyzdění stěn	3 dny	14.11. 17 16.11. 17	46FS+3 dny;47FS+3 dny		106;107;111;113
106	vyzdění příček	6 dny	20.11. 17 27.11. 17	105		113
107	montáž fasádních výplní	4 dny	20.11. 17 23.11. 17	105		108
108	sádrová omítka	10 dny	2.2. 18 15.2. 18	110;113;112;111;107		109;173;174FS+10 dny
109	hrubá skladba podlahy	4 dny	16.2. 18 21.2. 18	108		175FS+20 dny;179FS+20 dny
110	**TZB a elektro**	**73 dny**	**18.10. 17 1.2. 18**			**108**
111	rozvody ZTI	22 dny	3.1. 18 1.2. 18	105;101		138;108
112	rozvody VZT	6 dny	18.10. 17 25.10. 17	102		121;108
113	rozvod elektro	11 dny	7.12. 17 21.12. 17	103;105;106		122;108
114	**1.NP**	**38 dny**	**6.12. 17 31.1. 18**	**53**		**182**
115	vyzdění příček	4 dny	6.12. 17 11.12. 17	53		122
116	montáž fasádních výplní	3 dny	6.12. 17 8.12. 17	53		117
117	sádrová omítka	10 dny	11.1. 18 24.1. 18	119;120;121;122;116		118;183;184FS+10 dny
118	hrubá skladba podlahy	5 dny	25.1. 18 31.1. 18	117		185FS+20 dny;188FS+18 dny
119	**TZB a elektro**	**23 dny**	**6.12. 17 10.1. 18**			**117**
120	rozvody ZTI	23 dny	6.12. 17 10.1. 18	52		117;129
121	rozvody VZT	6 dny	6.12. 17 13.12. 17	112		117;130
122	rozvod elektro	11 dny	22.12. 17 10.1. 18	113;115		131;117
123	**2.NP**	**40 dny**	**16.1. 18 12.3. 18**	**58**		**191;217**
124	vyzdění příček	3 dny	16.1. 18 18.1. 18	58FS+10 dny		129;131
125	montáž fasádních výplní	4 dny	17.1. 18 22.1. 18	58FS+11 dny		126
126	sádrová omítka	10 dny	20.2. 18 5.3. 18	128;125;131;130;129		127;192;193FS+10 dny;214
127	hrubá skladba podlahy	5 dny	6.3. 18 12.3. 18	126		194FS+20 dny;197FS+15 dny
128	**TZB a elektro**	**25 dny**	**16.1. 18 19.2. 18**			**126**
129	rozvody ZTI	22 dny	19.1. 18 19.2. 18	124;120		215;126
130	rozvody VZT	6 dny	16.1. 18 23.1. 18	121;58FS+10 dny		139;126
131	rozvod elektro	10 dny	19.1. 18 1.2. 18	122;124		140;126
132	**3.NP**	**30 dny**	**9.2. 18 22.3. 18**	**62**		**200;217**
133	vyzdění příček	2 dny	9.2. 18 12.2. 18	62FS+15 dny		140
134	montáž fasádních výplní	2 dny	12.2. 18 13.2. 18	62FS+16 dny		135
135	sádrová omítka	8 dny	7.3. 18 16.3. 18	137;134;139;138;140		136FS+2 dny;201;202FS+10 dny;214
136	hrubá skladba podlahy	2 dny	21.3. 18 22.3. 18	135FS+2 dny		203FS+19 dny;206FS+14 dny
137	**TZB a elektro**	**16 dny**	**13.2. 18 6.3. 18**			**135**
138	rozvody ZTI	15 dny	14.2. 18 6.3. 18	111;65		215;135
139	rozvody VZT	6 dny	14.2. 18 21.2. 18	130;65		135
140	rozvod elektro	9 dny	13.2. 18 23.2. 18	133;131		211;216;135
141	**Dokončovací práce**	**110 dny**	**21.11. 17 30.4. 18**			**217**
142	**4.PP**	**44 dny**	**21.11. 17 24.1. 18**	**74**		**217**
143	VZT - rekup. Rozvody	7 dny	21.11. 17 29.11. 17	78		147
144	keramický obklad	3 dny	12.12. 17 14.12. 17	78FS+20 dny		147;150
145	keramická dlažba	6 dny	3.1. 18 10.1. 18	79FS+28 dny		150
146	chem. nátěr sklepů	1 den	3.1. 18 3.1. 18	79FS+28 dny		210FS+2 dny
147	SDK podhledy	5 dny	15.12. 17 21.12. 17	144;143		148FS-2 dny
148	malba 1	6 dny	20.12. 17 29.12. 17	147FS-2 dny		151
149	dřevěná podlaha	4 dny	12.1. 18 17.1. 18	79FS+35 dny		150
150	montáž zárubní a dveří	2 dny	18.1. 18 19.1. 18	144;145;149		151
151	malba 2	3 dny	22.1. 18 24.1. 18	150;148		217
152	**3.PP**	**44 dny**	**21.12. 17 23.2. 18**	**84**		**217**
153	VZT - rekup. Rozvody	8 dny	21.12. 17 4.1. 18	88		157
154	keramický obklad	6 dny	15.1. 18 22.1. 18	88FS+20 dny		157;160
155	keramická dlažba	6 dny	2.2. 18 9.2. 18	89FS+28 dny		160
156	chem. nátěr sklepů	1 den	2.2. 18 2.2. 18	89FS+28 dny		160FS+2 dny
157	SDK podhledy	3 dny	23.1. 18 25.1. 18	153;154		158
158	malba 1	6 dny	26.1. 18 2.2. 18	157		161
159	dřevěná podlaha	3 dny	13.2. 18 15.2. 18	89FS+35 dny		160
160	montáž zárubní a dveří	3 dny	16.2. 18 20.2. 18	159;154;155;156FS+2 dny		161
161	malba 2	3 dny	21.2. 18 23.2. 18	158;160		217
162	**2.PP**	**36 dny**	**24.1. 18 14.3. 18**	**94**		**217**
163	VZT - rekup. Rozvody	8 dny	24.1. 18 2.2. 18	98		167
164	keramický obklad	5 dny	31.1. 18 6.2. 18	98FS+10 dny		167;170
165	keramická dlažba	6 dny	21.2. 18 28.2. 18	99FS+20 dny		170
166	chem. nátěr sklepů	1 den	5.3. 18 5.3. 18	99FS+28 dny		170FS+2 dny
167	SDK podhledy	5 dny	7.2. 18 13.2. 18	163;164		168
168	malba 1	5 dny	14.2. 18 20.2. 18	167		171
169	dřevěná podlaha	5 dny	28.2. 18 6.3. 18	99FS+25 dny		170
170	montáž zárubní a dveří	2 dny	8.3. 18 9.3. 18	164;169;165;166FS+2 dny		171
171	malba 2	3 dny	12.3. 18 14.3. 18	168;170		217
172	**1.PP**	**34 dny**	**22.2. 18 12.4. 18**	104		**217**
173	VZT - rekup. Rozvody	8 dny	22.2. 18 5.3. 18	108		177
174	keramický obklad	5 dny	2.3. 18 8.3. 18	108FS+10 dny		177;180
175	keramická dlažba	6 dny	22.3. 18 29.3. 18	109FS+20 dny		180
176	chem. Nátěr garáže	5 dny	22.2. 18 28.2. 18			181;180FS+2 dny
177	SDK podhledy	5 dny	9.3. 18 15.3. 18	173;174		178;181
178	malba 1	5 dny	16.3. 18 22.3. 18	177		181
179	dřevěná podlaha	6 dny	22.3. 18 29.3. 18	109FS+20 dny		180
180	montáž zárubní a dveří	2 dny	3.4. 18 4.4. 18	174;175;179;176FS+2 dny		181
181	malba 2	6 dny	5.4. 18 12.4. 18	177;180;178;176		217
182	**1.NP**	**31 dny**	**1.2. 18 15.3. 18**	**114**		**217**
183	VZT - rekup. Rozvody	8 dny	1.2. 18 12.2. 18	117		186
184	keramický obklad	4 dny	8.2. 18 13.2. 18	117FS+10 dny		186;189
185	keramická dlažba	6 dny	1.3. 18 8.3. 18	118FS+20 dny		189
186	SDK podhledy	3 dny	14.2. 18 16.2. 18	183;184		187
187	malba 1	6 dny	19.2. 18 26.2. 18	186		190
188	dřevěná podlaha	7 dny	27.2. 18 7.3. 18	118FS+18 dny		189
189	montáž zárubní a dveří	2 dny	9.3. 18 12.3. 18	184;185;188		190
190	malba 2	3 dny	13.3. 18 15.3. 18	187;189		217
191	**2.NP**	**30 dny**	**13.3. 18 25.4. 18**	**123**		**217**
192	VZT - rekup. Rozvody	8 dny	13.3. 18 22.3. 18	126		195
193	keramický obklad	4 dny	20.3. 18 23.3. 18	126FS+10 dny		195;198
194	keramická dlažba	5 dny	12.4. 18 18.4. 18	127FS+20 dny		198
195	SDK podhledy	3 dny	26.3. 18 28.3. 18	192;193		196
196	malba 1	6 dny	29.3. 18 9.4. 18	195		199
197	dřevěná podlaha	6 dny	5.4. 18 12.4. 18	127FS+15 dny		198
198	montáž zárubní a dveří	2 dny	19.4. 18 20.4. 18	193;194;197		199
199	malba 2	3 dny	23.4. 18 25.4. 18	196;198		217
200	**3.NP**	**25 dny**	**23.3. 18 30.4. 18**	**132**		**217**
201	VZT - rekup. Rozvody	4 dny	23.3. 18 28.3. 18	135		204
202	keramický obklad	2 dny	4.4. 18 5.4. 18	135FS+10 dny		204;207
203	keramická dlažba	3 dny	23.4. 18 25.4. 18	136FS+19 dny		207
204	SDK podhledy	1 den	6.4. 18 6.4. 18	201;202		205
205	malba 1	2 dny	9.4. 18 10.4. 18	204		208
206	dřevěná podlaha	3 dny	16.4. 18 18.4. 18	136FS+14 dny		207
207	montáž zárubní a dveří	1 den	26.4. 18 26.4. 18	202;203;206		208
208	malba 2	2 dny	27.4. 18 30.4. 18	205;207		217
209	**Technologie**	**39 dny**	**8.1. 18 1.3. 18**			
210	Vybavení tech. místnosti	6 dny	8.1. 18 15.1. 18	146FS+2 dny		215
211	Vybavení slaboproudé místnosti	4 dny	26.2. 18 1.3. 18	140		216
212	montáž tepelného čerpadla	4 dny	5.2. 18 8.2. 18	53FS+40 dny		215FF+10 dny
213	**Kompletace a revize**	**38 dny**	**2.3. 18 26.4. 18**			**217**
214	VZT	5 dny	19.3. 18 23.3. 18	126;135		217
215	ZTI	35 dny	7.3. 18 26.4. 18	129;138;210;212FF+10 dny		217
216	elektro	20 dny	2.3. 18 29.3. 18	140;211		217
217	úklid objektu	17 dny	15.5. 18 6.6. 18	123;132;224FF;214;215;211		
218	**Fasáda**	**108 dny**	**2.1. 18 6.6. 18**			
219	**Terasy**	**108 dny**	**2.1. 18 6.6. 18**			
220	montáž kotev zábradlí	3 dny	2.1. 18 4.1. 18	58		221SS
221	spádové betony	8 dny	2.1. 18 11.1. 18	220SS;54		222FS+6 dny
222	zateplení, hydroizolace, klempířin	27 dny	22.1. 18 27.2. 18	221FS+6 dny		226FS-2 dny
223	montáž zábradlí	4 dny	18.4. 18 23.4. 18	227FF		230
224	terasová prkna	25 dny	2.5. 18 6.6. 18	230		236;217FF
225	**KZS**	**48 dny**	**26.2. 18 7.5. 18**			
226	stavba lešení	13 dny	26.2. 18 14.3. 18	222FS-2 dny;68;70;72		227SS+5 dny;228
227	zateplení fasády + perlinka	34 dny	5.3. 18 23.4. 18	226SS+5 dny;228FF+20 dny		229FF;230;223FF
228	hromosvody	2 dny	15.3. 18 16.3. 18	226		227FF+20 dny
229	klempířské prvky	11 dny	9.4. 18 23.4. 18	227FF		230
230	probarvená omítka	5 dny	24.4. 18 30.4. 18	227;223;229		231SS+3 dny;224
231	demontáž lešení	6 dny	27.4. 18 7.5. 18	230SS+3 dny		233FF+8 dny;234
232	**Okolí**	**36 dny**	**23.4. 18 13.6. 18**			
233	zahradní úpravy 1	18 dny	23.4. 18 18.5. 18	231FF+8 dny		235
234	zpevněné plochy, zámková dlažba	19 dny	9.5. 18 4.6. 18	231		235
235	zahradní úpravy 2	5 dny	5.6. 18 11.6. 18	234;233		237
236	terasová prkna	4 dny	7.6. 18 12.6. 18	224		237FS-1 den
237	odstranění staveniště a úklid	2 dny	12.6. 18 13.6. 18	235;236FS-1 den		

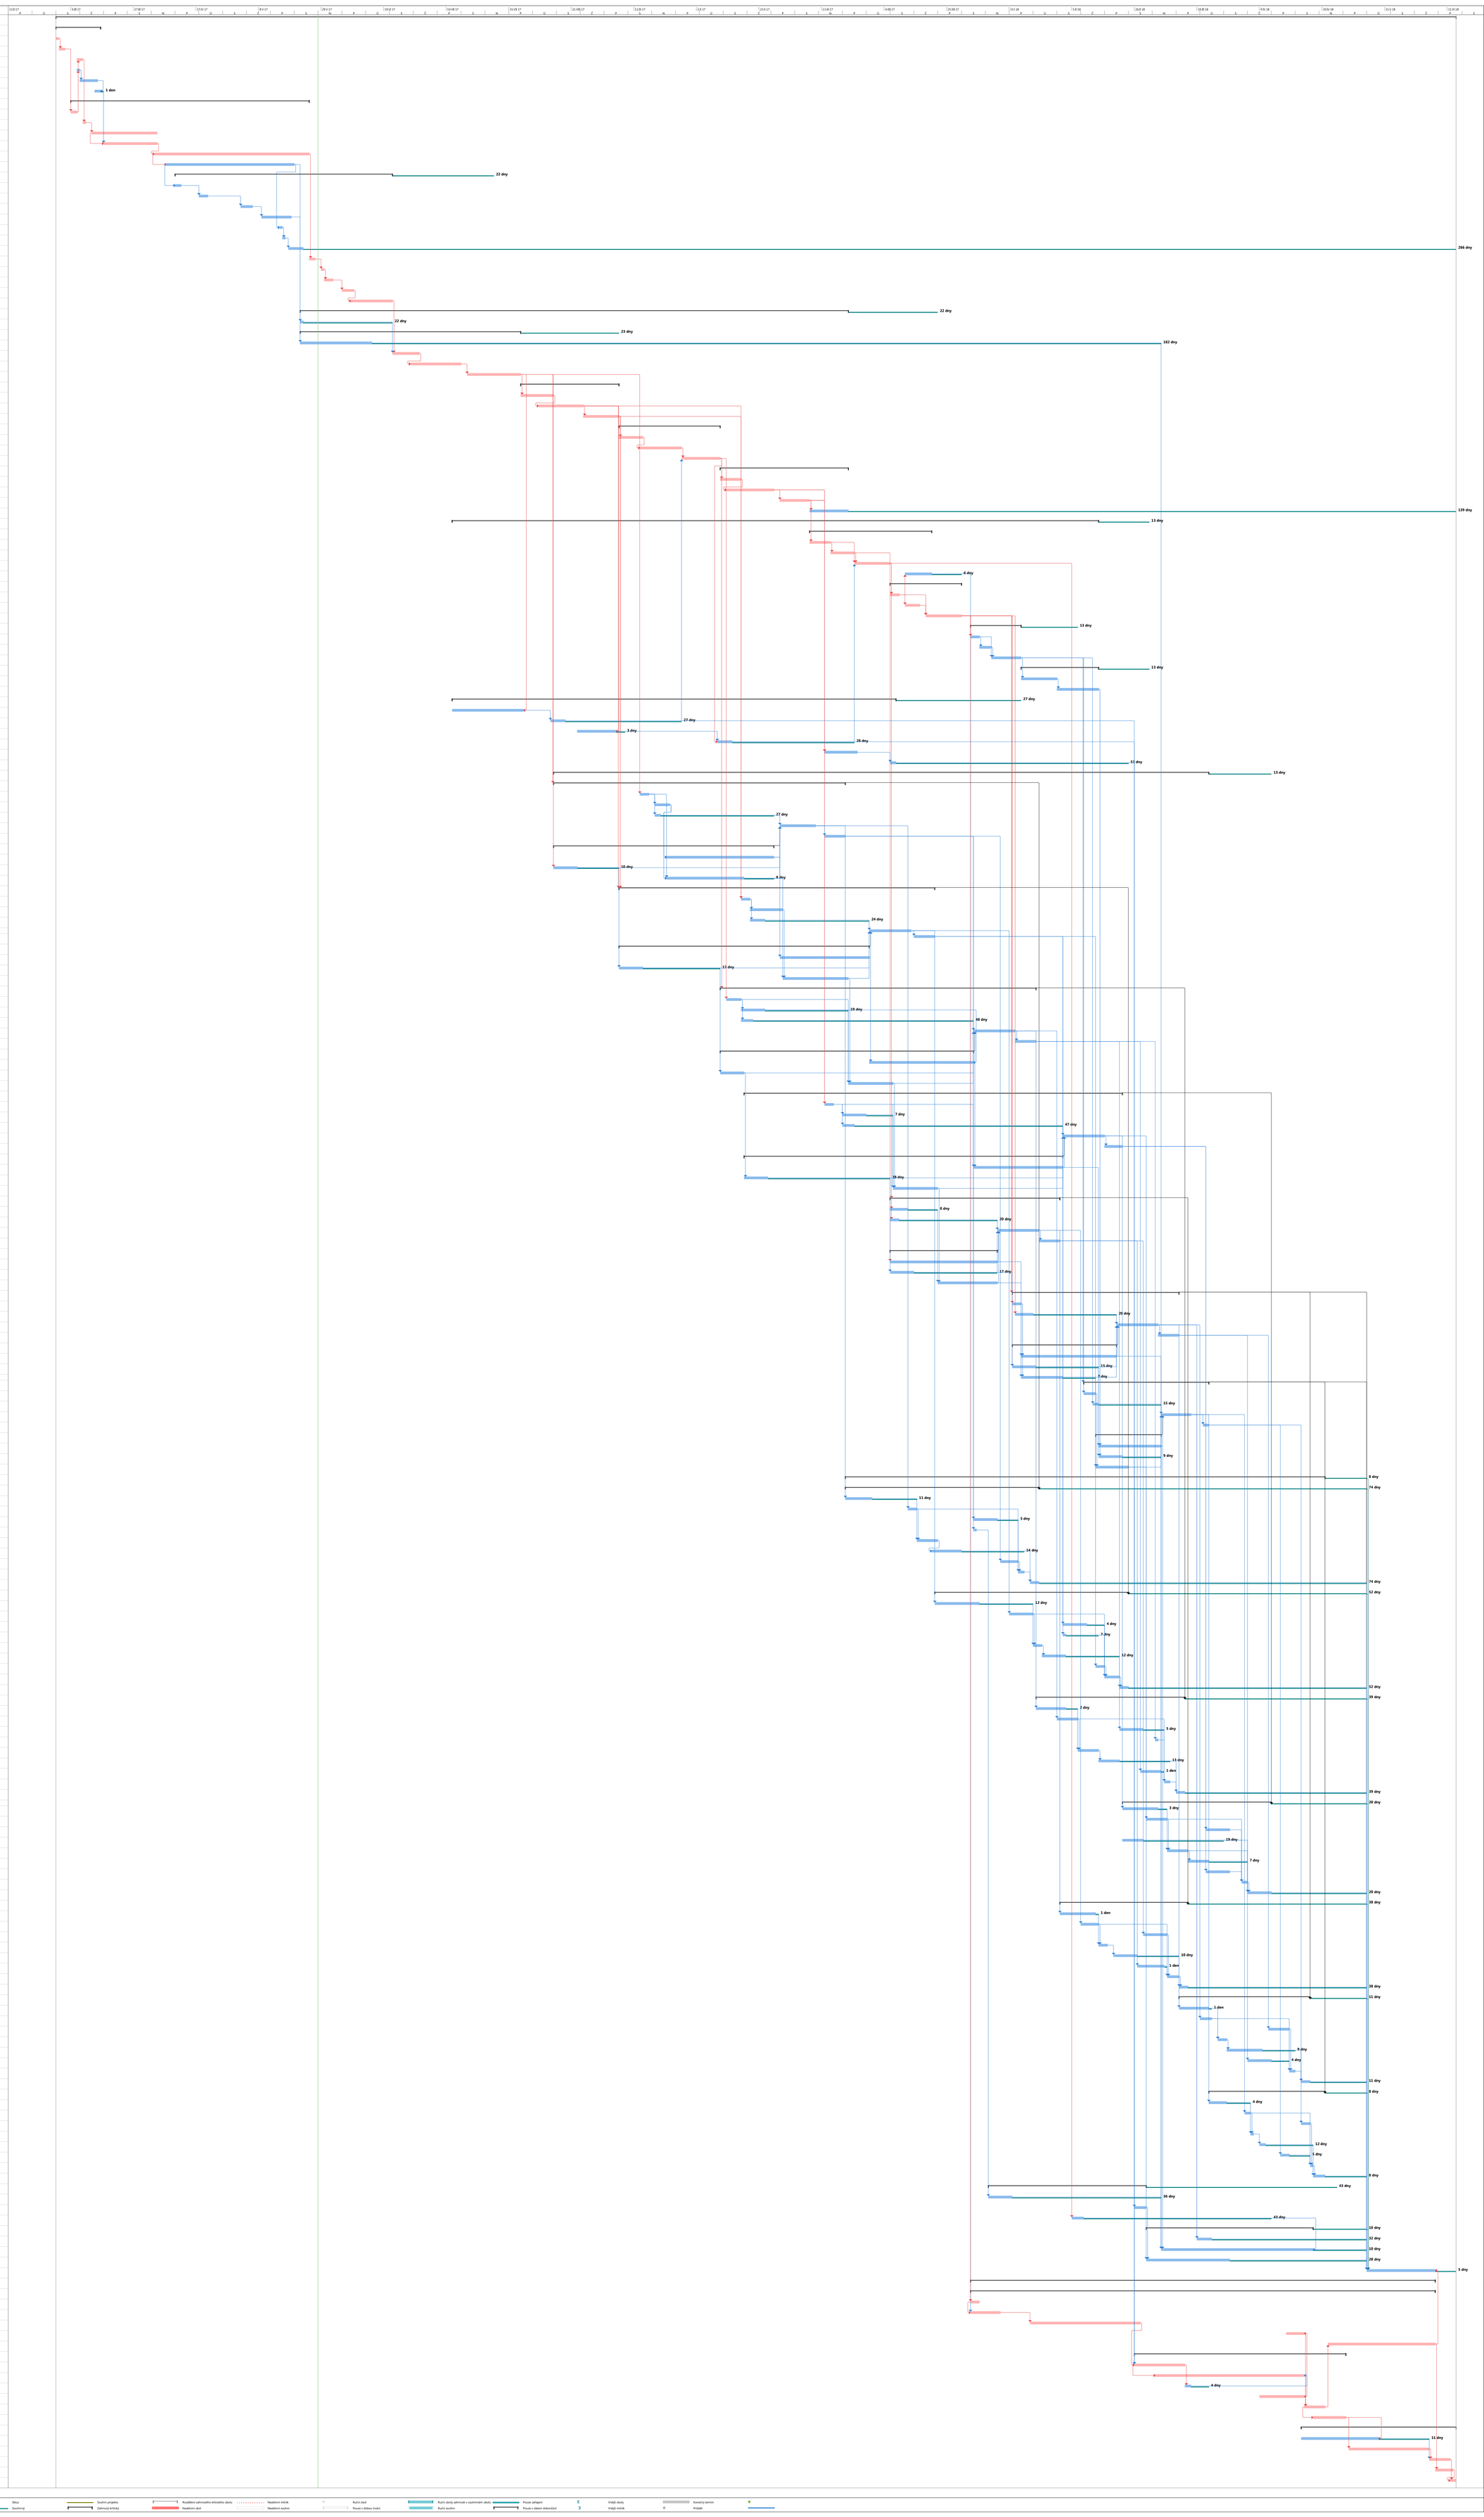

Kritický | Rozdělení kritického úkolu | Úkol | Rozdělení | Milník | Časová rezerva | Souhrnný | Souhrn projektu | Zahrnutý kritický | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Neaktivní úkol | Neaktivní milník | Neaktivní souhrn | Ruční úkol | Pouze s dobou trvání | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Ruční souhrn | Pouze zahájení | Pouze s datem dokončení | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín | Průběh
