Časo-prostorový graf

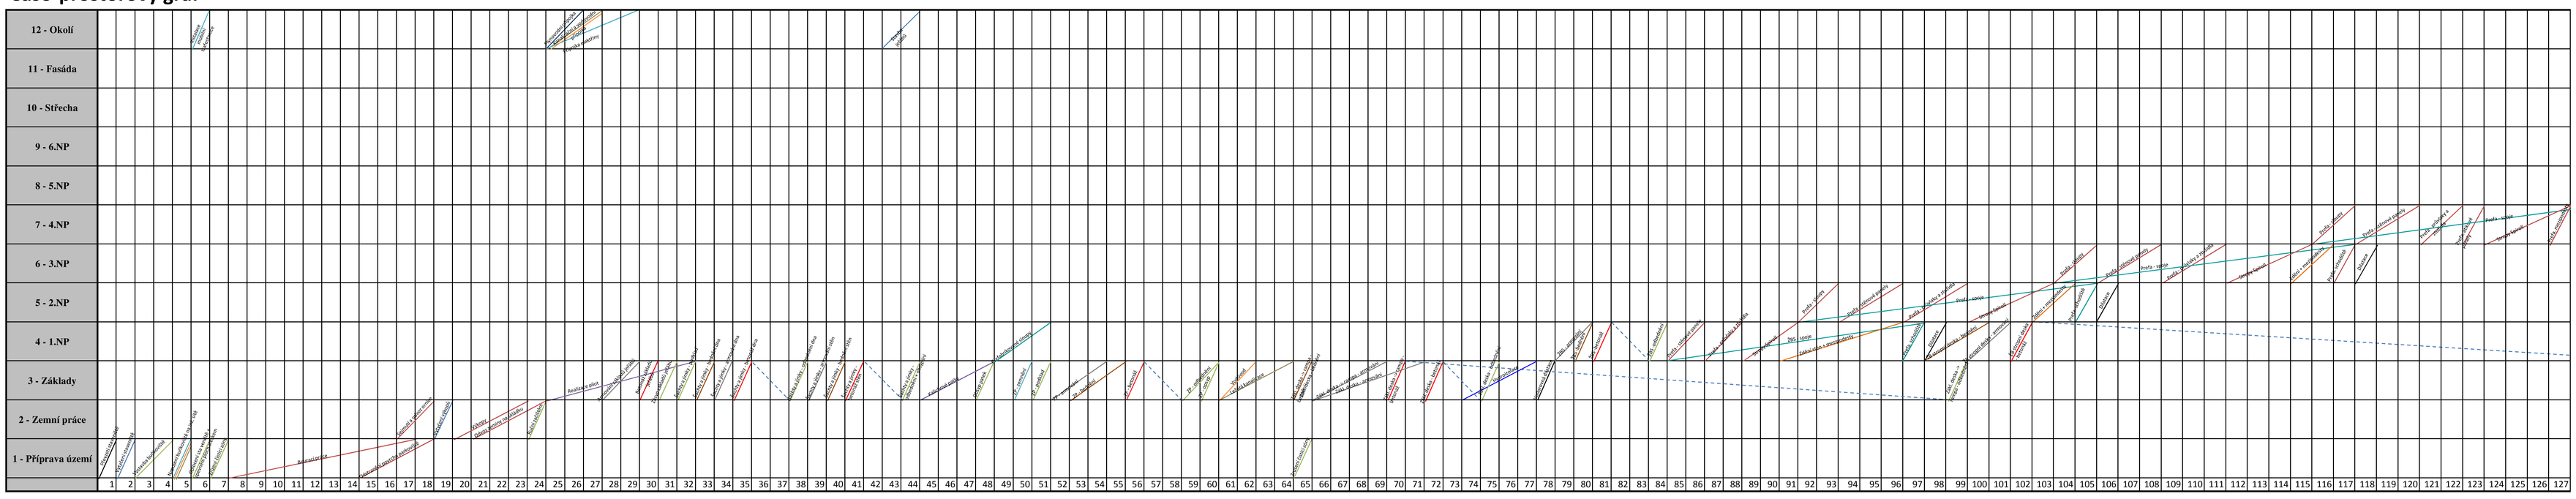

Doba výstavby - práce i o víkendech a svátkách

Datum	Den	Číslování pracovních dnů o víkendech a svátkách
7.3.2017	úterý	
8.3.2017	středa	
9.3.2017	čtvrtek	
10.3.2017	pátek	
11.3.2017	sobota	1
12.3.2017	neděle	2
13.3.2017	pondělí	
14.3.2017	úterý	
15.3.2017	středa	
16.3.2017	čtvrtek	
17.3.2017	pátek	
18.3.2017	sobota	3
19.3.2017	neděle	4
20.3.2017	pondělí	
21.3.2017	úterý	
22.3.2017	středa	
23.3.2017	čtvrtek	
24.3.2017	pátek	
25.3.2017	sobota	5
26.3.2017	neděle	6
27.3.2017	pondělí	
28.3.2017	úterý	
29.3.2017	středa	
30.3.2017	čtvrtek	
31.3.2017	pátek	
1.4.2017	sobota	7
2.4.2017	neděle	8
3.4.2017	pondělí	
4.4.2017	úterý	
5.4.2017	středa	
6.4.2017	čtvrtek	
7.4.2017	pátek	
8.4.2017	sobota	9
9.4.2017	neděle	10
10.4.2017	pondělí	
11.4.2017	úterý	
12.4.2017	středa	
13.4.2017	čtvrtek	
14.4.2017	pátek	11
15.4.2017	sobota	12
16.4.2017	neděle	13
17.4.2017	pondělí	14
18.4.2017	úterý	
19.4.2017	středa	
20.4.2017	čtvrtek	
21.4.2017	pátek	
22.4.2017	sobota	15
23.4.2017	neděle	16
24.4.2017	pondělí	
25.4.2017	úterý	
26.4.2017	středa	
27.4.2017	čtvrtek	
28.4.2017	pátek	
29.4.2017	sobota	17
30.4.2017	neděle	18
1.5.2017	pondělí	19
2.5.2017	úterý	
3.5.2017	středa	
4.5.2017	čtvrtek	
5.5.2017	pátek	
6.5.2017	sobota	20
7.5.2017	neděle	21
8.5.2017	pondělí	22
9.5.2017	úterý	
10.5.2017	středa	
11.5.2017	čtvrtek	
12.5.2017	pátek	
13.5.2017	sobota	23
14.5.2017	neděle	24
15.5.2017	pondělí	
16.5.2017	úterý	
17.5.2017	středa	
18.5.2017	čtvrtek	
19.5.2017	pátek	
20.5.2017	sobota	25
21.5.2017	neděle	26
22.5.2017	pondělí	
23.5.2017	úterý	
24.5.2017	středa	
25.5.2017	čtvrtek	
26.5.2017	pátek	
27.5.2017	sobota	27
28.5.2017	neděle	28
29.5.2017	pondělí	
30.5.2017	úterý	
31.5.2017	středa	
1.6.2017	čtvrtek	
2.6.2017	pátek	
3.6.2017	sobota	29
4.6.2017	neděle	30
5.6.2017	pondělí	
6.6.2017	úterý	
7.6.2017	středa	
8.6.2017	čtvrtek	
9.6.2017	pátek	
10.6.2017	sobota	31
11.6.2017	neděle	32
12.6.2017	pondělí	
13.6.2017	úterý	
14.6.2017	středa	
15.6.2017	čtvrtek	
16.6.2017	pátek	
17.6.2017	sobota	33
18.6.2017	neděle	34
19.6.2017	pondělí	
20.6.2017	úterý	
21.6.2017	středa	
22.6.2017	čtvrtek	
23.6.2017	pátek	
24.6.2017	sobota	35
25.6.2017	neděle	36
26.6.2017	pondělí	
27.6.2017	úterý	
28.6.2017	středa	
29.6.2017	čtvrtek	
30.6.2017	pátek	
1.7.2017	sobota	37
2.7.2017	neděle	38
3.7.2017	pondělí	
4.7.2017	úterý	
5.7.2017	středa	39
6.7.2017	čtvrtek	40
7.7.2017	pátek	
8.7.2017	sobota	41
9.7.2017	neděle	42
10.7.2017	pondělí	
11.7.2017	úterý	

Odhadované prodloužení výstavby, pokud by se pracovalo pouze v pracovních dnech

Datum	Den	Rozpočítání propracovaných víkendů a svátků
14.10.2017	sobota	
15.10.2017	neděle	
16.10.2017	pondělí	1
17.10.2017	úterý	2
18.10.2017	středa	3
19.10.2017	čtvrtek	4
20.10.2017	pátek	5
21.10.2017	sobota	
22.10.2017	neděle	
23.10.2017	pondělí	6
24.10.2017	úterý	7
25.10.2017	středa	8
26.10.2017	čtvrtek	9
27.10.2017	pátek	10
28.10.2017	sobota	
29.10.2017	neděle	
30.10.2017	pondělí	11
31.10.2017	úterý	12
1.11.2017	středa	13
2.11.2017	čtvrtek	14
3.11.2017	pátek	15
4.11.2017	sobota	
5.11.2017	neděle	
6.11.2017	pondělí	16
7.11.2017	úterý	17
8.11.2017	středa	18
9.11.2017	čtvrtek	19
10.11.2017	pátek	20
11.11.2017	sobota	
12.11.2017	neděle	
13.11.2017	pondělí	21
14.11.2017	úterý	22
15.11.2017	středa	23
16.11.2017	čtvrtek	24
17.11.2017	pátek	
18.11.2017	sobota	
19.11.2017	neděle	
20.11.2017	pondělí	25
21.11.2017	úterý	26
22.11.2017	středa	27
23.11.2017	čtvrtek	28
24.11.2017	pátek	29
25.11.2017	sobota	
26.11.2017	neděle	30
27.11.2017	pondělí	31
28.11.2017	úterý	32
29.11.2017	středa	33
30.11.2017	čtvrtek	34
1.12.2017	pátek	
2.12.2017	sobota	
3.12.2017	neděle	
4.12.2017	pondělí	35
5.12.2017	úterý	36
6.12.2017	středa	37
7.12.2017	čtvrtek	38
8.12.2017	pátek	39
9.12.2017	sobota	
10.12.2017	neděle	
11.12.2017	pondělí	40
12.12.2017	úterý	41
13.12.2017	středa	42
14.12.2017	čtvrtek	43
15.12.2017	pátek	44
16.12.2017	sobota	
17.12.2017	neděle	
18.12.2017	pondělí	45
19.12.2017	úterý	46
20.12.2017	středa	47
21.12.2017	čtvrtek	48
22.12.2017	pátek	49
23.12.2017	sobota	
24.12.2017	neděle	
25.12.2017	pondělí	
26.12.2017	úterý	
27.12.2017	středa	50
28.12.2017	čtvrtek	51
29.12.2017	pátek	52
30.12.2017	sobota	
31.12.2017	neděle	
1.1.2018	pondělí	53
2.1.2018	úterý	54
3.1.2018	středa	55
4.1.2018	čtvrtek	56
5.1.2018	pátek	57
6.1.2018	sobota	
7.1.2018	neděle	58
8.1.2018	pondělí	59
9.1.2018	úterý	60
10.1.2018	středa	61
11.1.2018	čtvrtek	62
12.1.2018	pátek	
13.1.2018	sobota	
14.1.2018	neděle	
15.1.2018	pondělí	63
16.1.2018	úterý	64
17.1.2018	středa	65
18.1.2018	čtvrtek	66
19.1.2018	pátek	67
20.1.2018	sobota	
21.1.2018	neděle	
22.1.2018	pondělí	68
23.1.2018	úterý	69
24.1.2018	středa	70
25.1.2018	čtvrtek	71
26.1.2018	pátek	72
27.1.2018	sobota	
28.1.2018	neděle	
29.1.2018	pondělí	73
30.1.2018	úterý	74

Graf nasazení pracovníků

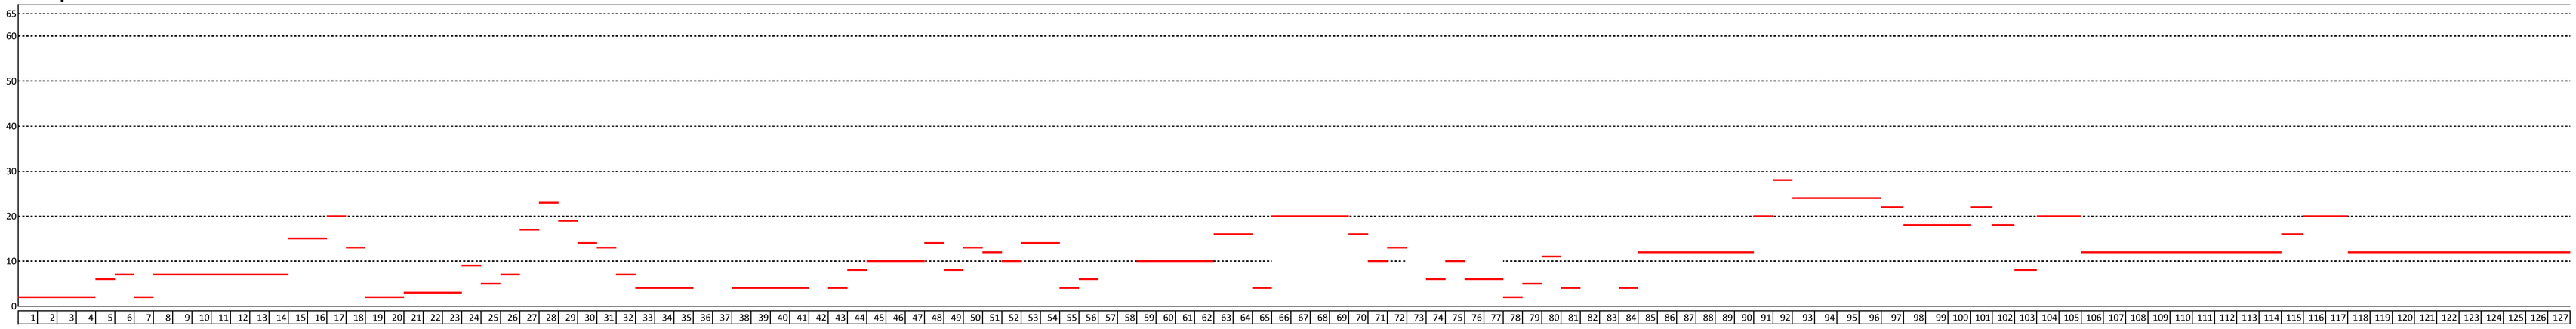

Graf potřeby materiálu

| | | |

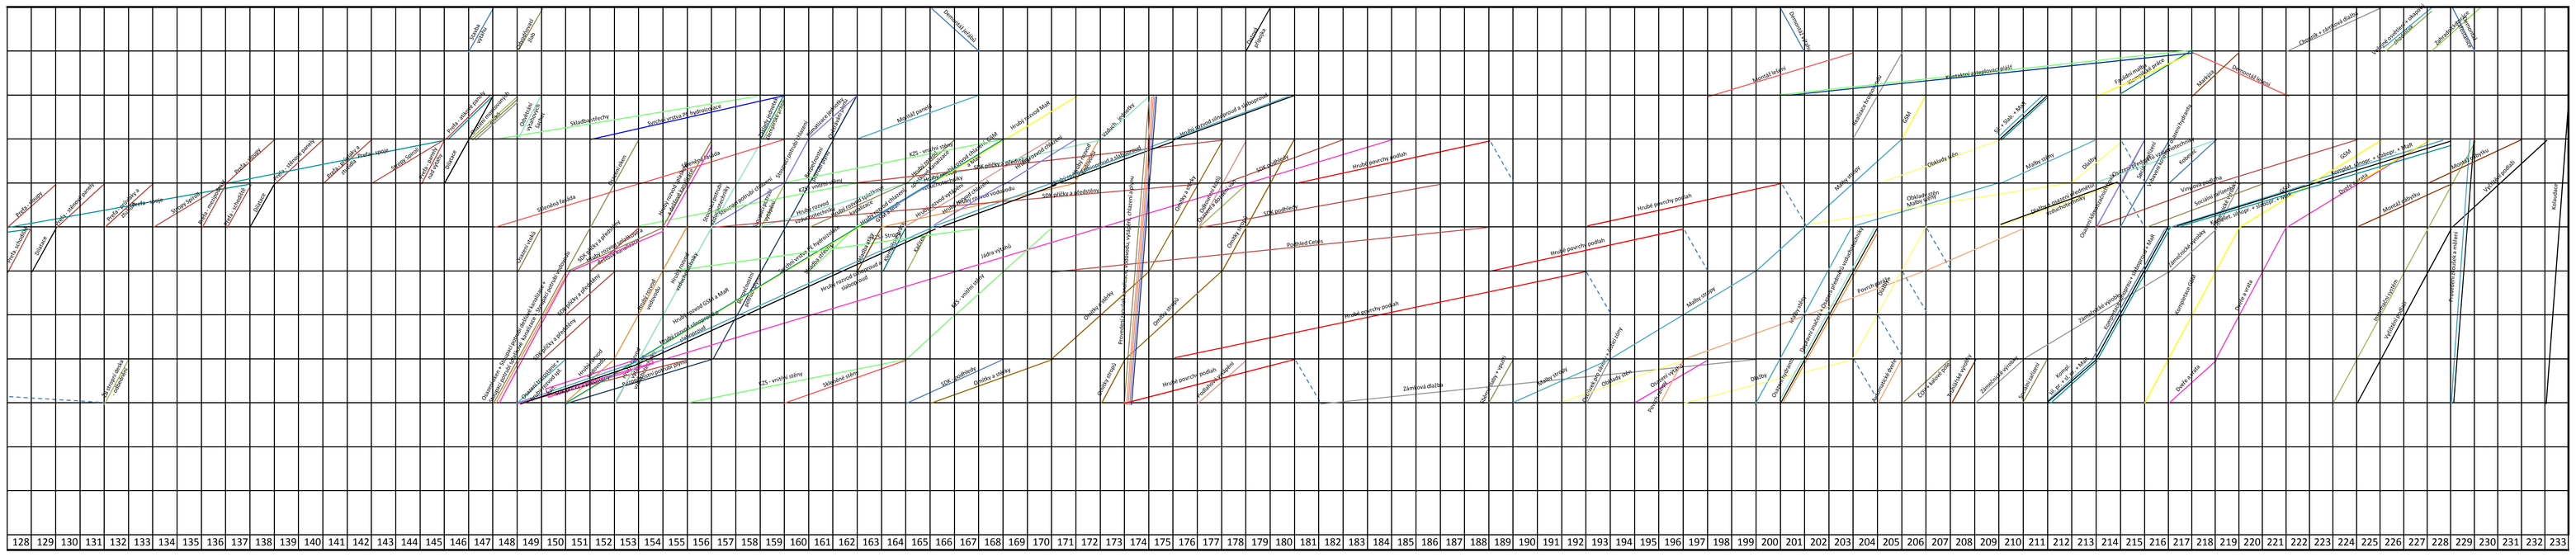

- Stavbyvedoucí, mistr stavební výroby
- Geodet
- Strojník
- Pomocný dělník
- Specialista zakládání
- Specialista silnoproud
- Specialista slaboproud
- Specialista TZB - vodovod
- Specialista TZB - kanalizace
- Specialista TZB - plyn
- Specialista TZB - vytápění
- Specialista TZB - klimatizace
- Specialista TZB - vzduchotechnika
- Tesař
- Armovač
- Betonář
- Izolatér
- Obkladač, pokladač dlažby
- Zedník
- Montéři oken a dveří
- Hydroizolace
- Omítkář
- Malíř
- Podlahář
- Sádrokartonář
- Truhlář
- Zámečník
- Výtahář
- Uklízeč
- Lešenář
- Fasádník
- Klempíř
- Zahradník
- Montér prefabrikovaných částí
- Montér skleněných stěn
- Specialista GSM
- Specialista MaR
- Pokladač zámkové dlažby
- Kobercář
- Pokladač vinylové podlahy

| | | |

Harmonogram

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1	Převzetí staveniště	1 den	7.3. 17	7.3. 17		2
2	Vytyčení staveniště	1 den	8.3. 17	8.3. 17	1	3
3	Výstavba buřkoviště	2 dny	9.3. 17	10.3. 17	2	4
4	Napojení buřkoviště na inženýrské sítě	1 den	11.3. 17	11.3. 17	3	5;14
5	Oplocení staveniště	1 den	12.3. 17	12.3. 17	4	6
6	Zřízení čistící zóny	1 den?	13.3. 17	13.3. 17	5	7
7	Bourací práce	10 dny	14.3. 17	23.3. 17	6	8FS-3 dny;9FS-1 den
8	Odstranění povrchu parkoviště	4 dny	21.3. 17	24.3. 17	7FS-3 dny	10
9	Sejmutí a odvoz ornice	2 dny	23.3. 17	24.3. 17	7FS-1 den	10
10	Vytyčení jednotlivých objektů výkopů	1 den	25.3. 17	25.3. 17	8;9	11
11	Výkopy	4 dny	26.3. 17	29.3. 17	10	12;13FS-3 dny
12	Ruční začištění	1 den	30.3. 17	30.3. 17	11	15;16;17;18;19
13	Odvoz zeminy na skládku	4 dny	27.3. 17	30.3. 17	11FS-3 dny	19
14	Instalace mobilní trofostanice	1 den	12.3. 17	12.3. 17	4	268
15	Kanalizační přípojka	3 dny	31.3. 17	2.4. 17	12	45
16	Vodovodní přípojka	3 dny	31.3. 17	2.4. 17	12	45
17	Plynovocní přípojka	2 dny	31.3. 17	1.4. 17	12	45
18	Přípojka elektřiny	5 dny	31.3. 17	4.4. 17	12	45
19	Realizace pilot	8 dny	31.3. 17	7.4. 17	12;13	20SS+3 dny
20	Armování jeřábu + zemnění	2 dny	3.4. 17	4.4. 17	19SS+3 dny	21
21	Betonáž kaladů jeřábu	1 den	5.4. 17	5.4. 17	20	22
22	Závsp a hutnění základu jeřábu	1 den	6.4. 17	6.4. 17	21	23
23	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - vytvoření podkladu	1 den	7.4. 17	7.4. 17	22	24
24	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - bednění dna	1 den	8.4. 17	8.4. 17	23	25
25	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - armování dna	1 den	9.4. 17	9.4. 17	24	26
26	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - betonáž dna	1 den	10.4. 17	10.4. 17	25	27FS+2 dny
27	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - odbednění dna	1 den	13.4. 17	13.4. 17	26FS+2 dny	28
28	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - armování stěn	1 den	14.4. 17	14.4. 17	27	29
29	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - bednění stěn	1 den	15.4. 17	15.4. 17	28	30
30	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - betonáž stěn	1 den	16.4. 17	16.4. 17	29	31FS+2 dny;32
31	Výtahové šachty a jímky v prostorách myčky - odbednění + obsyp	1 den	19.4. 17	19.4. 17	30FS+2 dny	33
32	Stavba jeřábů	2 dny	17.4. 17	18.4. 17	30	33
33	Kalichové patky	4 dny	20.4. 17	23.4. 17	31;32	34FF;35
34	Obsyp patek	1 den	23.4. 17	23.4. 17	33FF	35
35	Montáž prefabrikovaných sloupů 1.NP	3 dny	24.4. 17	26.4. 17	33;34	36SS+1 den
36	Základové pasy - zemnění	1 den	25.4. 17	25.4. 17	35SS+1 den	37
37	Základové pasy - vytvoření podkladu	1 den	26.4. 17	26.4. 17	36	38
38	Základové pasy - armování	3 dny	27.4. 17	29.4. 17	37	39SS+1 den
39	Základové pasy - bednění	3 dny	28.4. 17	30.4. 17	38SS+1 den	40
40	Základové pasy - betonáž	1 den	1.5. 17	1.5. 17	39	41FS+2 dny
41	Základové pasy - odbednění	2 dny	4.5. 17	5.5. 17	40FS+2 dny	42FF;43;44
42	Základové pasy - obsypání	1 den	5.5. 17	5.5. 17	41FF	43;44
43	Ležatá kanalizace	4 dny	6.5. 17	9.5. 17	41;42	45;49
44	Vodovodní přípojka	2 dny	6.5. 17	7.5. 17	41;42	45;49
45	Základová deska -> rampa - bednění	1 den	10.5. 17	10.5. 17	43;44;15;16;17;1I	46
46	Základová deska -> rampa -armování	4 dny	11.5. 17	14.5. 17	45	47
47	Základová deska -> rampa - betonáž	1 den	15.5. 17	15.5. 17	46	48FS+28 dny
48	Základová deska -> rampa -odbednění	1 den	13.6. 17	13.6. 17	47FS+28 dny	
49	Základová deska - bednění	1 den	10.5. 17	10.5. 17	43;44	50
50	Základová deska - armování	6 dny	11.5. 17	16.5. 17	49	51
51	Základová deska - betonáž	1 den	17.5. 17	17.5. 17	50	52FS+2 dny;53FS+1 den
52	Základová deska - odbednění	1 den	20.5. 17	20.5. 17	51FS+2 dny	53FF+1 den
53	Hydroizolace	4 dny	19.5. 17	22.5. 17	51FS+1 den;52FF-	54
54	Dilatace	1 den	23.5. 17	23.5. 17	53	55
55	ŽB stěny - armování 1.NP	2 dny	24.5. 17	25.5. 17	54	56FF
56	ŽB stěny - bednění 1.NP	1 den	25.5. 17	25.5. 17	55FF	57
57	ŽB stěny - betonáž 1.NP	1 den	26.5. 17	26.5. 17	56	58FS+2 dny
58	ŽB stěny - odbednění 1.NP	1 den	29.5. 17	29.5. 17	57FS+2 dny	59
59	Prefabrikované stěnové panely 1.NP	2 dny	30.5. 17	31.5. 17	58	60;61SS
60	Prefabrikované průvlaky a ztužidla 1.NP	2 dny	1.6. 17	2.6. 17	59	62
61	Spojování prefabrikovaných konstrukcí 1.NP	13 dny	30.5. 17	11.6. 17	59SS	64FF
62	Strop Spiroll 1.NP	3 dny	3.6. 17	5.6. 17	60	63FS-1 den;69
63	Zdění + mezipodesty 1.NP	6 dny	5.6. 17	10.6. 17	62FS-1 den	64;65
64	Prefabrikovaná schodiště 1.NP	1 den	11.6. 17	11.6. 17	63;61FF	65;107
65	Stropní deska + markýza - bednění 1.NP	3 dny	12.6. 17	14.6. 17	63;64	66SS+2 dny
66	Stropní deska + markýza - armování 1.NP	2 dny	14.6. 17	15.6. 17	65SS+2 dny	67
67	Stropní deska + markýza - betonáž 1.NP	1 den	16.6. 17	16.6. 17	66	68FS+28 dny
68	Stropní deska + markýza - odbednění 1.NP	1 den	15.7. 17	15.7. 17	67FS+28 dny	
69	Prefabrikované sloupy 2.NP	2 dny	6.6. 17	7.6. 17	62	70;72SS
70	Prefabrikované stěnové panely 2.NP	3 dny	8.6. 17	10.6. 17	69	71
71	Prefabrikované průvlaky a ztužidla 2.NP	3 dny	11.6. 17	13.6. 17	70	73
72	Spojování prefabrikovaných konstrukcí 2.NP	14 dny	6.6. 17	19.6. 17	69SS	75FF
73	Strop Spiroll 2.NP	4 dny	14.6. 17	17.6. 17	71	74FS-1 den;76
74	Zdění stěn + mezipodesty 2.NP	2 dny	17.6. 17	18.6. 17	73FS-1 den	75
75	Prefabrikovaná schodiště 2.NP	1 den	19.6. 17	19.6. 17	74;72FF	108
76	Prefabrikované sloupy 3.NP	2 dny	18.6. 17	19.6. 17	73	77;79SS
77	Prefabrikované stěnové panely 3.NP	3 dny	20.6. 17	22.6. 17	76	78
78	Prefabrikované průvlaky a ztužidla 3.NP	3 dny	23.6. 17	25.6. 17	77	80
79	Spojování prefabrikovaných konstrukcí 3.NP	14 dny	18.6. 17	1.7. 17	76SS	82FF
80	Strop Spiroll 3.NP	4 dny	26.6. 17	29.6. 17	78	81FS-1 den;83
81	Zdění stěn + mezipodesty 3.NP	2 dny	29.6. 17	30.6. 17	80FS-1 den	82
82	Prefabrikovaná schodiště 3.NP	1 den	1.7. 17	1.7. 17	81;79FF	109
83	Prefabrikované sloupy 4.NP	2 dny	30.6. 17	1.7. 17	80	84;87SS
84	Prefabrikované stěnové panely 4.NP	3 dny	2.7. 17	4.7. 17	83	85
85	Prefabrikované průvlaky a ztužidla 4.NP	2 dny	5.7. 17	6.7. 17	84	86
86	Prefabrikované atikové panely 4.NP	1 den	7.7. 17	7.7. 17	85	88
87	Spojování prefabrikovaných konstrukcí 4.NP	13 dny	30.6. 17	12.7. 17	83SS	90FF
88	Strop Spiroll 4.NP	4 dny	8.7. 17	11.7. 17	86	89FF;90;91
89	Prefabrikované mezipodesty 4.NP	1 den	11.7. 17	11.7. 17	88FF	90
90	Prefabrikovaná schodiště 4.NP	1 den	12.7. 17	12.7. 17	88;89;87FF	110
91	Prefabrikované sloupy 5.NP	2 dny	12.7. 17	13.7. 17	88	92;94SS
92	Prefabrikované stěnové panely 5.NP	2 dny	14.7. 17	15.7. 17	91	93
93	Prefabrikované průvlaky a ztužidla 5.NP	2 dny	16.7. 17	17.7. 17	92	95
94	Spojování prefabrikovaných konstrukcí 5.NP	10 dny	12.7. 17	21.7. 17	91SS	97FF
95	Strop Spiroll 5.NP	3 dny	18.7. 17	20.7. 17	93	96FF;97;98
96	Prefabrikované mezipodesty 5.NP	1 den	20.7. 17	20.7. 17	95FF	97
97	Prefabrikovaná schodiště 5.NP	1 den	21.7. 17	21.7. 17	95;96;94FF	111
98	Prefabrikované sloupy 5.NP	2 dny	21.7. 17	22.7. 17	95	99;101SS
99	Prefabrikované stěnové panely 5.NP	2 dny	23.7. 17	24.7. 17	98	100
100	Prefabrikované průvlaky a ztužidla 5.NP	2 dny	25.7. 17	26.7. 17	99	102
101	Spojování prefabrikovaných konstrukcí 5.NP	9 dny	21.7. 17	29.7. 17	98SS	103FF
102	Strop Spiroll 5.NP	3 dny	27.7. 17	29.7. 17	100	104;105
103	Prefabrikované panely nad výtahové šachty 5.NP	1 den	29.7. 17	29.7. 17	101FF	104;112;105
104	Prefabrikované atikové panely - střecha	2 dny	30.7. 17	31.7. 17	102;103	114FS-1 den;127;128;12
105	Spojování prefabrikovaných konstrukcí - střecha	2 dny	30.7. 17	31.7. 17	102;103	112
106	Stavba stavebního výtahu	1 den	1.8. 17	1.8. 17	104FF+1 den	129FF
107	Opracování vodorovné a svislé dilatace 1.NP	1 den	12.6. 17	12.6. 17	64	108
108	Opracování vodorovné a svislé dilatace 2.NP	1 den	20.6. 17	20.6. 17	107;75	109
109	Opracování vodorovné a svislé dilatace 3.NP	1 den	2.7. 17	2.7. 17	108;82	110
110	Opracování vodorovné a svislé dilatace 4.NP	1 den	13.7. 17	13.7. 17	109;90	111
111	Opracování vodorovné a svislé dilatace 5.NP	1 den	22.7. 17	22.7. 17	110;97	112
112	Opracování vodorovné a svislé dilatace 6.NP	1 den	1.8. 17	1.8. 17	111;103;105	113
113	Opracování vodorovné a svislé dilatace - střecha	1 den	2.8. 17	2.8. 17	112	115
114	Osazení montovaných prvků včetně odvětrání splaškové kanalizace a vpustí - střecha	2 dny	31.7. 17	1.8. 17	104FS-1 den	115FS-1 den;120;191
115	Skladba střechy - střecha	11 dny	3.8. 17	13.8. 17	114FS-1 den;113	116FF+1 den;117;121
116	Svrchní vrstva - hydroizolace - střecha	8 dny	7.8. 17	14.8. 17	115FF+1 den	118FF;122
117	Základy pod jednotky - střecha	1 den	14.8. 17	14.8. 17	115	119;164
118	Klempířské práce - střecha	1 den	14.8. 17	14.8. 17	116FF	119
119	Osazení vzduchotechnických jednotek - střecha	2 dny	15.8. 17	16.8. 17	117;118	163FF+2 dny
120	Osazení vtoků - 4.NP	1 den	2.8. 17	2.8. 17	114	121
121	Skladba střechy - 4.NP	2 dny	14.8. 17	15.8. 17	120;115	122FF+1 den;125
122	Svrchní vrstva - 4.NP	3 dny	15.8. 17	17.8. 17	121FF+1 den;116	123
123	Kačírek - 4.NP	1 den	18.8. 17	18.8. 17	125;122;126	322;124
124	Odstranění jeřábu	2 dny	19.8. 17	20.8. 17	123	
125	Skladba atiky - 4.NP	1 den	16.8. 17	16.8. 17	121	126;123
126	Klempířské práce - 4.NP	1 den	17.8. 17	17.8. 17	125	123
127	Skleněná fasáda 5.NP	6 dny	1.8. 17	6.8. 17	104	128;135
128	Skleněná fasáda 6.NP	6 dny	7.8. 17	12.8. 17	127;104	137;177
129	Osazení oken 1.NP	1 den	1.8. 17	1.8. 17	104;106FF	130;139;146;149;148;15
130	Osazení oken 2.NP	1 den	2.8. 17	2.8. 17	104;129	131;150;168
131	Osazení oken 3.NP	1 den	3.8. 17	3.8. 17	104;130	132;151
132	Osazení oken 4.NP	1 den	4.8. 17	4.8. 17	104;131	133;152;143;159;187;14
133	Osazení oken 5.NP	1 den	5.8. 17	5.8. 17	104;132	134;157;158;162;161;16
134	Osazení oken 6.NP	1 den	6.8. 17	6.8. 17	104;133	138;163;170;178
135	KZS - Vnitřní stěny 5.NP	9 dny	7.8. 17	15.8. 17	127	136SS+3 dny
136	SDK příčky a předstěny 5.NP	20 dny	10.8. 17	29.8. 17	135SS+3 dny;157F	179;181;197FF
137	KZS - Vnitřní stěny 6.NP	9 dny	13.8. 17	21.8. 17	128	138SS+2 dny
138	SDK příčky a předstěny 6.NP	15 dny	15.8. 17	29.8. 17	137SS+2 dny;134;	180FS+1 den;198FF
139	Stoupací potrubí splaškové kanalizace 1 - 4.NP	6 dny	2.8. 17	7.8. 17	129	141;142;140;192
140	Stoupací potrubí splaškové kanalizace 5 - 6.NP	2 dny	8.8. 17	9.8. 17	139	141;142;192
141	Hrubý rozvod splaškové kanalizace 5.NP	4 dny	10.8. 17	13.8. 17	139;140	138FF+2 dny;192
142	Hrubý rozvod splaškové kanalizace 6.NP	2 dny	10.8. 17	11.8. 17	139;140	138FF+2 dny;192
143	Stoupací potrubí dešťové kanalizace 1 - 4.NP	4 dny	5.8. 17	8.8. 17	132	145;192
144	Ležatá potrubí dešťové a splaškové kanalizace pod stropem 4.NP	4 dny	4.8. 17	7.8. 17	132SS	145;192;187
145	Stoupací potrubí dešťové kanalizace 5 - 6.NP	2 dny	9.8. 17	10.8. 17	143;144	138FF+2 dny;192
146	SDK příčky a předstěny 1.NP	7 dny	2.8. 17	8.8. 17	129;167FF+2 dny	147;186;193
147	Hrubý rozvod splaškové kanalizace 1.NP	2 dny	9.8. 17	10.8. 17	146	171;192
148	SDK příčky a předstěny 1.NP	7 dny	2.8. 17	8.8. 17	129;156FF+2 dny	172;189
149	Stoupací potrubí vodovodu	6 dny	2.8. 17	7.8. 17	129	192
150	SDK příčky a předstěny 2.NP	2 dny	3.8. 17	4.8. 17	130	152
151	SDK příčky a předstěny 3.NP	2 dny	4.8. 17	5.8. 17	131	160
152	SDK příčky a předstěny 4.NP	2 dny	5.8. 17	6.8. 17	132;150	160
153	Bezpečnostní potrubí plynu 1.NP	6 dny	2.8. 17	7.8. 17	129	154;192
154	Bezpečnostní potrubí plynu 2 - 6.NP	5 dny	8.8. 17	12.8. 17	153	155;192
155	Odvětrávání plynu	1 den	13.8. 17	13.8. 17	154	192
156	Hrubý rozvod vytápění 1.NP	1 den	2.8. 17	2.8. 17	129	148FF+2 dny;192
157	Stoupací potrubí vytápění 1.NP	1 den	6.8. 17	6.8. 17	133	136FF+2 dny;192
158	Hrubý rozvod vytápění 5 - 6.NP	6 dny	6.8. 17	11.8. 17	133	136FF+2 dny;138FF+2 dn
159	Hrubý rozvod vzduchotechniky 1.NP	1 den	5.8. 17	5.8. 17	132	160
160	Hrubý rozvod vzduchotechniky 2 - 4.NP	3 dny	7.8. 17	9.8. 17	159;151;152	162
161	Stoupací potrubí vzduchotechniky 5 - 6.NP	2 dny	6.8. 17	7.8. 17	133	136FF+2 dny
162	Hrubý rozvod vzduchotechniky 5.NP	6 dny	10.8. 17	15.8. 17	133;160	136FF+2 dny;163
163	Hrubý rozvod vzduchotechniky 6.NP	8 dny	16.8. 17	23.8. 17	134;162;119FF+2	138FF+1 den
164	Montáž solárních panelů	5 dny	15.8. 17	19.8. 17	117	165FF+3 dny
165	Hrubé rozvody silnoproud	28 dny	2.8. 17	29.8. 17	129;166SS;164FF-	138FF-5 dny
166	Osazení trafostanic	2 dny	2.8. 17	3.8. 17	129	165SS
167	Hrubý rozvod vodovodu 1.NP	2 dny	2.8. 17	3.8. 17	129	146FF+2 dny;192
168	Hrubý rozvod vodovodu 2 - 4.np	3 dny	3.8. 17	5.8. 17	130	192
169	Hrubý rozvod vodovodu 5.NP	8 dny	6.8. 17	13.8. 17	133	138FF+2 dny;170;192
170	Hrubý rozvod vodovodu 6.NP	1 den	14.8. 17	14.8. 17	134;169	138FF+2 dny;192
171	Sběrné žlaby a vpusti	1 den	11.8. 17	11.8. 17	147	192
172	SDK - podhledy 1.NP	4 dny	19.8. 17	22.8. 17	148;186FF+2 dny	199
173	Rozvody GSM	18 dny	2.8. 17	19.8. 17	129	138FF+2 dny
174	Rozvody MaR	18 dny	2.8. 17	19.8. 17	129	175
175	Rozvody MaR - střecha	3 dny	20.8. 17	22.8. 17	174	280
176	Jádra výtahů	36 dny	2.8. 17	6.9. 17	129	211FF+3 dny
177	Skleněné stěny 1.NP	6 dny	13.8. 17	18.8. 17	129;128	186FF+2 dny
178	Odkoušení kotlů	2 dny	7.8. 17	8.8. 17	134	260
179	SDK - podhledy 5.NP	10 dny	30.8. 17	8.9. 17	136	210
180	SDK - podhledy 6.NP	8 dny	31.8. 17	7.9. 17	138FS+1 den;198I	211SS+3 dny
181	Osazení a dozdění van 5.NP	2 dny	30.8. 17	31.8. 17	136	210
182	Stoupací potrubí chlazení 5.NP	3 dny	6.8. 17	8.8. 17	133	183;184
183	Stoupací potrubí chlazení 6.NP	1 den	9.8. 17	9.8. 17	182	185
184	Hrubý rozvod chlazení 5.NP	3 dny	9.8. 17	11.8. 17	182	136FF+2 dny
185	Hrubý rozvod chlazení 6.NP	3 dny	10.8. 17	12.8. 17	183	138FF+2 dny
186	KZS - strop 1.NP	10 dny	11.8. 17	20.8. 17	146;177FF+2 dny	172FF+2 dny
187	KZS - strop 4.NP	13 dny	8.8. 17	20.8. 17	132;144	188SS+3 dny
188	Podhled Cetris	18 dny	11.8. 17	28.8. 17	187SS+3 dny;190I	209
189	KZS - vnitřní stěny 1.NP	9 dny	9.8. 17	17.8. 17	148	190
190	KZS - vnitřní stěny 2-4.NP	6 dny	18.8. 17	23.8. 17	189	188FF+3 dny
191	Odvětrání výtahových šachet	1 den	2.8. 17	2.8. 17	114	192
192	Provedení zkoušek kanalizace, plynu, vodovodu, chlazení a vytápění	1 den	15.8. 17	15.8. 17	171;168;169;170;	257
193	Omítky a stěrky 1.NP	2 dny	9.8. 17	10.8. 17	146	205;194;199
194	Omítky a stěrky 2.NP	5 dny	11.8. 17	15.8. 17	193	195
195	Omítky a stěrky 3.NP	2 dny	16.8. 17	17.8. 17	194	196;252
196	Omítky a stěrky 4.NP	2 dny	18.8. 17	19.8. 17	195	197
197	Omítky a stěrky 5.NP	1 den	29.8. 17	29.8. 17	136FF;196	198
198	Omítky a stěrky 6.NP	1 den	30.8. 17	30.8. 17	138FF;197	180FF+3 dny
199	Omítky stropů 1.NP	1 den	23.8. 17	23.8. 17	193;172	200
200	Omítky stropů 2.NP	2 dny	24.8. 17	25.8. 17	199	201
201	Omítky stropů 3.NP	2 dny	26.8. 17	27.8. 17	200	202
202	Omítky stropů 4.NP	1 den	28.8. 17	28.8. 17	201	203
203	Omítky stropů 5.NP	1 den	29.8. 17	29.8. 17	202	204
204	Omítky stropů 6.NP	1 den	30.8. 17	30.8. 17	203	211
205	Hrubé povrchy podlah 1.NP	7 dny	11.8. 17	17.8. 17	193	207SS+2 dny;226;238FS+
206	Podlahové vytápění	2 dny	11.8. 17	12.8. 17	205SS	211
207	Hrubé povrchy podlah 2.NP	9 dny	13.8. 17	21.8. 17	205SS+2 dny	208;248FS+1 den
208	Hrubé povrchy podlah 3.NP	9 dny	22.8. 17	30.8. 17	207	209;249FS+1 den
209	Hrubé povrchy podlah 4.NP	8 dny	11.9. 17	18.9. 17	208;188;211	210SS+4 dny;250FS+1 de
210	Hrubé povrchy podlah 5.NP	8 dny	15.9. 17	22.9. 17	209SS+4 dny;179;	230FS+1 den;239FS+1 de
211	Hrubé povrchy podlah 6.NP	8 dny	3.9. 17	10.9. 17	180SS+3 dny;205;	209;240FS+1 den;260FS+
212	Zámková dlažba 1.NP	18 dny	19.8. 17	5.9. 17	205FS+1 den	213FF;214FF
213	Sběrné žlaby a vpusti	1 den	5.9. 17	5.9. 17	212FF	292
214	Ostrůvek pro závory a čisticí zóny	1 den	5.9. 17	5.9. 17	212FF	292
215	Demontáž výtahu	1 den	11.9. 17	11.9. 17	211	216FF+2 dny;312FF+2 dn
216	Montáž lešení	6 dny	8.9. 17	13.9. 17	215FF+2 dny	217SS+3 dny
217	Kontaktní zateplovací plášť	17 dny	11.9. 17	27.9. 17	216SS+3 dny;312I	218FF;219FF;220;221
218	Fasádní malba	4 dny	24.9. 17	27.9. 17	217FF;313FF	221
219	Klempířské práce	3 dny	25.9. 17	27.9. 17	217FF;313FF	221
220	Markýza	2 dny	28.9. 17	29.9. 17	217;313	221FF+2 dny
221	Demontáž lešení	4 dny	28.9. 17	1.10. 17	217;218;219;220I	222
222	Chodník + zámková dlažba	4 dny	2.10. 17	5.10. 17	221;317	223;224
223	Veřejné osvětlení	2 dny	6.10. 17	7.10. 17	222;318	311
224	Okapový chodník	2 dny	6.10. 17	7.10. 17	222;318	225
225	Zahradnické práce	2 dny	8.10. 17	9.10. 17	224;320	311
226	Malby stropy 1.NP	4 dny	18.8. 17	21.8. 17	205	227;232
227	Malby stropy 2.NP	3 dny	22.8. 17	24.8. 17	226	228;233
228	Malby stropy 3.NP	3 dny	25.8. 17	27.8. 17	227	229;234
229	Malby stropy 4.NP	2 dny	28.8. 17	29.8. 17	228	230;235
230	Malby stropy 5.NP	2 dny	24.9. 17	25.9. 17	210FS+1 den;229	231;236
231	Malby stropy 6.NP	2 dny	26.9. 17	27.9. 17	230	237
232	Malby stěny 1.NP	1 den	22.8. 17	22.8. 17	226;252	233;253
233	Malby stěny 2.NP	1 den	25.8. 17	25.8. 17	227;232	234
234	Malby stěny 3.NP	1 den	28.8. 17	28.8. 17	228;233	235
235	Malby stěny 4.NP	1 den	30.8. 17	30.8. 17	229;234	236
236	Malby stěny 5.NP	6 dny	26.9. 17	1.10. 17	230;235	237
237	Malby stěny 6.NP	4 dny	2.10. 17	5.10. 17	231;236;240	246FS-1 den;256;261;30
238	Obklady stěny 1.NP	5 dny	19.8. 17	23.8. 17	205FS+1 den	241
239	Obklady stěny 5.NP	11 dny	24.9. 17	4.10. 17	210FS+1 den	245FS-3 dny
240	Obklady stěny 6.NP	5 dny	12.9. 17	16.9. 17	211FS+1 den	237
241	Dlažby 1.NP	7 dny	24.8. 17	30.8. 17	238	242;254FS+1 den;255FS+
242	Dlažby 2.NP	1 den	31.8. 17	31.8. 17	241	243;298FS+1 den;263;27
243	Dlažby 3.NP	1 den	1.9. 17	1.9. 17	242	244;299FS+1 den;264;27
244	Dlažby 4.NP	1 den	2.9. 17	2.9. 17	243	245;300FS+1 den;265;27
245	Dlažby 5.NP	5 dny	2.10. 17	6.10. 17	244;239FS-3 dny	290FS-1 den;266;273;27
246	Dlažby 6.NP	2 dny	5.10. 17	6.10. 17	237FS-1 den	289;274;280;286;267
247	Povrch garáže 1.NP	1 den	19.8. 17	19.8. 17	205FS+1 den	262
248	Povrch garáže 2.NP	5 dny	23.8. 17	27.8. 17	207FS+1 den	263
249	Povrch garáže 3.NP	5 dny	1.9. 17	5.9. 17	208FS+1 den	264
250	Povrch garáže 4.NP	4 dny	20.9. 17	23.9. 17	209FS+1 den	265
251	Osazení výtahů	3 dny	18.8. 17	20.8. 17	205	
252	Osazení hydrantů 1 - 4.NP	1 den	18.8. 17	18.8. 17	195	232
253	Dopravní značení	4 dny	23.8. 17	26.8. 17	232	309
254	Automatické dveře	1 den	1.9. 17	1.9. 17	241FS+1 den	262
255	ČOV + kalové pole	2 dny	1.9. 17	2.9. 17	241FS+1 den	262
256	Osazení klimatizačních boxů	2 dny	6.10. 17	7.10. 17	237	322
257	Sociální zařízení 1.NP	1 den	31.8. 17	31.8. 17	241;192	259
258	Sociální zařízení 5.NP	5 dny	2.9. 17	6.9. 17	259	266
259	Sociální zařízení 6.NP	1 den	1.9. 17	1.9. 17	257	258
260	Vybavení kotelny	1 den	12.9. 17	12.9. 17	178;211FS+1 den	266
261	Osazení hydrantů	2 dny	6.10. 17	7.10. 17	237	311
262	Kompletace silnoproud 1.NP	2 dny	3.9. 17	4.9. 17	241;247;254;255	263
263	Kompletace silnoproud 2.NP	1 den	5.9. 17	5.9. 17	262;242;248	264
264	Kompletace silnoproud 3.NP	1 den	6.9. 17	6.9. 17	263;243;249	265
265	Kompletace silnoproud 4.NP	1 den	24.9. 17	24.9. 17	264;244;250	266
266	Kompletace silnoproud 5.NP	6 dny	9.10. 17	14.10. 17	290FS-2 dny;265;	267
267	Kompletace silnoproud 6.NP	6 dny	15.10. 17	20.10. 17	266;246	287;268
268	Demontáž trafostanice	1 den	21.10. 17	21.10. 17	267;14	311
269	Kompletace slaboproud 1.NP	2 dny	31.8. 17	1.9. 17	241	270
270	Kompletace slaboproud 2.NP	1 den	2.9. 17	2.9. 17	269;242	271
271	Kompletace slaboproud 3.NP	1 den	3.9. 17	3.9. 17	270;243	272
272	Kompletace slaboproud 4.NP	1 den	4.9. 17	4.9. 17	271
