PŘÍLOHA Č.5 - HARMONOGRAM

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1		**PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, BOURACÍ PRÁCE A HRUBÁ STAVBA**	**42 dny?**	**15.02. 17**	**28.03. 17**		
2		Příprava staveniště	2 dny	15.02. 17	16.02. 17		nákladní automob
3		Bourací práce 1.PP	1 den?	01.03. 17	01.03. 17	13	nákladní automob
4		Bourací práce 1.NP	6 dny	16.02. 17	21.02. 17	2SS+1 den	nákladní automob
5		Bourací práce 2.NP	3 dny	22.02. 17	24.02. 17	4	nákladní automob
6		Bourací práce 3.NP	2 dny	17.02. 17	18.02. 17	2	nákladní automob
7		Bourací práce 4.NP	2 dny	19.02. 17	20.02. 17	6	nákladní automob
8		Bourací práce 5.NP	2 dny	21.02. 17	22.02. 17	7	nákladní automob
9		Bourací práce 6.NP	2 dny	21.02. 17	22.02. 17	7	nákladní automob
10		Bourací práce 7.NP	2 dny	21.02. 17	22.02. 17	7	nákladní automob
11		Zednické práce 1.PP	1 den?	23.03. 17	24.03. 17	43SF	
12		Základy pod srtoje	1 den	06.03. 17	06.03. 17	16SS+4 dny	
13		Podlahové topení	4 dny	25.02. 17	28.02. 17	5	
14		Anhydrit 1.NP	1 den	01.03. 17	01.03. 17	13	pumpa
15		Broušení anhydritu 1.NP	2 dny	27.03. 17	28.03. 17	14FS+25 dny	bruska
16		Ocelové kce 1. a 2.NP	7 dny	02.03. 17	08.03. 17	14	svářecí zařízení
17		Betonářské práce 2.NP	1 den	06.03. 17	06.03. 17	16SS+4 dny	nákladní automob
18		Lešení prostorové	1 den	08.03. 17	08.03. 17	16FF	nákladní automob
19		Usazení lávky	1 den?	09.03. 17	09.03. 17	16	
20		Zednické práce 2.NP	2 dny	15.03. 17	16.03. 17	17FS+8 dny	
21		Lešení prostorové II.	1 den	10.03. 17	10.03. 17	19	nákladní automob
22		DMTZ podhled nad halou	1 den	11.03. 17	11.03. 17	21	nákladní automob
23		DMTZ lešení prostorové	1 den?	22.03. 17	22.03. 17	49	
24		Zednické práce 4.NP	1 den?	23.02. 17	23.02. 17	122	
25		**PŘIČKY A MONTOVANÉ KONSTRUKCE**	**32 dny**	**21.02. 17**	**24.03. 17**		
26		Bezpečnostní SDK příčky	3 dny	15.03. 17	17.03. 17	27	
27		Svislé SDK konstrukce 1.NP	3 dny	12.03. 17	14.03. 17	22	
28		SDK podhledy 1.NP	5 dny	18.03. 17	22.03. 17	26	
29		Svislé SDK konstrukce 2.NP	3 dny	12.03. 17	14.03. 17	22	
30		SDK podhledy 2.NP	10 dny	15.03. 17	24.03. 17	29	
31		Svislé SDK konsrtukce 3.NP	3 dny	21.02. 17	23.02. 17	127	
32		SDK podhledy 3.NP	5 dny	06.03. 17	10.03. 17	34	
33		Svislé SDK konstrukce 4.NP	1 den	02.03. 17	02.03. 17	38	
34		SDK podhledy 4.NP	3 dny	03.03. 17	05.03. 17	33	
35		Svislé SDK konstrukce 5.NP	1 den	27.02. 17	27.02. 17	37SS	
36		SDK podhledy 5.NP	1 den	28.02. 17	28.02. 17	35	
37		Svislé SDK konstrukce 6.NP	1 den	27.02. 17	27.02. 17	130	
38		SDK podhledy 6.NP	1 den	01.03. 17	01.03. 17	36	
39		**ÚPRAVY POVRCHŮ**	**31 dny?**	**03.03. 17**	**03.04. 17**		
40		Omítky 1.PP	1 den	02.04. 17	03.04. 17	71SF	
41		Malby 1.PP	1 den?	30.03. 17	31.03. 17	42SF;15	
42		Malby final 1.PP	1 den?	31.03. 17	31.03. 17	46FF	
43		Omítky 1.NP	1 den?	24.03. 17	25.03. 17	69SF;132;89	
44		Obklady 1.NP	3 dny	20.03. 17	22.03. 17	78;20	
45		Malby 1.NP	3 dny	28.03. 17	30.03. 17	50	
46		Malby final 1.NP	1 den?	31.03. 17	31.03. 17	45	
47		Omítky 2.NP	1 den?	13.03. 17	13.03. 17	52	
48		Obklady 2.NP	5 dny	20.03. 17	24.03. 17	78	
49		Malba nad halou	2 dny	20.03. 17	21.03. 17	30SS+5 dny	
50		Malby 2.NP	3 dny	25.03. 17	27.03. 17	30	
51		Malby final 2.NP	1 den?	28.03. 17	28.03. 17	50	
52		Omítky 3.NP	2 dny	11.03. 17	12.03. 17	32	
53		Obklady 3.NP	4 dny	13.03. 17	16.03. 17	52	
54		Malby 3.NP	2 dny	20.03. 17	21.03. 17	75	
55		Malby final 3.NP	1 den?	22.03. 17	22.03. 17	54	
56		Omítky 4.NP	3 dny	06.03. 17	08.03. 17	34	
57		Obklady 4.NP	4 dny	11.03. 17	14.03. 17	84	
58		Malby 4.NP	2 dny	17.03. 17	18.03. 17	81FS-1 den	
59		Malby final 4.NP	1 den?	19.03. 17	19.03. 17	58	
60		Omítky 5.NP	1 den	03.03. 17	04.03. 17	64SF	
61		Obklady 5.NP	3 dny	06.03. 17	08.03. 17	76	
62		Malby 5. NP	2 dny	11.03. 17	12.03. 17	84	
63		Malby final 5.NP	1 den?	13.03. 17	13.03. 17	62	
64		Omítky 6.NP	1 den?	04.03. 17	04.03. 17	124FS+1 den	
65		Obklady 6.NP	3 dny	06.03. 17	08.03. 17	76	
66		Malby 6.NP	2 dny	11.03. 17	12.03. 17	87	
67		Malby final 6.NP	1 den?	13.03. 17	13.03. 17	66	
68		**PODLAHY**	**31 dny?**	**05.03. 17**	**04.04. 17**		
69		Keram. Dlažba 1.PP	1 den	25.03. 17	25.03. 17	48	
70		Samonivelační hmota 1.NP	1 den	23.03. 17	23.03. 17	23;12	pumpa
71		Koberec 1.NP	2 dny	03.04. 17	04.04. 17	107;74	
72		Keram. Dlažba 1.NP	4 dny	25.03. 17	28.03. 17	48	
73		Samonivelační hmota 2.NP	1 den?	23.03. 17	23.03. 17	23	pumpa
74		Koberec 2.NP	1 den?	01.04. 17	01.04. 17	110	
75		Keram. Dlažba 2.NP	3 dny	17.03. 17	19.03. 17	53	
76		Samonivelační hmota 3.NP	1 den	05.03. 17	05.03. 17	64	pumpa
77		Koberec 3.NP	2 dny	25.03. 17	26.03. 17	112;80	
78		Keram. Dlažba 3.NP	3 dny	17.03. 17	19.03. 17	53	
79		Samonivelační hmota 4.NP	1 den	05.03. 17	05.03. 17	76SS	pumpa
80		Koberec 4.NP	2 dny	22.03. 17	23.03. 17	114;83	
81		Keram. Dlažba 4.NP	3 dny	15.03. 17	17.03. 17	57	
82		Samonivelační hmota 5.NP	1 den	05.03. 17	05.03. 17	79SS	pumpa
83		Koberec 5.NP	2 dny	17.03. 17	18.03. 17	86	
84		Keram. Dlažba 5.NP	2 dny	09.03. 17	10.03. 17	65	
85		Samonivelační hmota 6.NP	1 den	05.03. 17	05.03. 17	82SS	pumpa
86		Koberec 6.NP	2 dny	15.03. 17	16.03. 17	117	
87		Keram. Dlažba 6.NP	2 dny	09.03. 17	10.03. 17	65	
88		**TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE**	**30 dny?**	**02.03. 17**	**31.03. 17**		
89		Osazení zárubní 1.NP	1 den	17.03. 17	17.03. 17	90FF	
90		Povrch. úprava zárubní 1.NP	3 dny	15.03. 17	17.03. 17	93	
91		Renovace okeních otvorů 1.NP	1 den?	15.03. 17	15.03. 17	93	
92		Osazení zárubní 2.NP	1 den	24.03. 17	24.03. 17	50SF-1 den	
93		Povrch. úprava zárubní 2.NP	1 den?	14.03. 17	14.03. 17	95	
94		Mont. zábradlí a parapetu 2.NP	1 den?	29.03. 17	29.03. 17	108	
95		Povrch. úprava zárubní 3.NP	3 dny	11.03. 17	13.03. 17	97	
96		Mont. parapetu 3.NP	1 den?	17.03. 17	17.03. 17	78SS	
97		Povrch. úprava zárubní 4.NP	2 dny	09.03. 17	10.03. 17	61	
98		Povrch. úprava zárubní 5.NP	2 dny	04.03. 17	05.03. 17	99	
99		Povrch. úprava zárubní 6.NP	2 dny	02.03. 17	03.03. 17	38	
100		M+D dveřní křídla	2 dny	30.03. 17	31.03. 17	110FF	
101		**ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE**	**20 dny?**	**14.03. 17**	**02.04. 17**		
102		Demont.+Mont. zábradlí schod. zrcadla	2 dny	28.03. 17	29.03. 17	72FF+1 den	
103		Zábradlí SDK polopříčka	3 dny	24.03. 17	26.03. 17	73	
104		Nerez madlo 1.NP	1 den	31.03. 17	31.03. 17	110FF	
105		Bezpečnostní dveře	1 den	24.03. 17	24.03. 17	73	
106		M+D vstupní dveře 1.NP	1 den	16.03. 17	16.03. 17	159	
107		Hliníkové konstrukce 1.NP	2 dny	01.04. 17	02.04. 17	110	
108		Pochozí sklo-lávka	1 den	28.03. 17	28.03. 17	167	
109		Nerez madlo 2.NP	1 den	31.03. 17	31.03. 17	110FF	
110		Hliníkové konstrukce 2.NP	4 dny	28.03. 17	31.03. 17	50	
111		Nerez madlo 3.NP	2 dny	30.03. 17	31.03. 17	110FF	
112		Hliníkové konstrukce 3.NP	2 dny	23.03. 17	24.03. 17	55	
113		Nerez madlo 4.NP	1 den?	31.03. 17	31.03. 17	110FF	
114		Hliníkové konstrukce 4.NP	2 dny	20.03. 17	21.03. 17	59	
115		Nerez madlo 5.NP	1 den?	31.03. 17	31.03. 17	110FF	
116		Hliníkové konstrukce 5.NP	1 den?	14.03. 17	14.03. 17	63	
117		Hliníkové konstrukce 6.NP	1 den?	14.03. 17	14.03. 17	67	
118		**TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV**	**45 dny?**	**19.02. 17**	**04.04. 17**		
119		Elektro rozvody 1.NP	3 dny	02.03. 17	04.03. 17	14	
120		Elektro rozvody 2.NP	3 dny	03.03. 17	05.03. 17	124	
121		Elektro rozvody 3.NP	2 dny	23.02. 17	24.02. 17	122	
122		Elektro rozvody 4.NP	2 dny	21.02. 17	22.02. 17	7	
123		Elektro rozvody 5.NP	2 dny	27.02. 17	28.02. 17	121FS+2 dny	
124		Elektro rozvody 6.NP	2 dny	01.03. 17	02.03. 17	123	
125		ZTI+ÚT rozvody 1.NP	3 dny	06.03. 17	08.03. 17	126FS+2 dny	
126		ZTI+ÚT rozvody 2.NP	3 dny	01.03. 17	03.03. 17	13	
127		ZTI+ÚT rozvody 3.NP	2 dny	19.02. 17	20.02. 17	6	
128		ZTI+ÚT rozvody 4.NP	2 dny	21.02. 17	22.02. 17	127	
129		ZTI+ÚT rozvody 5.NP	2 dny	23.02. 17	24.02. 17	128	
130		ZTI+ÚT rozvody 6.NP	2 dny	25.02. 17	26.02. 17	129	
131		VZT strojovna 1.PP	7 dny	02.03. 17	08.03. 17	3	
132		VZT rozvody 1.NP	4 dny	15.03. 17	18.03. 17	133	
133		VZT rozvody 2.NP	6 dny	09.03. 17	14.03. 17	16;134	
134		VZT rozvody 3.NP	4 dny	03.03. 17	06.03. 17	135	
135		VZT rozvody 4.NP	3 dny	28.02. 17	02.03. 17	136	
136		VZT rozvody 5.NP	3 dny	25.02. 17	27.02. 17	137	
137		VZT rozvody 6.NP	2 dny	23.02. 17	24.02. 17	9	
138		Elektro kompletace 1.NP	12 dny	24.03. 17	04.04. 17	139SS	
139		Elektro kompletace 2.NP	12 dny	24.03. 17	04.04. 17	70;140	
140		Elektro kompletace 3.NP	3 dny	15.03. 17	17.03. 17	141	
141		Elektro kompletace 4.NP	2 dny	13.03. 17	14.03. 17	142FS+1 den	
142		Elektro kompletace 5.NP	2 dny	10.03. 17	11.03. 17	143	
143		Elektro kompletace 6.NP	2 dny	08.03. 17	09.03. 17	155	
144		ZTI+ÚT kompletace 1.NP	2 dny	01.04. 17	02.04. 17	145	
145		ZTI+ÚT kompletace 2.NP	4 dny	28.03. 17	31.03. 17	51SS;146	
146		ZTI+ÚT kompletace 3.NP	1 den?	23.03. 17	23.03. 17	55;147	
147		ZTI+ÚT kompletace 4.NP	2 dny	20.03. 17	21.03. 17	59;149	
148		ZTI+ÚT kompletace 5.NP	1 den?	11.03. 17	11.03. 17	84	
149		ZTI+ÚT kompletace 6.NP	1 den?	11.03. 17	11.03. 17	87	
150		VZT kompletace 1.NP	3 dny	31.03. 17	02.04. 17	151	
151		VZT kompletace 2.NP	3 dny	28.03. 17	30.03. 17	51SS;152	
152		VZT kompletace 3.NP	2 dny	13.03. 17	14.03. 17	153FS+1 den	
153		VZT kompletace 4.NP	2 dny	10.03. 17	11.03. 17	154	
154		VZT kompletace 5.NP	2 dny	08.03. 17	09.03. 17	155	
155		VZT kompletace 6.NP	2 dny	06.03. 17	07.03. 17	65SS	
156		Reknostrukce výtahu	18 dny	09.03. 17	26.03. 17	16	
157		**FASÁDA**	**10 dny?**	**13.03. 17**	**22.03. 17**		
158		Mont. Lešení + oplocení	1 den	13.03. 17	13.03. 17		nákladní automob
159		Úprava zdiva	2 dny	14.03. 17	15.03. 17	158	
160		Kamenný obklad	2 dny	20.03. 17	21.03. 17	161FS+2 dny	
161		Fasádní omítka	2 dny	16.03. 17	17.03. 17	159	
162		Demont. Lešení + oplocení	1 den?	22.03. 17	22.03. 17	160	nákladní automob
163		**DOKONČOVACÍ PRÁCE**	**11 dny?**	**25.03. 17**	**04.04. 17**		
164		Zazdění přístupového otvor	1 den	25.03. 17	25.03. 17	105	
165		Čištění budovy	6 dny	30.03. 17	04.04. 17	102	nákladní automob
166		Hasící přístroje	1 den?	01.04. 17	01.04. 17	46	
167		Skleněná stěna s logem	1 den?	27.03. 17	27.03. 17	103	
168		Montáž rolety	1 den?	03.04. 17	03.04. 17	107	
169		Zařizovací přeměty invalida	1 den?	03.04. 17	03.04. 17	107	
170		Předání stavby	0 dny	04.04. 17	04.04. 17	169FF;168FF;1	

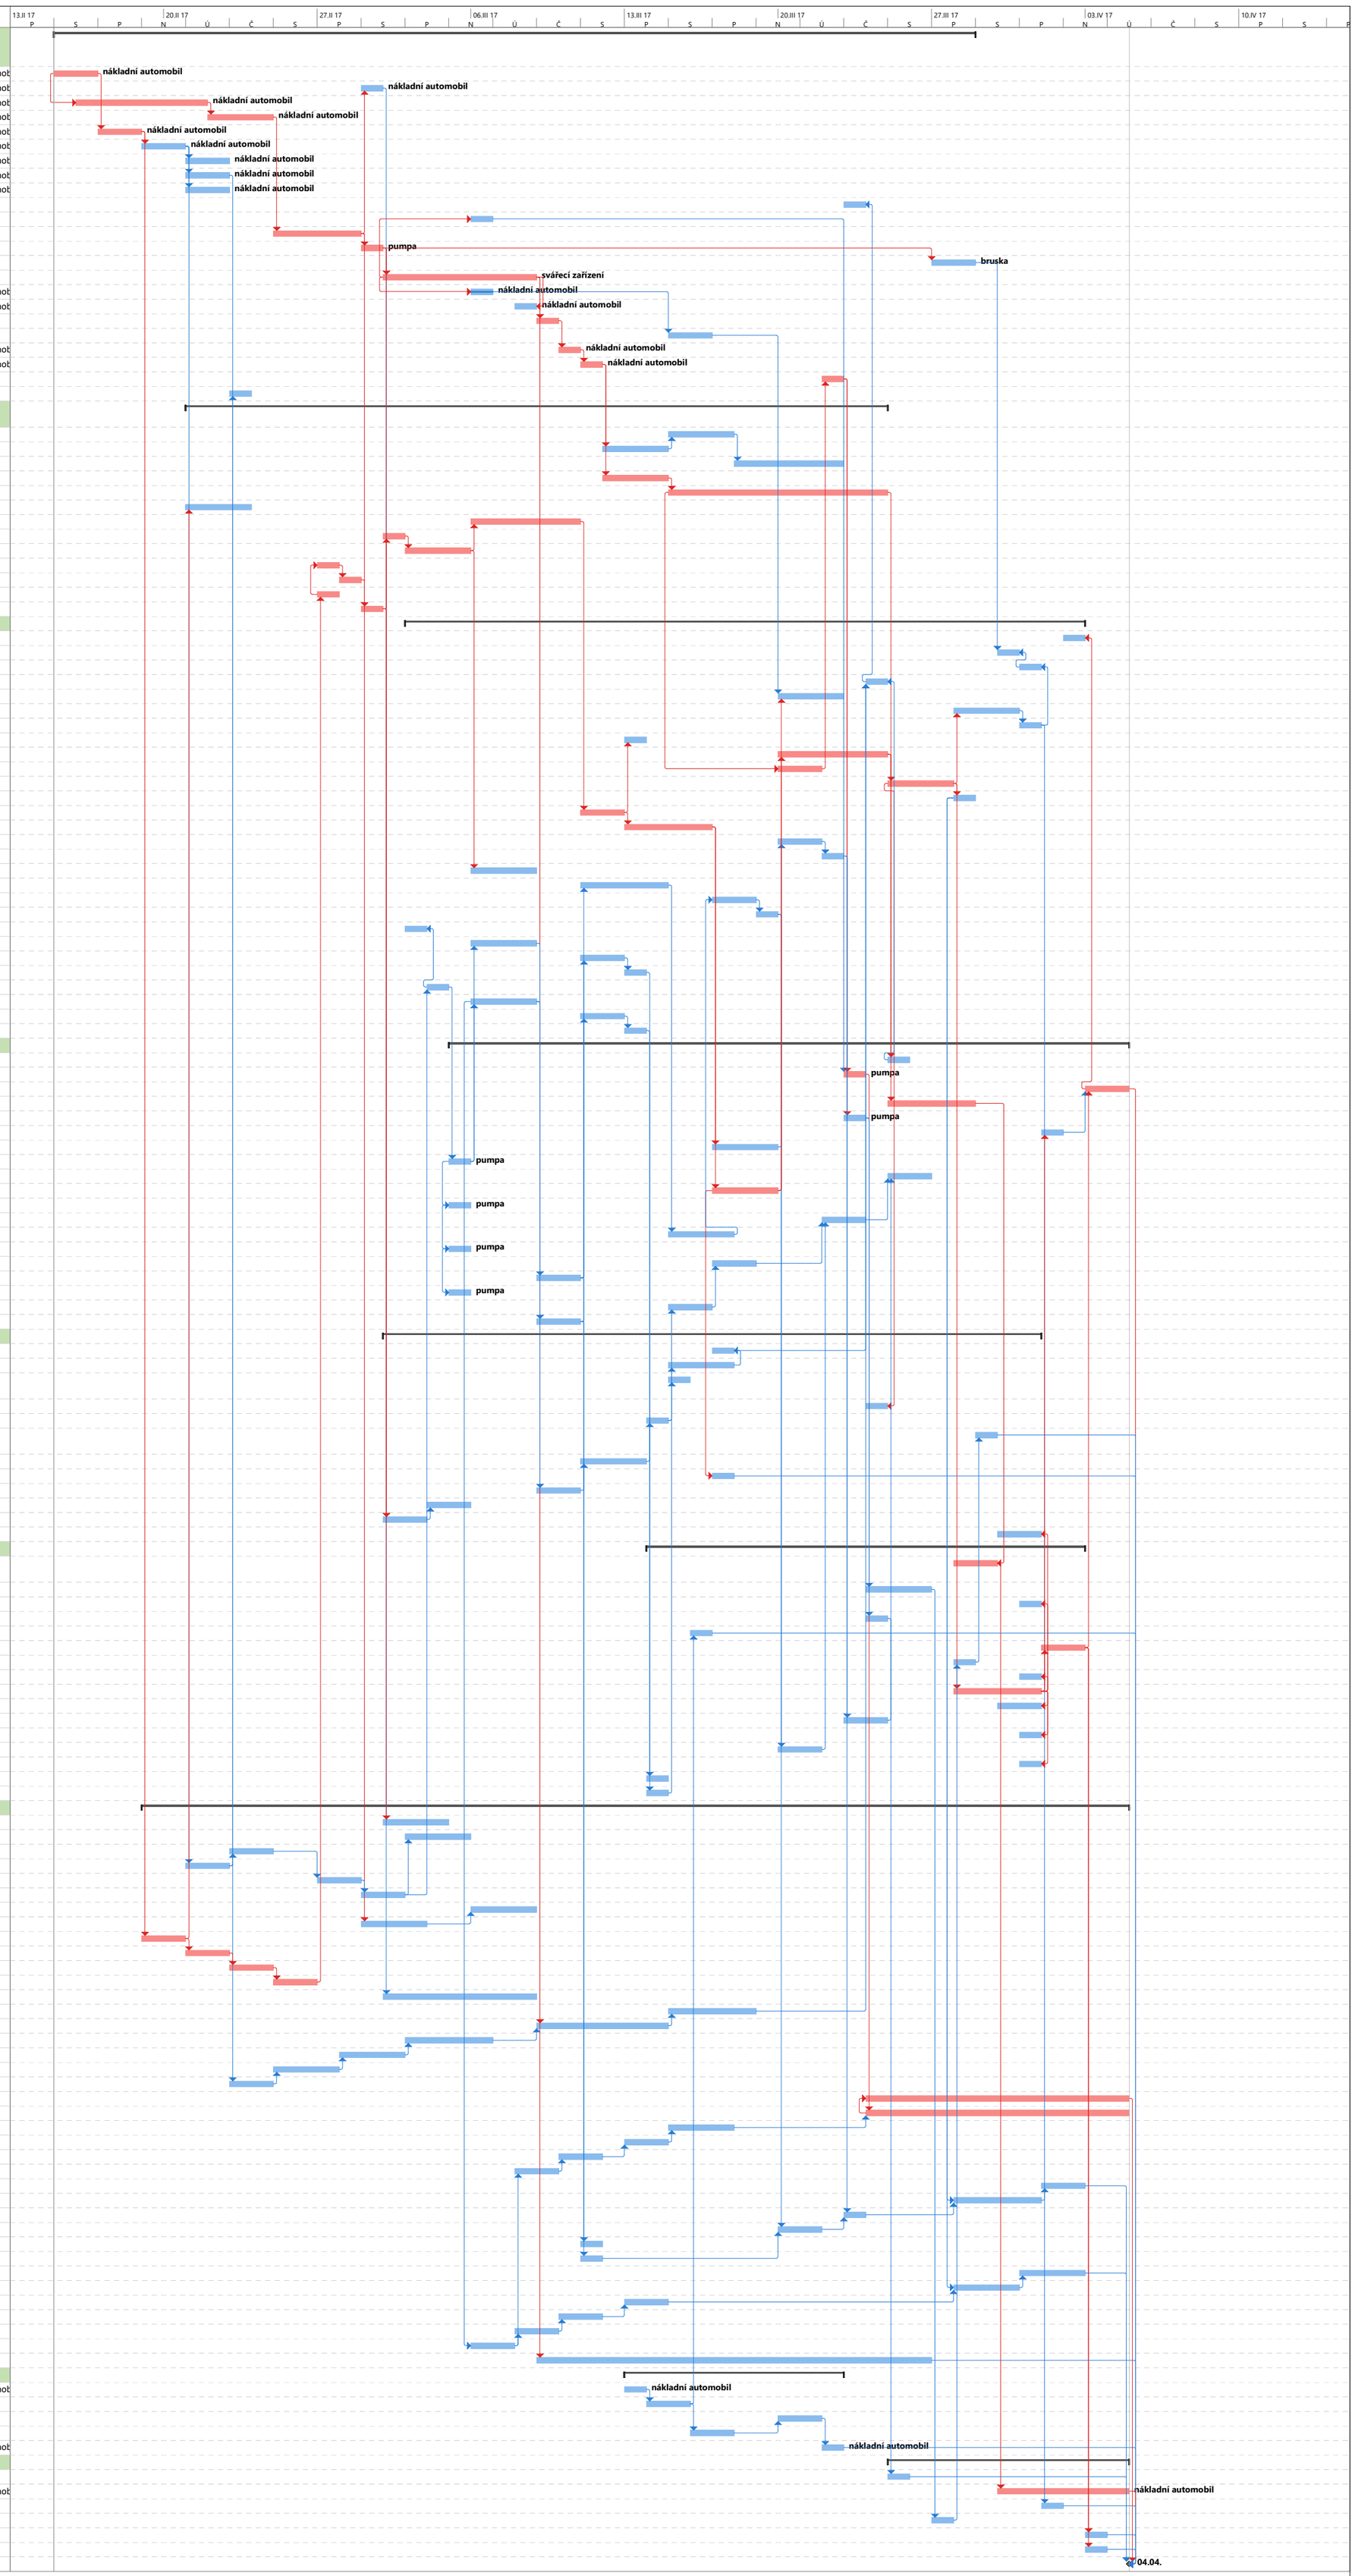

Projekt: harmonogram_bakalářs
Datum: 28.05. 17

Úkol	Souhrnný	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější milník	Kritické rozdělení	
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín	Průběh	
Milník	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Kritický	Průběh ručně zadaného úkolu	
