ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**Přípravné práce**	**7 dny**	**01.03. 18**	**09.03. 18**	
2	převzetí staveniště	1 den	01.03. 18	01.03. 18	
3	vytyčení staveniště	1 den	02.03. 18	02.03. 18	2
4	zřízení staveniště	1 den	05.03. 18	05.03. 18	3
5	odstranění křovin a porostu	1 den	06.03. 18	06.03. 18	4
6	sejmutí ornice	2 dny	07.03. 18	08.03. 18	5
7	provizorní napojení na el. Síť	1 den	09.03. 18	09.03. 18	6
8	provizorní napojení na vodovod	1 den	09.03. 18	09.03. 18	6
9	**Zemní práce**	**37 dny**	**09.03. 18**	**30.04. 18**	
10	vytyčení stavební jámy	1 den	09.03. 18	09.03. 18	6
11	výkop stavební jámy	21 dny	12.03. 18	09.04. 18	10
12	vytyčení základových pasů a desek	1 den	10.04. 18	10.04. 18	11
13	výkop základových pasů	4 dny	11.04. 18	16.04. 18	12
14	vodovodní přípojka	3 dny	17.04. 18	19.04. 18	13
15	kanalizační přípojka	3 dny	20.04. 18	24.04. 18	14
16	elektro přípojka	2 dny	25.04. 18	26.04. 18	15
17	plynová přípojka	2 dny	27.04. 18	30.04. 18	16
18	přemístění zeminy na skládku	10 dny	17.04. 18	30.04. 18	17FF
19	**Základy**	**18 dny**	**01.05. 18**	**24.05. 18**	
20	výztuž základových pasů	1 den	01.05. 18	01.05. 18	17
21	betonáž základových pasů	3 dny	02.05. 18	04.05. 18	20
22	zřízení bednění základové desky	1 den	07.05. 18	07.05. 18	21
23	výztuž základové desky	1 den	08.05. 18	08.05. 18	22
24	betonáž základové desky	3 dny	09.05. 18	11.05. 18	23
25	odstranění bednění desky	1 den	16.05. 18	16.05. 18	24FS+2 dny
26	vodorovná hydroizolace	6 dny	17.05. 18	24.05. 18	25
27	**Hrubá stavba (svislé+vodorovné)**	**98,75 dn**	**25.05. 18**	**10.10. 18**	**26**
28	**1. NP + část 2. NP**	**54,75 dn**	**25.05. 18**	**09.08. 18**	
29	výztuž ŽB stěn	7 dny	25.05. 18	04.06. 18	26
30	zřízení bednění ŽB stěn	14 dny	05.06. 18	22.06. 18	29
31	zřízení bednění schod. stupňů	1 den	25.06. 18	25.06. 18	30
32	výztuž schod. stupňů	1 den	26.06. 18	26.06. 18	31
33	betonáž ŽB stěn	8 dny	27.06. 18	09.07. 18	32
34	betonáž schod. stupňů	1 den	09.07. 18	10.07. 18	33
35	odstranění bednění ŽB stěn	7 dny	16.07. 18	25.07. 18	33FS+5 dny
36	odstranění bednení schod. stupňů	1 den	12.07. 18	13.07. 18	34FS+2 dny
37	provedení svislé hydroizolace	3 dny	25.07. 18	30.07. 18	35
38	provedení tep. Izolace XPS	3 dny	30.07. 18	02.08. 18	37
39	hutněný zásyp	5 dny	02.08. 18	09.08. 18	38
40	montáž panelů SPIROLL	1 den	25.07. 18	26.07. 18	35
41	**Zbytek 2. NP**	**27 dny**	**26.07. 18**	**03.09. 18**	
42	výztuž ŽB stěn	4 dny	26.07. 18	01.08. 18	40
43	zřízení bednění ŽB stěn	4 dny	01.08. 18	07.08. 18	42
44	betonáž ŽB stěn	5 dny	07.08. 18	14.08. 18	43
45	odstranění bednění ŽB stěn	3 dny	21.08. 18	24.08. 18	44FS+5 dny
46	montáž panelů SPIROLL	6 dny	24.08. 18	03.09. 18	45
47	**3. NP**	**49 dny**	**02.08. 18**	**10.10. 18**	
48	výztuž ŽB stěn	3 dny	03.09. 18	06.09. 18	46
49	zřízení bednění ŽB stěn	6 dny	06.09. 18	14.09. 18	48
50	betonáž ŽB stěn	3 dny	14.09. 18	19.09. 18	49
51	odstranění bednění ŽB stěn	4 dny	26.09. 18	02.10. 18	50FS+5 dny
52	montáž panelů SPIROLL	3 dny	02.10. 18	05.10. 18	51
53	montáž stropních panelů	1 den	05.10. 18	08.10. 18	52
54	drenážní trubky	1 den	02.08. 18	03.08. 18	38
55	hutněný zásyp	10 dny	09.08. 18	23.08. 18	39
56	zdění atiky	3 dny	05.10. 18	10.10. 18	52
57	**Střecha**	**20 dny**	**05.10. 18**	**02.11. 18**	
58	osazení vpustí a prostupů	1 den	05.10. 18	08.10. 18	52
59	parozábrana	4 dny	10.10. 18	16.10. 18	56;58
60	tepelná izolace střechy	5 dny	16.10. 18	23.10. 18	59
61	hydroizolace střechy	8 dny	23.10. 18	02.11. 18	60
62	**Dokončovací práce - vnitřní**	**89 dny**	**02.11. 18**	**13.03. 19**	
63	**1. NP**	**7 dny**	**02.11. 18**	**13.11. 18**	
64	osazení zárubní	1 den	02.11. 18	05.11. 18	61
65	montáž pomocného lešení	1 den	05.11. 18	06.11. 18	64
66	zdění příček	2 dny	06.11. 18	08.11. 18	65
67	osazení překladu	1 den	07.11. 18	08.11. 18	66FF
68	montáž oken	1 den	06.11. 18	07.11. 18	65
69	rozvody kanalizace	2 dny	06.11. 18	08.11. 18	65
70	rozvody vodovodu	3 dny	06.11. 18	09.11. 18	65
71	rozvody elektřiny	4 dny	06.11. 18	12.11. 18	65
72	demontáž pomocného lešení	1 den	12.11. 18	13.11. 18	71
73	**2. NP**	**14 dny**	**08.11. 18**	**28.11. 18**	
74	osazení zárubní	2 dny	08.11. 18	12.11. 18	67
75	montáž pomocného lešení	1 den	12.11. 18	13.11. 18	74
76	zdění příček	4 dny	13.11. 18	19.11. 18	75
77	osazení překladu	1 den	16.11. 18	19.11. 18	76FF
78	montáž oken	4 dny	13.11. 18	19.11. 18	75;68
79	rozvody vzduchotechniky	10 dny	13.11. 18	27.11. 18	75
80	rozvody kanalizace	2 dny	13.11. 18	15.11. 18	75;69
81	rozvody vodovodu	3 dny	13.11. 18	16.11. 18	75;70
82	rozvody elektřiny	4 dny	13.11. 18	19.11. 18	75;71
83	demontáž pomocného lešení	1 den	27.11. 18	28.11. 18	79
84	**3. NP**	**12 dny**	**19.11. 18**	**05.12. 18**	
85	osazení zárubní	1 den	19.11. 18	20.11. 18	77
86	montáž pomocného lešení	1 den	20.11. 18	21.11. 18	85
87	zdění příček	4 dny	21.11. 18	27.11. 18	86
88	osazení překladu	1 den	26.11. 18	27.11. 18	87FF
89	montáž oken	4 dny	21.11. 18	27.11. 18	86;78
90	rozvody vzduchotechniky	5 dny	27.11. 18	04.12. 18	86;79
91	rozvody kanalizace	2 dny	21.11. 18	23.11. 18	86;80

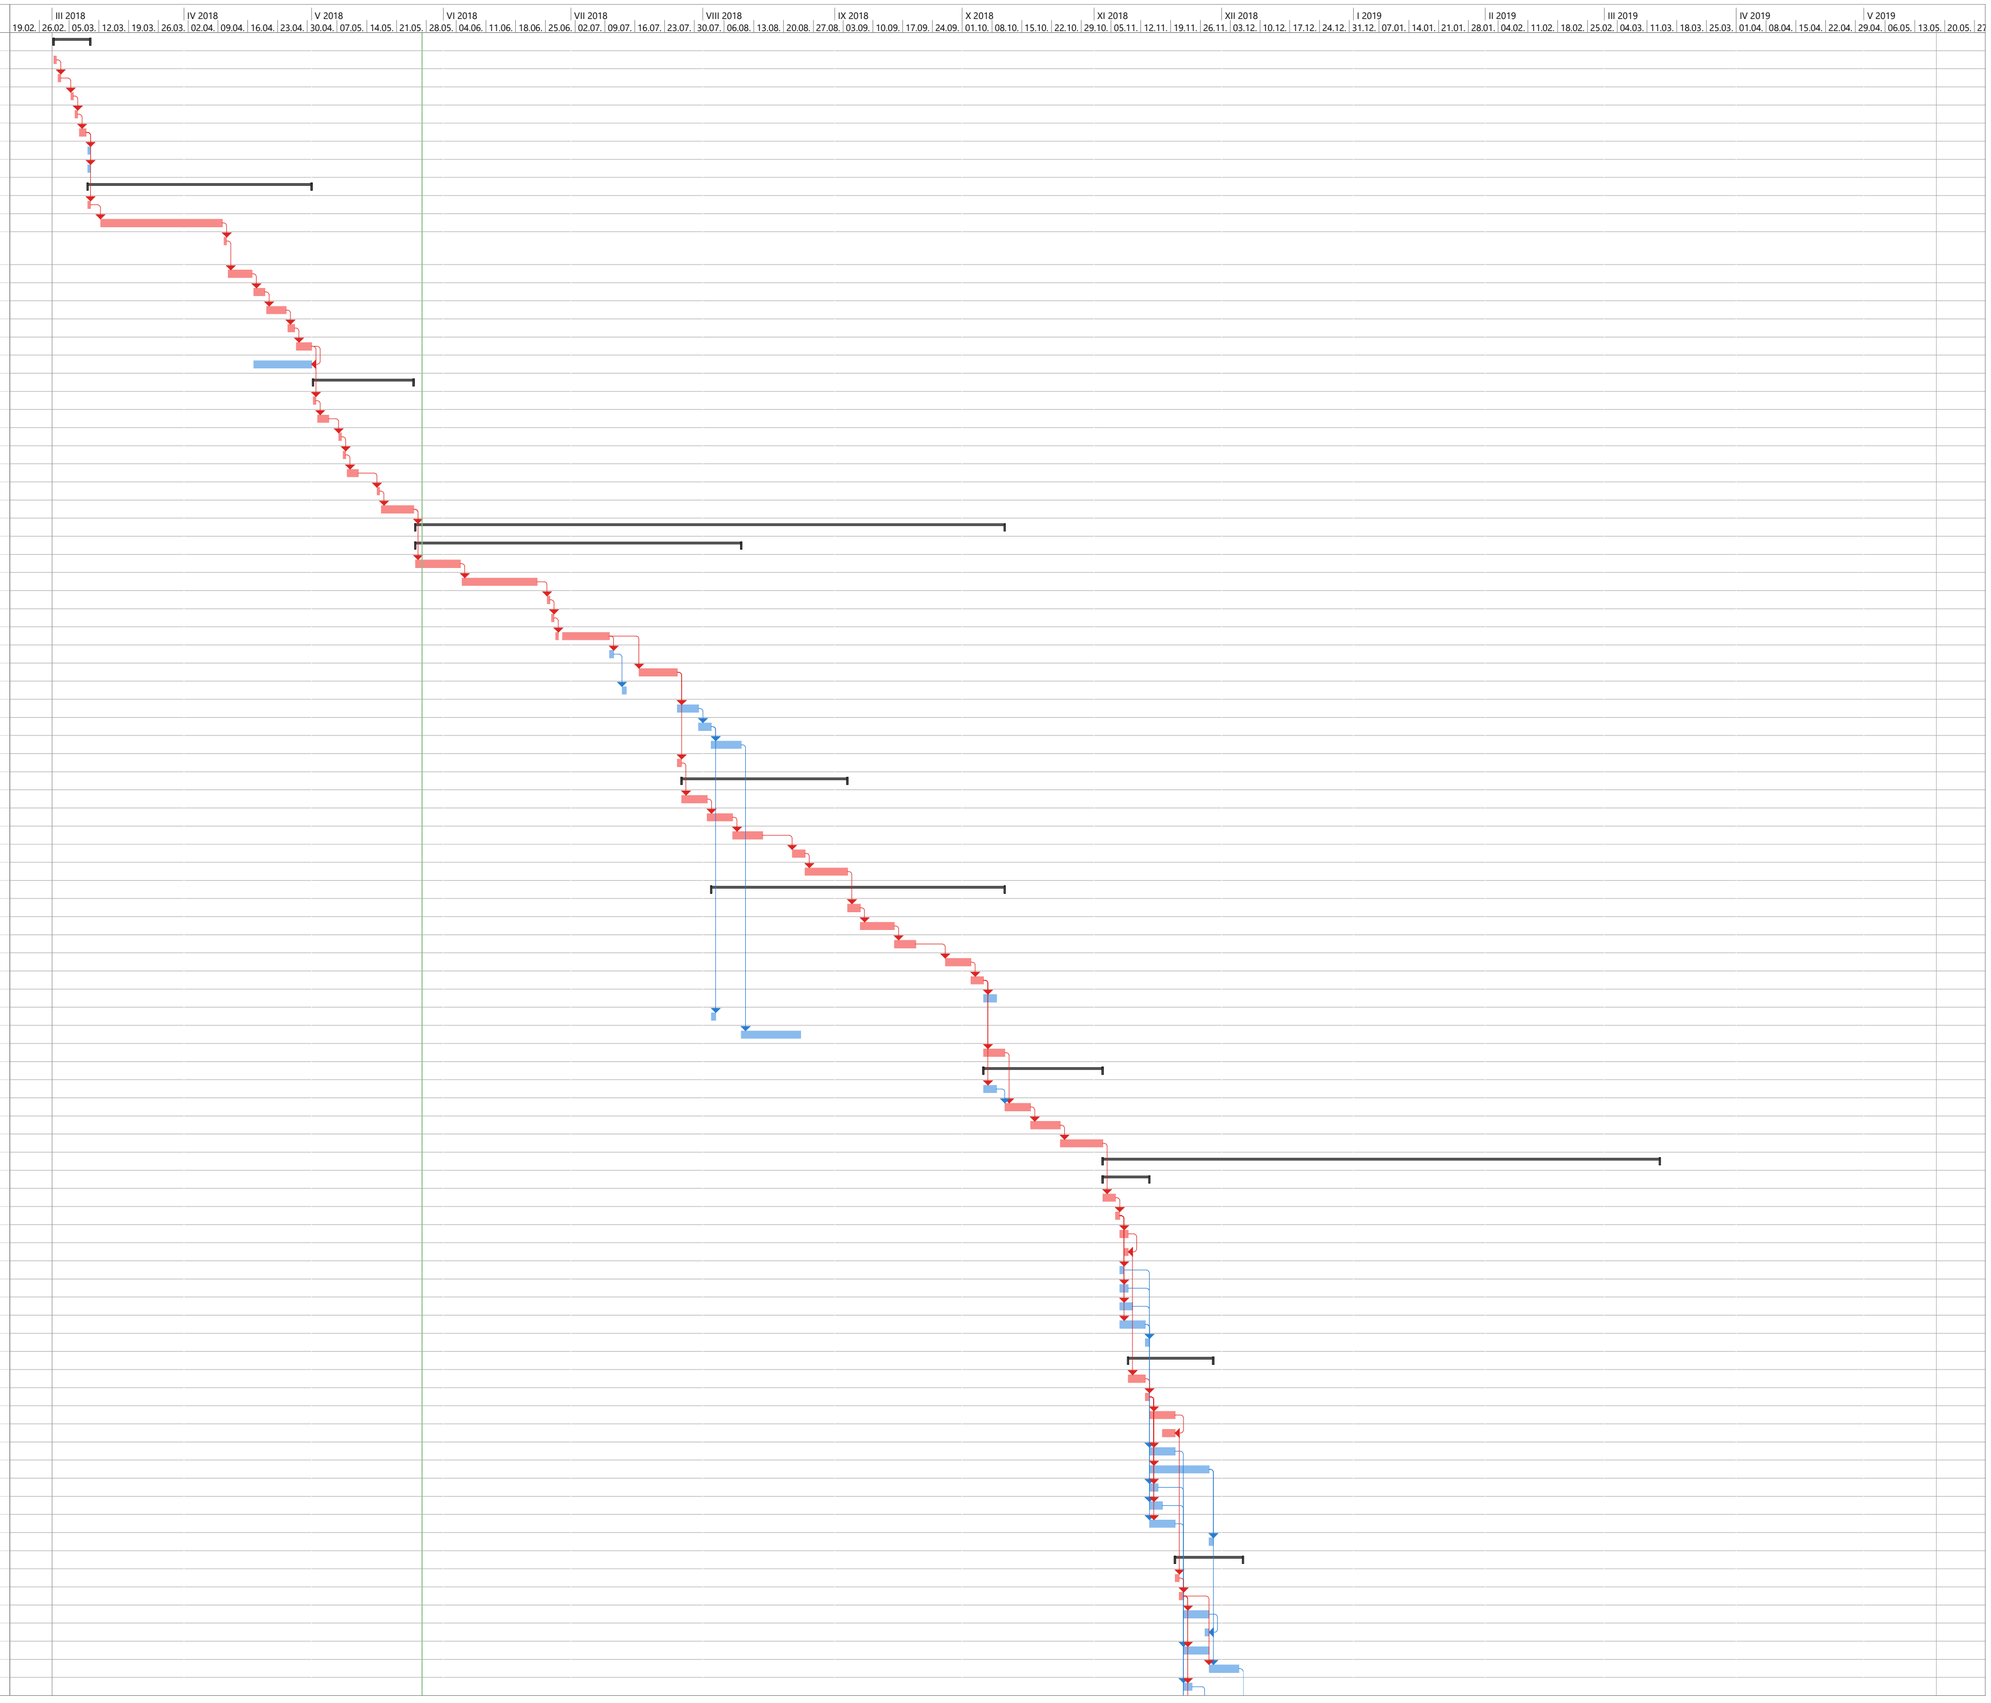
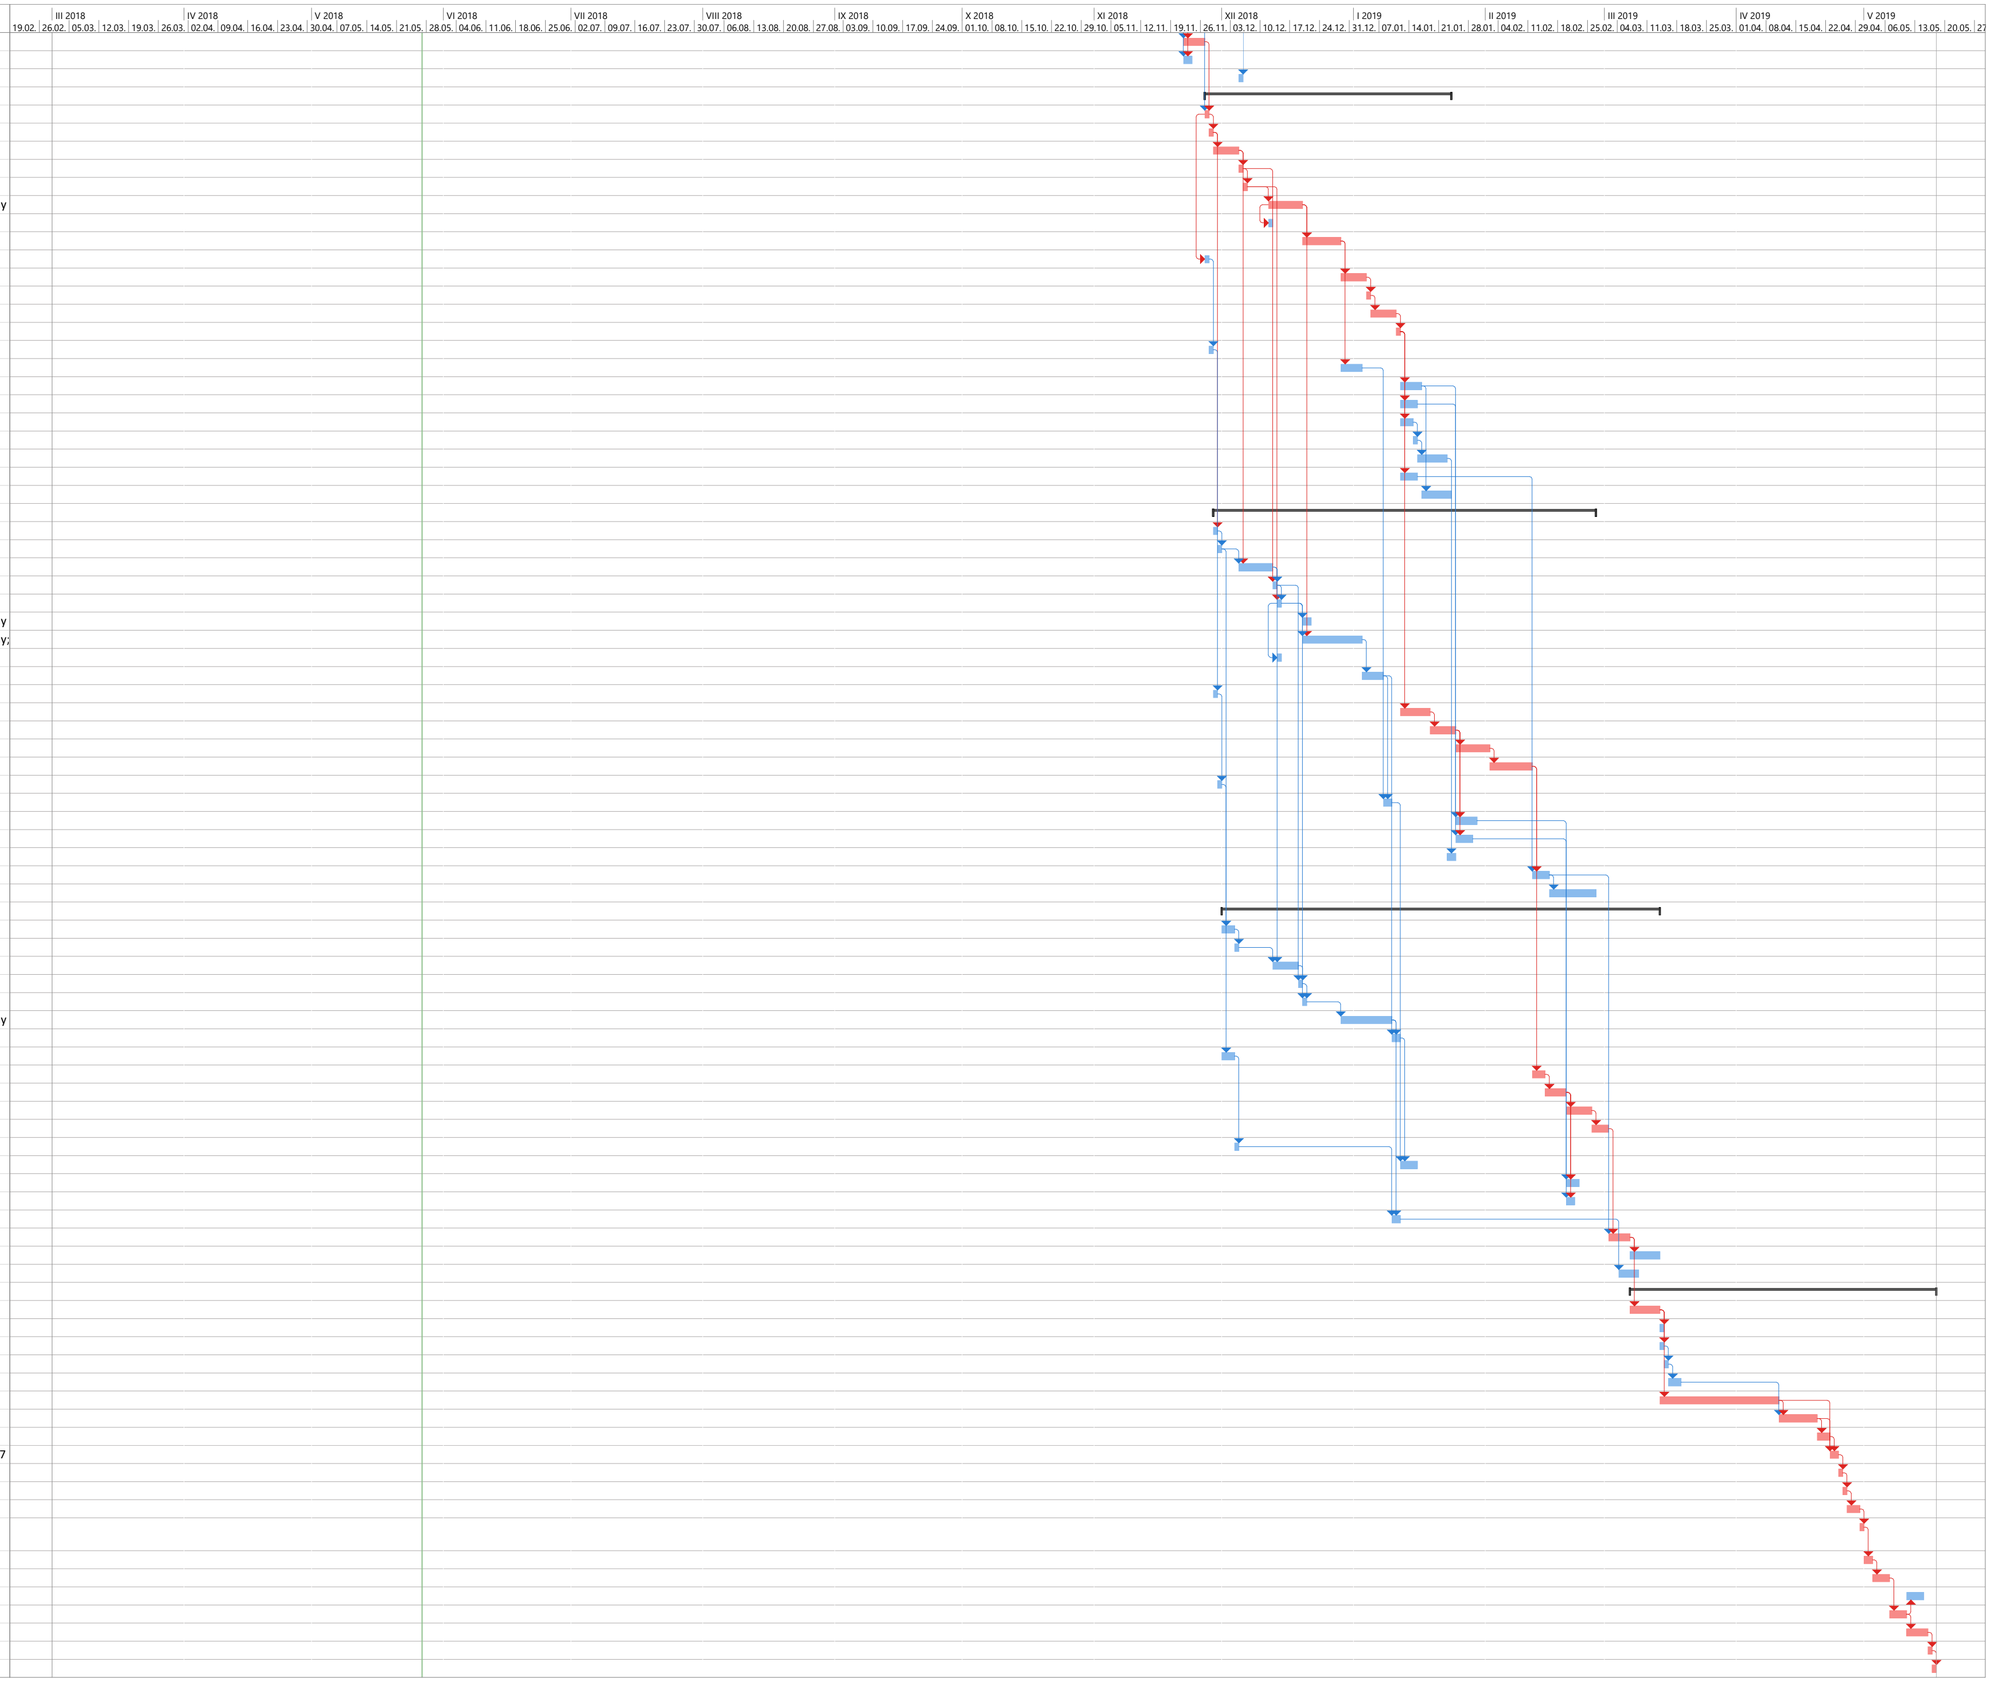
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
92	rozvody vodovodu	3 dny	21.11. 18	26.11. 18	86;81
93	rozvody elektřiny	2 dny	21.11. 18	23.11. 18	86;82
94	demontáž pomocného lešení	1 den	04.12. 18	05.12. 18	90
95	**1. NP**	**38 dny**	**26.11. 18**	**23.01. 19**	
96	montáž SDK instal. šachty	1 den	26.11. 18	27.11. 18	91;92
97	montáž SDK předstěny	1 den	27.11. 18	28.11. 18	96
98	pokládka tep. Izolace podlahy	4 dny	28.11. 18	04.12. 18	97
99	výztuž mazaniny - KARI síť	1 den	04.12. 18	05.12. 18	98
100	betonová mazanina + dil. Pásky	1 den	05.12. 18	06.12. 18	99
101	keramická dlažba	6 dny	11.12. 18	19.12. 18	100FS+3 dny
102	hydroizolace koupelny	1 den	11.12. 18	12.12. 18	101SS
103	obklady	4 dny	19.12. 18	28.12. 18	101
104	osazení parapetů - vnitřní	1 den	26.11. 18	27.11. 18	96SS
105	omítka stěn	3 dny	28.12. 18	03.01. 19	103
106	omítka stropu	1 den	03.01. 19	04.01. 19	105
107	štuková omítka stěn	4 dny	04.01. 19	10.01. 19	106
108	štuková omítka stropu	1 den	10.01. 19	11.01. 19	107
109	osazení dveří	1 den	27.11. 18	28.11. 18	104
110	kompletace - sanita	2 dny	28.12. 18	02.01. 19	103
111	kompletace - vzduchotechnika	3 dny	11.01. 19	16.01. 19	108
112	kompletace - elektro	2 dny	11.01. 19	15.01. 19	108
113	montáž zábradlí schodiště	1 den	11.01. 19	14.01. 19	108
114	montáž zábradlí	1 den	14.01. 19	15.01. 19	113
115	montáž ocelového schodiště	5 dny	15.01. 19	22.01. 19	114
116	malba stěn + stropů	2 dny	11.01. 19	15.01. 19	108
117	úklid	5 dny	16.01. 19	23.01. 19	111
118	**2. NP**	**60 dny**	**28.11. 18**	**26.02. 19**	
119	montáž SDK instal. šachty	1 den	28.11. 18	29.11. 18	97
120	montáž SDK předstěny	1 den	29.11. 18	30.11. 18	119
121	pokládka tep. Izolace podlahy	6 dny	04.12. 18	12.12. 18	120;98
122	výztuž mazaniny - KARI síť	1 den	12.12. 18	13.12. 18	121;99
123	betonová mazanina + dil. Pásky	1 den	13.12. 18	14.12. 18	122;100
124	pokládka gumové podlahy	2 dny	19.12. 18	21.12. 18	123FS+3 dny
125	keramická dlažba	6 dny	19.12. 18	02.01. 19	123FS+3 dny;
126	hydroizolace bazénu	1 den	13.12. 18	14.12. 18	123SS
127	obklady	3 dny	02.01. 19	07.01. 19	125
128	osazení parapetů - vnitřní	1 den	28.11. 18	29.11. 18	109
129	omítka stěn	5 dny	11.01. 19	18.01. 19	108
130	omítka stropu	4 dny	18.01. 19	24.01. 19	129
131	štuková omítka stěn	6 dny	24.01. 19	01.02. 19	130
132	štuková omítka stropu	6 dny	01.02. 19	11.02. 19	131
133	osazení dveří	1 den	29.11. 18	30.11. 18	128
134	kompletace - sanita	2 dny	07.01. 19	09.01. 19	127;110
135	kompletace - vzduchotechnika	3 dny	24.01. 19	29.01. 19	130;111
136	kompletace - elektro	2 dny	24.01. 19	28.01. 19	130;112
137	montáž zábradlí	2 dny	22.01. 19	24.01. 19	115
138	malba stěn + stropů	4 dny	11.02. 19	15.02. 19	132;116
139	úklid	7 dny	15.02. 19	26.02. 19	138
140	**3. NP**	**69 dny**	**30.11. 18**	**13.03. 19**	
141	montáž SDK instal. šachty	1 den	30.11. 18	03.12. 18	120
142	montáž SDK předstěny	1 den	03.12. 18	04.12. 18	141
143	pokládka tep. Izolace podlahy	4 dny	12.12. 18	18.12. 18	142;121
144	výztuž mazaniny - KARI síť	1 den	18.12. 18	19.12. 18	143;122
145	betonová mazanina + dil. Pásky	1 den	19.12. 18	20.12. 18	144;123
146	keramická dlažba	7 dny	28.12. 18	09.01. 19	145FS+3 dny
147	obklady	2 dny	09.01. 19	11.01. 19	146;127
148	osazení parapetů - vnitřní	1 den	30.11. 18	03.12. 18	133
149	omítka stěn	3 dny	11.02. 19	14.02. 19	132
150	omítka stropu	3 dny	14.02. 19	19.02. 19	149
151	štuková omítka stěn	4 dny	19.02. 19	25.02. 19	150
152	štuková omítka stropu	4 dny	25.02. 19	01.03. 19	151
153	osazení dveří	1 den	03.12. 18	04.12. 18	148
154	kompletace - sanita	2 dny	11.01. 19	15.01. 19	147;134
155	kompletace - vzduchotechnika	3 dny	19.02. 19	22.02. 19	150;135
156	kompletace - elektro	2 dny	19.02. 19	21.02. 19	150;136
157	montáž plošiny	2 dny	09.01. 19	11.01. 19	153;146
158	malba stěn + stropů	3 dny	01.03. 19	06.03. 19	152;138
159	úklid	5 dny	06.03. 19	13.03. 19	158
160	montáž terasy	5 dny	04.03. 19	08.03. 19	157
161	**Dokončovací práce - vnější**	**52 dny**	**06.03. 19**	**17.05. 19**	
162	montáž lešení	5 dny	06.03. 19	13.03. 19	158
163	zakrytí oken fólií	1 den	13.03. 19	14.03. 19	162
164	montáž tepelné izolace	1 den	13.03. 19	14.03. 19	162
165	oplechování parapetů - vnější	1 den	14.03. 19	15.03. 19	164
166	vnější omítka	1 den	15.03. 19	18.03. 19	165
167	montáž odvětrávané fasády	20 dny	13.03. 19	10.04. 19	162
168	oplechování atiky	7 dny	10.04. 19	19.04. 19	166;167
169	oplechování ploch	1 den	19.04. 19	22.04. 19	168
170	demontáž lešení	2 dny	22.04. 19	24.04. 19	169;168;167
171	lože pro okapový chodník	1 den	24.04. 19	25.04. 19	170
172	okapový chodník	1 den	25.04. 19	26.04. 19	171
173	lože pro zámkovou dlažbu	1 den	26.04. 19	29.04. 19	172
174	lože pro zámkovou dlažbu - parkování	1 den	29.04. 19	30.04. 19	173
175	zámková dlažba - chodník	2 dny	30.04. 19	02.05. 19	174
176	zámková dlažba - parkovací stání	2 dny	02.05. 19	06.05. 19	175
177	odvoz zařízení staveniště	2 dny	10.05. 19	14.05. 19	178
178	úprava terénu	4 dny	06.05. 19	10.05. 19	176
179	zatravnění	3 dny	10.05. 19	15.05. 19	178
180	předání stavby	1 den	15.05. 19	16.05. 19	179
181	kolaudace	1 den	16.05. 19	17.05. 19	180
