Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [td]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
pripravne prace						
101 /	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 pripravne prace	2	1	0	27.3.17	31.3.17
409	BOURÁNÍ ZÁKLADŮ 1 pripravne prace	6	1	0	27.3.17	31.3.17
459	DOPRAVA A SKLAD VYB HMOTI 1 pripravne prace	1	1	0	27.3.17	31.3.17
9980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 pripravne prace	1	1	0	3.4.17	7.4.17
stavebni cast						
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 stavebni cast	6	3	0	3.4.17	21.4.17
10501	PAŽENÍ 1 stavebni cast	4	2	0	10.4.17	21.4.17
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 stavebni cast	4	3	0	3.4.17	21.4.17
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 stavebni cast	1	2	0	10.4.17	21.4.17
11101	ČERPÁNÍ VODY 1 stavebni cast	2	4	1	10.4.17	5.5.17
11460	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 stavebni cast	1	2	1	17.4.17	28.4.17
11502	ZÁKLADY 1 stavebni cast	9	2	0	24.4.17	5.5.17
11505	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 stavebni cast	1	2	0	9.5.17	19.5.17
11606	PODKL BETON SPOD STAVBY 1 stavebni cast	4	2	0	15.5.17	26.5.17
11657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 stavebni cast	4	2	0	29.5.17	9.6.17
11704	PODKLAD DRENÁŽE 1 stavebni cast	1	2	2	9.5.17	19.5.17
11757	DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 1 stavebni cast	2	2	2	15.5.17	26.5.17
11859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1 stavebni cast	3	2	4	24.4.17	5.5.17
12103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY 1 stavebni cast	4	2	0	5.6.17	16.6.17
12253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 1 stavebni cast	10	2	0	5.6.17	16.6.17
12304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1 stavebni cast	2	2	0	19.6.17	30.6.17
12404	STROP SUTERÉN 1 stavebni cast	15	2	0	19.6.17	30.6.17
12453 ZTI	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 1 stavebni cast	2	2	1	5.6.17	16.6.17
12508 ZTI	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 stavebni cast	1	2	1	19.6.17	30.6.17
12607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 stavebni cast	4	3	1	3.7.17	21.7.17
12608	TEPELNÁ IZOLACE SUTERÉNU 1 stavebni cast	2	2	1	17.7.17	28.7.17
12609	ODPAŽENÍ 1 stavebni cast	4	2	1	24.7.17	4.8.17
12751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 stavebni cast	1	2	1	31.7.17	11.8.17
13203	ZDI NOSNÉ + NADEZDÍVKA 1 stavebni cast	10	8	0	3.7.17	25.8.17
13404	STROPY 1 stavebni cast	15	6	0	10.7.17	18.8.17
13504	SCHODIŠTĚ 1 stavebni cast	4	6	0	10.7.17	18.8.17
13607	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 stavebni cast	5	2	1	3.7.17	14.7.17
13859	PŘESUN HMOT TE 3 1 stavebni cast	3	6	1	3.7.17	11.8.17
14107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 stavebni cast	10	8	0	21.8.17	13.10.17
14200	NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ 1 stavebni cast	1	6	0	4.9.17	13.10.17
14409 ZTI	DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ 1 stavebni cast	2	6	0	4.9.17	15.9.17
14427 VZT	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 1 stavebni cast	2	2	7	4.9.17	15.9.17
14507	KANALIZACE STŘEŠNÍ PRVKY 1 stavebni cast	1	2	3	2.10.17	13.10.17
14557 HROMOS	HROMOSVOD STŘEŠNÍ ČÁST 1 stavebni cast	1	2	1	23.10.17	3.11.17
14727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH 1 stavebni cast	6	5	0	2.10.17	3.11.17
14757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 stavebni cast	10	5	0	2.10.17	3.11.17
14807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 stavebni cast	3	2	1	30.10.17	10.11.17
14859	PŘESUN HMOT STŘECHA 1 stavebni cast	2	4	6	21.8.17	15.9.17
15123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 stavebni cast	4	5	9	24.7.17	25.8.17
15125	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ 1 stavebni cast	2	3	11	24.7.17	11.8.17
15254	ZADNÍ SCHODIŠTĚ 1 stavebni cast	1	2	9	7.8.17	18.8.17
15306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 stavebni cast	2	2	8	28.8.17	8.9.17
15357	VRATA + VSTUPNÍ STĚNA 1 stavebni cast	2	2	10	21.8.17	1.9.17
15507 ZTI	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 stavebni cast	2	6	6	4.9.17	13.10.17
15527 ZTI	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 stavebni cast	4	5	7	4.9.17	6.10.17
15547 PLYN	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 stavebni cast	2	2	10	4.9.17	15.9.17
15567 ZTI	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ 1 stavebni cast	2	2	2	6.11.17	16.11.17
15587 ÚT	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 stavebni cast	6	4	0	30.10.17	24.11.17
15607 ÚT	ARMATURY ÚT 1 stavebni cast	1	2	0	6.11.17	16.11.17
15627 ÚT	OTOPNÁ TĚLESA 1 stavebni cast	2	4	0	6.11.17	1.12.17
15647 ÚT	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1 stavebni cast	2	2	0	20.11.17	1.12.17
15667 ÚT	KOTELNY ÚT 1 stavebni cast	2	2	1	6.11.17	16.11.17
15687 ÚT	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 stavebni cast	1	2	1	6.11.17	16.11.17
15707 ELEKTR	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 stavebni cast	2	4	0	13.11.17	8.12.17
15727 ELEKTR	SILNOPROUD VODIČE 1 stavebni cast	2	4	0	13.11.17	8.12.17
15747 ELEKTR	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 stavebni cast	1	2	0	27.11.17	8.12.17
15767 ELEKTR	SLABOPROUD TRUBKY 1 stavebni cast	1	2	1	6.11.17	16.11.17
15787 ELEKTR	SLABOPROUD VODIČE 1 stavebni cast	1	4	1	6.11.17	1.12.17
15807 VZT	VZDUCHOTEČESNÍKA 1 stavebni cast	4	2	1	27.11.17	8.12.17
15859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 1 stavebni cast	2	4	15	24.7.17	18.8.17
16137	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 stavebni cast	10	10	0	11.12.17	16.2.18
16147	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 stavebni cast	1	4	0	5.2.18	2.3.18
16207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 stavebni cast	3	4	0	19.2.18	16.3.18
16706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 stavebni cast	6	2	0	12.3.18	23.3.18
16900	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 1 stavebni cast	2	2	2	12.3.18	23.3.18
17127	MONTÁŽ DVEŘÍ A HLIN.STĚN 1 stavebni cast	2	2	2	16.4.18	27.4.18
17257 PIŘ	POŽÁRNÍ UCPÁVKY A TMELY 1 stavebni cast	1	2	3	19.3.18	30.3.18
17303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ 1 stavebni cast	2	2	0	2.4.18	13.4.18
17357	PARAPETY VNITŘNÍ 1 stavebni cast	3	4	2	16.4.18	11.5.18
17407	OBKLADY VNITŘNÍ 1 stavebni cast	6	4	0	26.3.18	20.4.18
17607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 stavebni cast	6	5	0	9.4.18	11.5.18
17657	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 stavebni cast	6	4	0	30.4.18	25.5.18
17707	MALBY VNITŘNÍ 1 stavebni cast	4	4	0	16.4.18	11.5.18
17767	PODHL SÁDROKART 1 stavebni cast	6	5	0	23.4.18	25.5.18
17859	PŘESUN HMOT POVRCHY 1 stavebni cast	2	4	3	19.3.18	13.4.18
18109 VÝTAH	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 stavebni cast	2	1	1	7.5.18	18.5.18
18157	PODLAHY DŘEVĚNÉ 1 stavebni cast	5	5	0	23.4.18	25.5.18
18257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 stavebni cast	3	2	0	14.5.18	25.5.18
18309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 stavebni cast	1	2	1	7.5.18	18.5.18
18327	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ 1 stavebni cast	1	2	1	7.5.18	18.5.18
18407	KÓJE PRO KOLA 1 stavebni cast	6	2	1	7.5.18	18.5.18
18457 ZTI	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 stavebni cast	3	2	1	7.5.18	18.5.18
18607 MAR	MĚŘENÍ A REGULACE 1 stavebni cast	2	2	1	7.5.18	18.5.18
18657 ELEKTR	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 stavebni cast	4	2	1	7.5.18	18.5.18
18707 ELEKTR	SILNOPROUD KOMPLETACE 1 stavebni cast	4	2	0	14.5.18	25.5.18
18809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 stavebni cast	12	2	0	28.5.18	8.6.18
19109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 1 stavebni cast	5	2	0	12.3.18	23.3.18
19226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 stavebni cast	4	5	0	26.3.18	27.4.18
19307 HROMOS	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 stavebni cast	2	2	5	26.3.18	6.4.18
19400	KONSTRUKCE BALKONŮ 1 stavebni cast	4	2	2	23.4.18	4.5.18
19407	TRUHLÁŘI OBKLADY VNĚJŠÍ 1 stavebni cast	6	5	0	16.4.18	18.5.18
19427 ELEKTR	SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 stavebni cast	1	2	5	23.4.18	4.5.18
19457 ELEKTR	SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 stavebni cast	1	2	1	30.4.18	11.5.18
19509	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA 1 stavebni cast	3	2	0	14.5.18	25.5.18
19557	OBKLADY SOKLU VNĚJŠÍ 1 stavebni cast	4	3	2	16.4.18	4.5.18
19687	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY 1 stavebni cast	4	4	3	23.4.18	18.5.18
19727	NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 stavebni cast	1	3	0	7.5.18	25.5.18
19806	DLAŽBA VENKOVNÍ 1 stavebni cast	1	2	0	7.5.18	18.5.18
19859	PŘESUN HMOT TE 9 1 stavebni cast	2	2	8	12.3.18	23.3.18
19980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 stavebni cast	1	1	0	11.6.18	15.6.18
komunikace						
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 komunikace	3	1	0	7.5.18	11.5.18
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 komunikace	2	1	0	7.5.18	11.5.18
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 komunikace	1	1	0	7.5.18	11.5.18
23155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 komunikace	3	1	0	14.5.18	18.5.18
23359	SILNIČNÍ PROPUSTKY 1 komunikace	4	1	0	14.5.18	18.5.18
26105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 komunikace	3	1	0	14.5.18	18.5.18
26205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 komunikace	3	1	0	14.5.18	18.5.18
29309	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ 1 komunikace	3	1	0	21.5.18	25.5.18
29709	ČISTĚNÍ USAZENIN 1 komunikace	3	1	0	21.5.18	25.5.18
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 komunikace	1	1	0	21.5.18	25.5.18
terenni upravy						
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 terenni upravy	2	1	0	28.5.18	1.6.18
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 terenni upravy	3	1	0	28.5.18	1.6.18
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 terenni upravy	2	1	0	28.5.18	1.6.18
33101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 terenni upravy	3	1	0	28.5.18	1.6.18
39101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 terenni upravy	4	1	0	4.6.18	8.6.18
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 terenni upravy	1	1	0	4.6.18	8.6.18
kanalizacni prip						
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 kanalizacni prip	2	1	0	27.3.17	31.3.17
40159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 kanalizacni prip	3	1	0	27.3.17	31.3.17
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 kanalizacni prip	3	1	0	27.3.17	31.3.17
40359	ODSTRANĚNÍ PODKLADU 1 kanalizacni prip	5	1	0	27.3.17	31.3.17
40501	PAŽENÍ 1 kanalizacni prip	3	1	0	27.3.17	31.3.17
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 kanalizacni prip	2	1	0	27.3.17	31.3.17
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 kanalizacni prip	1	1	0	27.3.17	31.3.17
43408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 kanalizacni prip	3	1	0	3.4.17	7.4.17
46278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 kanalizacni prip	3	1	0	3.4.17	7.4.17
49108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 kanalizacni prip	2	1	0	3.4.17	7.4.17
49300	ODPAŽENÍ 1 kanalizacni prip	2	1	0	10.4.17	14.4.17
49401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 kanalizacni prip	4	1	0	10.4.17	14.4.17
49501	PODKLÁDNÍ VRSTVA KOM 1 kanalizacni prip	3	1	0	17.4.17	21.4.17
49705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 kanalizacni prip	3	1	0	17.4.17	21.4.17
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 kanalizacni prip	1	1	0	17.4.17	21.4.17
vodovodni prip						
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 vodovodni prip	2	1	0	3.4.17	7.4.17
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 vodovodni prip	3	1	0	3.4.17	7.4.17
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 vodovodni prip	2	1	1	3.4.17	7.4.17
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 vodovodni prip	1	1	1	3.4.17	7.4.17
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 vodovodni prip	2	1	0	10.4.17	14.4.17
56178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 vodovodni prip	3	1	0	10.4.17	14.4.17
59108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 vodovodni prip	2	1	0	10.4.17	14.4.17
59501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 vodovodni prip	4	1	0	17.4.17	21.4.17
59601	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 vodovodni prip	3	1	0	17.4.17	21.4.17
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 vodovodni prip	1	1	0	17.4.17	21.4.17
plynovodni prip						
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 plynovodni prip	2	1	1	10.4.17	14.4.17
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 plynovodni prip	2	1	1	10.4.17	14.4.17
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 plynovodni prip	2	1	1	10.4.17	14.4.17
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 plynovodni prip	1	1	1	10.4.17	14.4.17
66108	POTRUBÍ Z PLASTU 1 plynovodni prip	2	1	0	17.4.17	21.4.17
66207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 plynovodni prip	1	1	0	17.4.17	21.4.17
69108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 plynovodni prip	2	1	0	24.4.17	28.4.17
69501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 plynovodni prip	2	1	0	24.4.17	28.4.17
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 plynovodni prip	1	1	0	24.4.17	28.4.17

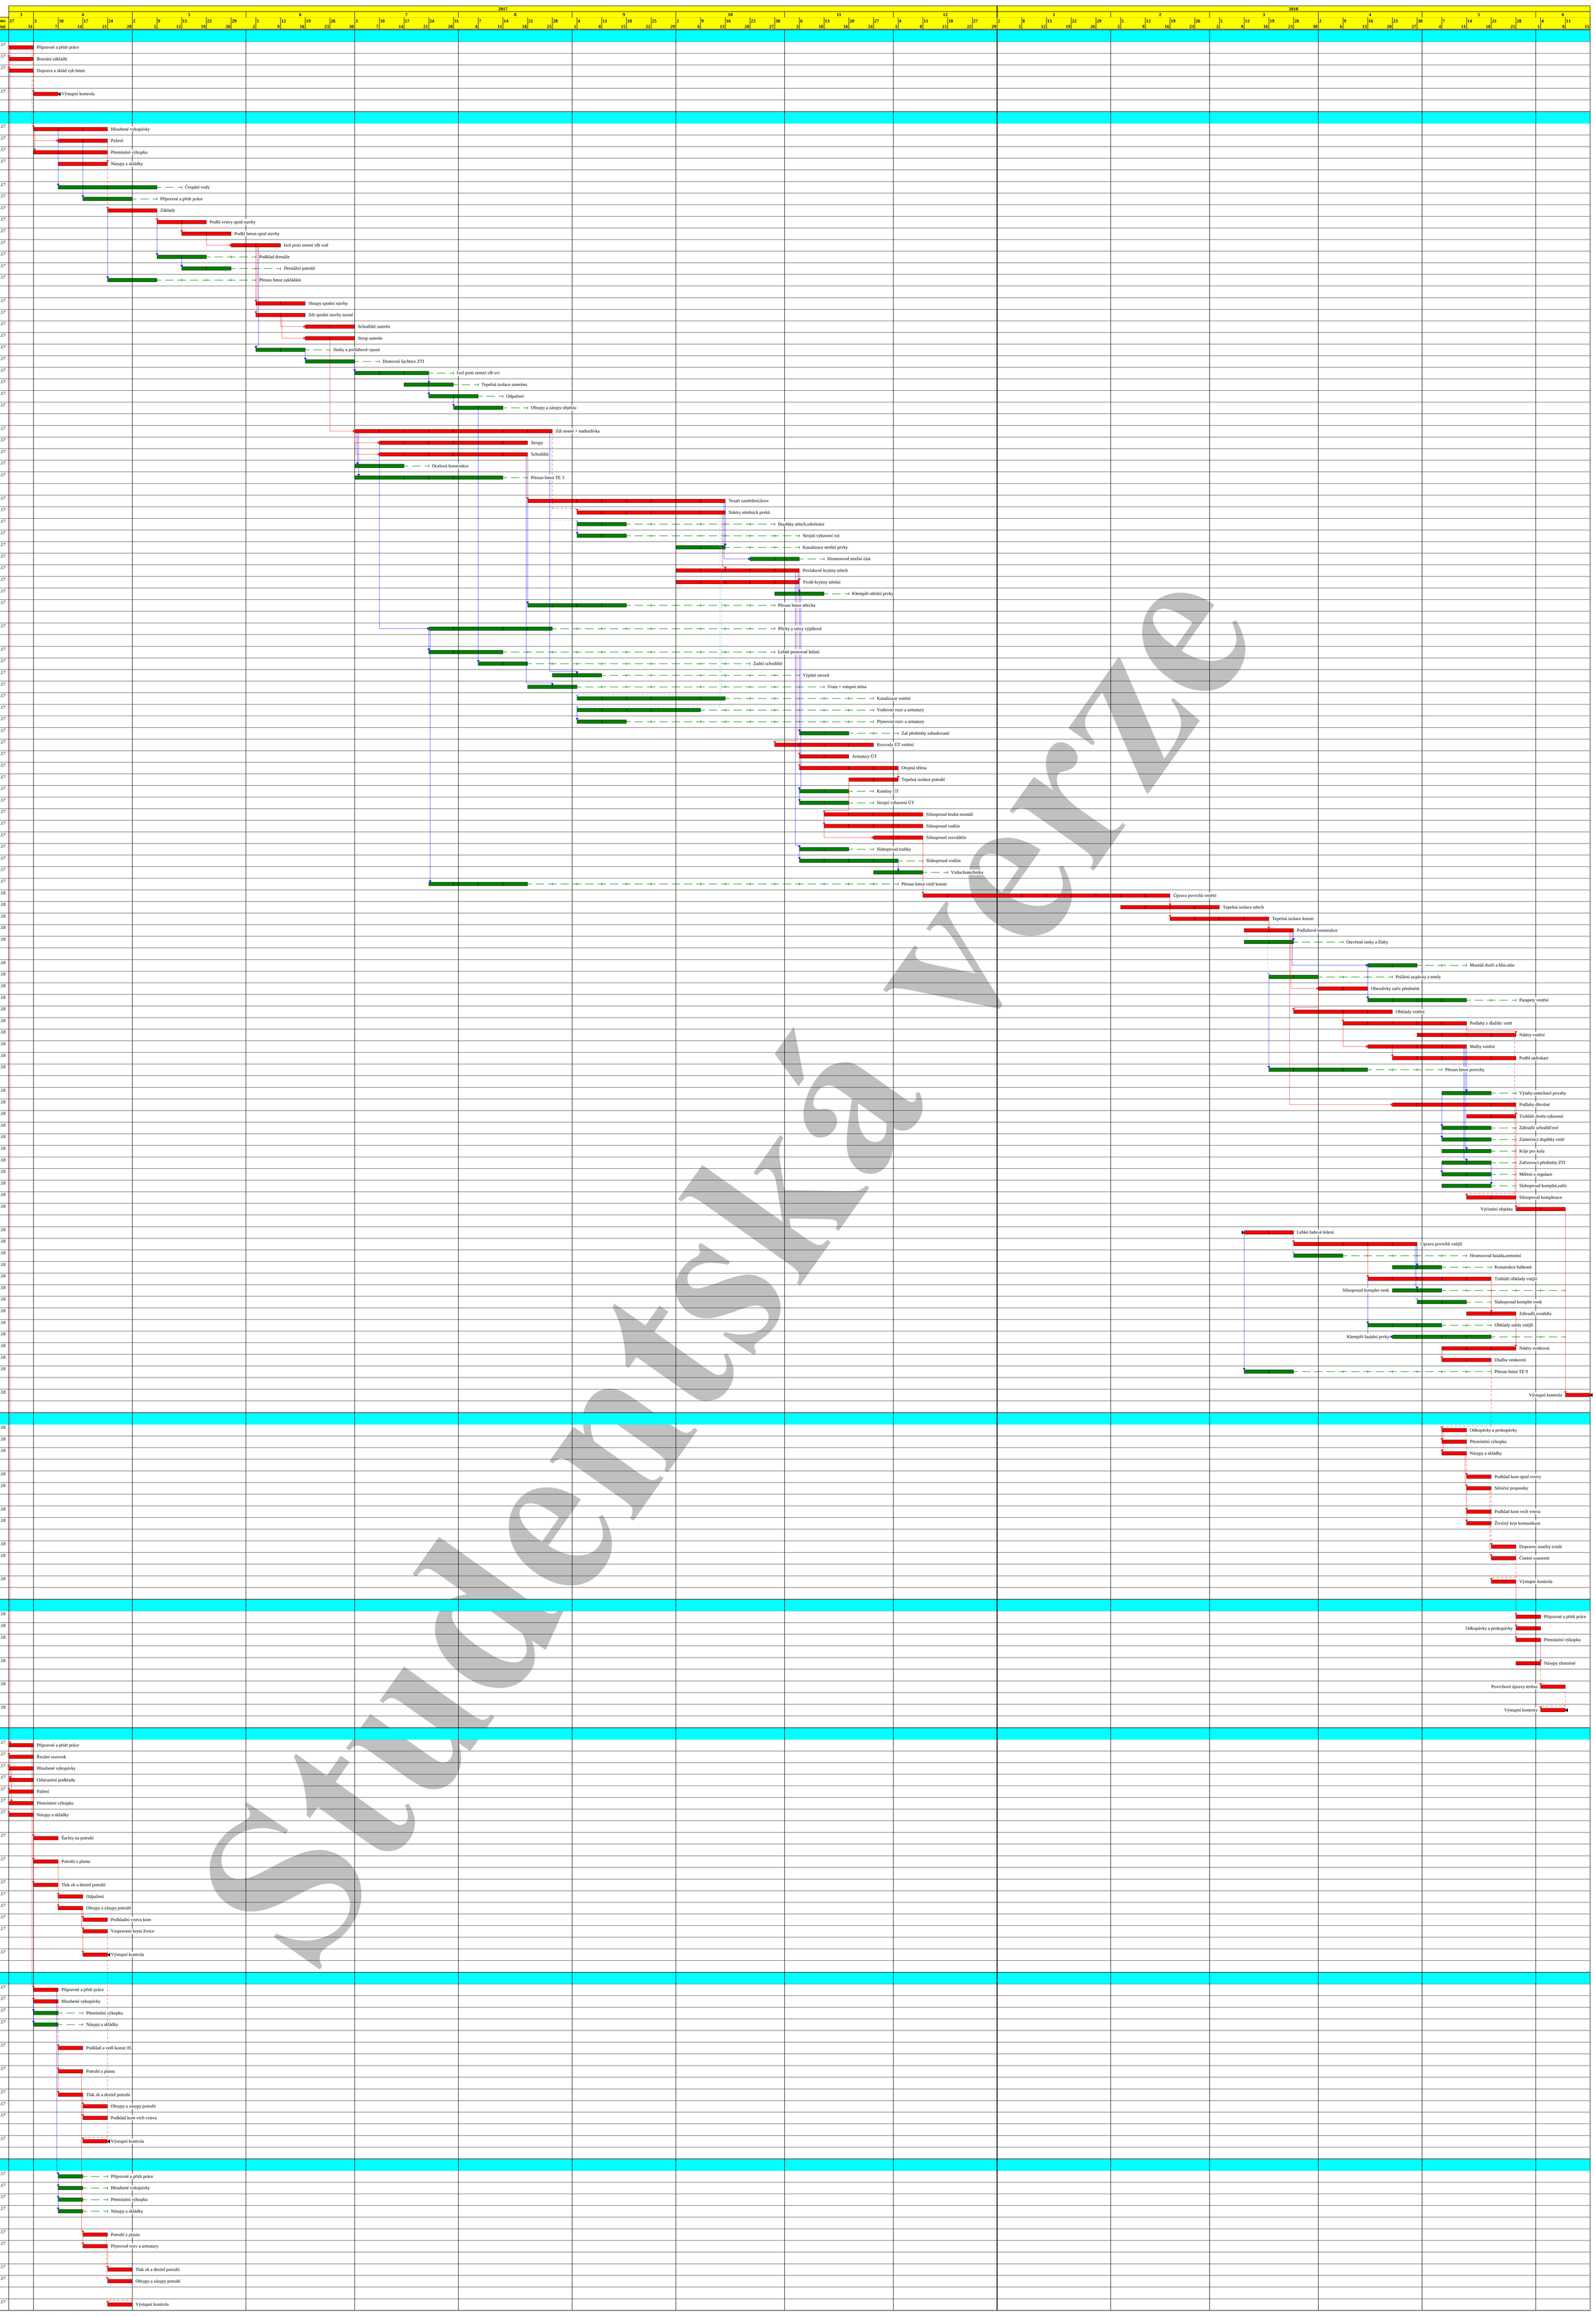

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze
