CONTEC - Časový graf akce: 0001BDPE Pekařka - Rezidence pod skálou

11.12.17

SO 00 HTU+piloty

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
5	Zemní práce, bourání 1 SO 00 HTU+piloty	23	6	0	3.9.18	12.10.18
30	PŘESUN HMOT TE 3 1 SO 00 HTU+piloty	3	1	0	8.10.18	12.10.18
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 00 HTU+piloty	1	1	0	8.10.18	12.10.18
10005	Zemní práce, bourání 1 SO13Zaj.stěn.lom	2	5	1	17.9.18	19.10.18
10030	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 1 SO13Zaj.stěn.lom	2	2	0	15.10.18	26.10.18
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO13Zaj.stěn.lom	1	1	0	22.10.18	26.10.18
20005	Zemní práce, bourání 1 IO1b Prodl.vod.ř	5	1	0	24.9.18	27.9.18
20030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO1b Prodl.vod.ř	2	1	0	1.10.18	5.10.18
20060	Omítky a potěry 1 IO1b Prodl.vod.ř	5	2	1	8.10.18	19.10.18
20090	Vnější úpravy 1 IO1b Prodl.vod.ř	4	2	0	15.10.18	26.10.18
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO1b Prodl.vod.ř	1	1	0	22.10.18	26.10.18
30005	Zemní práce, bourání 1 IO01a Vodov.příp	5	1	0	1.10.18	5.10.18
30030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO01a Vodov.příp	2	1	0	8.10.18	12.10.18
30060	Omítky a potěry 1 IO01a Vodov.příp	8	1	0	15.10.18	19.10.18
30090	Vnější úpravy 1 IO01a Vodov.příp	4	2	0	22.10.18	2.11.18
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO01a Vodov.příp	1	1	0	29.10.18	2.11.18
40005	Zemní práce, bourání 1 IO1d Vodom.šacht	5	1	0	8.10.18	12.10.18
40030	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 IO1d Vodom.šacht	3	1	0	15.10.18	19.10.18
40060	Omítky a potěry 1 IO1d Vodom.šacht	3	2	0	22.10.18	2.11.18
40090	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 IO1d Vodom.šacht	2	1	0	29.10.18	2.11.18
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO1d Vodom.šacht	1	1	0	29.10.18	2.11.18
50005	Zemní práce, bourání 1 IO2e přel.jed.ka	5	1	2	24.9.18	27.9.18
50030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2e přel.jed.ka	6	2	0	1.10.18	12.10.18
50060	Omítky a potěry 1 IO2e přel.jed.ka	4	2	0	15.10.18	26.10.18
50090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO2e přel.jed.ka	4	1	0	22.10.18	26.10.18
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2e přel.jed.ka	1	1	0	29.10.18	2.11.18
60005	Zemní práce, bourání 1 IO2a p.spla+dešť	5	1	2	1.10.18	5.10.18
60030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2a p.spla+dešť	5	2	0	8.10.18	19.10.18
60060	Omítky a potěry 1 IO2a p.spla+dešť	4	2	0	22.10.18	2.11.18
60090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO2a p.spla+dešť	4	1	0	29.10.18	2.11.18

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

CONTEC - Časový graf akce: 0001BDPE Pekařka - Rezidence pod skálou

11.12.17 IO2a p.spla+dešť

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2a p.spla+dešť	1	1	0	5.11.18	9.11.18
70005	Zemní práce, bourání 1 IO2b are.splaš.k	5	1	2	8.10.18	12.10.18
70030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2b are.splaš.k	8	4	0	15.10.18	9.11.18
70060	Omítky a potěry 1 IO2b are.splaš.k	4	4	1	29.10.18	23.11.18
70090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO2b are.splaš.k	4	2	0	19.11.18	30.11.18
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2b are.splaš.k	1	1	0	3.12.18	7.12.18
80005	Zemní práce, bourání 1 IO2d ret.nádrž.d	5	1	2	15.10.18	19.10.18
80030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2d ret.nádrž.d	4	2	0	22.10.18	2.11.18
80060	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 IO2d ret.nádrž.d	2	1	0	5.11.18	9.11.18
80090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO2d ret.nádrž.d	4	1	0	5.11.18	9.11.18
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2d ret.nádrž.d	1	1	0	12.11.18	16.11.18
90005	Zemní práce, bourání 1 IO2h Usaz.nádrž	5	1	2	22.10.18	26.10.18
90030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2h Usaz.nádrž	4	2	0	29.10.18	9.11.18
90090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO2h Usaz.nádrž	4	1	0	12.11.18	16.11.18
90095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2h Usaz.nádrž	1	1	0	19.11.18	23.11.18
100005	Zemní práce, bourání 1 IO2careál.dešť.k	5	1	2	29.10.18	2.11.18
100030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2careál.dešť.k	8	4	0	5.11.18	30.11.18
100060	Omítky a potěry 1 IO2careál.dešť.k	4	4	1	19.11.18	14.12.18
100090	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 IO2careál.dešť.k	6	2	0	10.12.18	21.12.18
100095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2careál.dešť.k	1	1	0	27.12.18	28.12.18
110005	Zemní práce, bourání 1 IO1c Areál.vodov	5	1	1	5.11.18	9.11.18
110030	Hrubá vrchní stavba 1 IO1c Areál.vodov	8	4	0	12.11.18	7.12.18
110060	Omítky a potěry 1 IO1c Areál.vodov	5	3	1	3.12.18	21.12.18
110090	Vnější úpravy 1 IO1c Areál.vodov	8	2	0	17.12.18	28.12.18
110095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO1c Areál.vodov	1	1	0	27.12.18	28.12.18
120005	Zemní práce, bourání 1 IO3 Příp.horkov.	7	1	0	5.11.18	9.11.18
120060	POTRUBÍ OCELOVÉ 1 IO3 Příp.horkov.	3	1	0	12.11.18	16.11.18
120090	Vnější úpravy 1 IO3 Příp.horkov.	3	2	0	19.11.18	30.11.18
120095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO3 Příp.horkov.	1	1	0	3.12.18	7.12.18

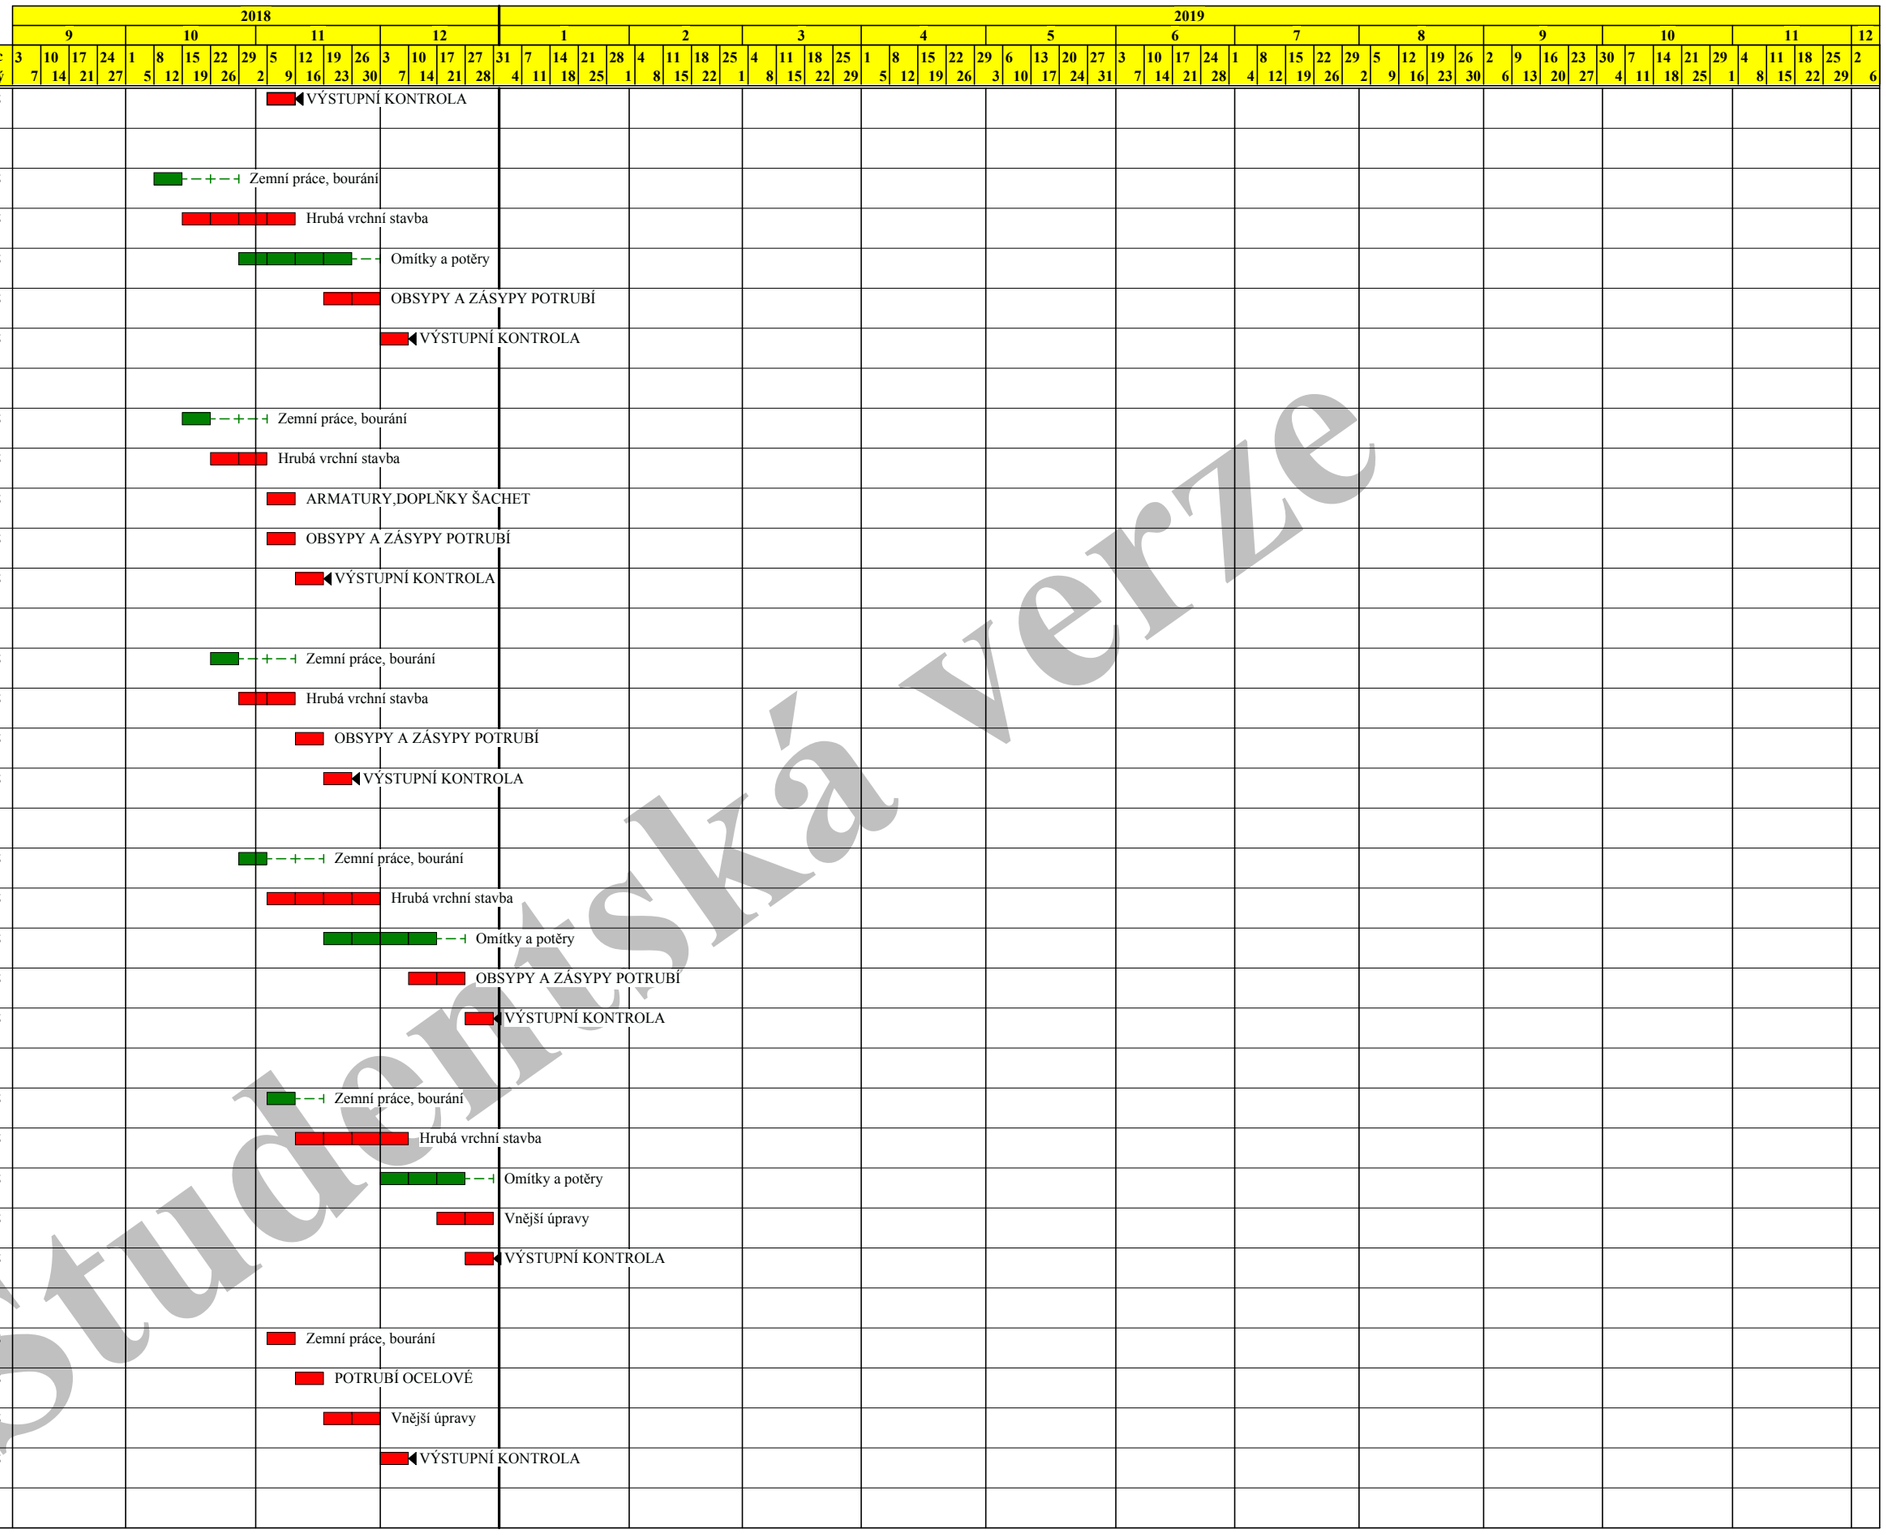

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

CONTEC - Časový graf akce: 0001BDPE Pekařka - Rezidence pod skálou

11.12.17 SO6 Podz.park.st

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
130010	Zakládání 1 SO6 Podz.park.st	22	4	0	29.10.18	23.11.18
130030	Hrubá vrchní stavba 1 SO6 Podz.park.st	23	8	1	12.11.18	4.1.19
130040	Střecha 1 SO6 Podz.park.st	15	7	2	7.1.19	22.2.19
130050	Příčky,hrubé instalace 1 SO6 Podz.park.st	10	6	3	7.1.19	15.2.19
130060	Omítky a potěry 1 SO6 Podz.park.st	4	6	3	7.1.19	15.2.19
130070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO6 Podz.park.st	9	5	0	18.2.19	22.3.19
130080	Vnitřní kompletace 1 SO6 Podz.park.st	6	5	0	18.2.19	22.3.19
130090	Vnější úpravy 1 SO6 Podz.park.st	6	2	2	25.2.19	8.3.19
130095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO6 Podz.park.st	1	1	0	25.3.19	29.3.19
140030	Hrubá vrchní stavba 1 SO7 Vjezd.rampa	3	8	9	12.11.18	4.1.19
140060	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ 1 SO7 Vjezd.rampa	2	2	9	7.1.19	18.1.19
140090	PODLAHY SYNTETICKÉ 1 SO7 Vjezd.rampa	3	1	0	25.3.19	29.3.19
140095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO7 Vjezd.rampa	1	1	0	25.3.19	29.3.19
150010	Zakládání 1 SO 03 bytovkaIII	4	6	2	29.10.18	7.12.18
150020	Spodní stavba 1 SO 03 bytovkaIII	7	6	9	10.12.18	18.1.19
150030	Hrubá vrchní stavba 1 SO 03 bytovkaIII	17	10	1	7.1.19	15.3.19
150040	Střecha 1 SO 03 bytovkaIII	6	9	1	18.3.19	17.5.19
150050	Příčky,hrubé instalace 1 SO 03 bytovkaIII	14	10	8	11.3.19	17.5.19
150060	Omítky a potěry 1 SO 03 bytovkaIII	11	15	0	4.3.19	14.6.19
150070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO 03 bytovkaIII	8	8	1	3.6.19	26.7.19
150080	Vnitřní kompletace 1 SO 03 bytovkaIII	6	10	0	27.5.19	2.8.19
150090	Vnější úpravy 1 SO 03 bytovkaIII	4	20	1	11.3.19	26.7.19
150095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 03 bytovkaIII	1	1	0	5.8.19	9.8.19
160010	Zakládání 1 SO 02 bytovka II	4	6	6	12.11.18	21.12.18
160020	Spodní stavba 1 SO 02 bytovka II	8	6	15	27.12.18	1.2.19
160030	Hrubá vrchní stavba 1 SO 02 bytovka II	16	10	1	4.3.19	10.5.19
160040	Střecha 1 SO 02 bytovka II	6	9	1	13.5.19	12.7.19
160050	Příčky,hrubé instalace 1 SO 02 bytovka II	14	10	8	6.5.19	12.7.19
160060	Omítky a potěry 1 SO 02 bytovka II	11	15	0	29.4.19	9.8.19
160070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO 02 bytovka II	7	8	1	29.7.19	20.9.19
160080	Vnitřní kompletace 1 SO 02 bytovka II	6	10	0	22.7.19	27.9.19
160090	Vnější úpravy 1 SO 02 bytovka II	4	20	1	6.5.19	20.9.19
160095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 02 bytovka II	1	1	0	30.9.19	4.10.19

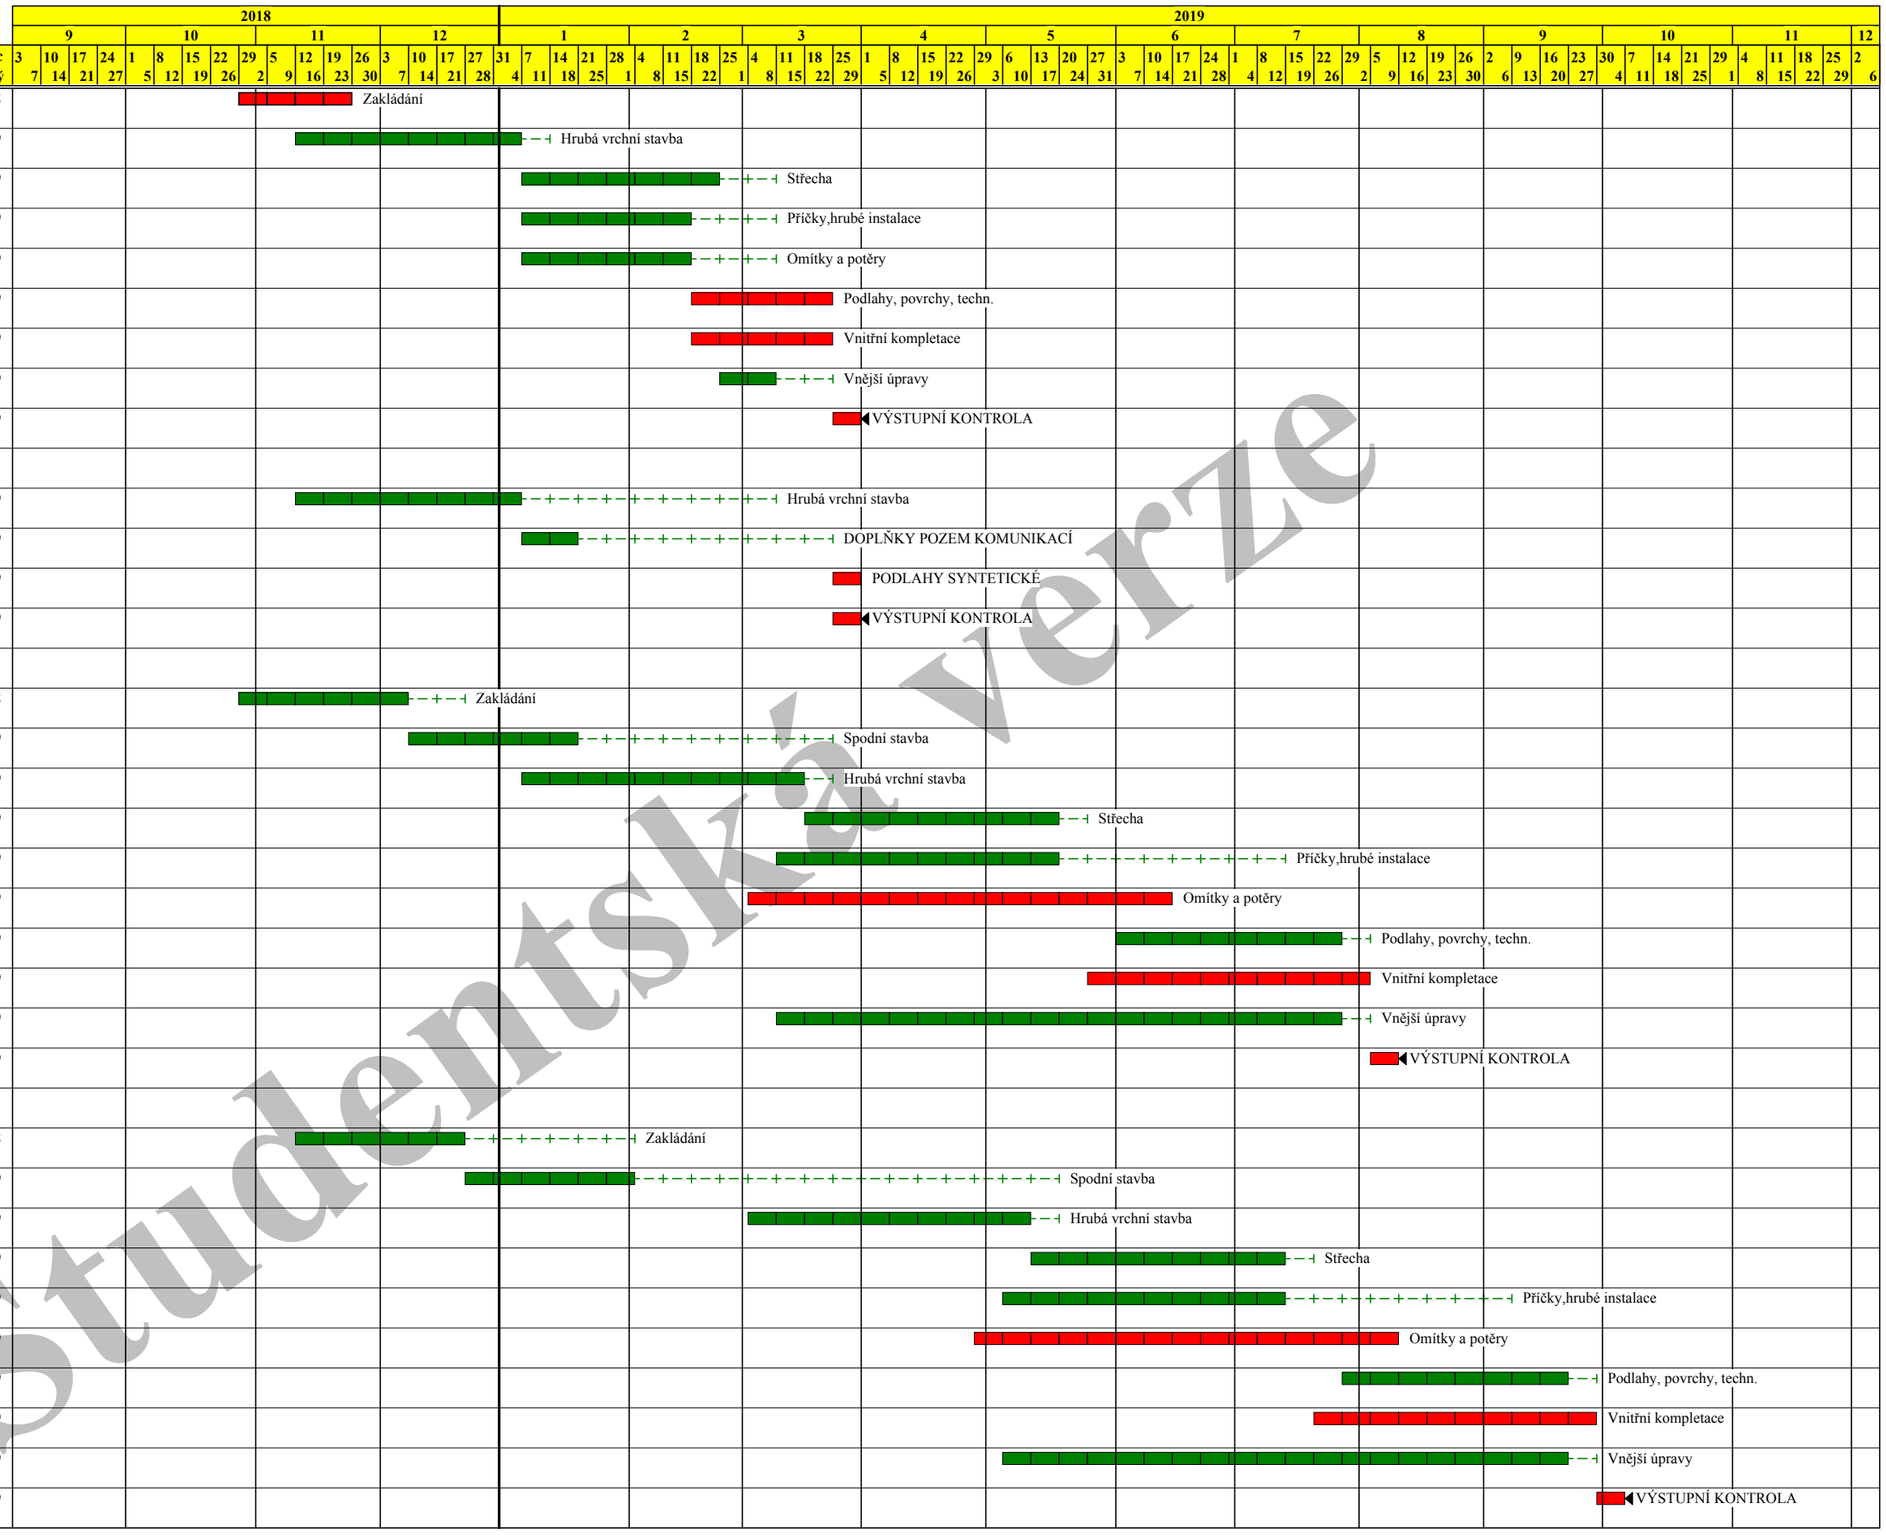

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

11.12.17 SO 01 bytovka I

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
170010	Zakládání 1 SO 01 bytovka I	3	8	14	12.11.18	4.1.19
170020	Spodní stavba 1 SO 01 bytovka I	7	6	21	7.1.19	15.2.19
170030	Hrubá vrchní stavba 1 SO 01 bytovka I	17	10	1	29.4.19	4.7.19
170040	Střecha 1 SO 01 bytovka I	6	9	1	8.7.19	6.9.19
170050	Příčky,hrubé instalace 1 SO 01 bytovka I	14	10	9	1.7.19	6.9.19
170060	Omítky a potěry 1 SO 01 bytovka I	11	16	0	24.6.19	11.10.19
170070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO 01 bytovka I	7	8	1	30.9.19	22.11.19
170080	Vnitřní kompletace 1 SO 01 bytovka I	6	10	0	23.9.19	29.11.19
170090	Vnější úpravy 1 SO 01 bytovka I	4	21	1	1.7.19	22.11.19
170095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 01 bytovka I	1	1	0	2.12.19	6.12.19
180010	Zakládání 1 SO 04 bytovka IV	4	6	0	29.10.18	7.12.18
180020	Spodní stavba 1 SO 04 bytovka IV	8	6	0	10.12.18	18.1.19
180030	Hrubá vrchní stavba 1 SO 04 bytovka IV	17	12	1	7.1.19	29.3.19
180040	Střecha 1 SO 04 bytovka IV	6	9	1	1.4.19	31.5.19
180050	Příčky,hrubé instalace 1 SO 04 bytovka IV	15	11	9	25.3.19	7.6.19
180060	Omítky a potěry 1 SO 04 bytovka IV	11	17	0	18.3.19	12.7.19
180070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO 04 bytovka IV	7	8	1	1.7.19	23.8.19
180080	Vnitřní kompletace 1 SO 04 bytovka IV	6	10	0	24.6.19	30.8.19
180090	Vnější úpravy 1 SO 04 bytovka IV	6	23	1	18.3.19	23.8.19
180095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 04 bytovka IV	1	1	0	2.9.19	6.9.19
190010	Zakládání 1 SO 05 bytovka V	4	6	0	12.11.18	21.12.18
190020	Spodní stavba 1 SO 05 bytovka V	7	9	5	27.12.18	22.2.19
190030	Hrubá vrchní stavba 1 SO 05 bytovka V	18	12	1	18.3.19	7.6.19
190040	Střecha 1 SO 05 bytovka V	7	9	1	10.6.19	9.8.19
190050	Příčky,hrubé instalace 1 SO 05 bytovka V	15	11	10	3.6.19	16.8.19
190060	Omítky a potěry 1 SO 05 bytovka V	11	17	0	27.5.19	20.9.19
190070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO 05 bytovka V	8	8	1	9.9.19	1.11.19
190080	Vnitřní kompletace 1 SO 05 bytovka V	6	10	0	2.9.19	8.11.19
190090	Vnější úpravy 1 SO 05 bytovka V	6	23	1	27.5.19	1.11.19
190095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 05 bytovka V	1	1	0	11.11.19	15.11.19
200030	Hrubá vrchní stavba 1 IO2gareál.dren.k	11	2	0	4.2.19	15.2.19
200095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO2gareál.dren.k	1	1	0	18.2.19	22.2.19

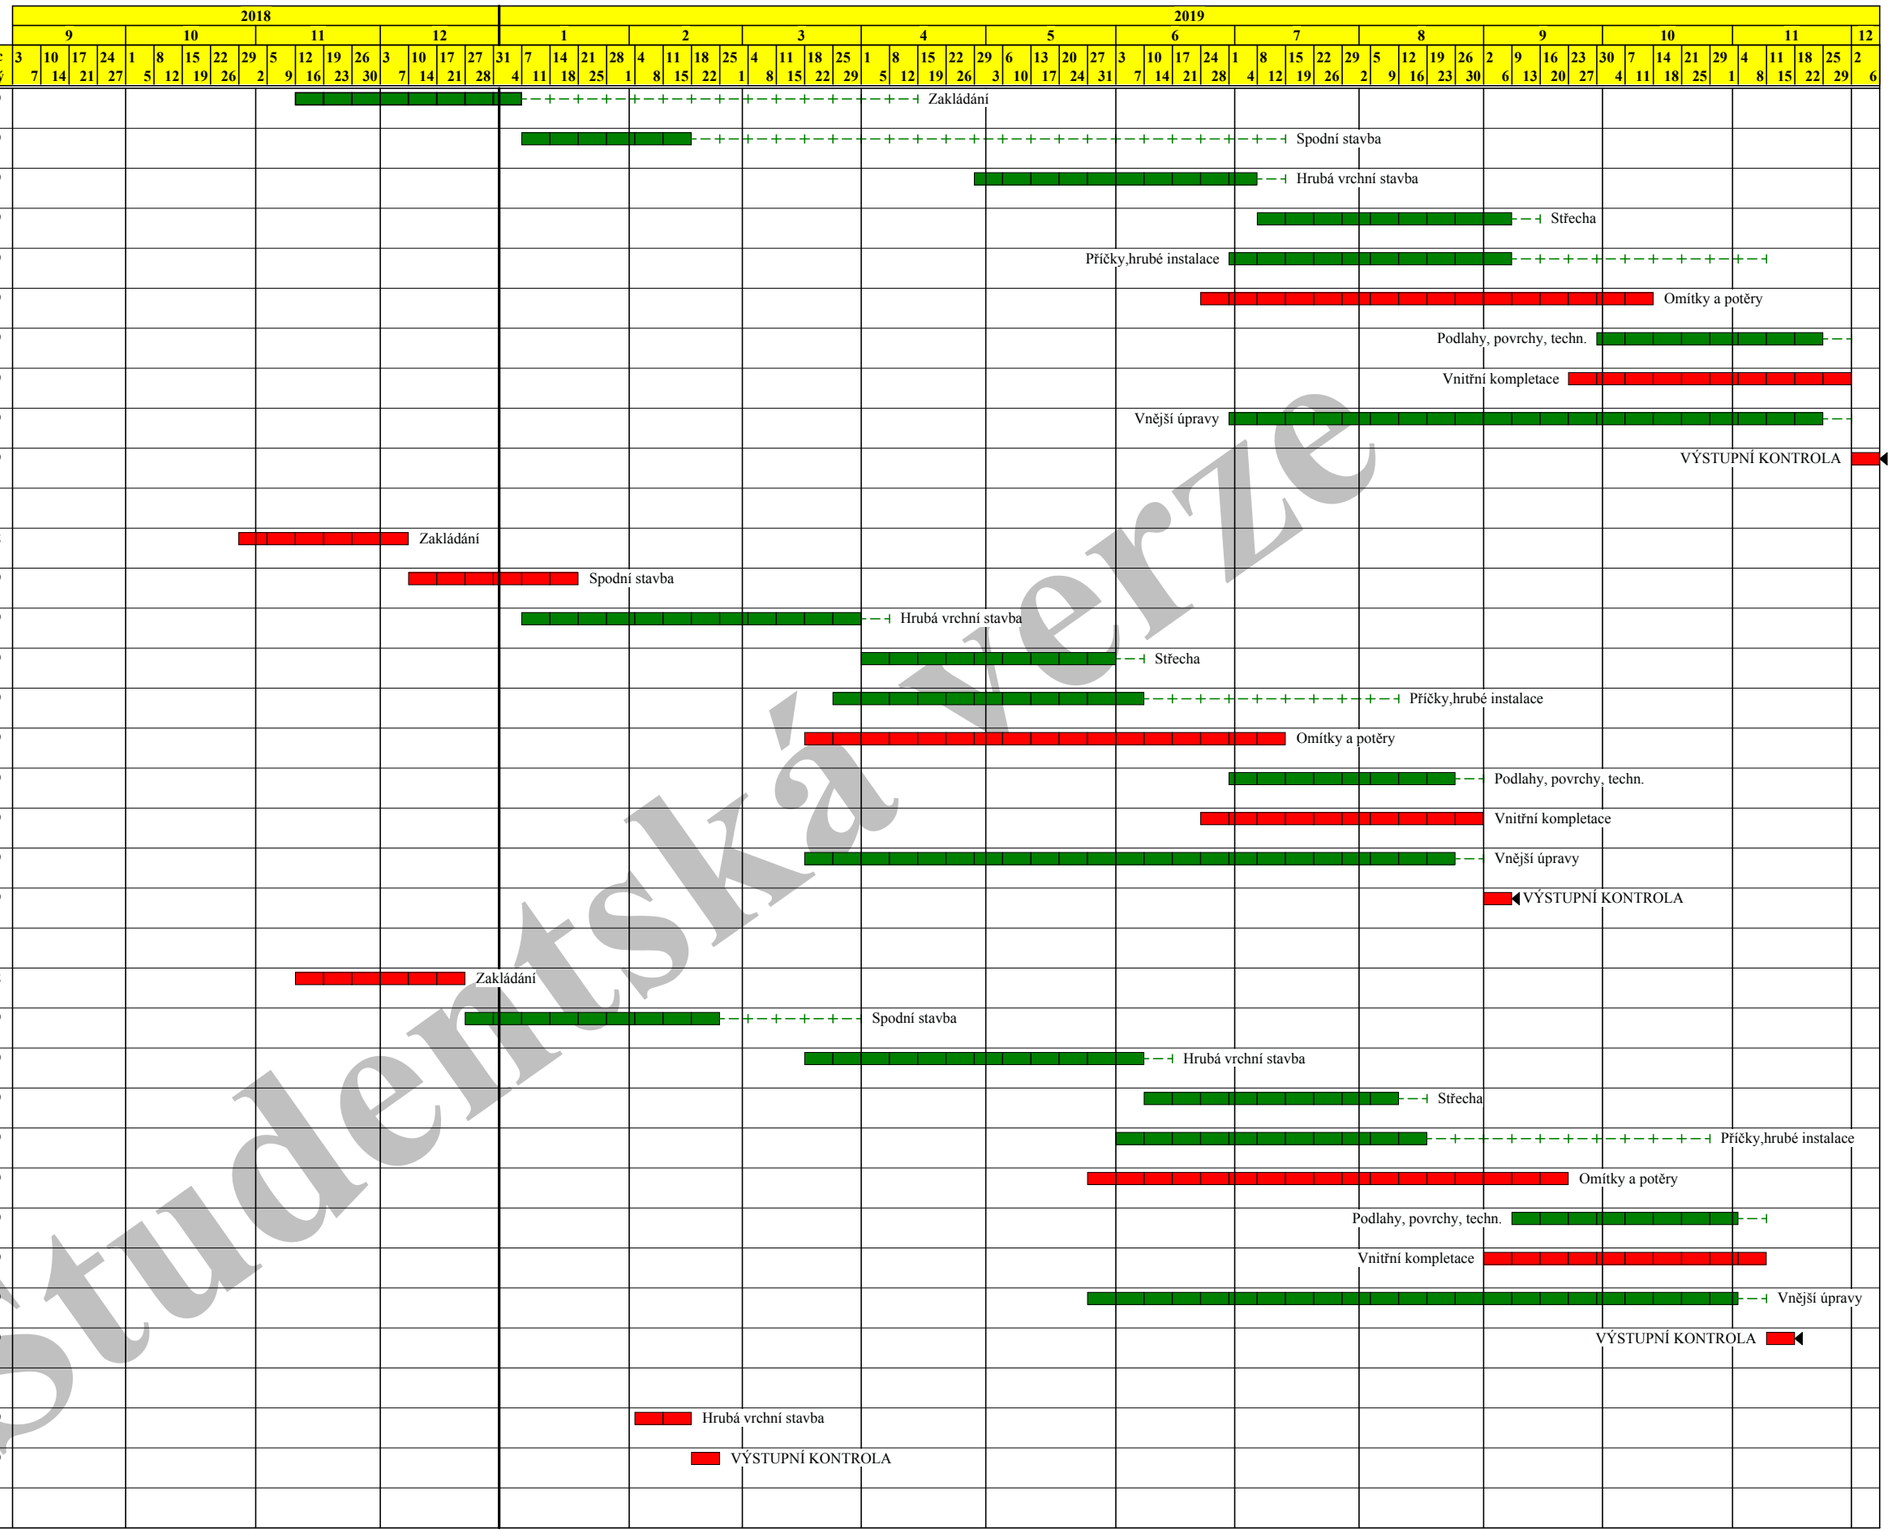

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

11.12.17 SO10 Vodní prvek

Index Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
210005	Zemní práce, bourání 1 SO10 Vodní prvek	3	3	0	25.2.19	15.3.19
210030	PŘESUN HMOT TE 3 1 SO10 Vodní prvek	3	1	1	4.3.19	8.3.19
210060	Omítky a potěry 1 SO10 Vodní prvek	5	1	0	18.3.19	22.3.19
210090	Vnější úpravy 1 SO10 Vodní prvek	4	1	0	25.3.19	29.3.19
210095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO10 Vodní prvek	1	1	0	25.3.19	29.3.19
220005	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 IO6 Areál.osvětl	3	1	0	10.6.19	14.6.19
220030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 IO6 Areál.osvětl	2	1	0	17.6.19	21.6.19
220060	Omítky a potěry 1 IO6 Areál.osvětl	12	3	0	24.6.19	12.7.19
220095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO6 Areál.osvětl	1	1	0	15.7.19	19.7.19
230005	Zemní práce, bourání 1 IO7Kom.azpev.plo	10	2	0	15.7.19	26.7.19
230030	Hrubá vrchní stavba 1 IO7Kom.azpev.plo	6	3	1	22.7.19	9.8.19
230060	Omítky a potěry 1 IO7Kom.azpev.plo	12	4	0	29.7.19	23.8.19
230090	Vnější úpravy 1 IO7Kom.azpev.plo	5	5	0	12.8.19	13.9.19
230095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 IO7Kom.azpev.plo	1	1	0	9.9.19	13.9.19
240005	Zemní práce, bourání 1 SO8 Stan.SKOaTKO	7	1	1	22.7.19	26.7.19
240030	Hrubá vrchní stavba 1 SO8 Stan.SKOaTKO	7	2	1	29.7.19	9.8.19
240060	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO8 Stan.SKOaTKO	4	1	1	26.8.19	30.8.19
240090	Vnější úpravy 1 SO8 Stan.SKOaTKO	4	1	1	2.9.19	6.9.19
240095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO8 Stan.SKOaTKO	1	1	0	9.9.19	13.9.19
250005	Zemní práce, bourání 1 SO12 Opěrné stěn	5	1	2	29.7.19	2.8.19
250060	Omítky a potěry 1 SO12 Opěrné stěn	8	3	1	12.8.19	30.8.19
250095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO12 Opěrné stěn	1	1	0	9.9.19	13.9.19
260005	Zemní práce, bourání 1 SO 00 Sadové úpr	12	4	8	22.7.19	16.8.19
260030	SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ 1 SO 00 Sadové úpr	10	6	3	12.8.19	20.9.19
260060	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 SO 00 Sadové úpr	3	1	3	23.9.19	27.9.19
260090	Vnější úpravy 1 SO 00 Sadové úpr	14	6	0	16.9.19	25.10.19
260095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 00 Sadové úpr	1	1	0	21.10.19	25.10.19

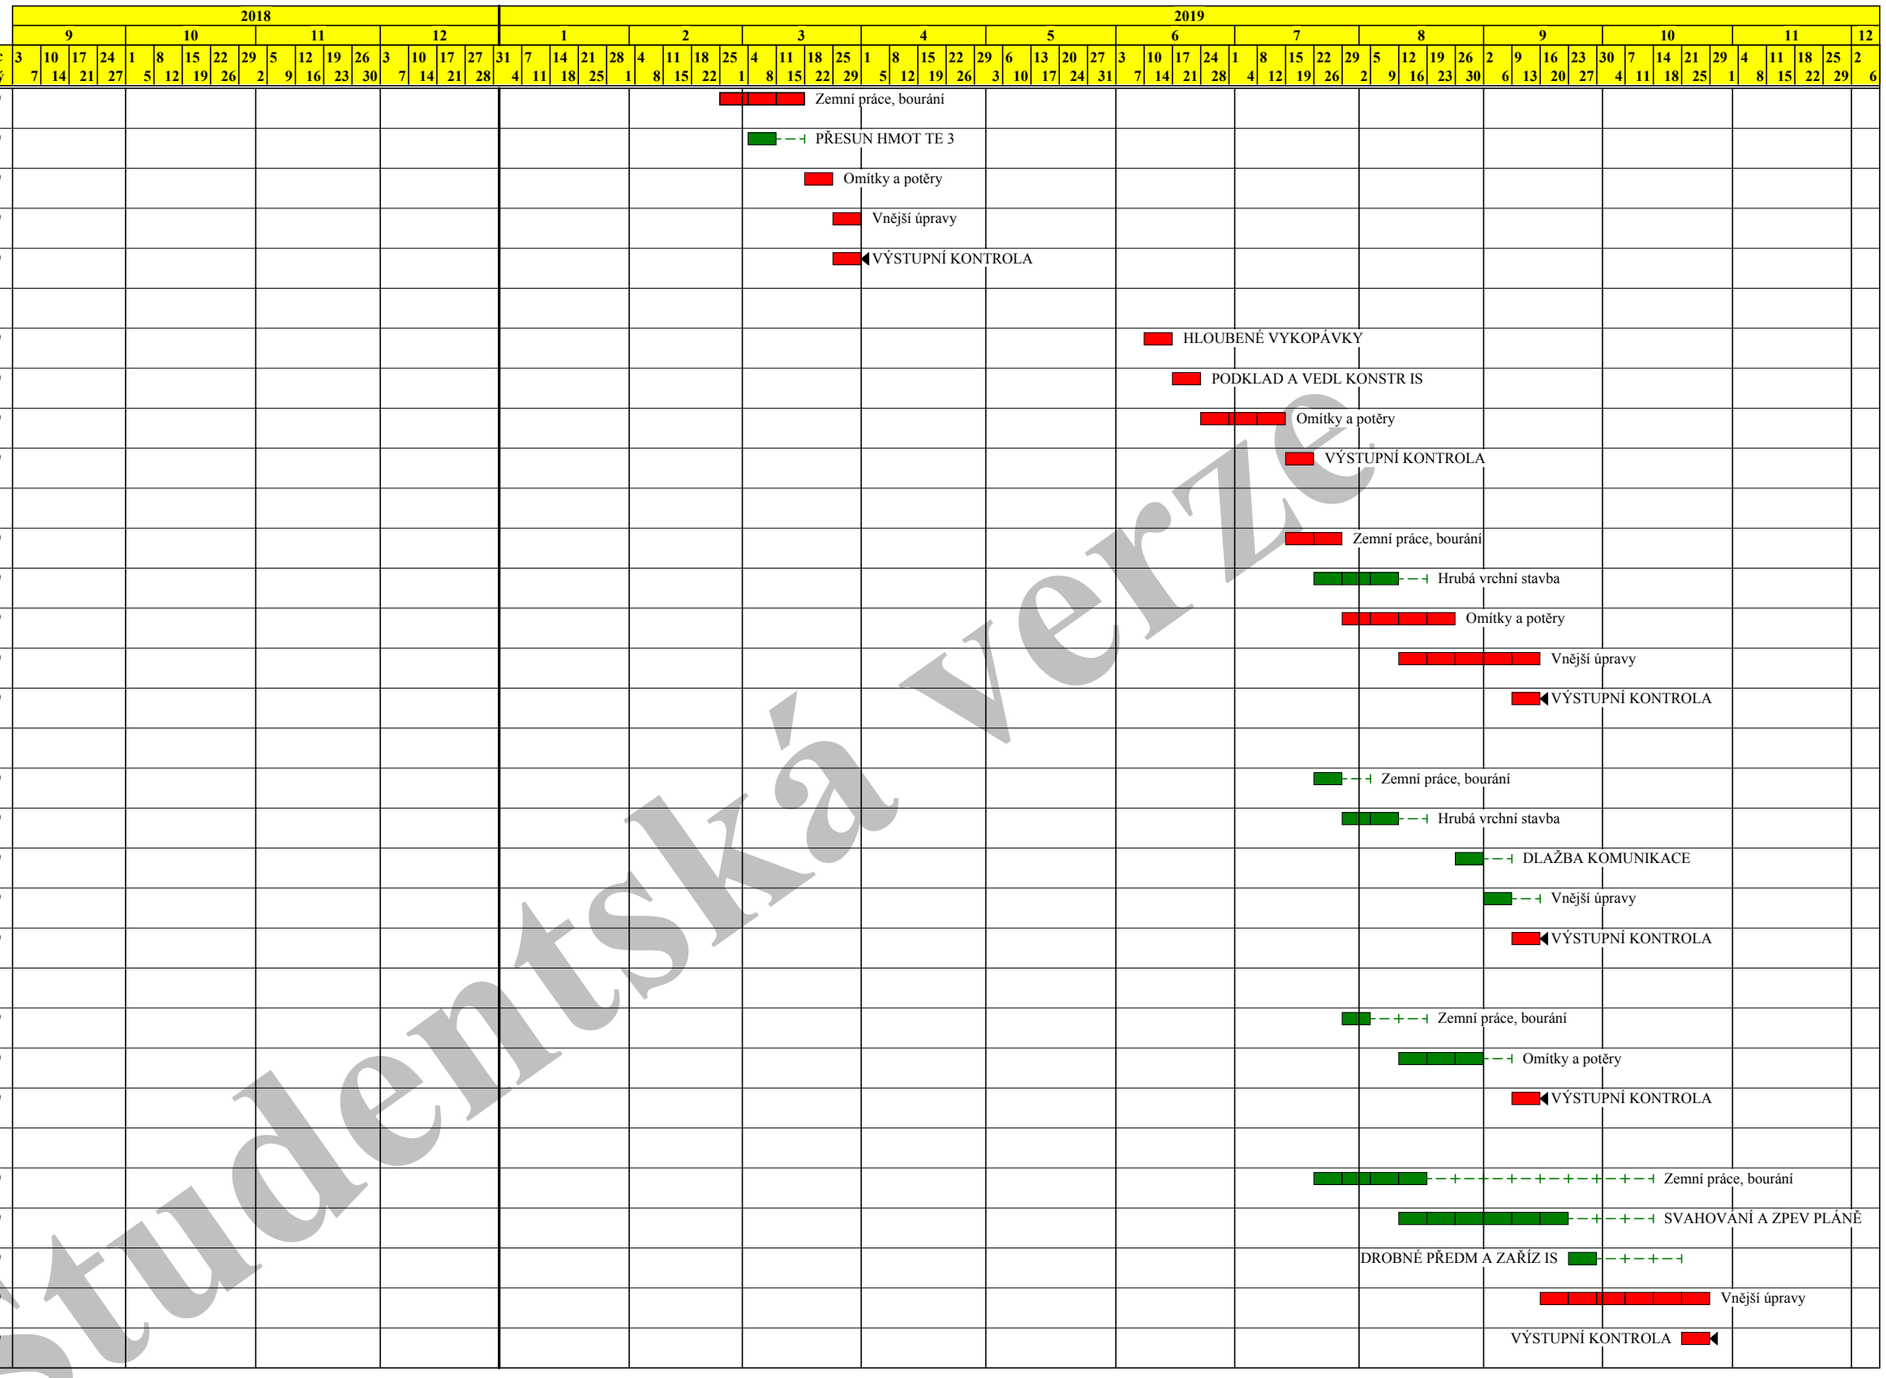

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

Studentská verze
