Příloha č. 6_aktualizace HMG 2. etapa (2)

HMG ŘEMESLA

Dnes: **04.01.2020** **Týdenní kalendář**

Start den 08.07.2019 Připočti dny 2

KOORDINACE ŘEMESEL A OSTATNÍCH PRACÍ

ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů	POZN.
D	**1NP**				
	páteřní rozvod voda a topení	po.24.06.	pá.12.07.	19	
	páteřní rozvod vzt	po.01.07.	út.16.07.	16	
	páteřní rozvod elektro silno + slabo	po.01.07.	po.15.07.	15	
	rozvody elektro učebny	po.15.07.	ne.21.07.	7	
	rozvody vody učebny	po.08.07.	pá.19.07.	12	
	osazení H	pá.12.07.	pá.19.07.	8	
	přizdívka ytong v učebnách	pá.19.07.	po.22.07.	4	
	REZERVA	po.22.07.	ne.28.07.	7	
	osazení výplní plast	po.29.07.	pá.09.08.	12	
	osazení výplní hliník	po.29.07.	pá.09.08.	12	
	omítky	ne.04.08.	pá.16.08.	13	
	rozvody topení učebny	pá.16.08.	pá.23.08.	8	
	rozvody vzt učebny	pá.16.08.	út.20.08.	5	
	osazení parapetů	pá.16.08.	st.21.08.	6	
	hydroizolace	čt.15.08.	st.21.08.	7	
	hrubé podlahy	pá.23.08.	pá.30.08.	8	
	SDK	pá.30.08.	pá.13.09.	15	
	obkladačské práce	út.03.09.	út.17.09.	15	
	kompletace el, ZTI, topení	út.17.09.	po.07.10.	21	
D	**2NP**				
	páteřní rozvod voda a topení	po.15.07.	pá.26.07.	12	
	páteřní rozvod vzt	po.15.07.	út.30.07.	16	
	páteřní rozvod elektro silno + slabo	po.15.07.	po.29.07.	15	
	rozvody elektro učebny	po.29.07.	ne.04.08.	7	
	rozvody vody učebny	po.22.07.	pá.02.08.	12	
	osazení H	pá.26.07.	pá.02.08.	8	
	přizdívka ytong v učebnách	út.30.07.	pá.02.08.	4	
	osazení výplní plast	po.29.07.	pá.09.08.	12	
	osazení výplní hliník	po.29.07.	pá.09.08.	12	
	omítky	po.12.08.	so.24.08.	13	
	rozvody topení učebny	so.24.08.	so.31.08.	8	
	rozvody vzt učebny	so.24.08.	po.26.08.	3	
	osazení parapetů	so.24.08.	so.31.08.	8	
	hrubé podlahy	so.31.08.	so.07.09.	8	
	SDK	so.07.09.	so.21.09.	15	
	obkladačské práce	st.11.09.	st.25.09.	15	
	kompletace el, ZTI, topení	pá.13.09.	čt.03.10.	21	
E	**1 A 2 NP**				
	zdění příček	ne.07.07.	st.17.07.	11	
	rozvod voda a topení	st.17.07.	st.31.07.	15	
	rozvod vzt	st.17.07.	st.31.07.	15	
	rozvod elektro silno + slabo	st.17.07.	st.31.07.	15	
	osazení H	pá.26.07.	st.31.07.	6	
	přizdívka ytong	st.31.07.	so.03.08.	4	
	osazení výplní plast	st.31.07.	st.07.08.	8	
	osazení výplní hliník	st.31.07.	st.07.08.	8	
	omítky	st.07.08.	pá.16.08.	10	
	osazení parapetů	pá.16.08.	pá.23.08.	8	
	hydroizolace	pá.30.08.	čt.05.09.	7	
	hrubé podlahy	so.07.09.	čt.12.09.	6	
	SDK	čt.12.09.	čt.26.09.	15	

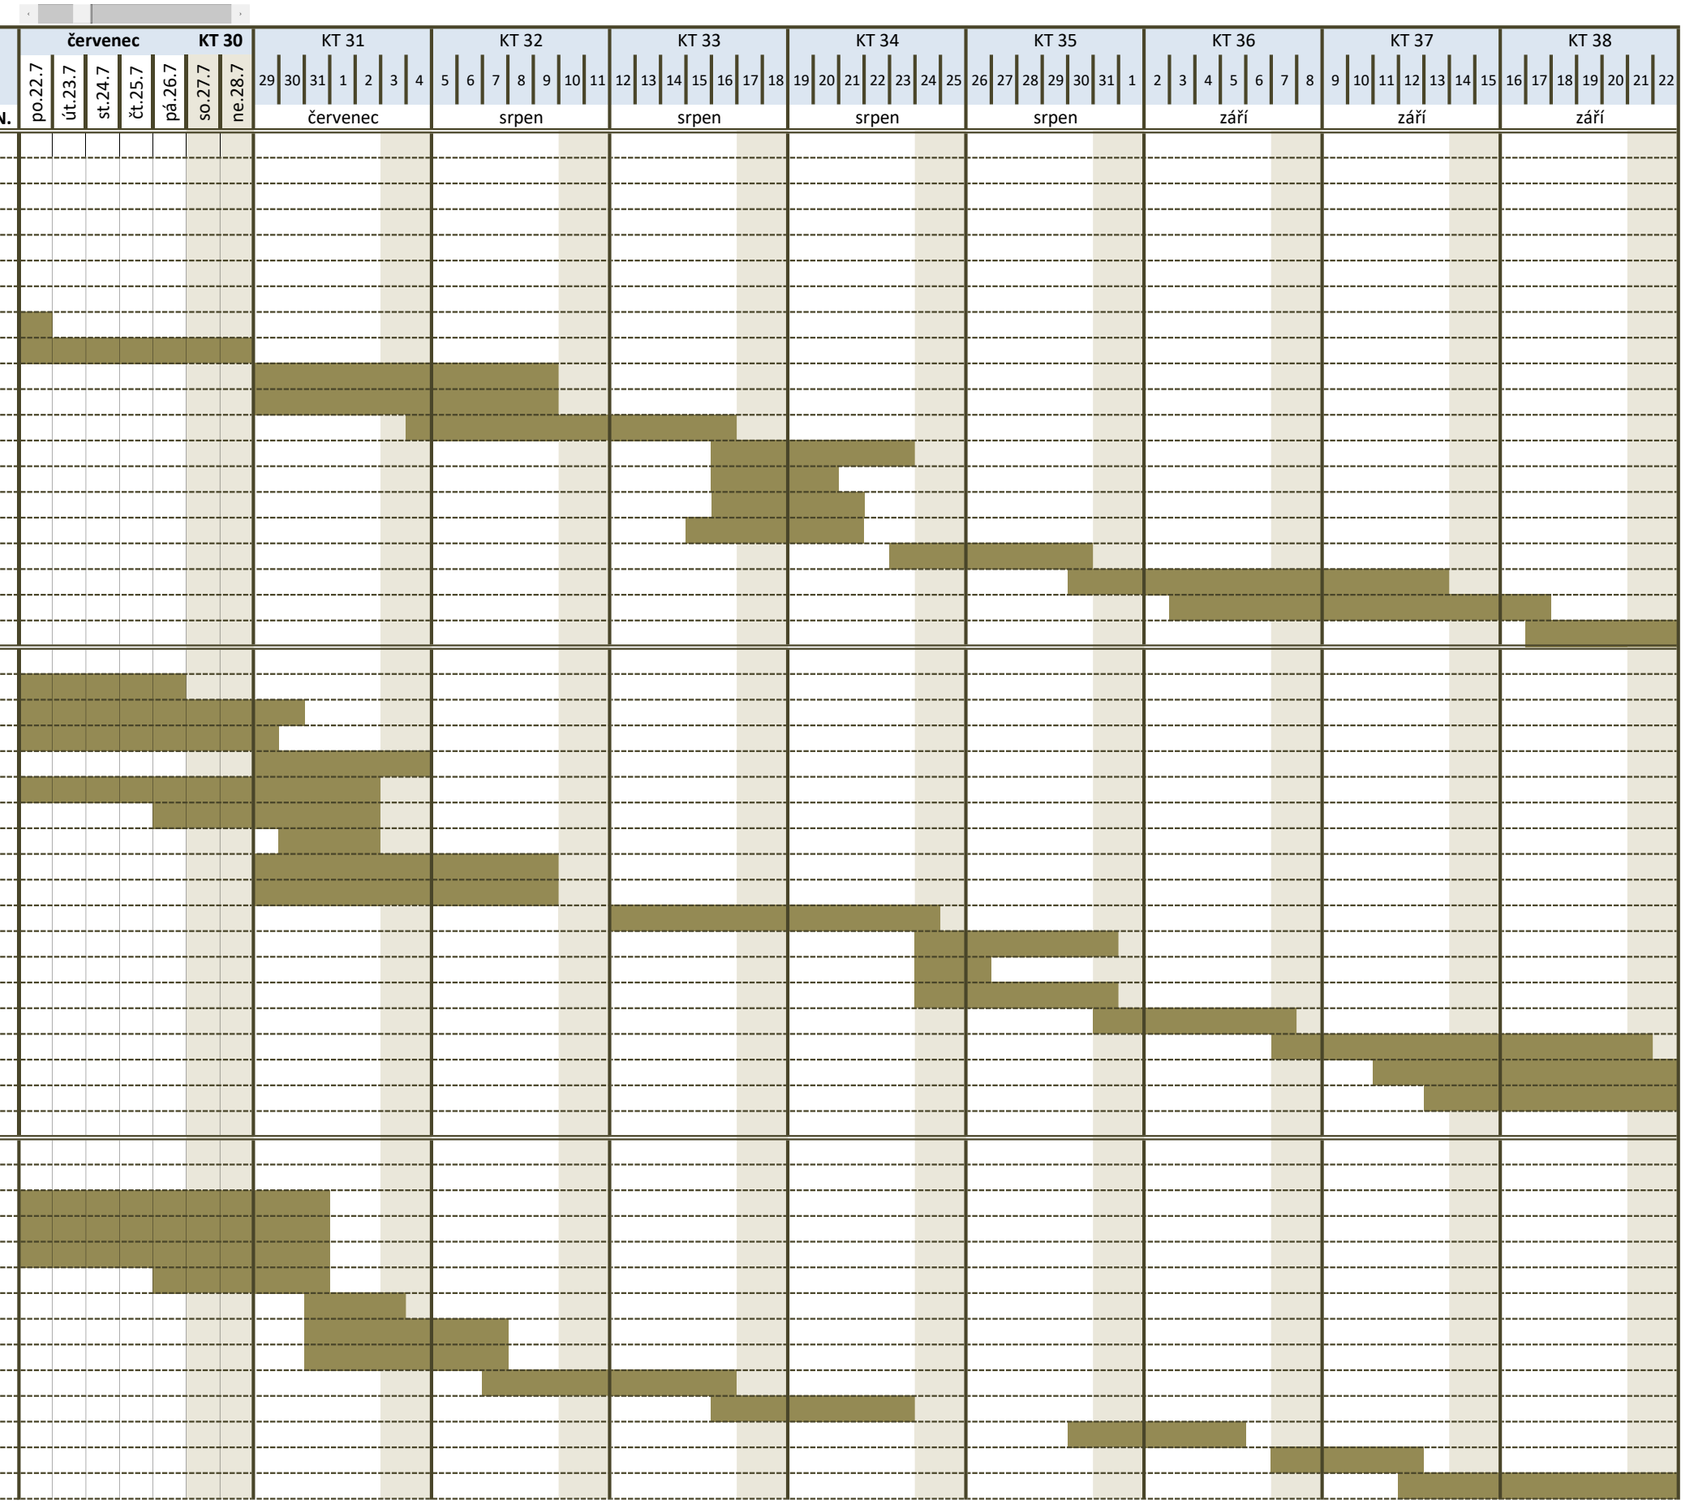
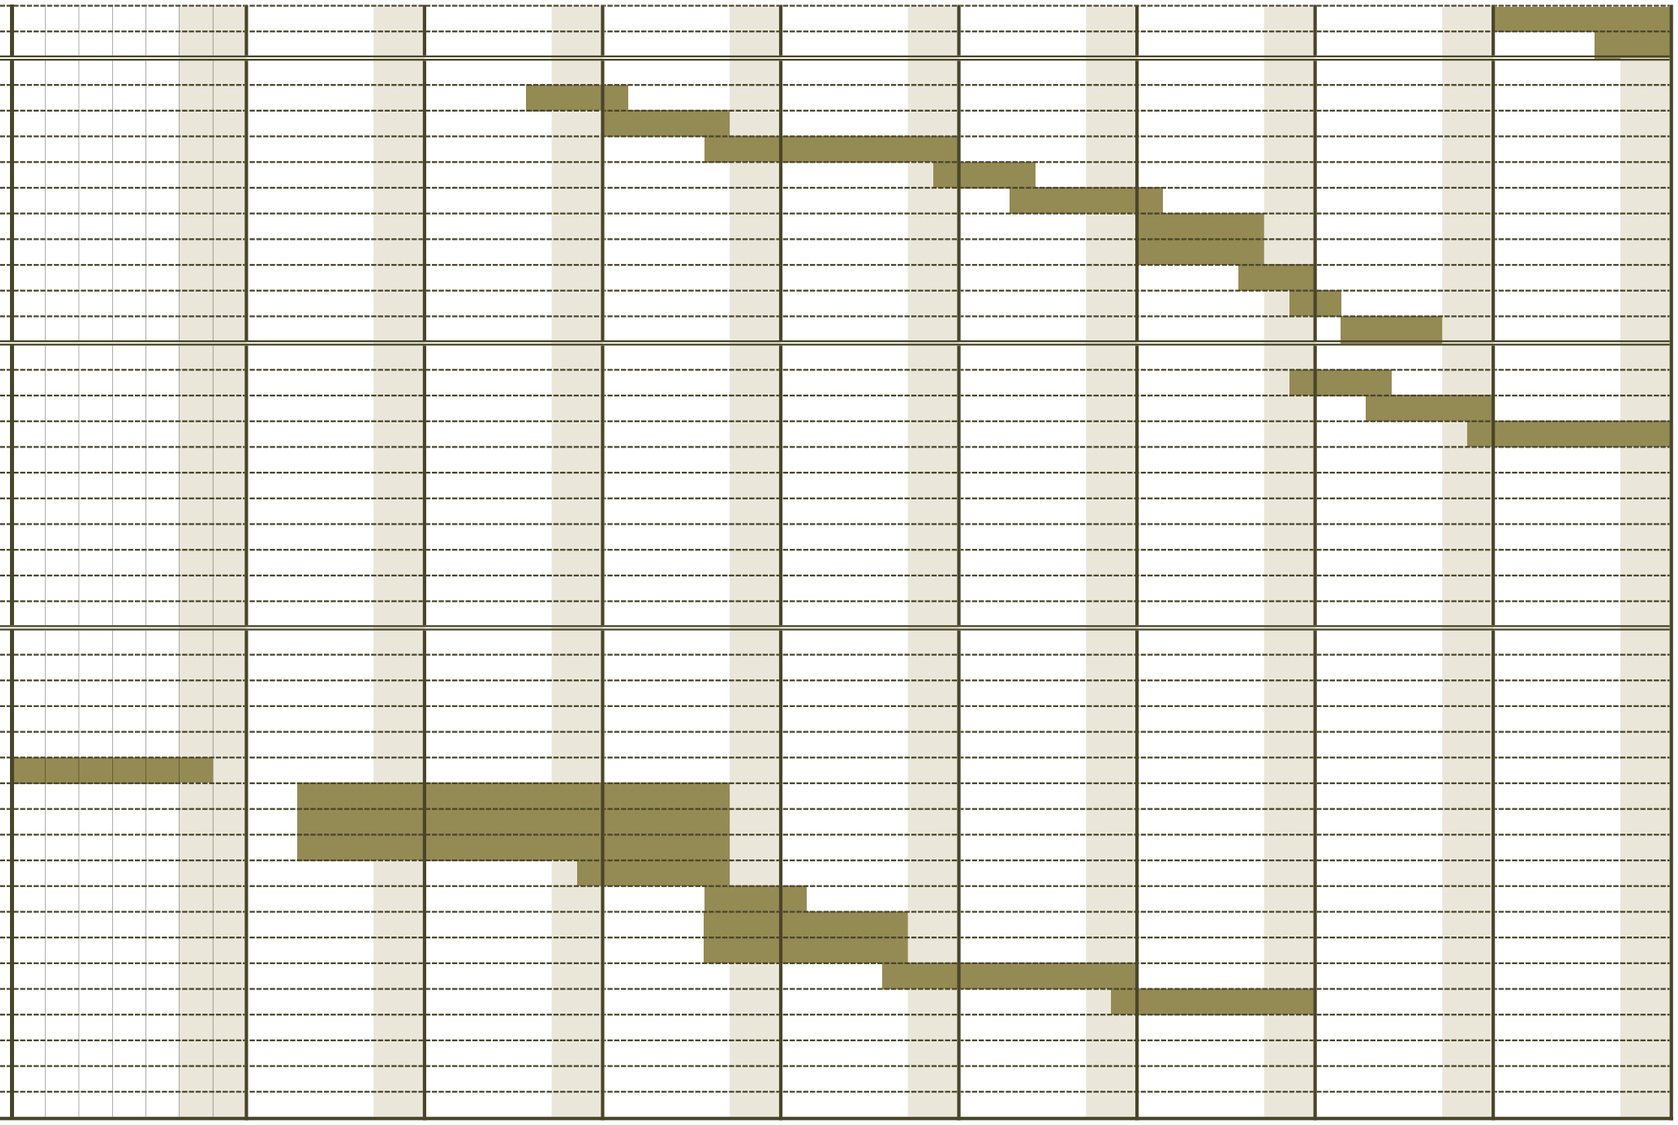
	obkladačské práce	po.16.09.	po.30.09.	15
	kompletace el, ZTI, topení	pá.20.09.	čt.10.10.	21
EXT	**ATRIUM ostatní práce**			
	montáž lešení	pá.09.08.	po.12.08.	4
	instalace žaluzií - příprava	po.12.08.	pá.16.08.	5
	fasáda - omítka	pá.16.08.	ne.25.08.	10
	klempířské kce - příprava	ne.25.08.	st.28.08.	4
	fásáda	st.28.08.	po.02.09.	6
	kompletace žaluzií	po.02.09.	pá.06.09.	5
	klempířské kce	po.02.09.	pá.06.09.	5
	demontáž lešení	pá.06.09.	ne.08.09.	3
	soklové práce	ne.08.09.	po.09.09.	2
	okapový chodník	út.10.09.	pá.13.09.	4
EXT D	**ostatní práce**			
	montáž lešení	ne.08.09.	st.11.09.	4
	instalace žaluzií - příprava	st.11.09.	ne.15.09.	5
	fasáda - omítka	ne.15.09.	út.24.09.	10
	klempířské kce - příprava	út.24.09.	pá.27.09.	4
	fásáda	pá.27.09.	st.02.10.	6
	kompletace žaluzií	st.02.10.	ne.06.10.	5
	klempířské kce	st.02.10.	ne.06.10.	5
	demontáž lešení	ne.06.10.	út.08.10.	3
	soklové práce	út.08.10.	st.09.10.	2
	okapový chodník	čt.10.10.	ne.13.10.	4
F	**1 A 2 NP**			
	zdění 2np	ne.07.07.	pá.12.07.	6
	strop 2np	so.13.07.	út.16.07.	4
	zdění atiky	st.17.07.	st.17.07.	1
	beton atiky	čt.18.07.	čt.18.07.	1
	zdění příček	po.22.07.	so.27.07.	6
	rozvod voda a topení	st.31.07.	pá.16.08.	17
	rozvod vzt	st.31.07.	pá.16.08.	17
	rozvod elektro silno + slabo	st.31.07.	pá.16.08.	17
	osazení H	ne.11.08.	pá.16.08.	6
	přizdívka ytong	pá.16.08.	po.19.08.	4
	osazení výplní plast	pá.16.08.	pá.23.08.	8
	osazení výplní hliník	pá.16.08.	pá.23.08.	8
	omítky	pá.23.08.	ne.01.09.	10
	osazení parapetů	ne.01.09.	ne.08.09.	8
	hydroizolace	so.28.09.	pá.04.10.	7
	hrubé podlahy	ne.06.10.	pá.11.10.	6
	SDK	pá.11.10.	pá.25.10.	15
