CONTEC - Ļasový graf akce: 0FINVAR2 Prádelna nem.Ļeské Budĵovice

6.11.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název ļinnosti SmĪhnost	Pracovník Ţ	Doba [týd.]	Rez.	Zaļátek možný	Konec možný
SO01 - PŠeloģky						
101	Př ÍPRAVNÉ A Př IDR PRÁCE 1 SO01 - PŠeloģky	8	3	0	22.7.19	9.8.19
102	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍř š 1 SO07 zpev. ploch	3	1	0	22.7.19	26.7.19
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO01 - PŠeloģky	3	1	1	22.7.19	26.7.19
302	Ļ.ERPÁNÍ VODY 1 SO01 - PŠeloģky	1	1	2	22.7.19	26.7.19
501	PAĢENÍ 1 SO01 - PŠeloģky	2	3	1	22.7.19	9.8.19
601	Př EMÍSŤnNÍ VÝKOPKU 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	3	22.7.19	26.7.19
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO01 - PŠeloģky	1	1	3	22.7.19	26.7.19
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	0	12.8.19	16.8.19
3408	ĢACHTY NA POTRUBÍ 1 SO01 - PŠeloģky	3	3	0	19.8.19	6.9.19
3859	Př ESUN HMOT TE 3 // 1 SO01 - PŠeloģky	3	1	6	12.8.19	16.8.19
6278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO01 - PŠeloģky	3	1	0	9.9.19	13.9.19
6409	DROBNÉ Př EDM A ZAř ÍZ IS // 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	0	16.9.19	20.9.19
6456	ÚPRAVA POVRCHŠ VNŤnJĢÍ IS // 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	2	16.9.19	20.9.19
6508	ARMATURY,DOPLŒKY ĢACHET 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	2	16.9.19	20.9.19
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ // 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	0	16.9.19	20.9.19
9301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO01 - PŠeloģky	4	1	0	23.9.19	27.9.19
9401	ZÁSYPY 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	0	30.9.19	4.10.19
9605	ODPAĢENÍ 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	0	7.10.19	11.10.19
9859	Př ESUN HMOT TE 9 // 1 SO01 - PŠeloģky	2	1	0	7.10.19	11.10.19
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA // 1 SO01 - PŠeloģky	1	1	0	7.10.19	11.10.19
SO02 Kan. pŠpoj						
10101	Př ÍPRAVNÉ A Př IDR PRÁCE 1 SO02 Kan. pŠpoj	2	1	0	12.8.19	16.8.19
10201	Ļ.ERPÁNÍ VODY 1 SO02 Kan. pŠpoj	1	1	0	12.8.19	16.8.19
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO02 Kan. pŠpoj	3	1	0	12.8.19	16.8.19
10501	PAĢENÍ 1 SO02 Kan. pŠpoj	3	3	0	12.8.19	30.8.19
10601	Př EMÍSŤnNÍ VÝKOPKU 1 SO02 Kan. pŠpoj	2	1	2	12.8.19	16.8.19
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO02 Kan. pŠpoj	1	1	2	12.8.19	16.8.19
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO02 Kan. pŠpoj	2	2	0	19.8.19	30.8.19
13203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO02 Kan. pŠpoj	5	7	0	26.8.19	11.10.19

Ļinnost: kritická - , zpoģdĪná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Smlouva	Pracovník	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO02 Kan. přípoj	5	7	0	2.9.19	18.10.19
13859	Př ESUN HMOT TE 3 // 1 SO02 Kan. přípoj	3	1	11	26.8.19	30.8.19
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ 1 SO02 Kan. přípoj	4	1	1	21.10.19	25.10.19
16278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO02 Kan. přípoj	3	2	0	21.10.19	1.11.19
16409	DROBNÉ Př EDM A ZAŘ ÍZ IS // 1 SO02 Kan. přípoj	2	1	0	4.11.19	8.11.19
16456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNitřní IS // 1 SO02 Kan. přípoj	2	1	2	4.11.19	8.11.19
16508	ARMATURY,DOPLňKY ŠACHET 1 SO02 Kan. přípoj	2	1	3	4.11.19	8.11.19
16559	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY 1 SO02 Kan. přípoj	3	1	4	29.10.19	1.11.19
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO02 Kan. přípoj	2	1	1	4.11.19	8.11.19
19301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO02 Kan. přípoj	4	1	0	11.11.19	15.11.19
19401	ZÁSYPY 1 SO02 Kan. přípoj	2	3	0	18.11.19	6.12.19
19605	ODPAŽENÍ 1 SO02 Kan. přípoj	2	2	0	2.12.19	13.12.19
19859	Př ESUN HMOT TE 9 // 1 SO02 Kan. přípoj	2	1	1	2.12.19	6.12.19
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA // 1 SO02 Kan. přípoj	1	1	0	9.12.19	13.12.19
SO03 vod. přípoj						
20101	Př ÍPRAVNÉ A Př IDR PRÁCE 1 SO03 vod. přípoj	2	1	2	19.8.19	23.8.19
20159	ř EZÁNÍ VOZOVEK 1 SO03 vod. přípoj	3	1	2	19.8.19	23.8.19
20201	ČERPÁNÍ VODY 1 SO03 vod. přípoj	1	1	2	19.8.19	23.8.19
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO03 vod. přípoj	3	1	2	19.8.19	23.8.19
20501	PAŽENÍ 1 SO03 vod. přípoj	2	2	1	2.9.19	13.9.19
20601	Př EMÍSTěNÍ VÝKOPKU 1 SO03 vod. přípoj	2	1	2	19.8.19	23.8.19
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO03 vod. přípoj	1	1	2	2.9.19	6.9.19
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO03 vod. přípoj	2	1	7	16.9.19	20.9.19
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ / 1 SO03 vod. přípoj	3	1	3	21.10.19	25.10.19
23859	Př ESUN HMOT TE 3 / 1 SO03 vod. přípoj	3	1	12	16.9.19	20.9.19
26158	POTRUBÍ LITINOVÉ 1 SO03 vod. přípoj	4	1	3	29.10.19	1.11.19
26168	POTRUBÍ OCELOVÉ 1 SO03 vod. přípoj	3	1	3	29.10.19	1.11.19
26178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO03 vod. přípoj	3	1	2	4.11.19	8.11.19
26259	DROBNÉ Př EDM A ZAŘ ÍZ IS / 1 SO03 vod. přípoj	2	1	4	11.11.19	15.11.19
26506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNitřní IS / 1 SO03 vod. přípoj	2	1	2	11.11.19	15.11.19

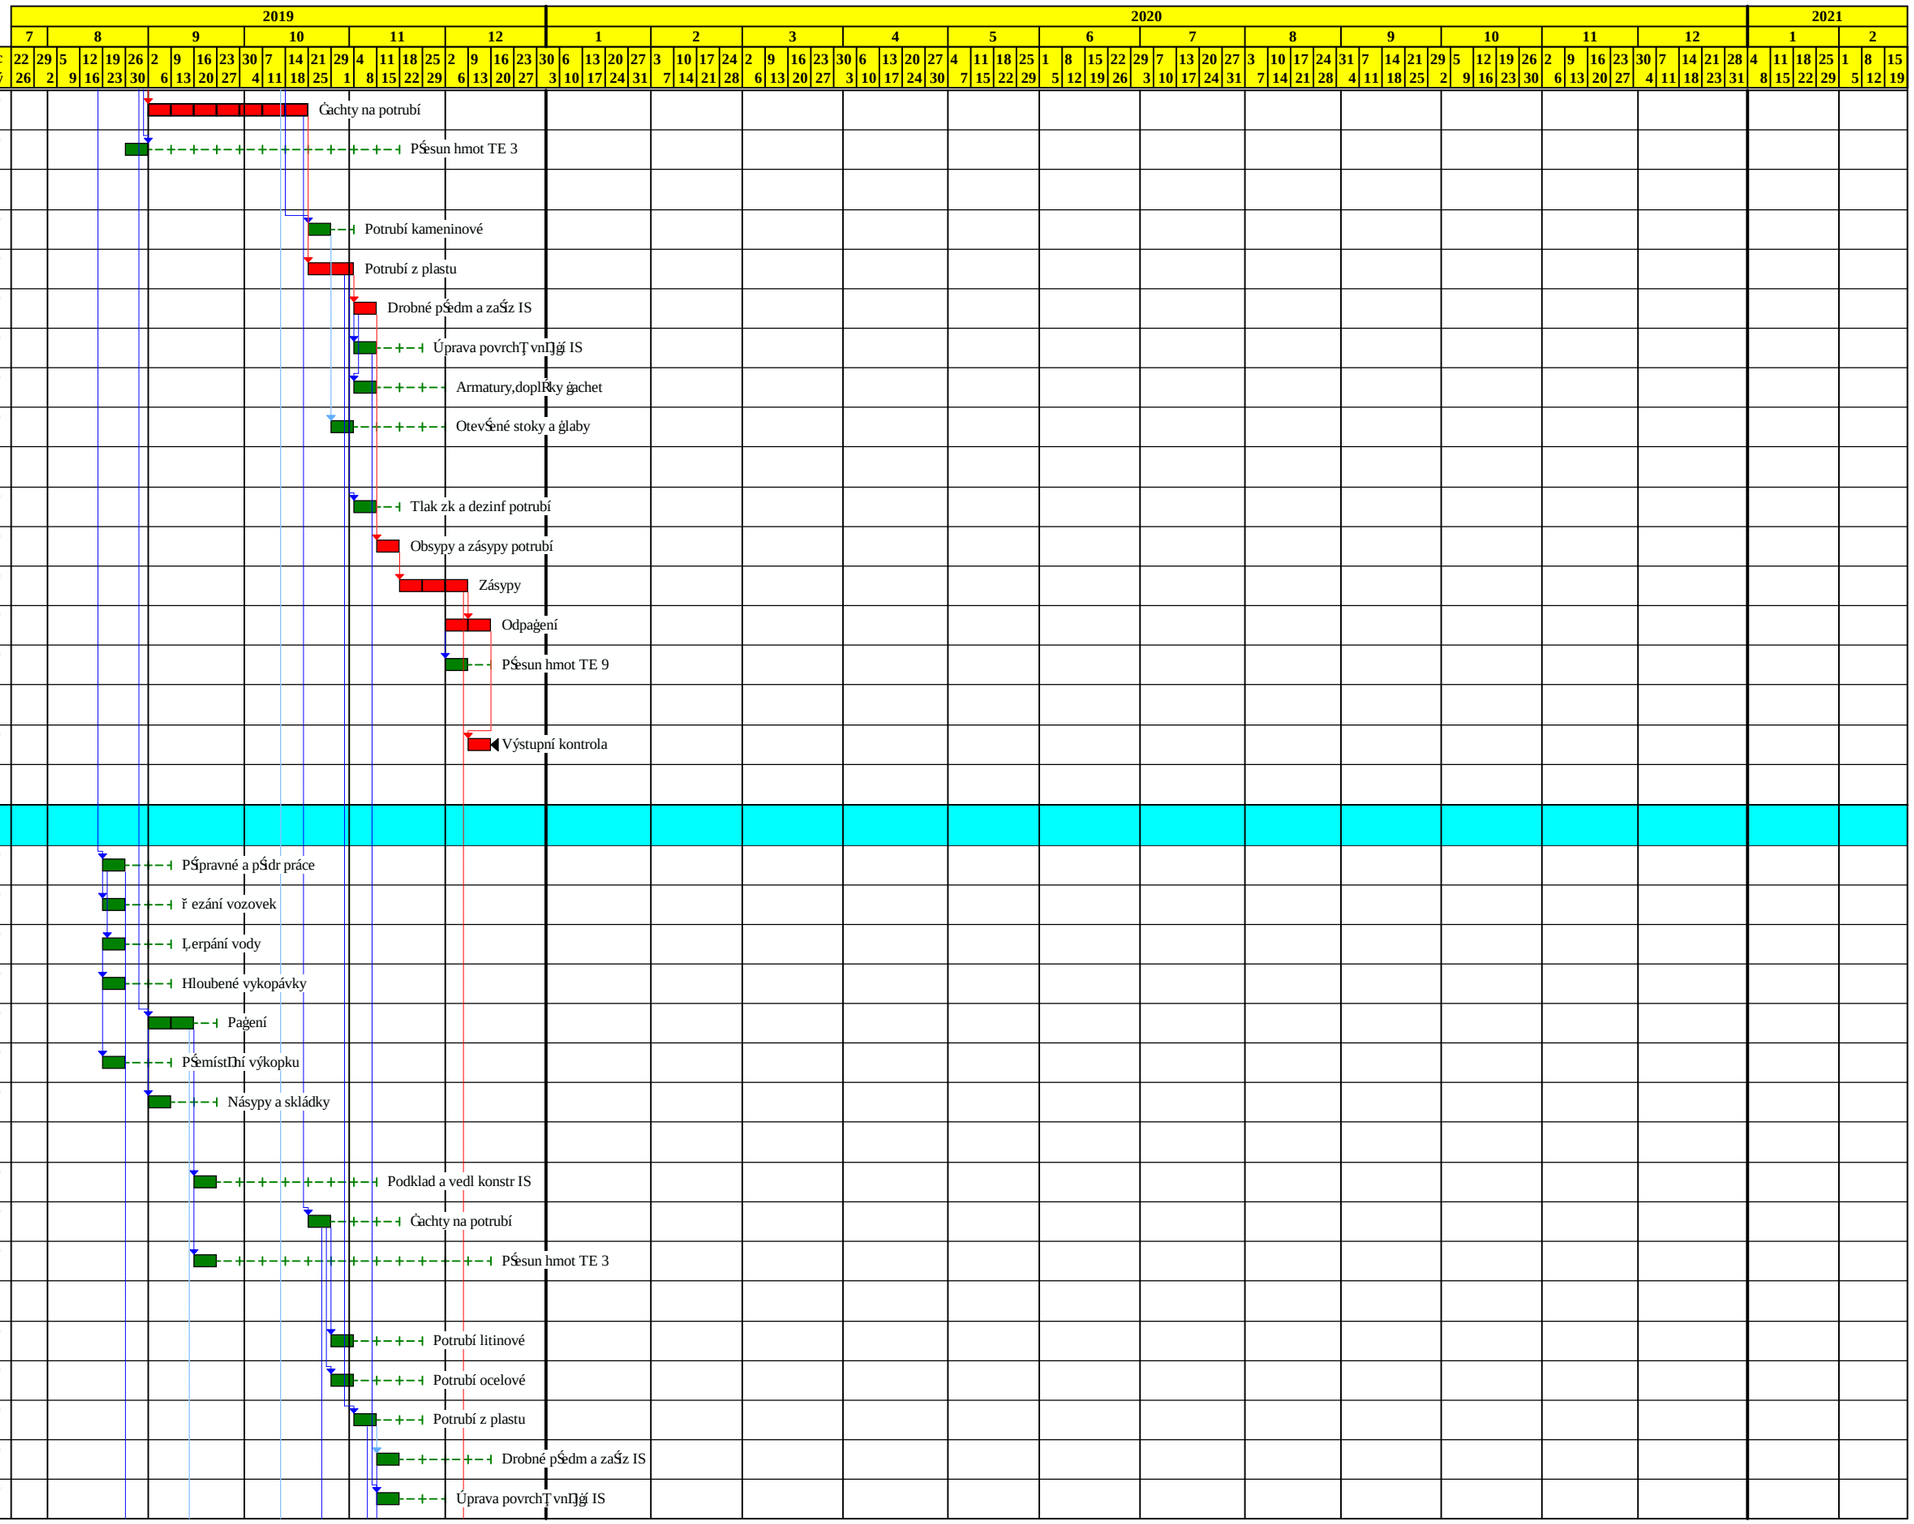

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název ĵinnosti SmĽhnost	Pracovník Ţ	Doba [týd.]	Rez.	Zaľátek mo ńný	Konec mo ńný
26608	ARMATURY,DOPLœKY ĠACHET 1 SO03 vod. pŚpoj	2	1	4	11.11.19	15.11.19
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO03 vod. pŚpoj	2	1	2	11.11.19	15.11.19
29301	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO03 vod. pŚpoj	4	1	2	18.11.19	22.11.19
29501	ZÁSYPY 1 SO03 vod. pŚpoj	2	1	0	9.12.19	13.12.19
29859	Př ESUN HMOT TE 9 / 1 SO03 vod. pŚpoj	2	1	0	16.12.19	20.12.19
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA / 1 SO03 vod. pŚpoj	1	1	0	16.12.19	20.12.19
SO04 par. pŚpoj						
30101	Př ÍPRAVNÉ A Př IDR PRÁCE 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	2	26.8.19	30.8.19
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO04 par. pŚpoj	3	1	2	26.8.19	30.8.19
30601	Př EMÍSŤnNÍ VÝKOPKU 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	2	26.8.19	30.8.19
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO04 par. pŚpoj	1	1	1	16.9.19	20.9.19
33102	ZÁKLADY IS 1 SO04 par. pŚpoj	3	1	6	16.9.19	20.9.19
33503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO04 par. pŚpoj	4	2	4	14.10.19	25.10.19
33607	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 SO04 par. pŚpoj	5	1	8	30.9.19	4.10.19
33758	ĠACHTY NA POTRUBÍ 1 SO04 par. pŚpoj	3	1	4	29.10.19	1.11.19
33859	Př ESUN HMOT TE 3 1 SO04 par. pŚpoj	3	2	12	23.9.19	4.10.19
36168	POTRUBÍ OCELOVÉ 1 SO04 par. pŚpoj	3	1	4	4.11.19	8.11.19
36406	ÚPRAVA POVRCHŠ VNŤnJĠÍ IS 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	1	16.12.19	20.12.19
36508	ARMATURY,DOPLœKY ĠACHET 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	0	16.12.19	20.12.19
36607	NÁŤnRY POTRUBÍ 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	0	23.12.19	27.12.19
36709	OST DOK KONST A PRÁCE IS 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	0	23.12.19	27.12.19
36859	Př ESUN HMOT TE 6 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	8	4.11.19	8.11.19
39108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	3	18.11.19	22.11.19
39207	TEPELNÁ IZOLACE VNŤnJĠÍ 1 SO04 par. pŚpoj	2	3	3	25.11.19	13.12.19
39401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO04 par. pŚpoj	4	1	0	30.12.19	3.1.20
39705	ZÁSYPY 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	0	6.1.20	10.1.20
39859	Př ESUN HMOT TE 9 1 SO04 par. pŚpoj	2	1	3	16.12.19	20.12.19
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO04 par. pŚpoj	1	1	0	6.1.20	10.1.20

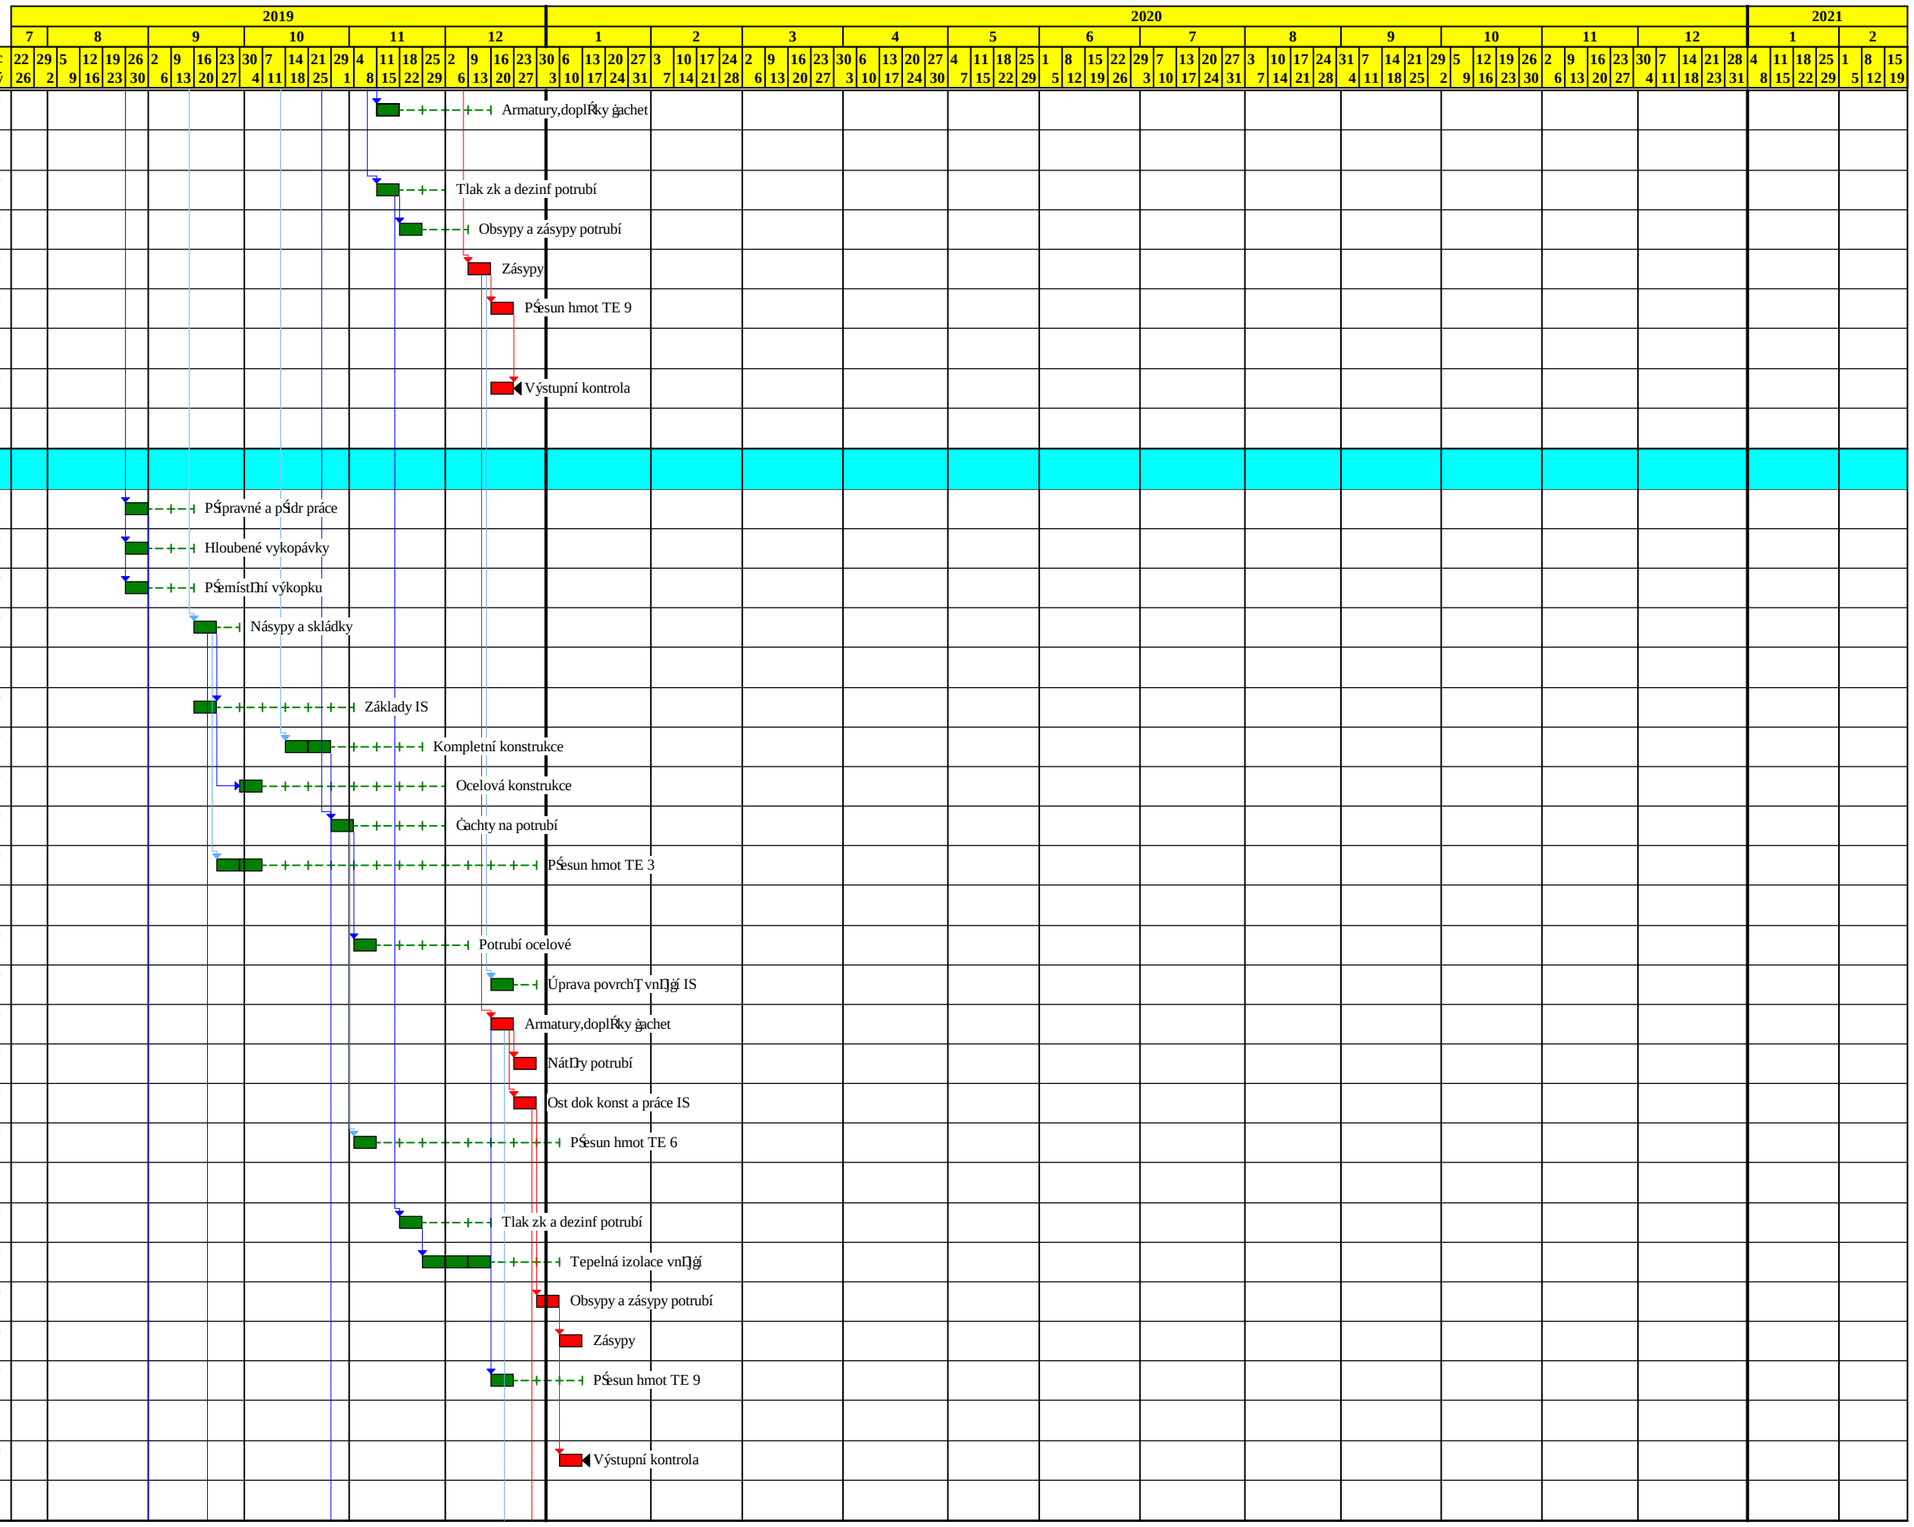

Ľinnost: kritická - , zpoĝdĎná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

6.11.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název ļinnosti SmĪhnost	Pracovník Ţ	Doba [týd.]	Rez.	Zaļátek možný	Konec možný
SO05 NN pŠípojka						
40101	Př ÍPRAVNÉ A Př IDR PRÁCE 1 SO05 NN pŠípojka		2	1	2	2.9.19 6.9.19
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO05 NN pŠípojka		3	1	2	2.9.19 6.9.19
40601	Př EMÍSŤnNÍ VÝKOPKU 1 SO05 NN pŠípojka		2	1	2	2.9.19 6.9.19
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO05 NN pŠípojka		1	1	1	23.9.19 27.9.19
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 SO05 NN pŠípojka		2	1	9	23.9.19 27.9.19
43403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO05 NN pŠípojka		4	2	5	29.10.19 8.11.19
43859	Př ESUN HMOT TE 3 1 SO05 NN pŠípojka		3	1	13	23.9.19 27.9.19
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 SO05 NN pŠípojka		2	1	5	18.11.19 22.11.19
46601	ZÁSYPY 1 SO05 NN pŠípojka		2	2	0	30.12.19 10.1.20
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO05 NN pŠípojka		3	1	0	13.1.20 17.1.20
46859	Př ESUN HMOT TE 6 1 SO05 NN pŠípojka		2	1	4	23.12.19 27.12.19
49859	Př ESUN HMOT TE 9 1 SO05 NN pŠípojka		2	1	4	23.12.19 27.12.19
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO05 NN pŠípojka		1	1	0	20.1.20 24.1.20
SO06 hl. objekt						
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO06 hl. objekt		3	2	2	9.9.19 20.9.19
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO06 hl. objekt		1	2	2	9.9.19 20.9.19
50409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 SO06 hl. objekt		5	3	2	9.9.19 27.9.19
50501	PAĢENÍ 1 SO06 hl. objekt		1	2	2	9.9.19 20.9.19
50601	Př EMÍSŤnNÍ VÝKOPKU 1 SO06 hl. objekt		2	4	2	9.9.19 4.10.19
50701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO06 hl. objekt		1	2	1	30.9.19 11.10.19
50802	POLĢTÁř ZÁKLADš 1 SO06 hl. objekt		2	5	2	16.9.19 18.10.19
51352	VRTY PRO PILOTY 1 SO06 hl. objekt		3	3	5	30.9.19 18.10.19
51402	PILOTY 1 SO06 hl. objekt		3	5	5	7.10.19 8.11.19
51405	ZÁKLADY 1 SO06 hl. objekt		6	3	2	7.10.19 25.10.19
51406	PODKLAD LEĢ KANALIZACE 1 SO06 hl. objekt		2	2	1	30.9.19 11.10.19
51408	KANALIZACE LEĢATÁ 1 SO06 hl. objekt		2	3	1	14.10.19 1.11.19
51409	SLOUPY A PILÍř E 1 SO06 hl. objekt		6	6	5	29.10.19 6.12.19
51415	NÁSYPY ZHUTŇnNÉ 1 SO06 hl. objekt		3	4	5	9.12.19 3.1.20
51420	ZASTřEĢENÍ Z BETONU 1 SO06 hl. objekt		1	2	0	13.1.20 24.1.20

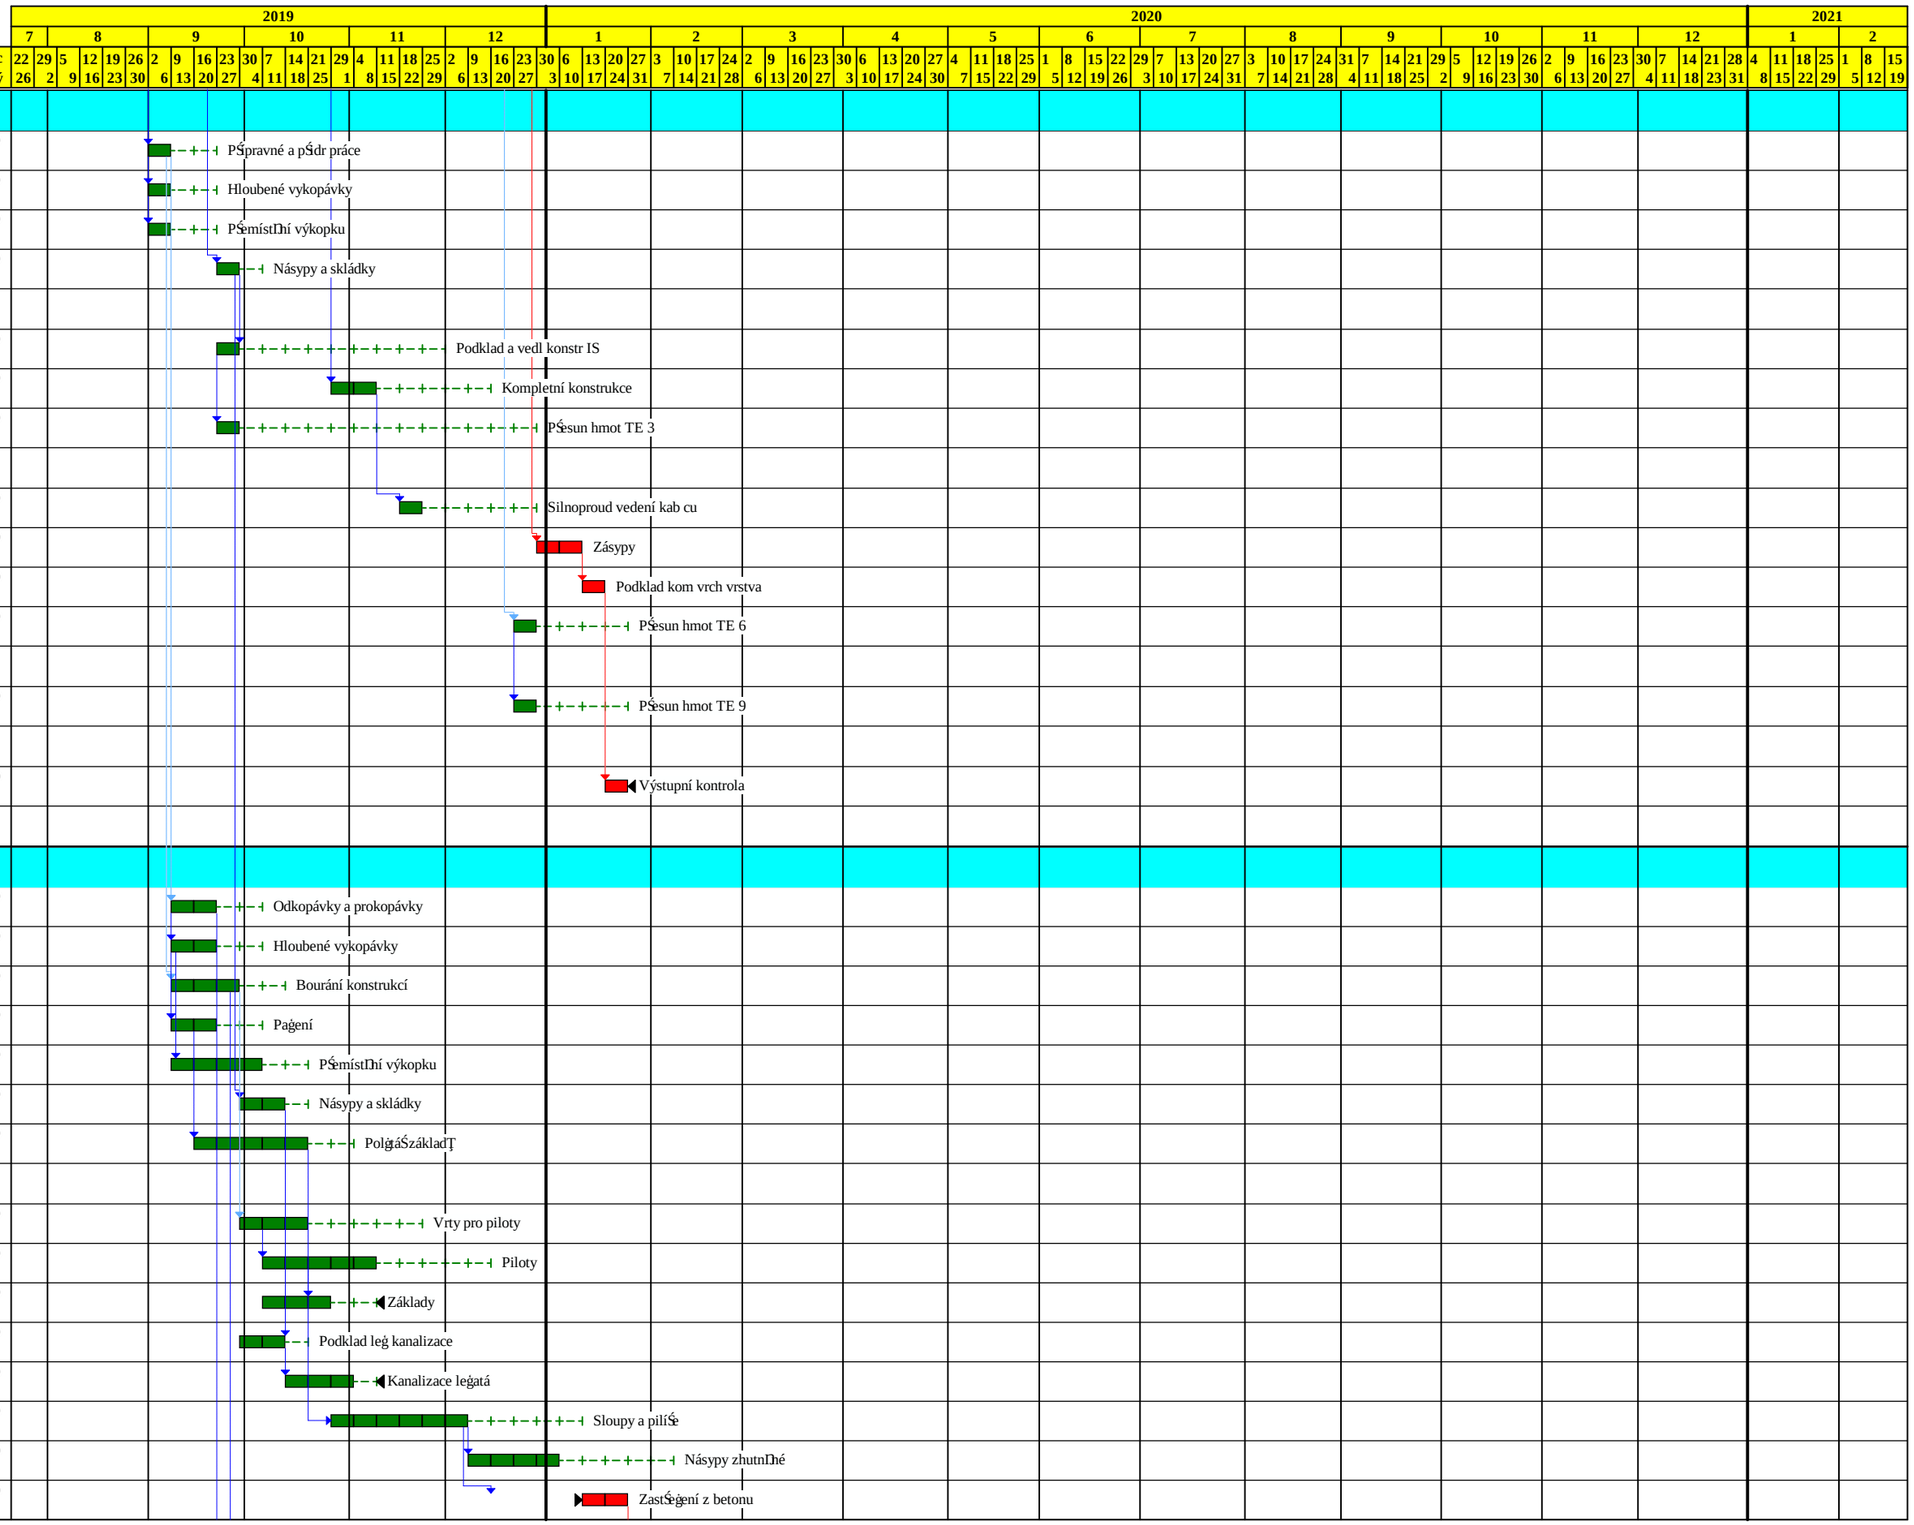

Ļinnost: kritická - , zpoĝdĪná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

CONTEC - Ļasový graf akce: 0FINVAR2 Prádelna nem.Ļeské Budĵovice

6.11.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název ĵinnosti SmĴhnost	Pracovníkĵ	Doba [týd.]	Rez.	Zaļátek možný	Konec možný
51452	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO06 hl. objekt	2	2	0	27.1.20	7.2.20
51607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 SO06 hl. objekt	2	4	0	17.2.20	13.3.20
52453	JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI 1 SO06 hl. objekt	1	2	4	2.3.20	13.3.20
52508	DOMOVNÍ ĠACHTICE ZTI 1 SO06 hl. objekt	1	2	6	16.3.20	27.3.20
52607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 SO06 hl. objekt	1	2	13	16.3.20	27.3.20
53103	ZDI NOSNÉ 1 SO06 hl. objekt	4	2	0	16.3.20	27.3.20
53203	STĺnNY NOSNÉ MONTOVANÉ 1 SO06 hl. objekt	2	2	2	16.3.20	27.3.20
53304	STROPY 1 SO06 hl. objekt	4	3	0	30.3.20	17.4.20
53354	SCHODIĠŤn 1 SO06 hl. objekt	2	2	3	6.4.20	17.4.20
53400	ZÁMEĻNÍCI KONSTR PRVKY 1 SO06 hl. objekt	2	2	14	20.4.20	30.4.20
53503	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 SO06 hl. objekt	4	2	0	6.4.20	17.4.20
53607	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 SO06 hl. objekt	5	4	2	16.3.20	10.4.20
53809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR / 1 SO06 hl. objekt	1	2	0	27.4.20	7.5.20
54157	OCELOVÁ KONSTRUKCE STŕ EĠ 1 SO06 hl. objekt	8	8	0	4.5.20	26.6.20
54259	ÚPRAVY VĺnTRACÍCH OTVORš / 1 SO06 hl. objekt	1	2	0	29.6.20	10.7.20
54357	KANALIZACE STREĠNÍ PRVKY 1 SO06 hl. objekt	1	2	0	29.6.20	10.7.20
54407	TEPELNÁ IZOLACE STŕ ECH 1 SO06 hl. objekt	2	6	0	29.6.20	7.8.20
54507	ZÁMEĻNÍCI STŕ EĠNÍ PRVKY 1 SO06 hl. objekt	1	2	0	10.8.20	21.8.20
54607	POVLAKOVÉ KRYTINY STŕ ECH 1 SO06 hl. objekt	10	9	0	24.8.20	23.10.20
54707	HROMOSVOD STREĠNÍ ĻÁST / 1 SO06 hl. objekt	1	2	8	12.10.20	23.10.20
54757	KLEMPÍŕ I STŕ EĠNÍ PRVKY 1 SO06 hl. objekt	2	2	0	12.10.20	23.10.20
54807	NÁTĺnRY STŕ EĠNÍCH PRVKš / 1 SO06 hl. objekt	1	2	11	12.10.20	23.10.20
55123	PŕÍĻKY A STĺnNY VÝPLœOVÉ 1 SO06 hl. objekt	3	4	2	13.4.20	7.5.20
55160	ZAŕ PŕEDMĺnTY ZABUDOVANÉ 1 SO06 hl. objekt	1	2	2	13.4.20	24.4.20
55167	INSTAL PREFAB ZABUDOVANÉ 1 SO06 hl. objekt	2	2	1	20.4.20	30.4.20
55189	LEHKÉ PROSTOROVÉ LEĠENÍ 1 SO06 hl. objekt	1	2	16	23.3.20	3.4.20
55286	VÝPLNĺn OTVORš 1 SO06 hl. objekt	1	2	13	4.5.20	15.5.20
55307	ZÁMEĻ VÝPL OTV,OBV PLÁĆş 1 SO06 hl. objekt	8	8	13	4.5.20	26.6.20
55327	TRUHLÁŕ I OKNA 1 SO06 hl. objekt	1	2	19	4.5.20	15.5.20
55452	DROBNÉ ZÁKLADY 1 SO06 hl. objekt	2	2	28	6.4.20	17.4.20
55507	KANALIZACE VNITŕ NÍ 1 SO06 hl. objekt	2	3	10	27.4.20	15.5.20
55527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO06 hl. objekt	4	12	1	27.4.20	17.7.20
55557	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 SO06 hl. objekt	1	2	1	7.7.20	17.7.20

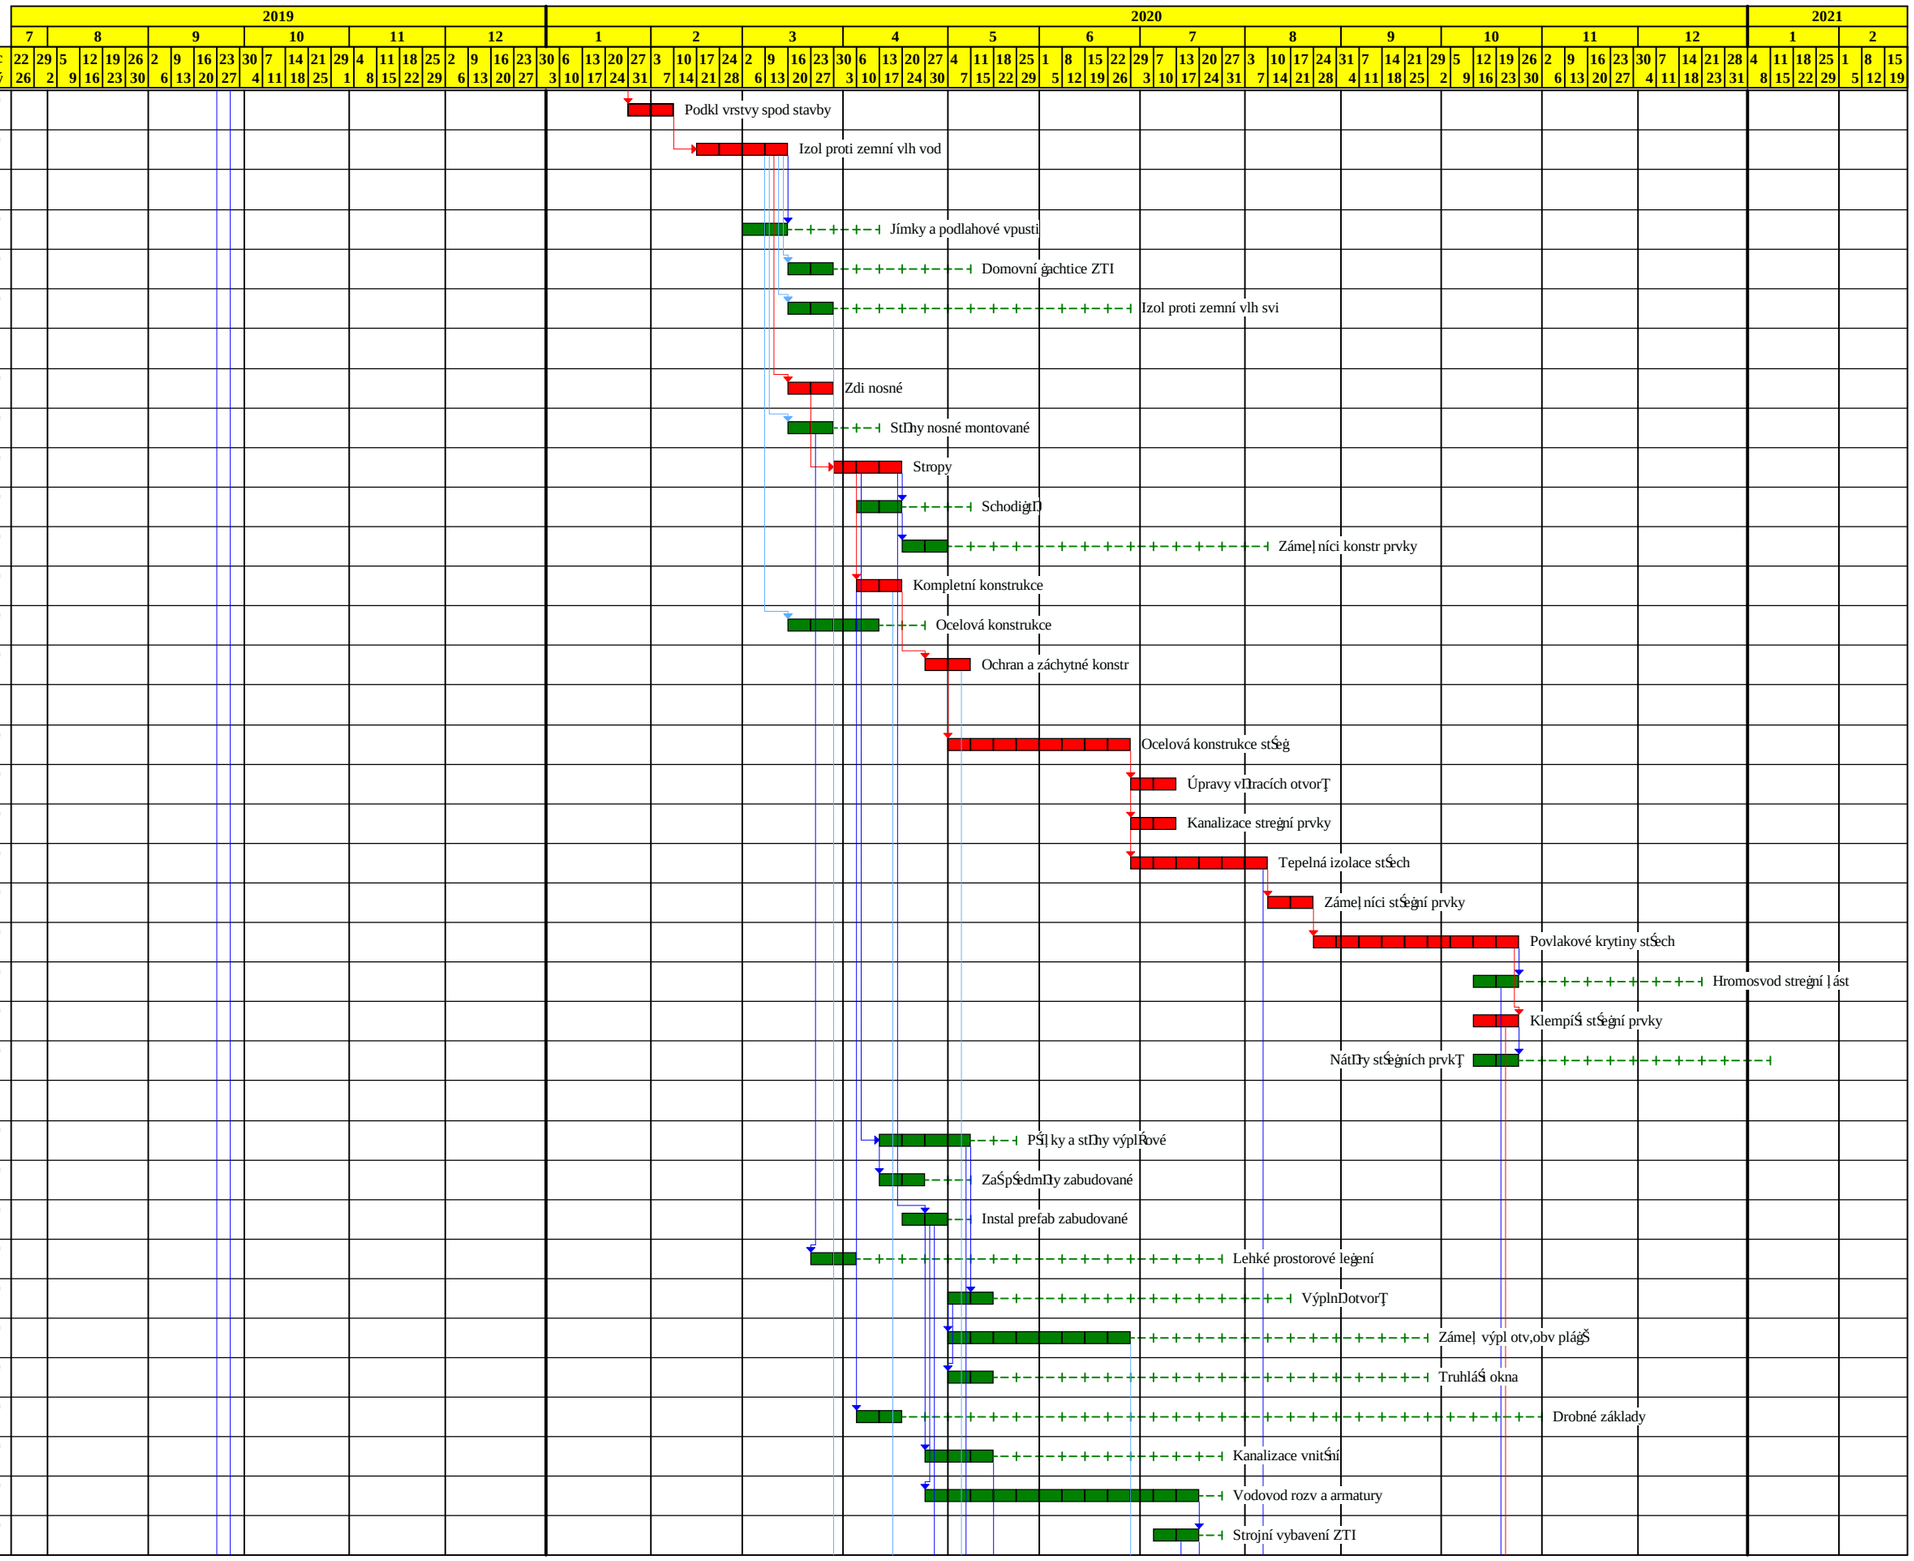

Ļinnost: kritická - , zpoġdĺná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

6.11.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název ĵinnosti SmĪhnost	Pracovník Ţ	Doba [týd.]	Rez.	Zaĵátek mo ́ný	Konec mo ́ný
55600	POTRUBÍ Z PLASTU 1 SO06 hl. objekt	3	3	1	20.7.20	7.8.20
55607	ROZVODY ÚT VNITř NÍ 1 SO06 hl. objekt	4	10	1	20.7.20	25.9.20
55627	ARMATURY ÚT 1 SO06 hl. objekt	2	5	3	31.8.20	2.10.20
55647	OTOPNÁ T'nLESA 1 SO06 hl. objekt	1	2	13	29.6.20	10.7.20
55657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1 SO06 hl. objekt	2	5	3	7.9.20	9.10.20
55687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 SO06 hl. objekt	1	2	17	5.10.20	16.10.20
55707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁĢ / 1 SO06 hl. objekt	1	11	11	27.4.20	10.7.20
55727	SILNOPROUD VODIĻE / 1 SO06 hl. objekt	1	8	11	1.6.20	24.7.20
55747	SILNOPROUD ROZVÁD'nĻE / 1 SO06 hl. objekt	1	2	22	20.7.20	31.7.20
55767	SLABOPROUD TRUBKY / 1 SO06 hl. objekt	1	2	13	4.5.20	15.5.20
55787	SLABOPROUD VODIĻE / 1 SO06 hl. objekt	1	2	11	13.7.20	24.7.20
56109	LEHKÉ POMOCNÉ LEČENÍ 1 SO06 hl. objekt	2	6	14	27.4.20	5.6.20
56306	ÚPRAVA POVRCHŠ VNITř NÍ 1 SO06 hl. objekt	12	12	4	13.7.20	2.10.20
56407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 SO06 hl. objekt	1	2	1	29.9.20	9.10.20
56700	NÁT'nRY POTRUBÍ 1 SO06 hl. objekt	1	2	7	29.9.20	9.10.20
56709	DROBNÉ DOPLœKY VNITř NÍ 1 SO06 hl. objekt	1	2	7	29.9.20	9.10.20
56806	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 SO06 hl. objekt	4	5	1	5.10.20	6.11.20
57107	ZÁMEĻ ST'nNY,Př ÍĻKY,PODHL 1 SO06 hl. objekt	2	2	1	9.11.20	20.11.20
57127	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 1 SO06 hl. objekt	3	3	3	12.10.20	30.10.20
57307	OBKLADY VNITř NÍ 1 SO06 hl. objekt	3	6	5	5.10.20	13.11.20
57507	PODLAHY SYNTETICKÉ 1 SO06 hl. objekt	3	3	1	23.11.20	11.12.20
57607	PODLAHY Z DLAĢDIC VNITř 1 SO06 hl. objekt	3	5	5	9.11.20	11.12.20
57657	NÁT'nRY VNITř NÍ 1 SO06 hl. objekt	2	2	12	12.10.20	23.10.20
57707	MALBY VNITř NÍ 1 SO06 hl. objekt	2	7	3	19.10.20	4.12.20
57807	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 SO06 hl. objekt	4	5	1	23.11.20	23.12.20
57810	KANALIZACE Př ÍSLUČENSTVÍ 1 SO06 hl. objekt	1	2	29	18.5.20	29.5.20
57811	VODOVOD Př ÍSLUČENSTVÍ 1 SO06 hl. objekt	2	2	29	18.5.20	29.5.20
58109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 SO06 hl. objekt	2	2	23	27.7.20	7.8.20
58257	ZÁMEĻNÍCI DOPLœKY VNITř 1 SO06 hl. objekt	2	2	3	14.12.20	23.12.20
58307	TRUHLÁř I DVEř E,VYBAVENÍ 1 SO06 hl. objekt	2	3	1	28.12.20	15.1.21
58407	ZAř IZOVACÍ Př EDM'nTY ZTI 1 SO06 hl. objekt	2	2	1	14.12.20	23.12.20
58607	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 SO06 hl. objekt	1	2	11	5.10.20	16.10.20
58707	SLABOPROUD KOMPLET,ZAř ÍZ / 1 SO06 hl. objekt	2	2	10	23.11.20	4.12.20
58757	SILNOPROUD KOMPLETACE / 1 SO06 hl. objekt	2	6	1	28.12.20	5.2.21

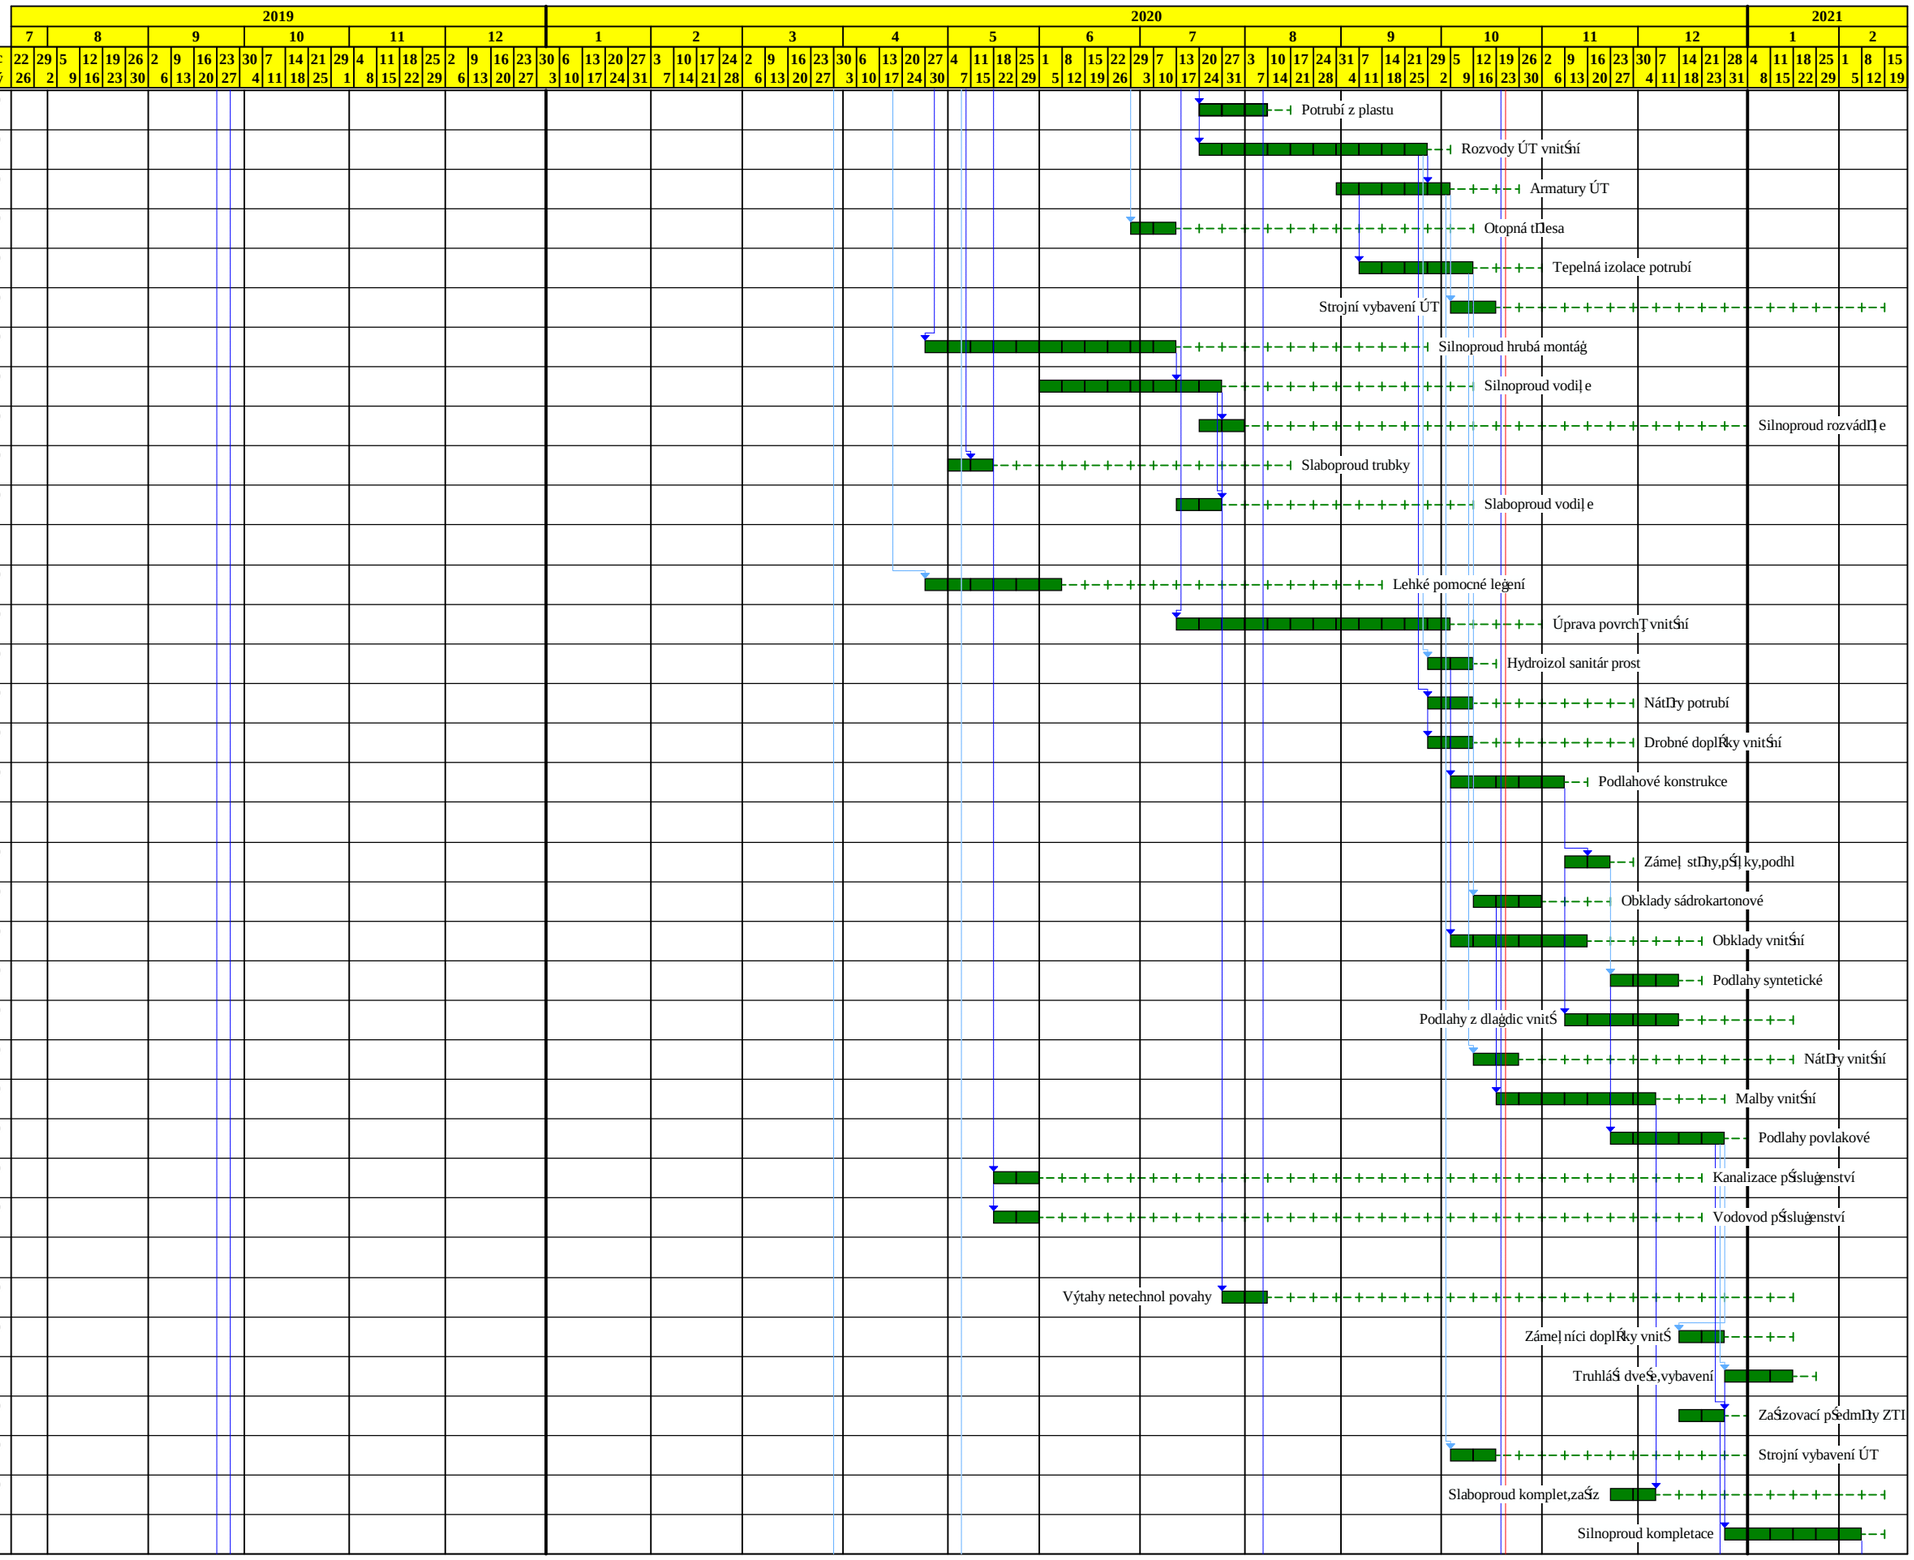

Ļinnost: kritická - , zpoĝdĪná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

6.11.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název Činnosti Smlouva	Pracovník	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
58800	PODLAHY TEXTILNÍ 1 SO06 hl. objekt	1	2	1	25.1.21	5.2.21
58809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 SO06 hl. objekt	6	5	0	11.1.21	12.2.21
59109	LEHKÉ ŘÍDOVÉ KRYTÍ 1 SO06 hl. objekt	3	2	23	30.3.20	10.4.20
59207	TEPELNÁ IZOLACE VNITŘNÍ 1 SO06 hl. objekt	2	4	8	20.7.20	14.8.20
59226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 1 SO06 hl. objekt	4	2	8	10.8.20	21.8.20
59259	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 SO06 hl. objekt	1	2	18	10.8.20	21.8.20
59307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ / 1 SO06 hl. objekt	1	2	8	19.10.20	30.10.20
59357	SILNOPROUD KOMPLET VENK / 1 SO06 hl. objekt	1	2	19	17.8.20	28.8.20
59557	KLEMPÍŘ I FASÁDNÍ PRVKY 1 SO06 hl. objekt	4	12	0	19.10.20	8.1.21
59607	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO06 hl. objekt	1	2	8	2.11.20	13.11.20
59701	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO06 hl. objekt	2	2	8	2.11.20	13.11.20
59800	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO06 hl. objekt	2	6	1	28.12.20	5.2.21
59859	PŘESUN HMOT TE 9 / 1 SO06 hl. objekt	2	3	34	11.5.20	29.5.20
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA / 1 SO06 hl. objekt	1	1	0	15.2.21	19.2.21
SO07 zpev. ploch						
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO07 zpev. ploch	3	1	13	17.8.20	21.8.20
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO07 zpev. ploch	3	1	13	17.8.20	21.8.20
60409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 SO07 zpev. ploch	5	1	13	17.8.20	21.8.20
60410	BOURÁNÍ OSTATNÍCH KONSTR 1 SO07 zpev. ploch	2	1	14	24.8.20	28.8.20
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO07 zpev. ploch	2	1	14	24.8.20	28.8.20
60701	NÁSYPY A SKLÁDKY // 1 SO07 zpev. ploch	1	1	14	24.8.20	28.8.20
60751	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 SO07 zpev. ploch	2	2	13	24.8.20	4.9.20
60802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 1 SO07 zpev. ploch	2	1	13	24.8.20	28.8.20
63101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 SO07 zpev. ploch	3	1	13	31.8.20	4.9.20
63155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 SO07 zpev. ploch	3	1	14	31.8.20	4.9.20
63359	SILNIČNÍ PROPUSTKY // 1 SO07 zpev. ploch	4	1	13	7.9.20	11.9.20
63509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 SO07 zpev. ploch	2	1	13	14.9.20	18.9.20
63708	ŽACHTY NA POTRUBÍ // 1 SO07 zpev. ploch	3	1	15	14.9.20	18.9.20
65000	SLOUPY DROBNÉ 1 SO07 zpev. ploch	3	1	15	21.9.20	25.9.20
66105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 SO07 zpev. ploch	3	1	13	14.9.20	18.9.20
66205	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 SO07 zpev. ploch	3	1	14	21.9.20	25.9.20
66255	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ / 1 SO07 zpev. ploch	3	1	16	14.9.20	18.9.20

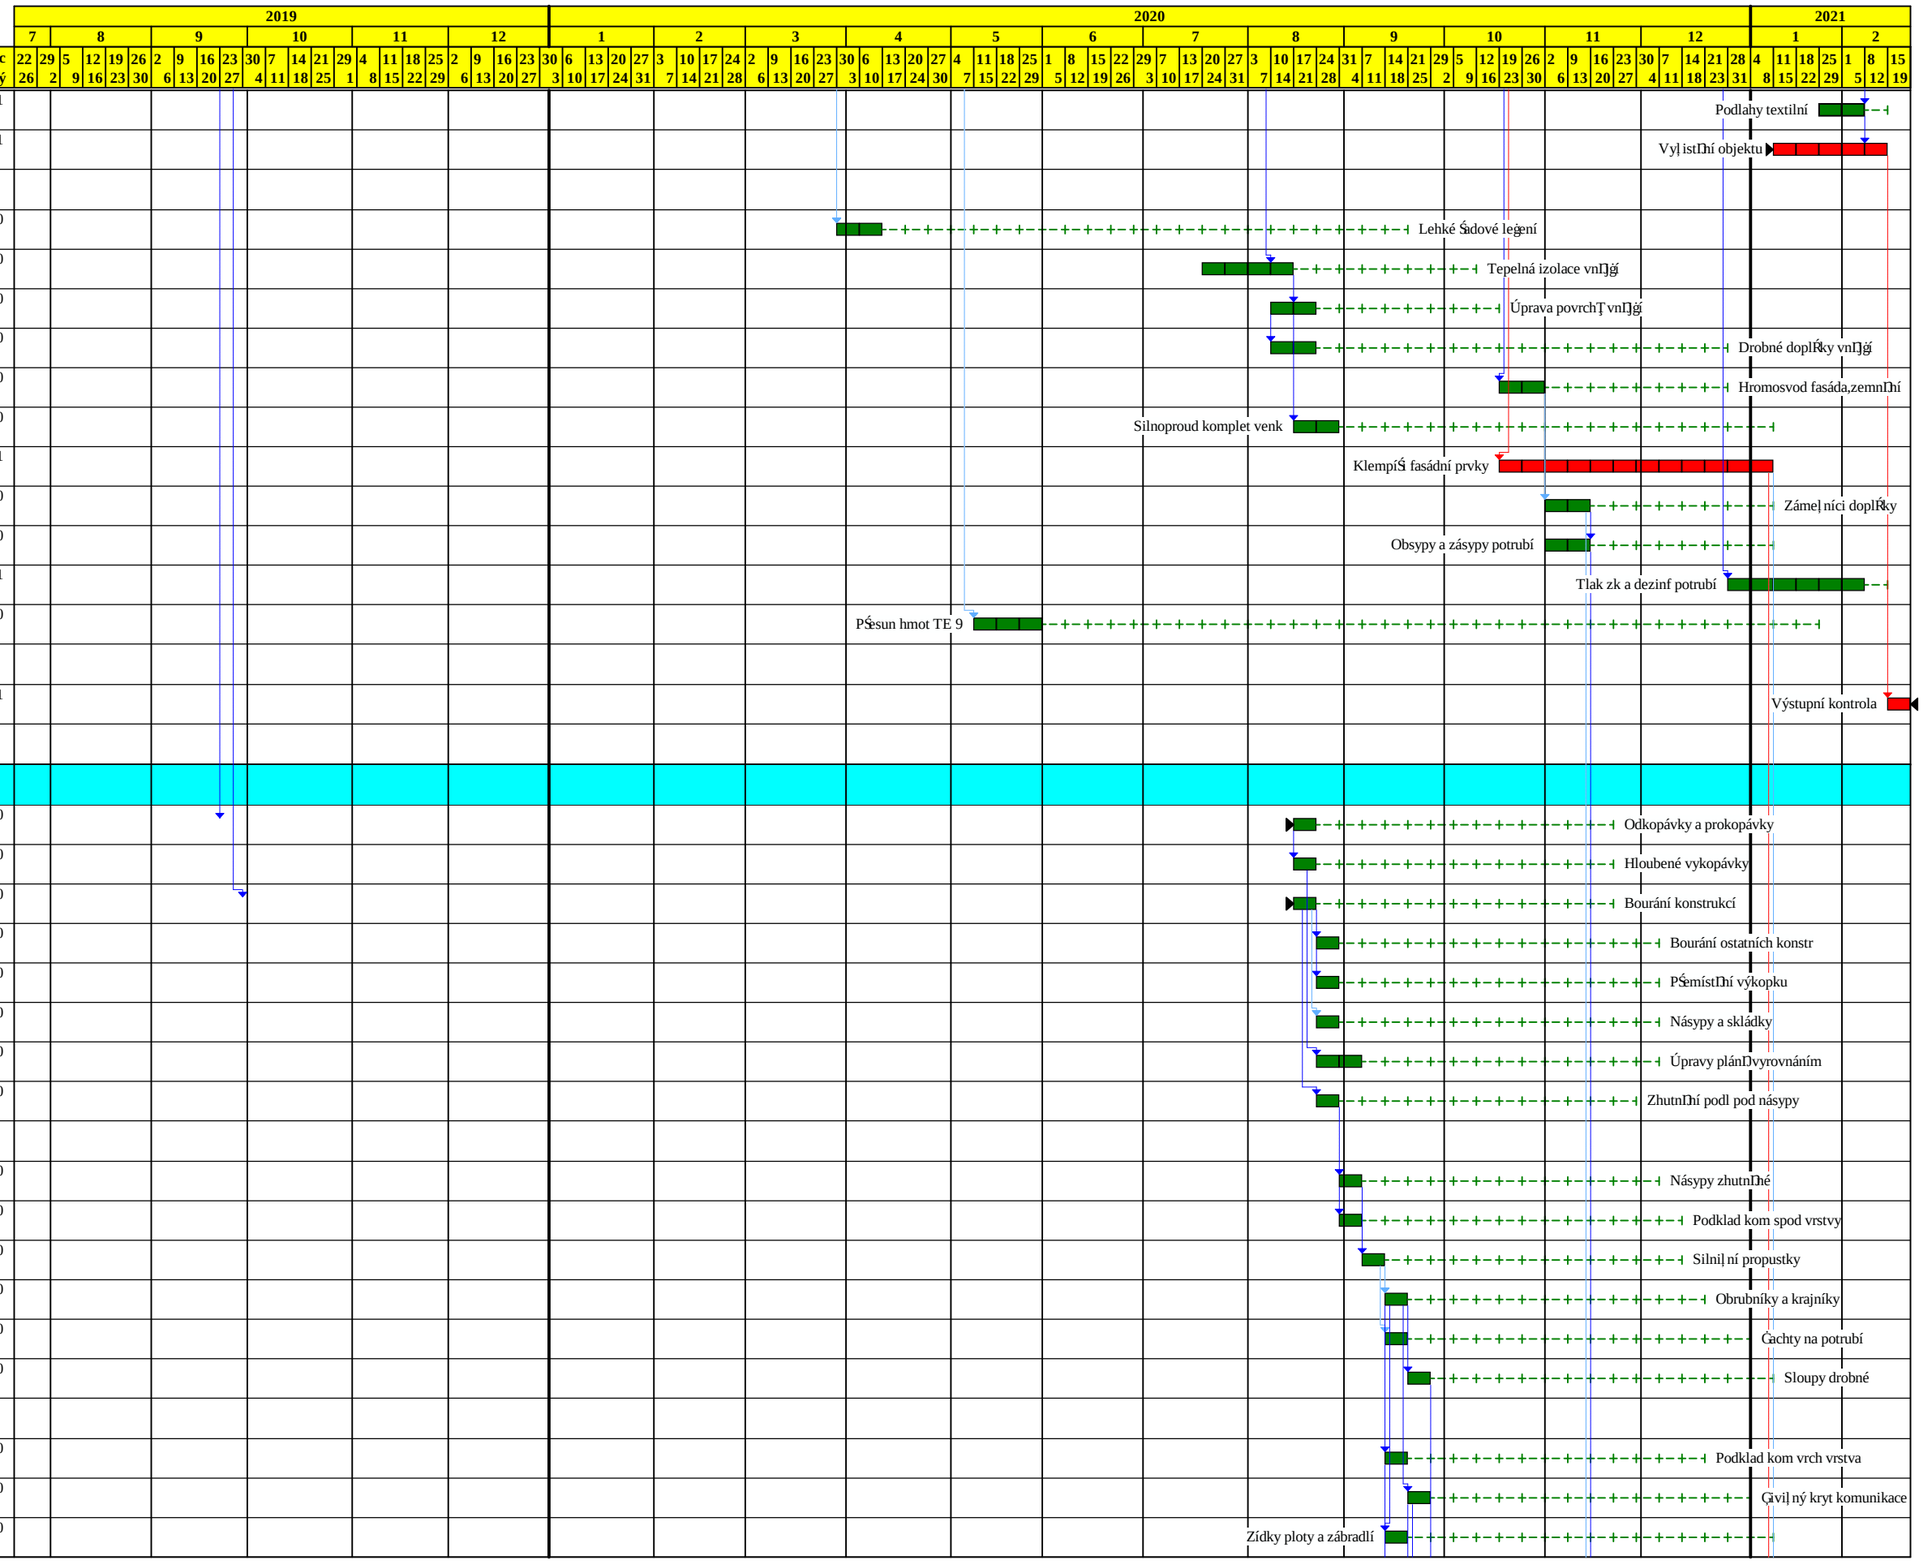

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

6.11.19

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název ľinnosti SmĎhnost	Pracovník	Doba [týd.]	Rez.	Zaľátek možný	Konec možný
66305	DLAĞBA KOMUNIKACE 1 SO07 zpev. ploch	4	4	13	14.9.20	9.10.20
66409 //	OTEVřENÉ STOKY A ĞLABY 1 SO07 zpev. ploch	3	1	15	21.9.20	25.9.20
66809 //	DOPLŒKY POZEM KOMUNIKACÍ 1 SO07 zpev. ploch	3	1	15	21.9.20	25.9.20
69109 //	ZÁBRADLÍ,SVODIDLA 1 SO07 zpev. ploch	3	1	15	29.9.20	2.10.20
69309	DOPRAVNÍ ZNAĽKY SVISLÉ 1 SO07 zpev. ploch	3	1	16	5.10.20	9.10.20
69405 //	DLAĞBA PřnČí KOMUNIKACE 1 SO07 zpev. ploch	3	1	8	16.11.20	20.11.20
69551	ODSTR SILNIĽ KONSTRUKCÍ 1 SO07 zpev. ploch	2	1	15	29.9.20	2.10.20
69601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 SO07 zpev. ploch	4	1	8	16.11.20	20.11.20
69709 //	ĽISTřnÍ USAZENIN 1 SO07 zpev. ploch	3	1	1	11.1.21	15.1.21
69759 //	DOPRAVNÍ ZNAĽKY VODOROV 1 SO07 zpev. ploch	2	1	1	18.1.21	22.1.21
69801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 SO07 zpev. ploch	4	3	0	11.1.21	29.1.21
69859 //	Př ESUN HMOT TE 9 1 SO07 zpev. ploch	2	1	17	29.9.20	2.10.20
69980 //	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO07 zpev. ploch	1	1	0	25.1.21	29.1.21

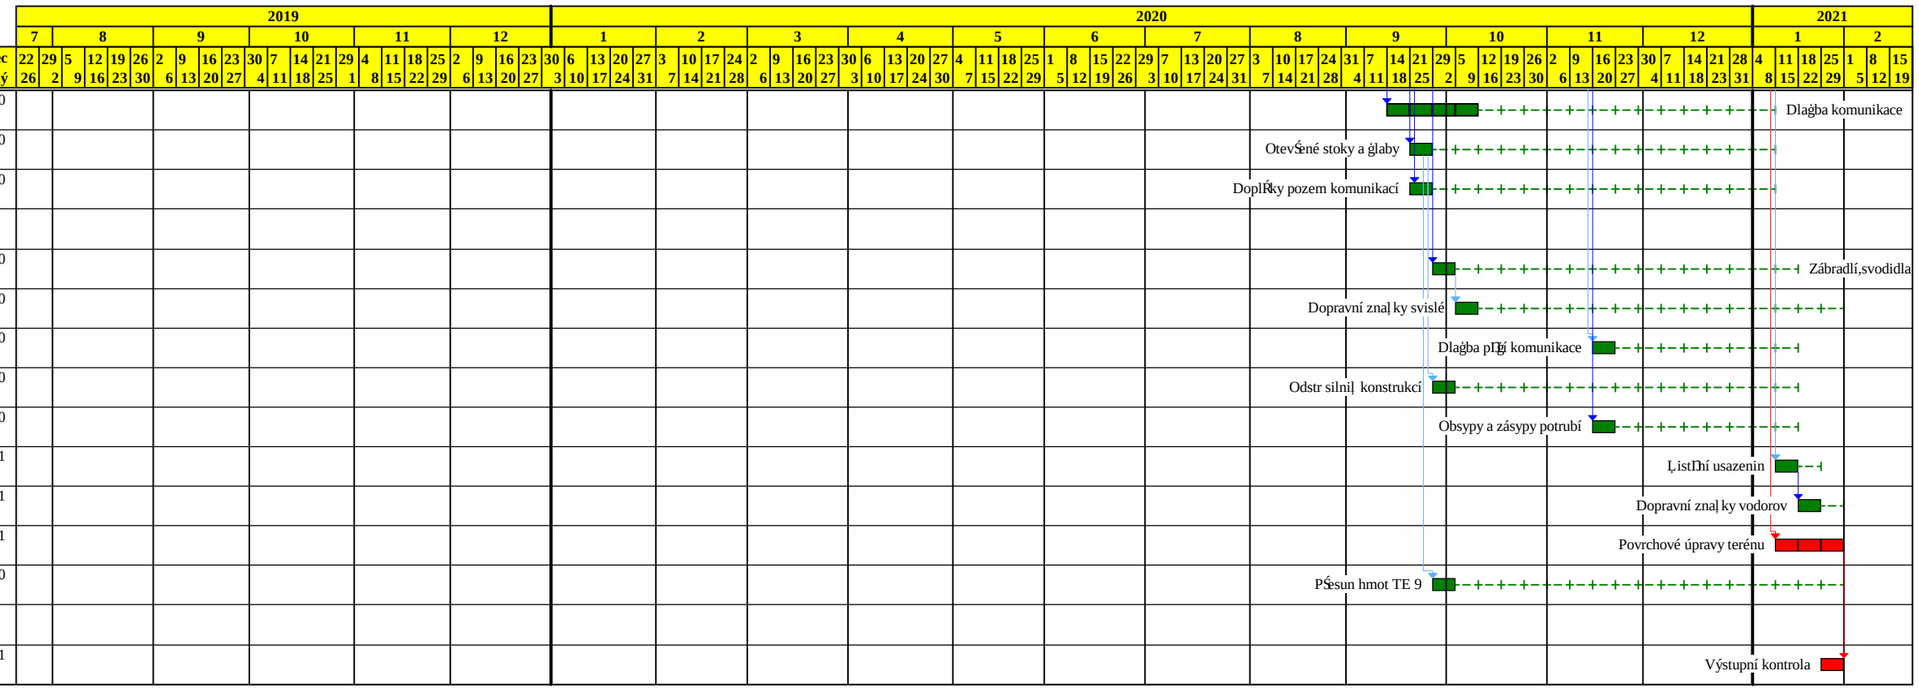

Ľinnost: kritická - , zpoĝdĎná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
