CONTEC - Časový graf akce: 00010003 KÚ JIHLAVA

21.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
Dodav.	Směnno:					
PŘÍPOJKA KAN						
159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 PŘÍPOJKA KAN	1	1	0	29.11.21	3.12.21
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 PŘÍPOJKA KAN	4	2	0	29.11.21	10.12.21
459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 PŘÍPOJKA KAN	3	1	1	29.11.21	3.12.21
501	PAŽENÍ 1 PŘÍPOJKA KAN	5	2	2	29.11.21	10.12.21
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 PŘÍPOJKA KAN	2	1	1	29.11.21	3.12.21
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 PŘÍPOJKA KAN	1	1	1	29.11.21	3.12.21
3203	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 PŘÍPOJKA KAN	4	4	0	13.12.21	7.1.22
3408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 PŘÍPOJKA KAN	9	2	3	13.12.21	23.12.21
6278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 PŘÍPOJKA KAN	6	2	0	10.1.22	21.1.22
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 PŘÍPOJKA KAN	2	1	0	24.1.22	28.1.22
9108	ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ 1 PŘÍPOJKA KAN	2	2	0	17.1.22	28.1.22
9401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 PŘÍPOJKA KAN	8	1	0	31.1.22	4.2.22
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 PŘÍPOJKA KAN	3	1	0	7.2.22	11.2.22
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘÍPOJKA KAN	1	1	0	7.2.22	11.2.22
PŘIP. VOD						
10159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 PŘIP. VOD	3	1	2	20.12.21	23.12.21
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 PŘIP. VOD	3	1	1	3.1.22	7.1.22
10359	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 PŘIP. VOD	2	2	0	3.1.22	14.1.22
10459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 PŘIP. VOD	4	2	0	3.1.22	14.1.22
10501	PAŽENÍ 1 PŘIP. VOD	2	1	1	3.1.22	7.1.22
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 PŘIP. VOD	2	1	0	10.1.22	14.1.22
16207	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 PŘIP. VOD	2	1	0	17.1.22	21.1.22
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 PŘIP. VOD	2	1	0	17.1.22	21.1.22
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 PŘIP. VOD	4	1	0	24.1.22	28.1.22
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 PŘIP. VOD	3	1	0	31.1.22	4.2.22
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘIP. VOD	1	1	0	31.1.22	4.2.22
PŘÍPOJKA PLYN						
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 PŘÍPOJKA PLYN	3	1	0	3.1.22	7.1.22
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 PŘÍPOJKA PLYN	2	1	0	3.1.22	7.1.22
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 PŘÍPOJKA PLYN	1	1	0	3.1.22	7.1.22
26108	POTRUBÍ Z PLASTU 1 PŘÍPOJKA PLYN	3	1	0	10.1.22	14.1.22
26207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 PŘÍPOJKA PLYN	2	1	0	10.1.22	14.1.22
29108	TLAKOVÁ ZKOUŠKA 1 PŘÍPOJKA PLYN	2	1	0	17.1.22	21.1.22
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 PŘÍPOJKA PLYN	4	1	0	17.1.22	21.1.22
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘÍPOJKA PLYN	1	1	0	24.1.22	28.1.22
PŘÍPOJKA NN						
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 PŘÍPOJKA NN	2	1	0	20.12.21	23.12.21
30159	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 PŘÍPOJKA NN	3	1	0	20.12.21	23.12.21
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 PŘÍPOJKA NN	3	1	0	20.12.21	23.12.21
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 PŘÍPOJKA NN	2	1	1	20.12.21	23.12.21
33104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 PŘÍPOJKA NN	2	1	0	27.12.21	31.12.21
36207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 PŘÍPOJKA NN	2	1	0	3.1.22	7.1.22
36257	SILNOPROUD VEDENÍ KAB AL 1 PŘÍPOJKA NN	2	2	0	3.1.22	14.1.22
36357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 1 PŘÍPOJKA NN	10	4	0	3.1.22	28.1.22
36407	SILNOPROUD OSTATNÍ 1 PŘÍPOJKA NN	8	3	0	10.1.22	28.1.22
36601	ZÁSYPY 1 PŘÍPOJKA NN	2	1	0	31.1.22	4.2.22
36654	DLAŽBY IS 1 PŘÍPOJKA NN	4	1	0	7.2.22	11.2.22
39605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 PŘÍPOJKA NN	3	1	0	14.2.22	18.2.22
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA / 1 PŘÍPOJKA NN	1	1	0	14.2.22	18.2.22
SO 01 KÚ						
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 SO 01 KÚ	6	4	0	24.1.22	18.2.22
40201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 SO 01 KÚ	3	2	0	24.1.22	4.2.22

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

CONTEC - Časový graf akce: 00010003 KÚ JIHLAVA

21.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnno:	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO 01 KÚ	7	5	0	24.1.22	25.2.22
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO 01 KÚ	6	5	0	24.1.22	25.2.22
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO 01 KÚ	9	4	1	24.1.22	18.2.22
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO 01 KÚ	1	2	3	24.1.22	4.2.22
40859	PŘESUN HMOT TE 0 1 SO 01 KÚ	1	1	7	24.1.22	28.1.22
41502	ZÁKLADY 1 SO 01 KÚ	13	8	0	31.1.22	25.3.22
41606	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 SO 01 KÚ	6	7	0	28.2.22	15.4.22
41657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 SO 01 KÚ	4	5	0	28.3.22	29.4.22
41704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE / 1 SO 01 KÚ	2	1	3	28.2.22	4.3.22
41757	KANALIZACE LEŽATÁ 1 SO 01 KÚ	5	4	3	7.3.22	1.4.22
42103	SLOUPY SPODNÍ STAVBY 1 SO 01 KÚ	4	5	3	28.3.22	29.4.22
42203	KANÁLY PRO INŽ SÍTĚ 1 SO 01 KÚ	2	2	1	18.4.22	29.4.22
42253	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 1 SO 01 KÚ	10	7	0	4.4.22	20.5.22
42304	SCHODIŠTĚ SUTERÉN 1 SO 01 KÚ	2	2	2	23.5.22	3.6.22
42404	STROP SUTERÉN 1 SO 01 KÚ	15	6	0	2.5.22	10.6.22
42607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 SO 01 KÚ	2	7	2	30.5.22	15.7.22
42702	SKLEPNÍ SVĚTLÍKY 1 SO 01 KÚ	2	3	2	18.7.22	5.8.22
42751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 SO 01 KÚ	2	9	2	8.8.22	7.10.22
43103	SLOUPY A PILÍŘE 1 SO 01 KÚ	8	18	0	23.5.22	23.9.22
43203	ZDI NOSNÉ 1 SO 01 KÚ	5	21	2	23.5.22	14.10.22
43404	STROPY 2 SO 01 KÚ	26	21	0	13.6.22	4.11.22
43504	SCHODIŠTĚ 1 SO 01 KÚ	4	12	5	25.7.22	14.10.22
43553	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 SO 01 KÚ	1	15	2	8.8.22	18.11.22
44253	ZDI NADSTŘEŠNÍ 1 SO 01 KÚ	2	4	4	24.10.22	18.11.22
44327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 SO 01 KÚ	3	7	4	21.11.22	6.1.23
44427	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT /VZT 1 SO 01 KÚ	3	3	4	9.1.23	27.1.23
44507	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 SO 01 KÚ	1	1	12	14.11.22	18.11.22
44557	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 SO 01 KÚ	2	4	8	9.1.23	3.2.23
44657	ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO 01 KÚ	4	7	4	9.1.23	24.2.23
44727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECHI 1 SO 01 KÚ	3	15	4	9.1.23	21.4.23
44807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 SO 01 KÚ	4	16	4	30.1.23	19.5.23
44900	VEGETAČNÍ STŘECHY 1 SO 01 KÚ	2	12	4	20.3.23	9.6.23
45123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 SO 01 KÚ	4	6	0	10.10.22	18.11.22
45187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 SO 01 KÚ	13	9	7	19.9.22	18.11.22
45209	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 1 SO 01 KÚ	6	6	0	24.10.22	2.12.22
45306	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 SO 01 KÚ	2	6	7	17.10.22	25.11.22
45507	KANALIZACE VNITŘNÍ 1 SO 01 KÚ	5	10	2	14.11.22	20.1.23
45527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO 01 KÚ	7	10	1	14.11.22	20.1.23
45530	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 SO 01 KÚ	3	3	5	23.1.23	10.2.23
45547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 SO 01 KÚ	2	5	2	14.11.22	16.12.22
45587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ 1 SO 01 KÚ	10	11	0	14.11.22	27.1.23
45607	ARMATURY ÚT 1 SO 01 KÚ	2	11	0	28.11.22	10.2.23
45627	OTOPNÁ TĚLESA 1 SO 01 KÚ	2	6	0	2.1.23	10.2.23
45647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1 SO 01 KÚ	3	5	0	9.1.23	10.2.23
45687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 SO 01 KÚ	2	2	4	30.1.23	10.2.23
45707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 SO 01 KÚ	9	10	1	14.11.22	20.1.23
45727	SILNOPROUD VODIČE 1 SO 01 KÚ	9	11	12	21.11.22	3.2.23
45747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE 1 SO 01 KÚ	8	4	12	9.1.23	3.2.23
45767	SLABOPROUD TRUBKY 1 SO 01 KÚ	2	7	5	14.11.22	30.12.22
45787	SLABOPROUD VODIČE 1 SO 01 KÚ	10	8	15	21.11.22	13.1.23
45807	VZDUCHOTECHNIKA /VZT 1 SO 01 KÚ	10	11	6	14.11.22	27.1.23
45859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR 1 SO 01 KÚ	1	3	27	10.10.22	27.10.22
46207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 SO 01 KÚ	8	10	5	5.12.22	10.2.23
46254	ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ 1 SO 01 KÚ	12	11	4	5.12.22	17.2.23
46306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ 2 SO 01 KÚ	20	19	0	5.12.22	14.4.23
46407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 SO 01 KÚ	2	5	4	23.1.23	24.2.23
46706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 SO 01 KÚ	12	13	0	30.1.23	28.4.23
46807	ZÁMEČNÍCI ZDVOJ PODLAHY 1 SO 01 KÚ	1	6	2	13.3.23	21.4.23
47107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 1 SO 01 KÚ	36	16	0	16.1.23	5.5.23
47127	ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL 1 SO 01 KÚ	3	10	6	6.3.23	12.5.23
47407	OBKLADY VNITŘNÍ 1 SO 01 KÚ	8	7	0	13.3.23	28.4.23
47457	PODLAHY SYNTETICKÉ 1 SO 01 KÚ	12	8	0	13.3.23	5.5.23
47607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ 1 SO 01 KÚ	10	18	1	20.2.23	23.6.23
47657	NÁTĚRY VNITŘNÍ 1 SO 01 KÚ	3	5	8	3.4.23	5.5.23

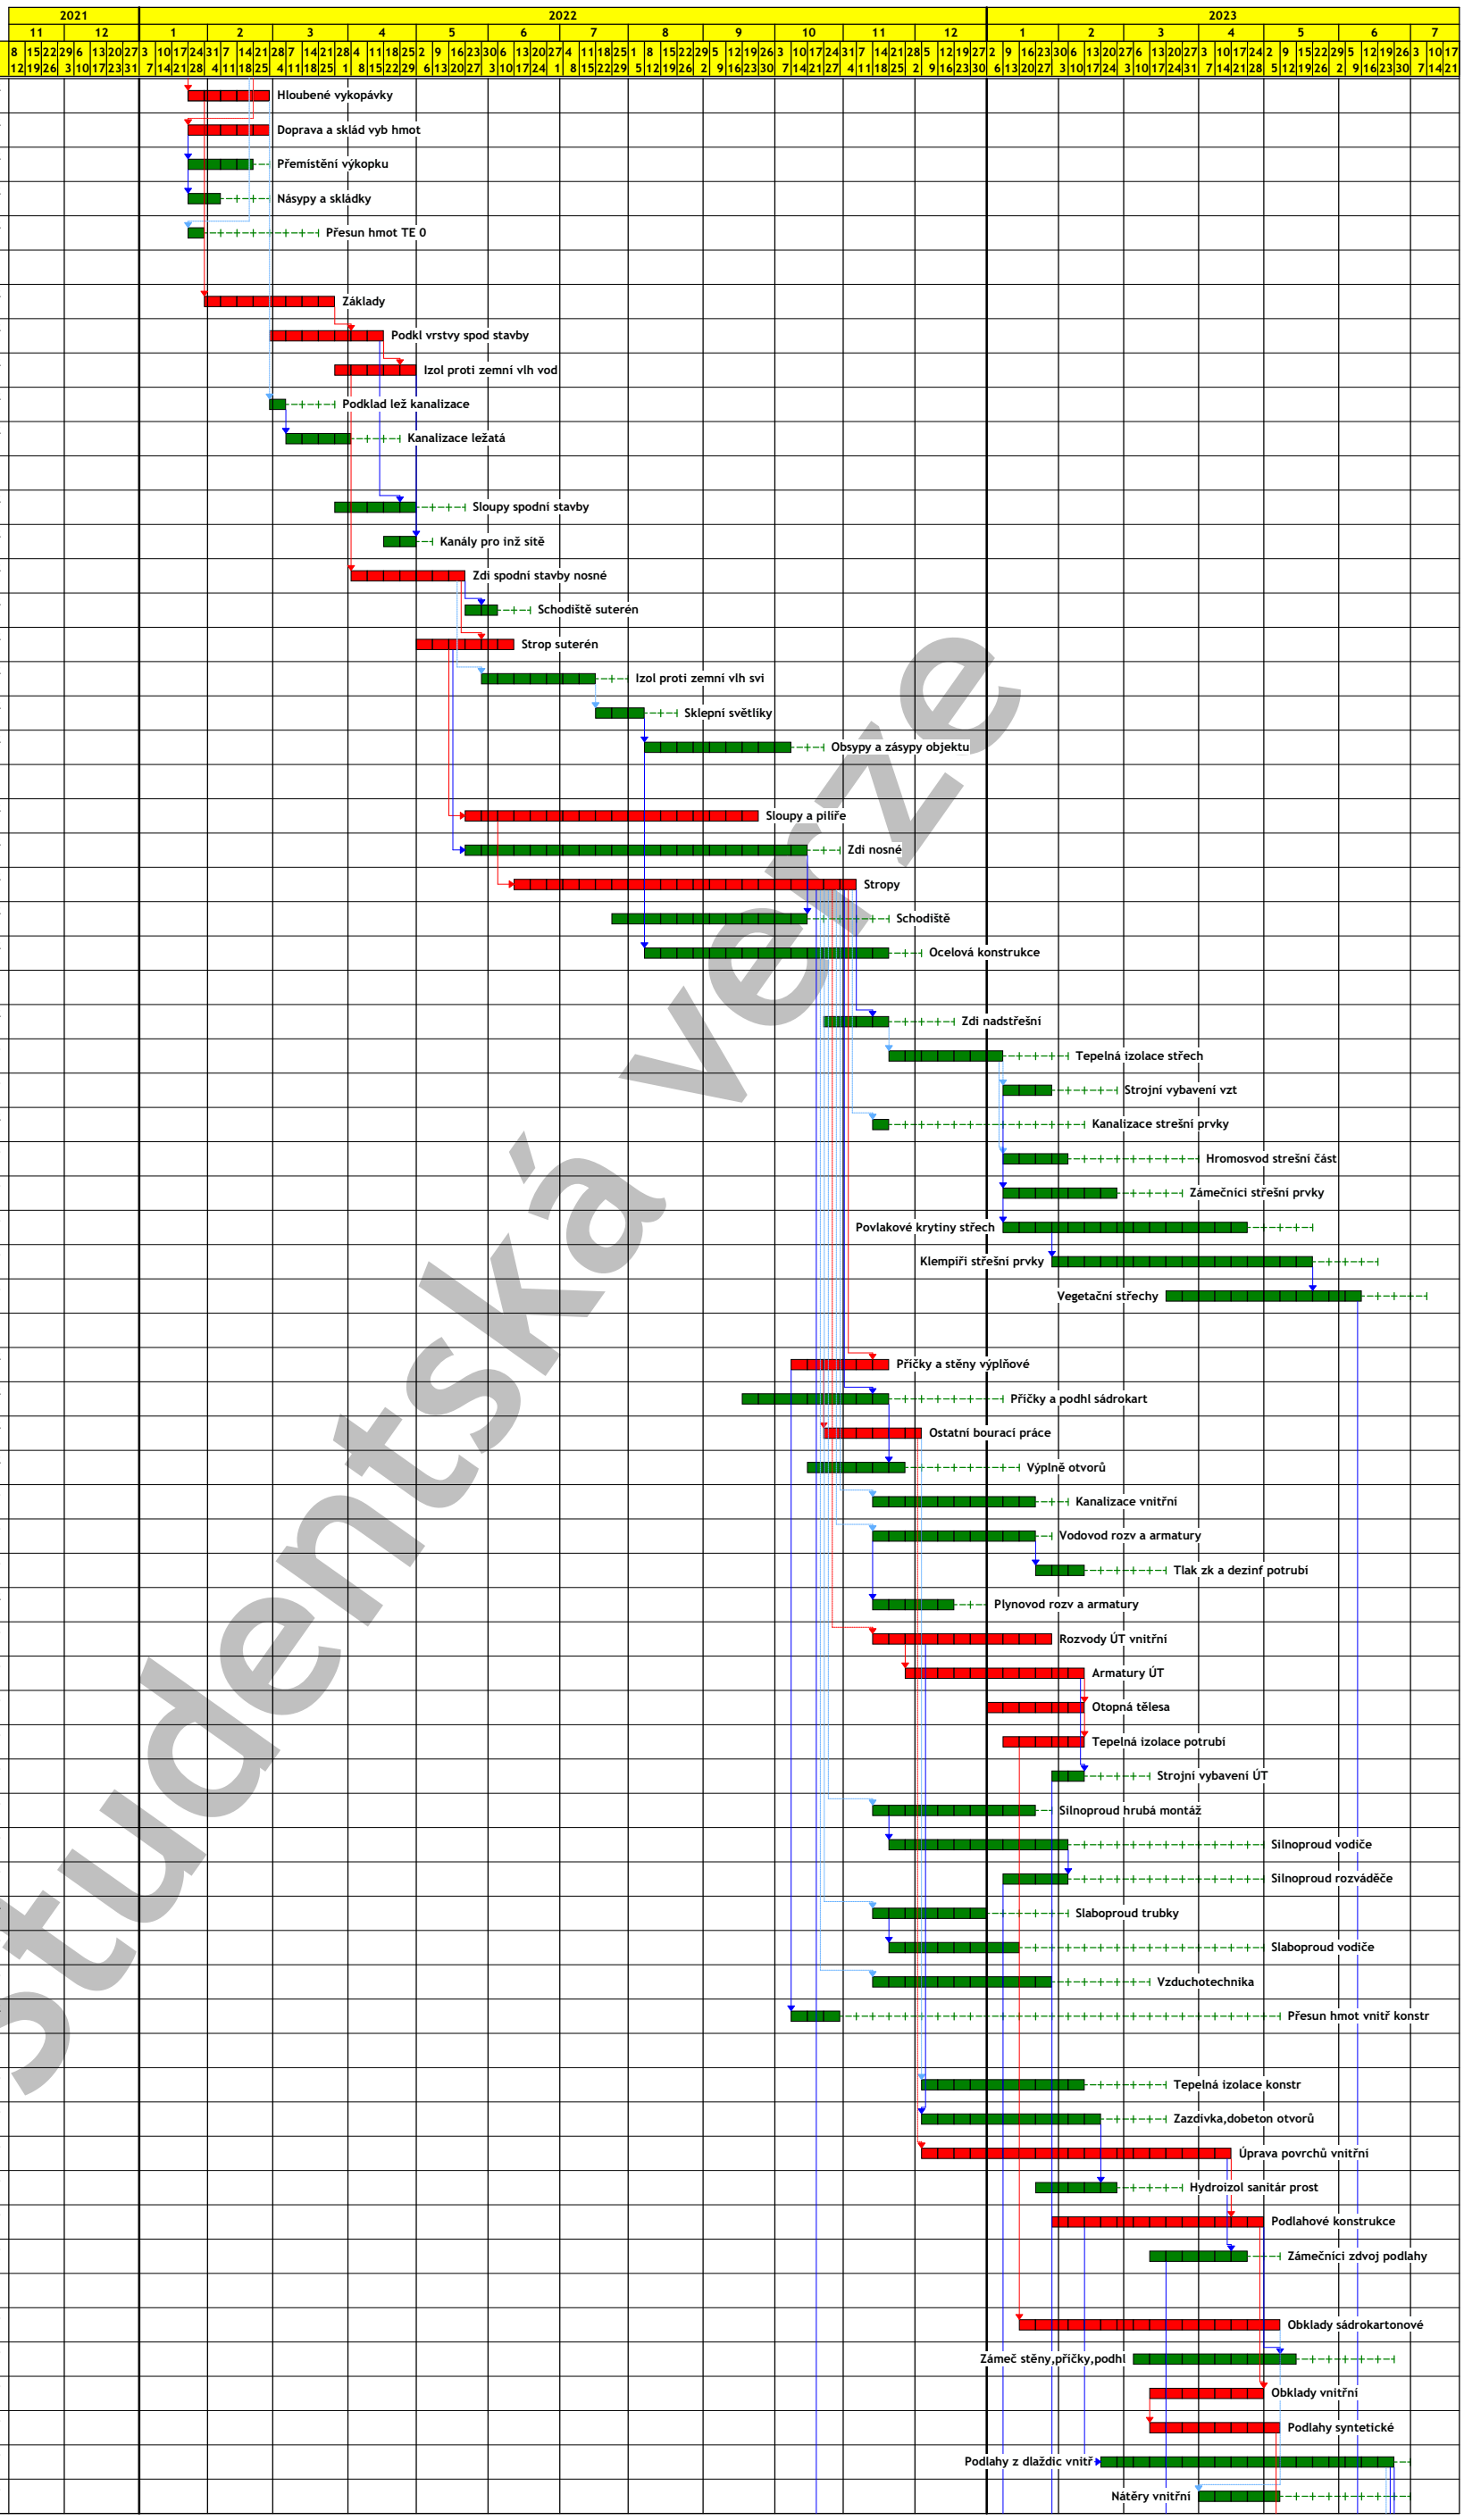

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

CONTEC - Časový graf akce: 00010003 KÚ JIHLAVA

21.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnno:	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
47707	MALBY VNITŘNÍ 1 SO 01 KÚ	12	10	2	20.3.23	26.5.23
47708	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ 1 SO 01 KÚ	1	2	4	22.5.23	2.6.23
47727	DOPRAVNÍ ZNAČKY VOD VNI 1 SO 01 KÚ	1	4	0	24.4.23	19.5.23
47728	DOPRAVNÍ ZNAČKY SVIS VNI 1 SO 01 KÚ	1	4	0	22.5.23	16.6.23
47757	PODLAHY POVLAKOVÉ 1 SO 01 KÚ	4	12	3	27.3.23	16.6.23
48109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY 1 SO 01 KÚ	1	4	13	9.1.23	3.2.23
48207	PODLAHY TEXTILNÍ 1 SO 01 KÚ	4	1	5	29.5.23	2.6.23
48257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 SO 01 KÚ	6	3	2	5.6.23	23.6.23
48309	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ 1 SO 01 KÚ	2	1	2	19.6.23	23.6.23
48457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI 1 SO 01 KÚ	9	3	0	19.6.23	7.7.23
48607 /MAR	MĚŘENÍ A REGULACE 1 SO 01 KÚ	4	5	18	30.1.23	3.3.23
48657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ 1 SO 01 KÚ	9	8	2	2.5.23	23.6.23
48707	SILNOPROUD KOMPLETACE 1 SO 01 KÚ	11	13	1	3.4.23	30.6.23
48809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU 1 SO 01 KÚ	10	9	0	9.5.23	7.7.23
49109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ 1 SO 01 KÚ	9	4	3	23.1.23	17.2.23
49207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ 1 SO 01 KÚ	5	6	3	30.1.23	10.3.23
49210	ŽALUZIE 1 SO 01 KÚ	10	3	17	30.1.23	17.2.23
49307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ 1 SO 01 KÚ	2	9	3	20.2.23	21.4.23
49407	FASÁDA OBKLAD 1 SO 01 KÚ	10	11	3	13.3.23	26.5.23
49410	FASÁDNÍ SLUNOLAM 1 SO 01 KÚ	2	4	3	15.5.23	9.6.23
49427 /	SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 SO 01 KÚ	2	2	8	13.3.23	24.3.23
49457 /	SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 SO 01 KÚ	1	1	8	13.3.23	17.3.23
49527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 SO 01 KÚ	2	1	3	12.6.23	16.6.23
49900	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 SO 01 KÚ	1	3	4	22.5.23	9.6.23
49980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO 01 KÚ	1	1	0	10.7.23	14.7.23
PŘÍPOJKA SLP						
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 PŘÍPOJKA SLP	1	3	2	24.4.23	12.5.23
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 PŘÍPOJKA SLP	3	1	3	9.5.23	12.5.23
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 PŘÍPOJKA SLP	2	1	4	9.5.23	12.5.23
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 PŘÍPOJKA SLP	2	1	3	15.5.23	19.5.23
56207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 1 PŘÍPOJKA SLP	2	1	3	22.5.23	26.5.23
56501	ZÁSYPY 1 PŘÍPOJKA SLP	2	1	3	29.5.23	2.6.23
56604	DLAŽBY IS 1 PŘÍPOJKA SLP	4	1	3	5.6.23	9.6.23
59505	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 PŘÍPOJKA SLP	3	1	3	12.6.23	16.6.23
59980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 PŘÍPOJKA SLP	1	1	3	12.6.23	16.6.23
VO						
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 VO	2	1	2	24.4.23	28.4.23
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 VO	3	1	2	24.4.23	28.4.23
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 VO	2	1	4	24.4.23	28.4.23
63304	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 VO	2	2	2	2.5.23	12.5.23
66257	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 1 VO	3	1	2	15.5.23	19.5.23
66307	SILNOPROUD VEDENÍ 1 VO	4	1	3	22.5.23	26.5.23
66407	SILNOPROUD OSTATNÍ 1 VO	4	1	3	22.5.23	26.5.23
66601	ZÁSYPY 1 VO	4	1	2	22.5.23	26.5.23
66804	DLAŽBY IS 1 VO	4	1	2	29.5.23	2.6.23
69980 /	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 VO	1	1	2	29.5.23	2.6.23
ČTÚ						
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 ČTÚ	9	2	1	8.11.21	19.11.21
70102	DLAŽBA ROZEBRÁNÍ 1 ČTÚ	4	1	1	8.11.21	12.11.21
70103	SEJMUTÍ ORNICE 1	2	3	2	8.11.21	26.11.21
70104	ODSTR. STÁV. PLOTŮ 1 ČTÚ	5	2	1	8.11.21	19.11.21
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 ČTÚ	4	4	1	10.4.23	5.5.23
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 ČTÚ	9	3	2	10.4.23	28.4.23
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 ČTÚ	1	3	2	10.4.23	28.4.23
70802	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 1 ČTÚ	2	2	1	17.4.23	28.4.23
73101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 ČTÚ	3	2	1	24.4.23	5.5.23

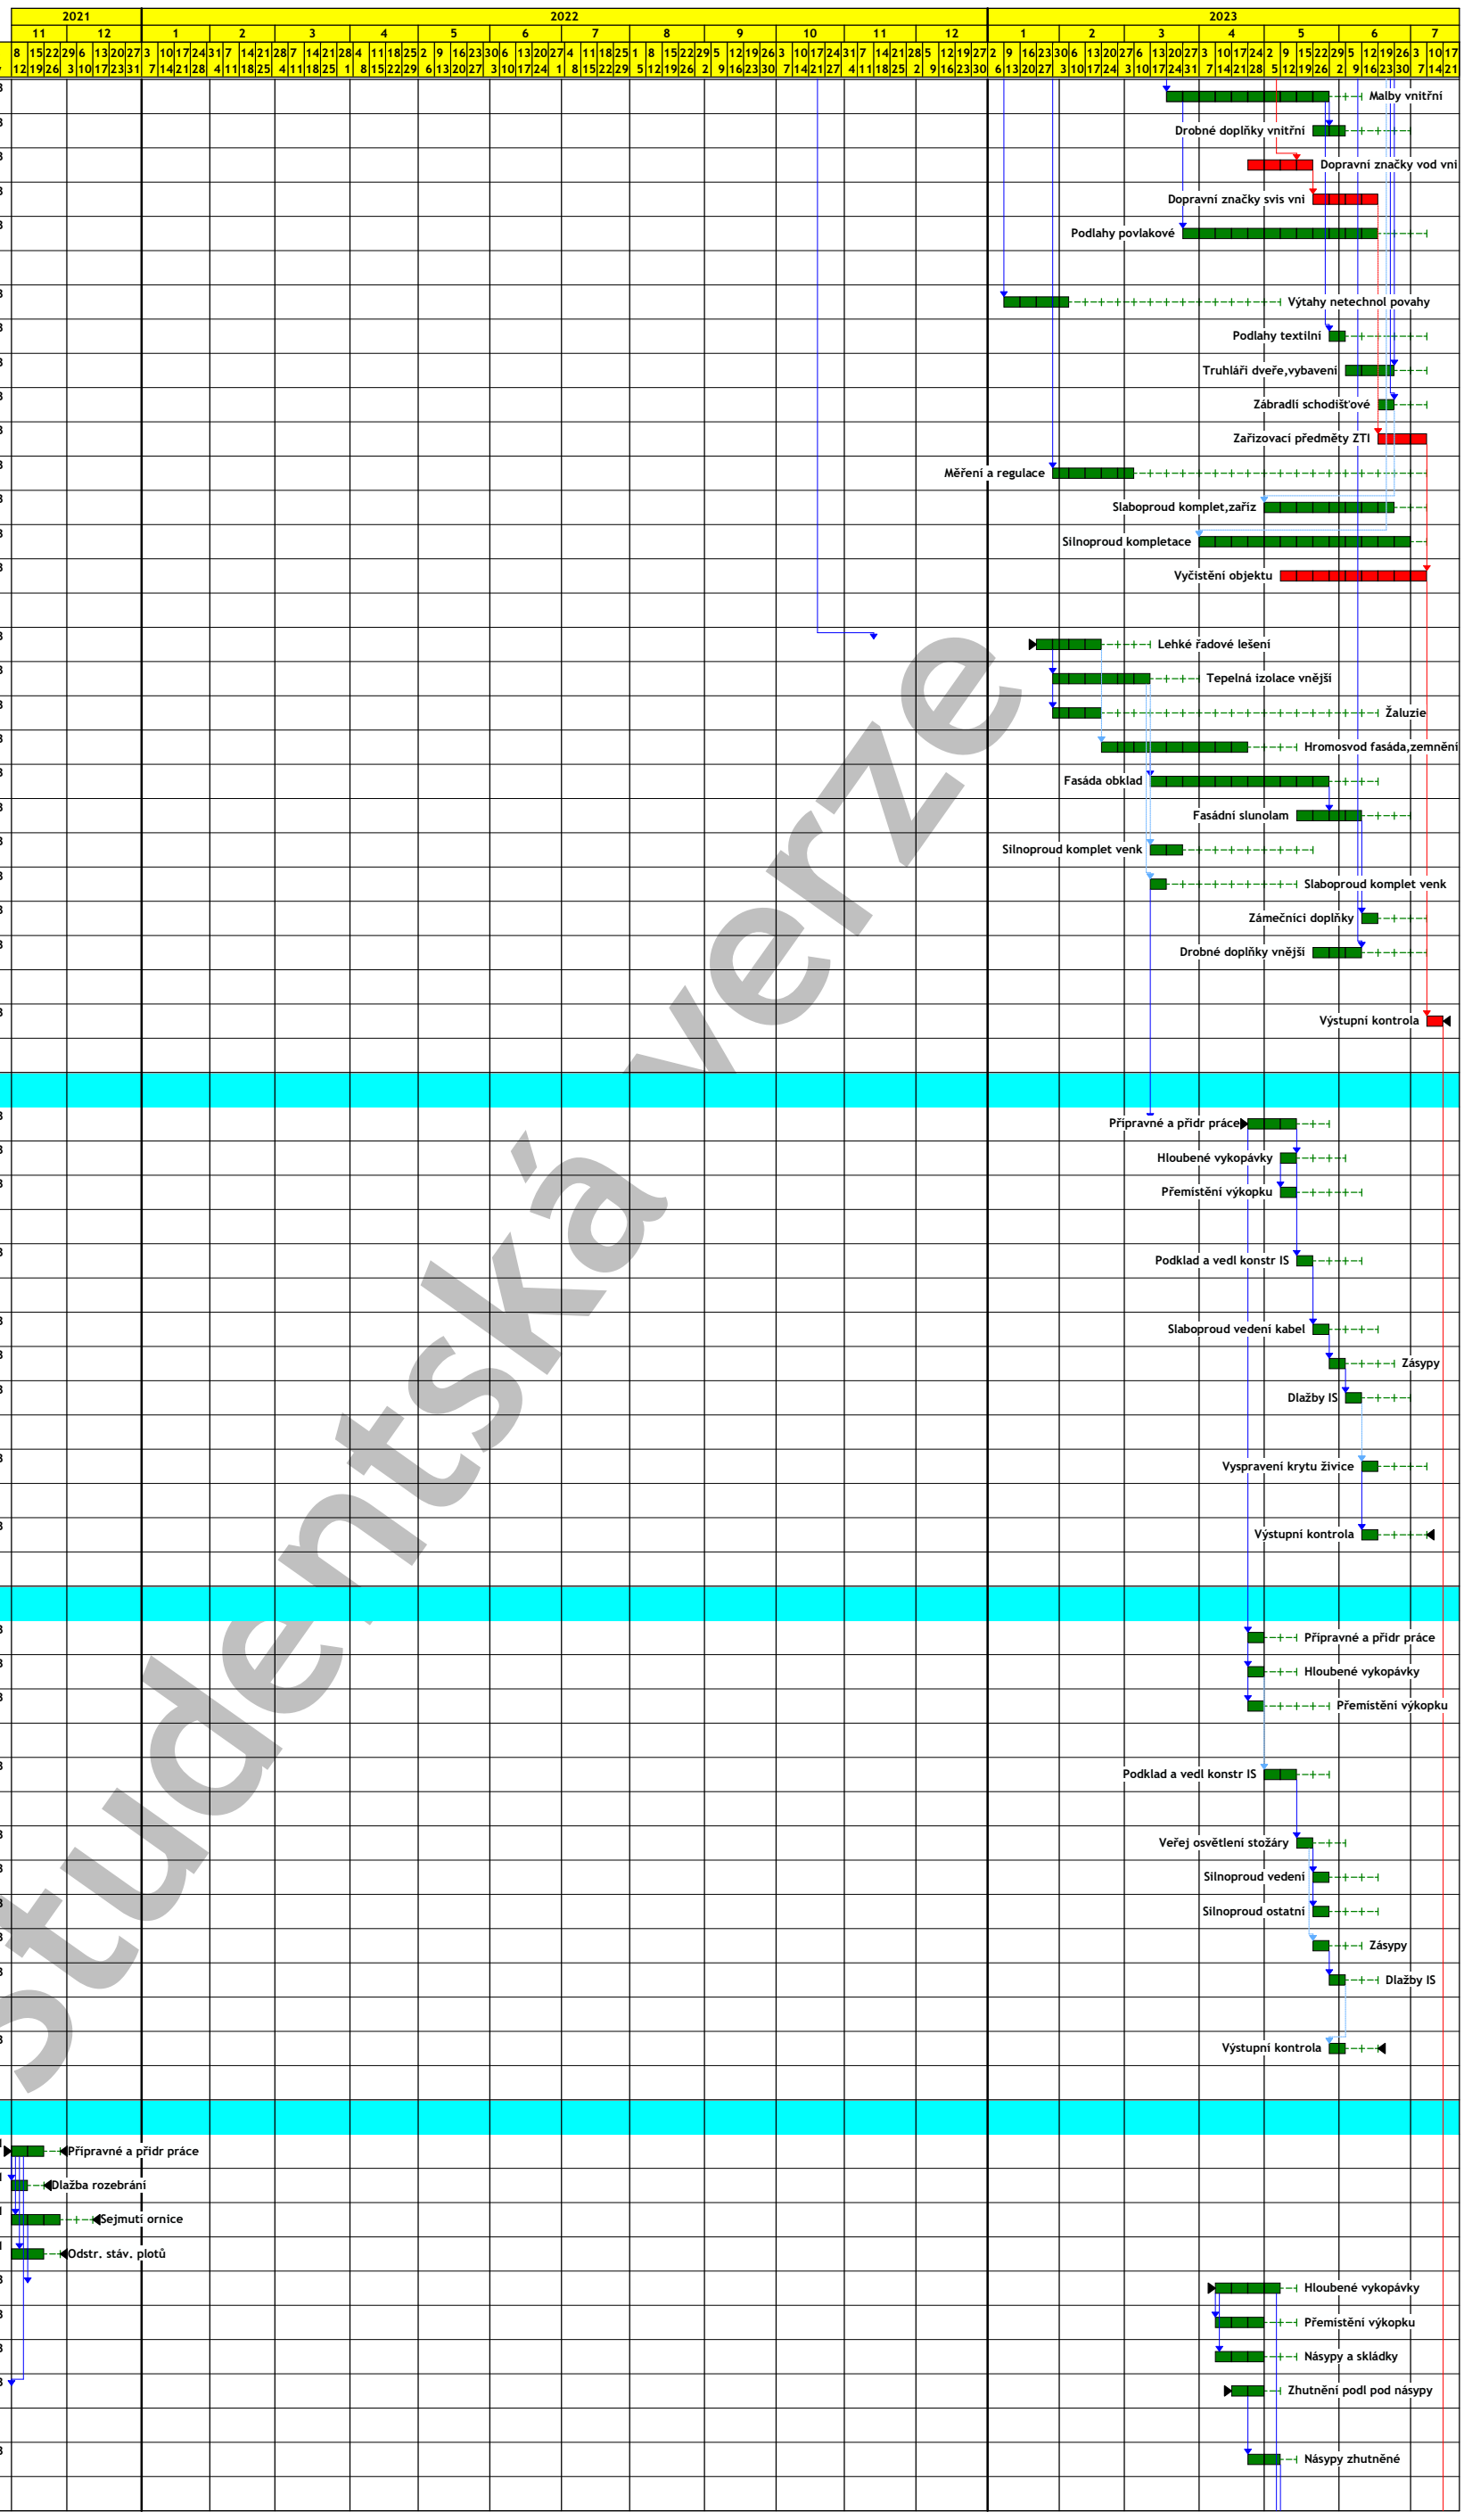

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

CONTEC - Časový graf akce: 00010003 KÚ JIHLAVA

21.12.21

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnno:	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
76254	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 1 ČTÚ	3	1	1	9.5.23	12.5.23
76408	POTRUBÍ Z DRENÁŽEK / 1 ČTÚ	3	1	6	9.5.23	12.5.23
76704	DLAŽBY 1 ČTÚ	12	6	1	9.5.23	16.6.23
79101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 ČTÚ	3	5	1	15.5.23	16.6.23
79253	DROBNÁ ARCHITEKTURA / 1 ČTÚ	2	1	2	12.6.23	16.6.23
79405	ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE 1 ČTÚ	3	1	1	12.6.23	16.6.23
79809	PARKOVIŠTĚ DOPLŇKY 1 ČTÚ	2	1	1	26.6.23	30.6.23
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 ČTÚ	1	1	1	26.6.23	30.6.23
80000	MILNÍK 1 PŘEDÁNÍ STAVBY	1	1	0	17.7.23	21.7.23

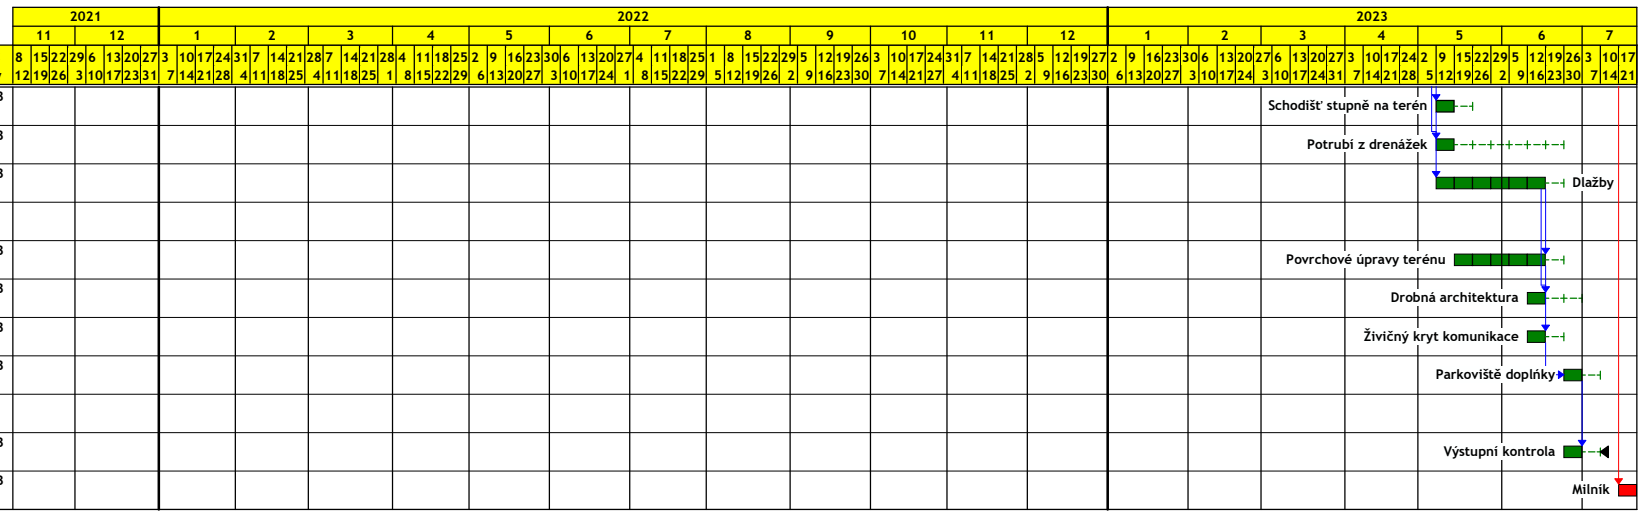

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze
