CONTEC - Časový graf akce: 0002CELE Rekonstrukce BD Brandýs nad Labem

9.12.17

Příloha č. 6

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
hlavni_objekt						
103	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	1	0	1.9.15	4.9.15
	1 hlavni_objekt					
104	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ	1	1	0	7.9.15	11.9.15
	1 hlavni_objekt					
105	ODSTRAN TVRDÝCH KRYTIN	1	2	0	14.9.15	25.9.15
	1 hlavni_objekt					
108	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	2	2	0	29.9.15	9.10.15
	1 hlavni_objekt					
112	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	6	7	0	12.10.15	27.11.15
	1 hlavni_objekt					
125	ODSTR PODLAH DŘEVĚNÝCH	1	2	7	19.10.15	30.10.15
	1 hlavni_objekt					
367	ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ	1	2	1	30.11.15	11.12.15
	1 hlavni_objekt					
417	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	1	1	0	9.11.15	13.11.15
	1 hlavni_objekt					
427	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	1	1	0	16.11.15	20.11.15
	1 hlavni_objekt					
437	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD	1	1	0	23.11.15	27.11.15
	1 hlavni_objekt					
457	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI	1	1	5	9.11.15	13.11.15
	1 hlavni_objekt					
517	DEMONTÁŽ KOTLŮ	1	1	0	30.11.15	4.12.15
	1 hlavni_objekt					
537	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT	1	1	0	7.12.15	11.12.15
	1 hlavni_objekt					
547	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT	1	1	1	7.12.15	11.12.15
	1 hlavni_objekt					
557	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	1	1	0	7.12.15	11.12.15
	1 hlavni_objekt					
579	ODSTR PODLAH POVLAKOVÝCH	1	1	0	14.12.15	18.12.15
	1 hlavni_objekt					
580	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	4	5	0	16.11.15	18.12.15
	1 hlavni_objekt					
581	ZAČÁTEK PŘERUŠENÍ STAVBY	0	1	0	21.12.15	21.12.15
MILNIK	1					
582	KONEC PŘERUŠENÍ STAVBY	0	1	0	29.4.16	29.4.16
MILNIK	1					
587	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	6	7	0	2.5.16	17.6.16
	1 hlavni_objekt					
588	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	2	1	0	20.6.16	24.6.16
	1 hlavni_objekt					
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	1	0	20.6.16	24.6.16
	1 hlavni_objekt					
701	NÁSYPY A SKLÁDKY	1	1	0	20.6.16	24.6.16
	1 hlavni_objekt					
859	PŘESUN HMOT TE 0	1	2	0	13.6.16	24.6.16
	1 hlavni_objekt					
999	ZAČÁTEK PŘERUŠENÍ STAVBY	0	1	0	27.6.16	27.6.16
MILNIK	1					
1000	KONEC PŘERUŠENÍ STAVBY	0	1	0	19.5.17	19.5.17
MILNIK	1					
1201	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	1	2	0	22.5.17	2.6.17
	1 hlavni_objekt					
1210	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	1	1	0	5.6.17	9.6.17
	1 hlavni_objekt					
1302	ZÁKLADY	2	1	0	12.6.17	16.6.17
	1 hlavni_objekt					
1607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	1	1	0	26.6.17	30.6.17
	1 hlavni_objekt					
1704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE	1	1	1	12.6.17	16.6.17
	1 hlavni_objekt					
1807	KANALIZACE LEŽATÁ	1	1	1	19.6.17	23.6.17
	1 hlavni_objekt					
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	2	1	0	26.6.17	30.6.17
	1 hlavni_objekt					

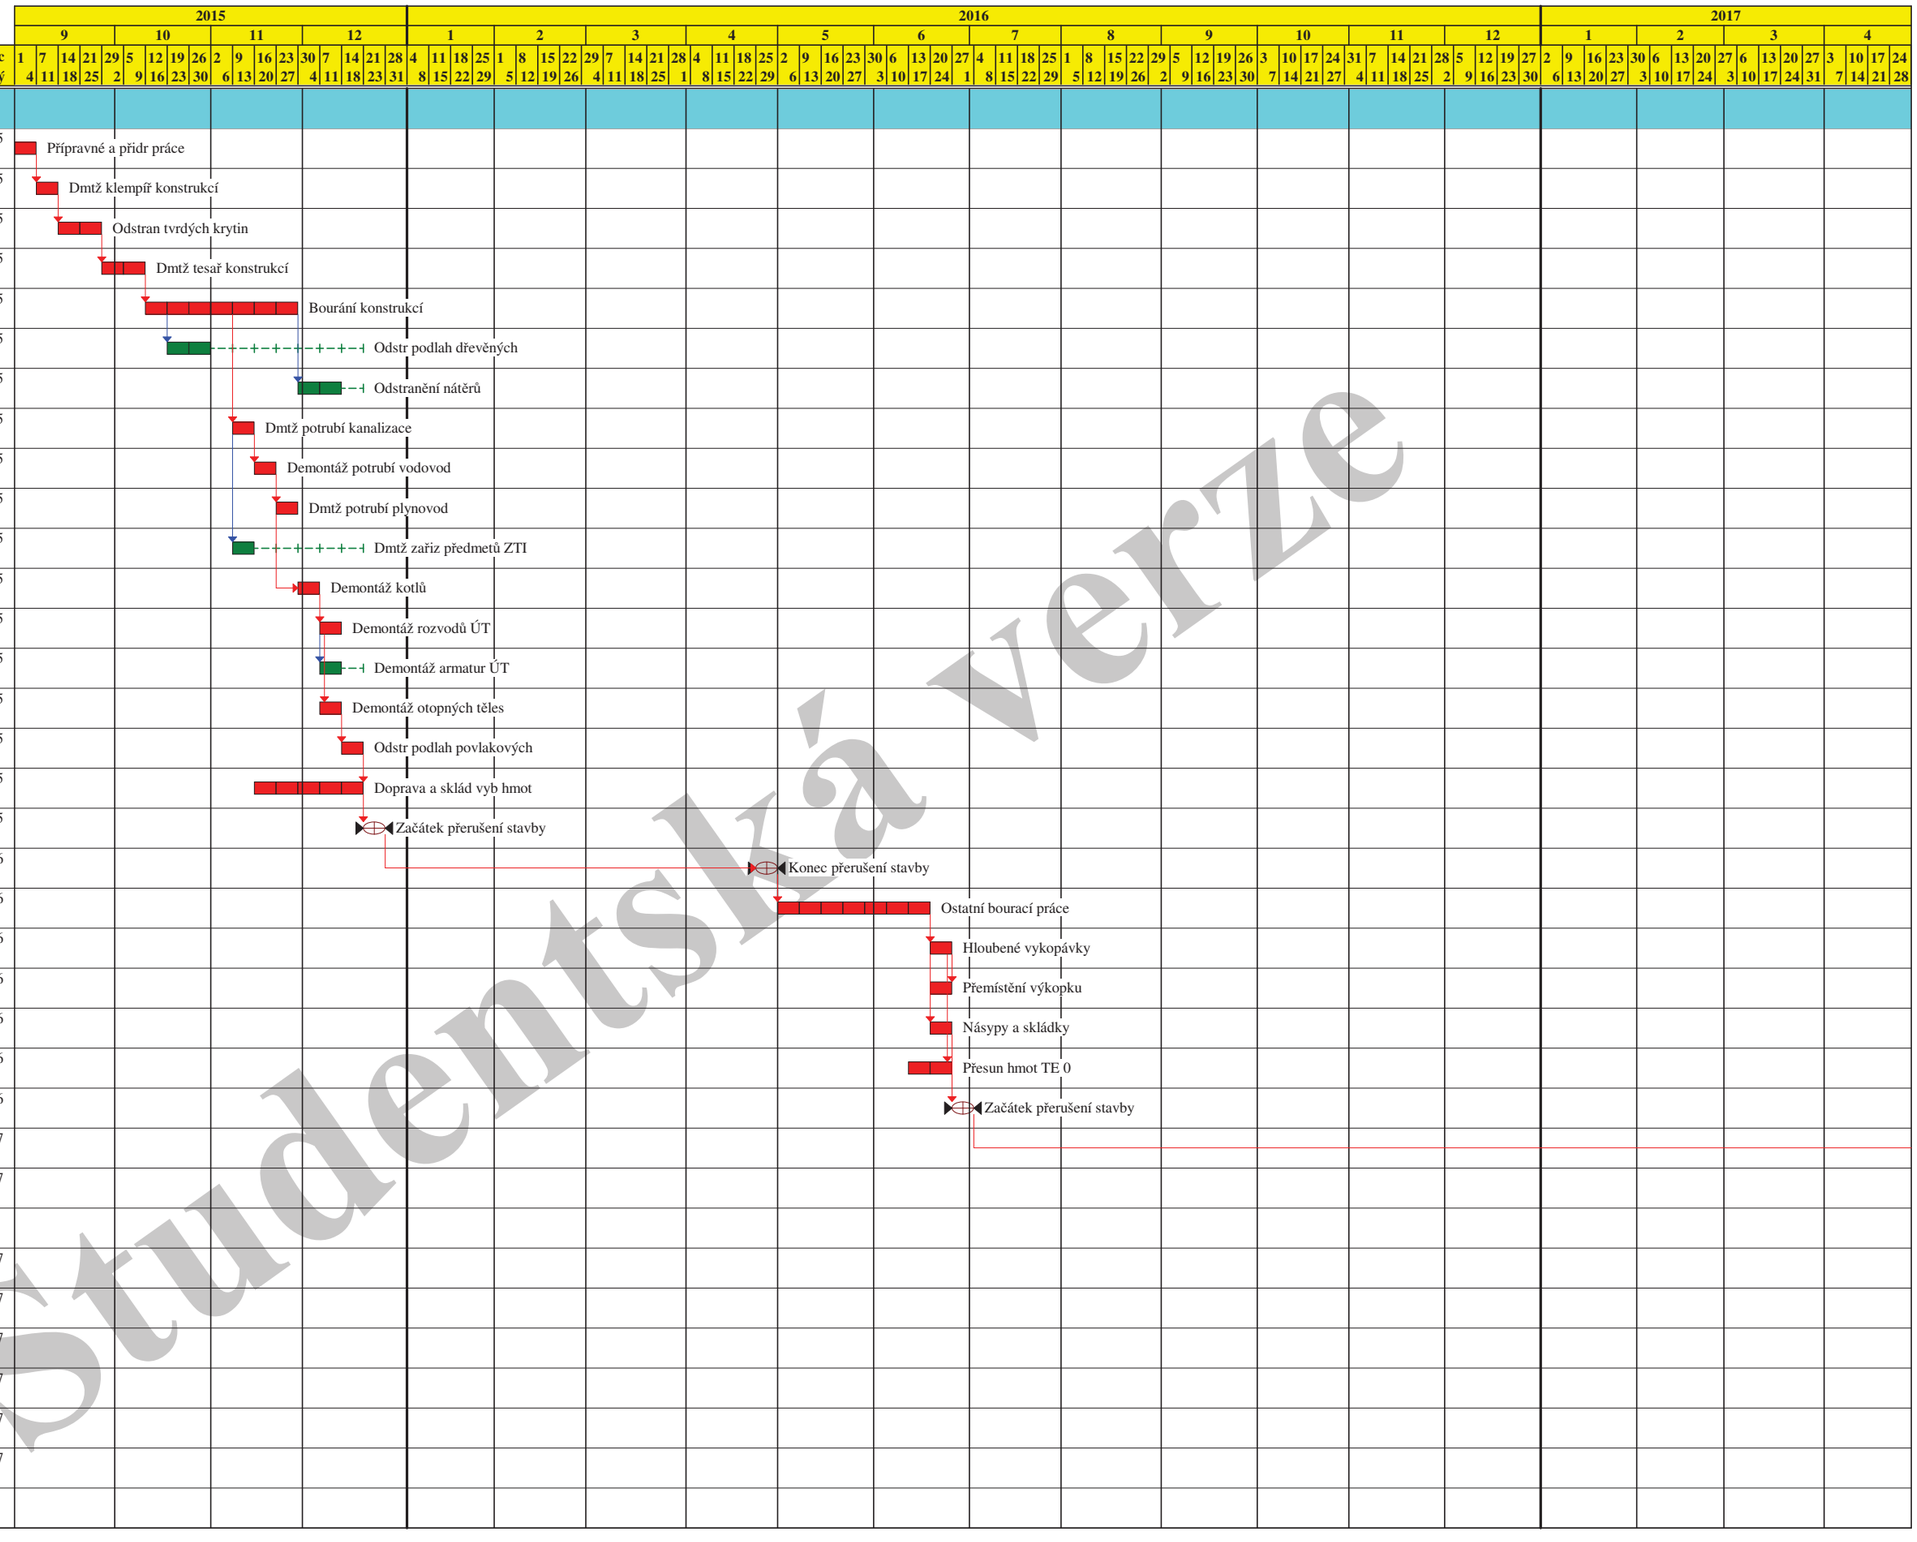

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze

9.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
1000 MILNIK	KONEC PŘERUŠENÍ STAVBY 1	0	1	0	19.5.17	19.5.17
1201	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1 hlavni_objekt	1	2	0	22.5.17	2.6.17
1210	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 hlavni_objekt	1	1	0	5.6.17	9.6.17
1302	ZÁKLADY 1 hlavni_objekt	2	1	0	12.6.17	16.6.17
1607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 hlavni_objekt	1	1	0	26.6.17	30.6.17
1704	PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 hlavni_objekt	1	1	1	12.6.17	16.6.17
1807	KANALIZACE LEŽATÁ 1 hlavni_objekt	1	1	1	19.6.17	23.6.17
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1 hlavni_objekt	2	1	0	26.6.17	30.6.17
2657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 hlavni_objekt	1	1	0	3.7.17	7.7.17
3253	ZDI NOSNÉ 1 hlavni_objekt	4	8	0	10.7.17	1.9.17
3354	STROPY 1 hlavni_objekt	2	1	0	7.8.17	11.8.17
3504	SCHODIŠTĚ 1 hlavni_objekt	2	1	0	14.8.17	18.8.17
3607	OCELOVÁ KONSTRUKCE 1 hlavni_objekt	2	1	8	14.8.17	18.8.17
3657	TESAŘI STĚNY A STROPY 1 hlavni_objekt	3	3	0	21.8.17	8.9.17
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR 1 hlavni_objekt	1	1	0	11.9.17	15.9.17
3859	PŘESUN HMOT TE 3 1 hlavni_objekt	2	1	0	11.9.17	15.9.17
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV 1 hlavni_objekt	3	3	0	18.9.17	6.10.17
4157	DŘEVOSTAVBY STŘEŠNÍ 1 hlavni_objekt	2	1	0	9.10.17	13.10.17
4307	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA 1 hlavni_objekt	1	1	2	16.10.17	20.10.17
4357	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 1 hlavni_objekt	1	1	0	16.10.17	20.10.17
4607	HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST 1 hlavni_objekt	1	1	2	23.10.17	27.10.17
4757	TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ 1 hlavni_objekt	3	2	0	23.10.17	3.11.17
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY 1 hlavni_objekt	2	1	0	6.11.17	10.11.17
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA 1 hlavni_objekt	1	2	0	30.10.17	10.11.17
4889	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ 1 hlavni_objekt	2	1	8	11.9.17	15.9.17
5001 MILNIK	DOKONČENÍ HRS 1	0	1	0	16.11.17	16.11.17
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ 1 hlavni_objekt	2	2	0	20.11.17	1.12.17
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART 1 hlavni_objekt	2	5	0	4.12.17	5.1.18
5256	VÝPLNĚ OTVORŮ 1 hlavni_objekt	1	1	2	8.1.18	12.1.18
5327	TRUHLÁŘI OKNA 1 hlavni_objekt	1	1	2	15.1.18	19.1.18

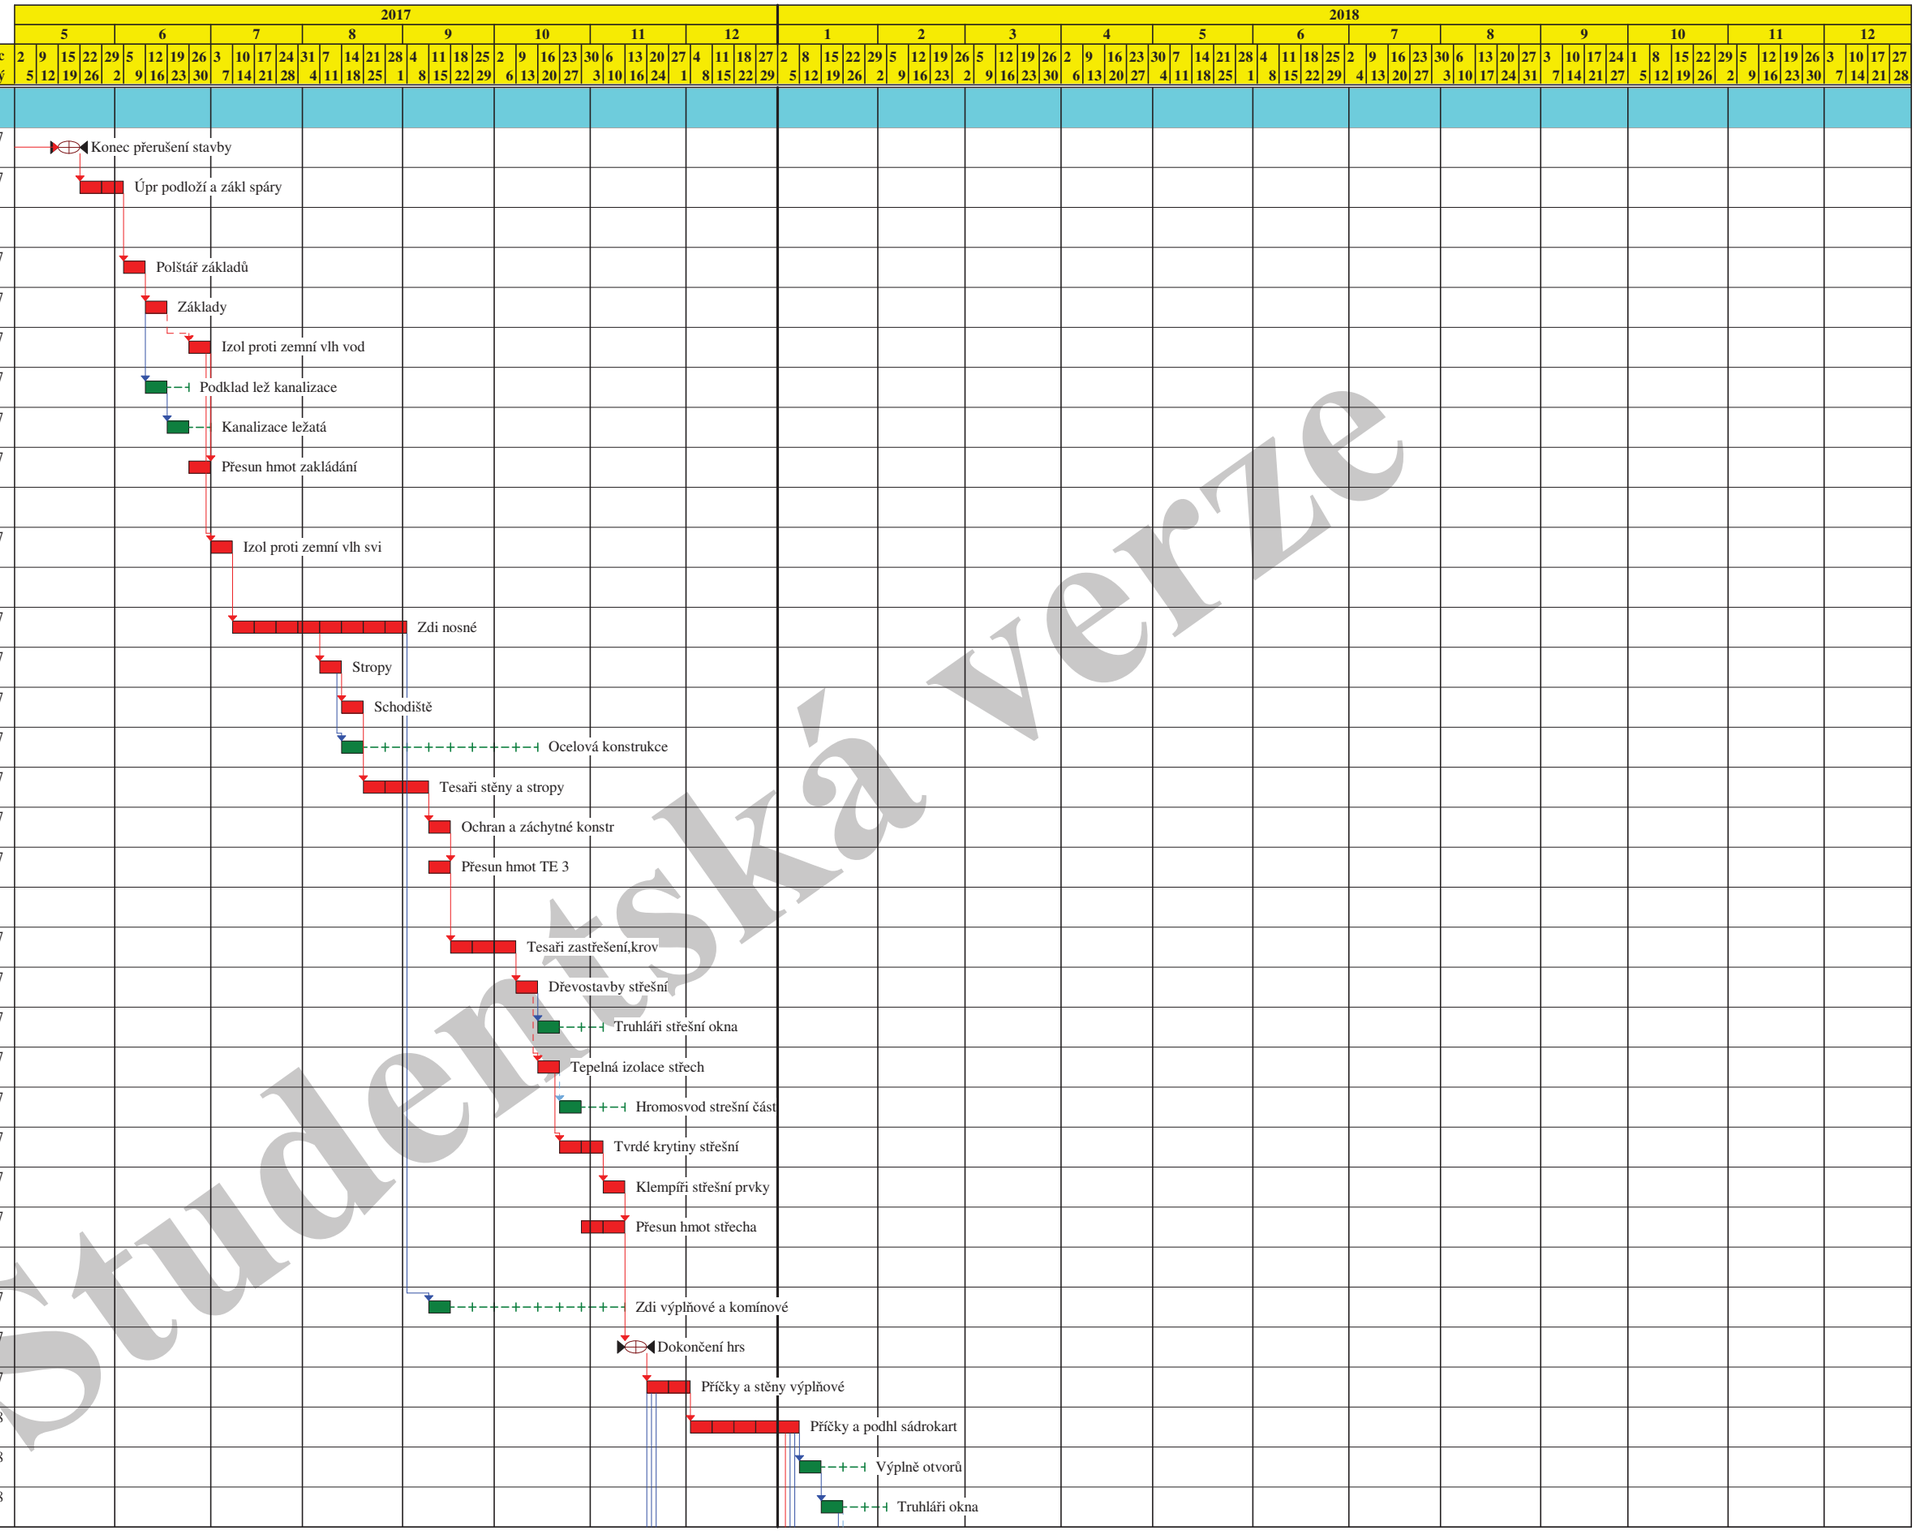

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze

9.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
5387	KLEMPÍŘI OPLECH DVEŘÍ	1	1	11	22.1.18	26.1.18
	1 hlavni_objekt					
5407	TESAŘI SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÉ	1	2	18	8.1.18	19.1.18
	1 hlavni_objekt					
5459	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	2	2	5	20.11.17	1.12.17
	1 hlavni_objekt					
5469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	2	1	6	20.11.17	24.11.17
	1 hlavni_objekt					
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	1	2	2	27.12.17	5.1.18
	1 hlavni_objekt					
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	4	2	0	27.12.17	5.1.18
	1 hlavni_objekt					
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	1	1	0	8.1.18	12.1.18
	1 hlavni_objekt					
5567	ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ	1	1	18	15.1.18	19.1.18
	1 hlavni_objekt					
5607	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	2	1	0	15.1.18	19.1.18
	1 hlavni_objekt					
5627	ARMATURY ÚT	1	1	0	22.1.18	26.1.18
	1 hlavni_objekt					
5647	OTOPNÁ TĚLESA	1	1	0	29.1.18	2.2.18
	1 hlavni_objekt					
5657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	1	2	15	29.1.18	9.2.18
	1 hlavni_objekt					
5667	KOTELNY ÚT	1	1	0	29.1.18	2.2.18
	1 hlavni_objekt					
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	1	1	0	29.1.18	2.2.18
	1 hlavni_objekt					
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ	1	1	0	5.2.18	9.2.18
	1 hlavni_objekt					
5727	SILNOPROUD VODIČE	1	2	0	12.2.18	23.2.18
	1 hlavni_objekt					
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	1	1	0	26.2.18	2.3.18
	1 hlavni_objekt					
5767	SLABOPROUD TRUBKY	1	1	0	5.3.18	9.3.18
	1 hlavni_objekt					
5787	SLABOPROUD VODIČE	1	1	13	12.3.18	16.3.18
	1 hlavni_objekt					
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	4	2	26	20.11.17	1.12.17
	1 hlavni_objekt					
6109	LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ	1	2	15	20.11.17	1.12.17
	1 hlavni_objekt					
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	2	1	13	22.1.18	26.1.18
	1 hlavni_objekt					
6254	ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ	1	1	6	12.3.18	16.3.18
	1 hlavni_objekt					
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	5	5	0	12.3.18	13.4.18
	1 hlavni_objekt					
6407	HYDROIZOL SANITÁR PROST	1	1	10	19.3.18	23.3.18
	1 hlavni_objekt					
6507	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITŘ	4	2	0	16.4.18	27.4.18
	1 hlavni_objekt					
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	1	2	20	29.1.18	9.2.18
	1 hlavni_objekt					
6657	TESAŘI PODLAHY	2	2	17	19.3.18	30.3.18
	1 hlavni_objekt					
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	2	1	0	30.4.18	4.5.18
	1 hlavni_objekt					
6859	PŘESUN HMOT TE 6	4	2	35	20.11.17	1.12.17
	1 hlavni_objekt					
7107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ	4	2	0	21.5.18	1.6.18
	1 hlavni_objekt					
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL	2	3	15	2.4.18	20.4.18
	1 hlavni_objekt					
7303	OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ	1	1	10	26.3.18	30.3.18
	1 hlavni_objekt					
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	2	2	0	4.6.18	15.6.18
	1 hlavni_objekt					

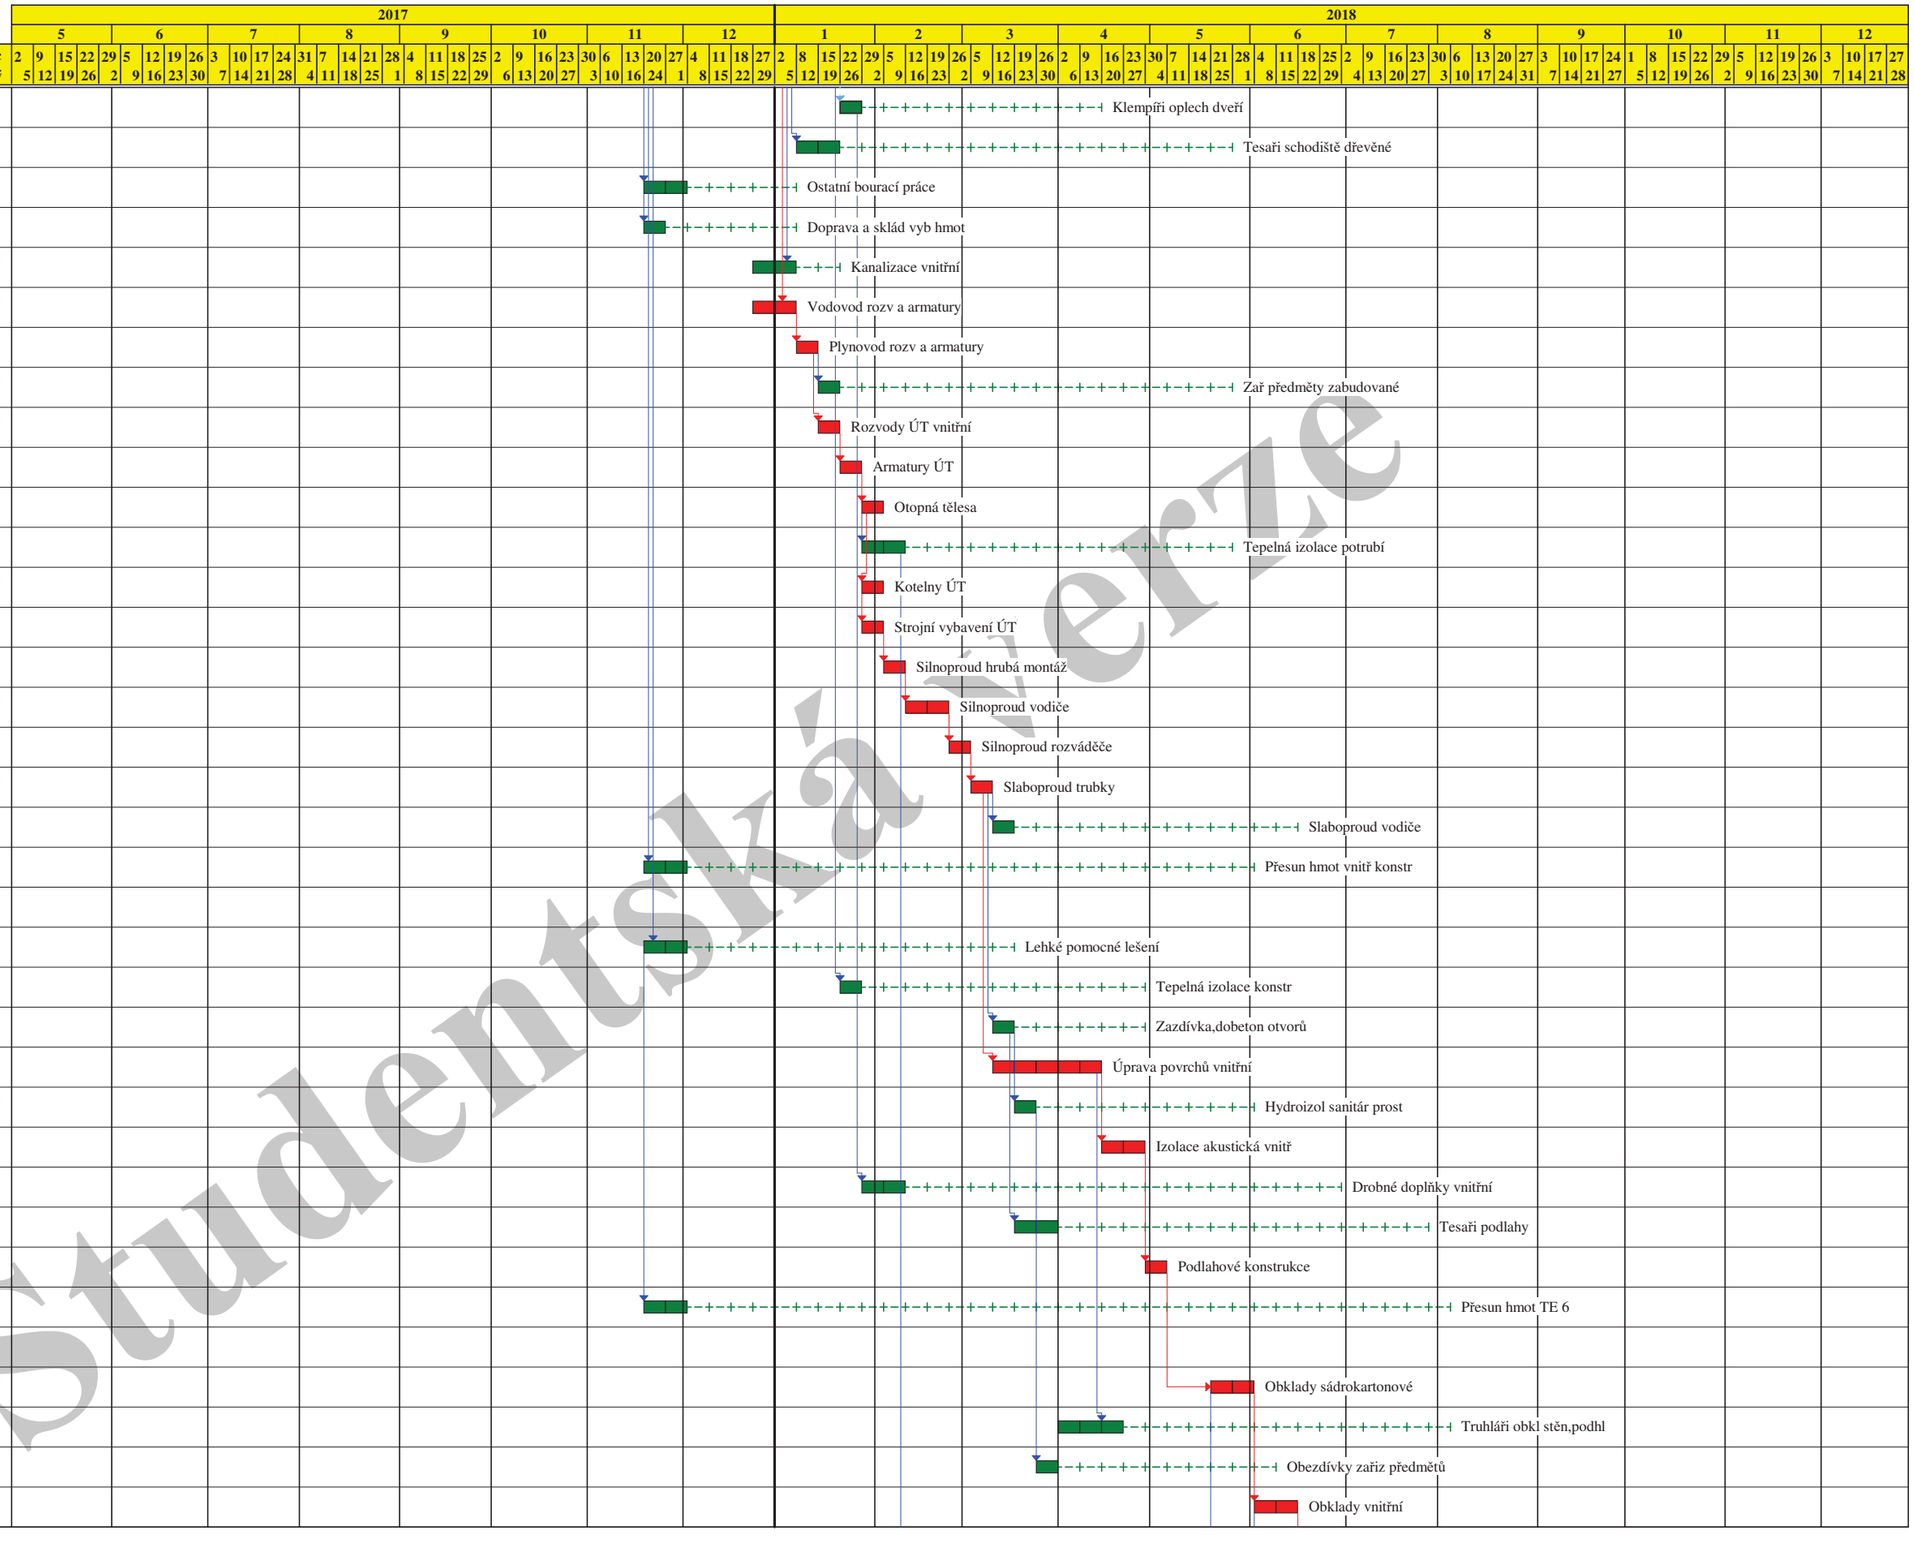

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	2	2	7	4.6.18	15.6.18
	1 hlavni_objekt					
7707	MALBY VNITŘNÍ	2	2	0	18.6.18	29.6.18
	1 hlavni_objekt					
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY	1	1	11	21.5.18	25.5.18
	1 hlavni_objekt					
8107	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	1	1	4	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
8207	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET	2	2	4	2.7.18	13.7.18
	1 hlavni_objekt					
8359	ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ	1	1	6	25.6.18	29.6.18
	1 hlavni_objekt					
8457	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ	1	1	6	25.6.18	29.6.18
	1 hlavni_objekt					
8527	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	2	1	5	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
8627	MĚŘENÍ A REGULACE	1	1	26	5.2.18	9.2.18
	1 hlavni_objekt					
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	1	1	5	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE	1	1	5	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	1	1	7	18.6.18	22.6.18
	1 hlavni_objekt					
9253	ŘÍMSY	2	1	0	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
9287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	1	1	0	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
9306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	3	5	0	2.7.18	3.8.18
	1 hlavni_objekt					
9356	DESKY PARAPET A OKAPNICE	1	1	0	6.8.18	10.8.18
	1 hlavni_objekt					
9657	KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY	1	1	0	6.8.18	10.8.18
	1 hlavni_objekt					
9858	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	2	1	5	2.7.18	4.7.18
	1 hlavni_objekt					
9859	PŘESUN HMOT TE 9	1	2	4	2.7.18	13.7.18
	1 hlavni_objekt					
9970	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	2	1	0	6.8.18	10.8.18
	1 hlavni_objekt					
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	2	1	0	13.8.18	17.8.18
	1 hlavni_objekt					
plyn_pripojka						
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	1	0	20.8.18	24.8.18
	1 plyn_pripojka					
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	2	1	0	20.8.18	24.8.18
	1 plyn_pripojka					
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	1	1	20.8.18	24.8.18
	1 plyn_pripojka					
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY	2	1	1	20.8.18	24.8.18
	1 plyn_pripojka					
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS	1	1	0	27.8.18	31.8.18
	1 plyn_pripojka					
13859	PŘESUN HMOT TE 3	2	1	1	27.8.18	31.8.18
	1 plyn_pripojka					
16108	POTRUBÍ Z PLASTU	2	1	0	3.9.18	7.9.18
	1 plyn_pripojka					
16258	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET	1	1	0	3.9.18	7.9.18
	1 plyn_pripojka					

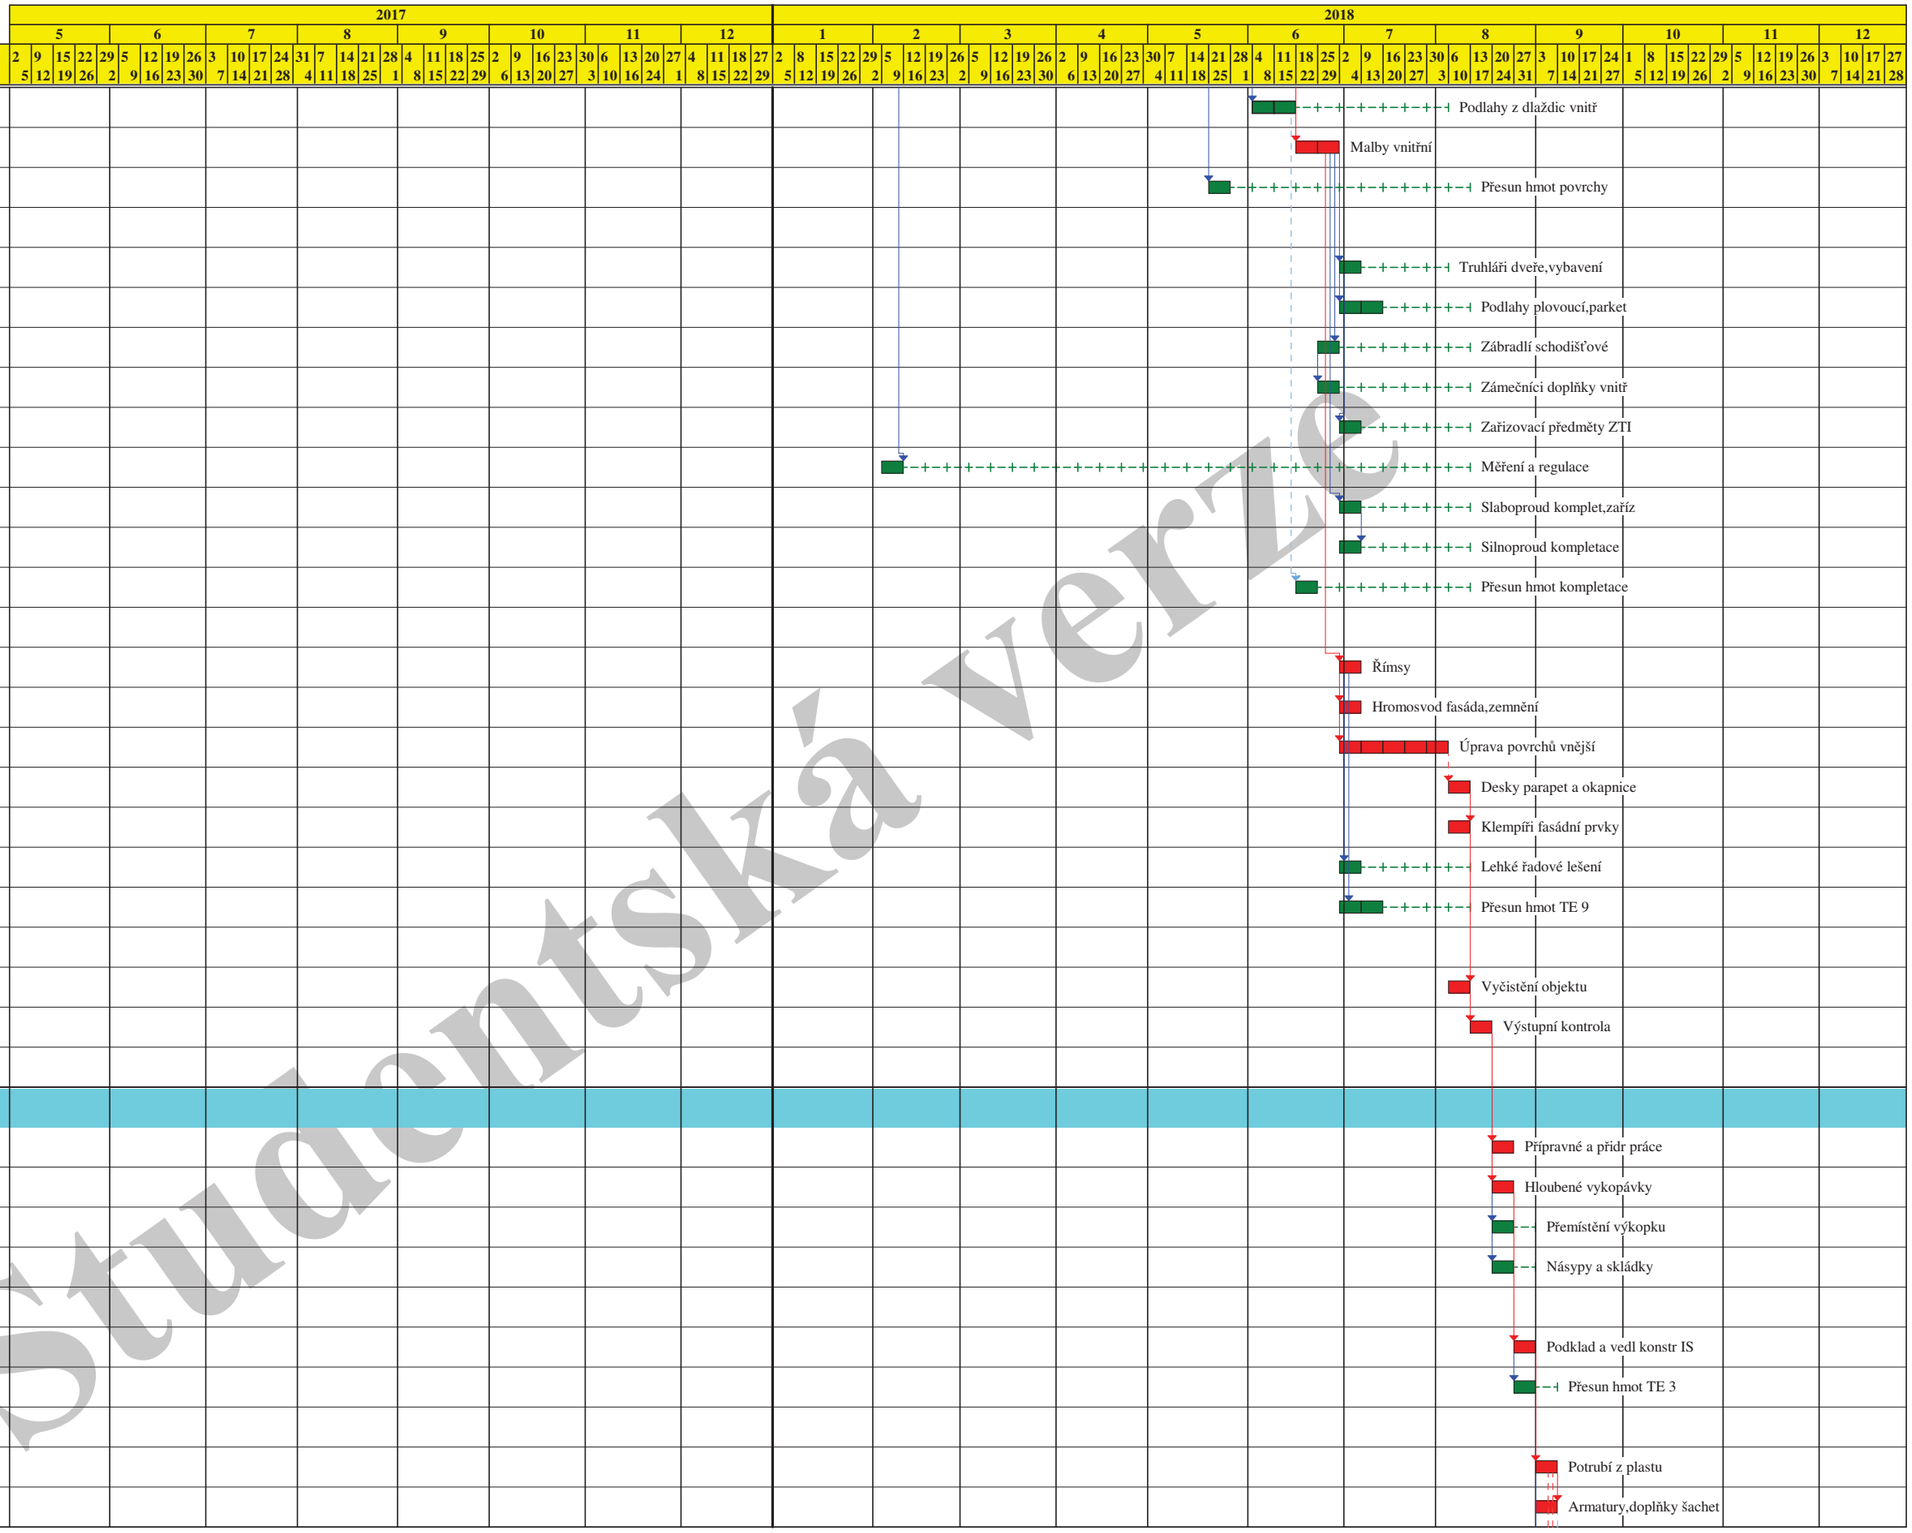

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
16859	PŘESUN HMOT TE 6	1	1	1	3.9.18	7.9.18
	1 plyn_pripojka					
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ	1	1	0	10.9.18	14.9.18
	1 plyn_pripojka					
19501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	2	1	0	10.9.18	14.9.18
	1 plyn_pripojka					
19859	PŘESUN HMOT TE 9	2	1	1	10.9.18	14.9.18
	1 plyn_pripojka					
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	2	1	0	17.9.18	21.9.18
	1 plyn_pripojka					
zpevnene_plochy						
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	2	1	0	24.9.18	27.9.18
	1 zpevnene_plochy					
20201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	4	1	0	24.9.18	27.9.18
	1 zpevnene_plochy					
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	1	1	1	24.9.18	27.9.18
	1 zpevnene_plochy					
23101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	4	1	0	1.10.18	5.10.18
	1 zpevnene_plochy					
23759	LOŽE POD CHODNÍK OBRUBY	1	1	0	8.10.18	12.10.18
	1 zpevnene_plochy					
23809	CHODNÍKOVÉ OBRUBY	2	1	0	8.10.18	12.10.18
	1 zpevnene_plochy					
26305	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	2	1	0	15.10.18	19.10.18
	1 zpevnene_plochy					
26859	PŘESUN HMOT TE 6	1	1	0	22.10.18	26.10.18
	1 zpevnene_plochy					
29101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	2	1	1	22.10.18	26.10.18
	1 zpevnene_plochy					
29405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE	6	1	1	22.10.18	26.10.18
	1 zpevnene_plochy					
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	2	1	0	29.10.18	2.11.18
	1 zpevnene_plochy					
oploceni						
30101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	1	1	0	5.11.18	9.11.18
	1 oploceni					
30201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	4	1	0	5.11.18	9.11.18
	1 oploceni					
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	4	1	0	5.11.18	9.11.18
	1 oploceni					
30409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	2	1	1	5.11.18	9.11.18
	1 oploceni					
30469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	2	1	1	5.11.18	9.11.18
	1 oploceni					
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	1	1	5.11.18	9.11.18
	1 oploceni					
30802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ	1	1	0	12.11.18	16.11.18
	1 oploceni					
30859	PŘESUN HMOT TE 0	1	1	2	12.11.18	16.11.18
	1 oploceni					
33102	ZÁKLADY IS	4	1	0	19.11.18	23.11.18
	1 oploceni					

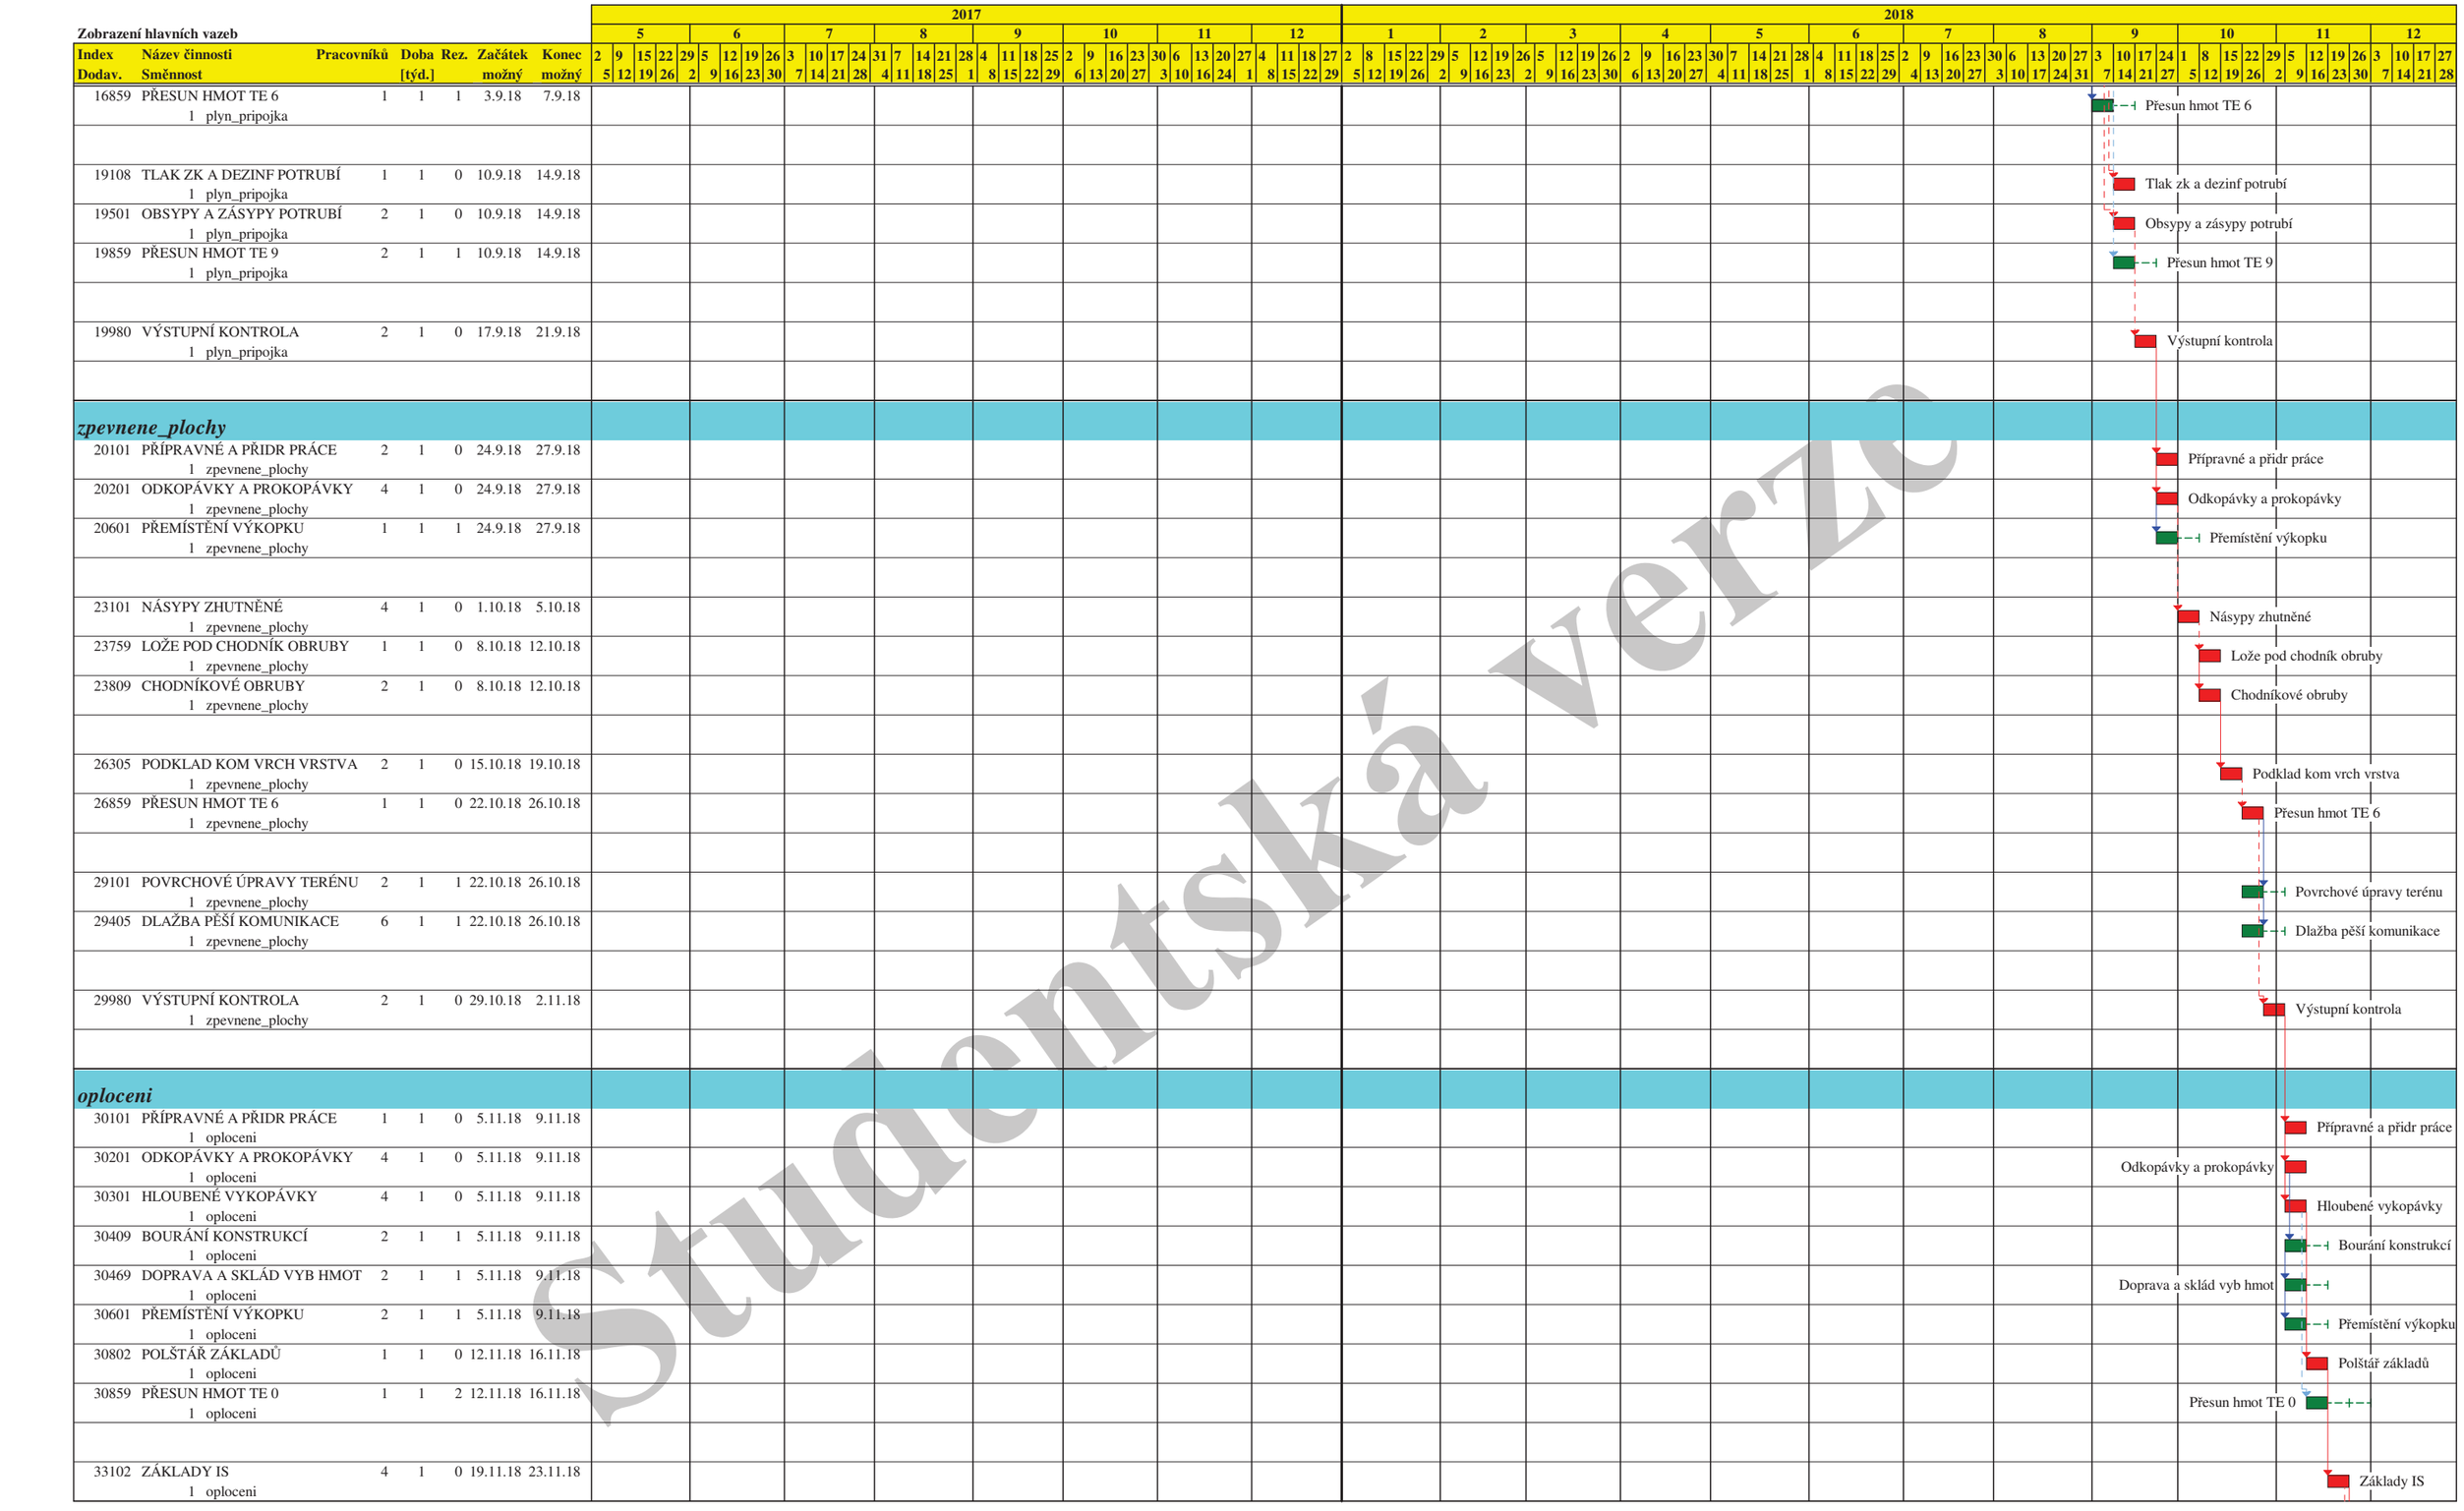

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze

9.12.17

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
36203	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 oploceni	3	1	0	26.11.18	30.11.18
36801	ZÁSYPY 1 oploceni	2	1	0	3.12.18	7.12.18
36859	PŘESUN HMOT TE 6 1 oploceni	1	1	0	3.12.18	7.12.18
39107	TESAŘI OPLOCENÍ DÍLCOVÉ 1 oploceni	2	1	0	3.12.18	7.12.18
39457	NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 oploceni	1	1	0	10.12.18	14.12.18
39859	PŘESUN HMOT TE 9 1 oploceni	2	1	2	3.12.18	7.12.18
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 oploceni	2	1	0	17.12.18	21.12.18

2017: 5 (2 9 15 22 29) | 6 (5 12 19 26) | 7 (3 10 17 24 31) | 8 (7 14 21 28) | 9 (4 11 18 25) | 10 (2 9 16 23 30) | 11 (6 13 20 27) | 12 (4 11 18 27)

2018: 1 (2 8 15 22 29) | 2 (5 12 19 26) | 3 (5 12 19 26) | 4 (2 9 16 23 30) | 5 (7 14 21 28) | 6 (4 11 18 25) | 7 (2 9 16 23 30) | 8 (6 13 20 27) | 9 (3 10 17 24) | 10 (1 8 15 22 29) | 11 (5 12 19 26) | 12 (3 10 17 27)

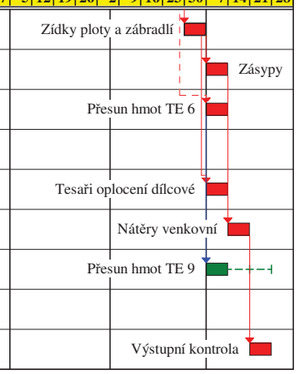

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba - .

Studentská verze
