Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
SO01 - a.dům						
101	ŘEZÁNÍ VOZOVEK	3	1	0	25.2.21	26.2.21
1	SO01 - a.dům					
201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	3	1	0	25.2.21	26.2.21
1	SO01 - a.dům					
301	PODCHYCOVÁNÍ	4	4	0	25.2.21	19.3.21
1	SO01 - a.dům					
409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	5	4	0	8.3.21	2.4.21
1	SO01 - a.dům					
410	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	2	1	0	15.3.21	19.3.21
1	SO01 - a.dům					
411	DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT	2	1	0	15.3.21	19.3.21
1	SO01 - a.dům					
412	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT	2	1	0	22.3.21	26.3.21
1	SO01 - a.dům					
413	DMTŽ ZAŘIZ PŘEDMETŮ ZTI	2	1	0	22.3.21	26.3.21
1	SO01 - a.dům					
414	OTLUČENÍ OMÍTEK	2	5	0	29.3.21	30.4.21
1	SO01 - a.dům					
415	VYSEKÁNÍ RÝH	2	1	0	29.3.21	2.4.21
1	SO01 - a.dům					
416	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	4	2	3	22.3.21	2.4.21
1	SO01 - a.dům					
417	DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ	2	1	4	22.3.21	26.3.21
1	SO01 - a.dům					
418	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD	2	2	0	29.3.21	9.4.21
1	SO01 - a.dům					
419	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE	2	2	0	5.4.21	16.4.21
1	SO01 - a.dům					
420	DMTŽ POTRUBÍ PLYNOVOD	2	1	0	19.4.21	23.4.21
1	SO01 - a.dům					
421	BOURÁNÍ PODLAH A DLAŽEB	3	1	0	26.4.21	30.4.21
1	SO01 - a.dům					
422	BOURÁNÍ STROPŮ,SCHODIŠŤ	2	4	0	3.5.21	28.5.21
1	SO01 - a.dům					
469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	3	9	0	29.3.21	28.5.21
1	SO01 - a.dům					
501	PAŽENÍ	2	1	0	31.5.21	4.6.21
1	SO01 - a.dům					
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	4	1	0	25.2.21	26.2.21
1	SO01 - a.dům					
1101	ČERPÁNÍ VODY	1	13	1	1.3.21	28.5.21
1	SO01 - a.dům					
1155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY	3	1	0	31.5.21	4.6.21
1	SO01 - a.dům					
1452	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY	2	1	0	7.6.21	11.6.21
1	SO01 - a.dům					
1502	ZÁKLADY	9	1	1	7.6.21	11.6.21
1	SO01 - a.dům					
1757	KANALIZACE LEŽATÁ	2	2	0	14.6.21	25.6.21
1	SO01 - a.dům					
1859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	6	1	3	31.5.21	4.6.21
1	SO01 - a.dům					
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI	2	1	2	28.6.21	2.7.21
1	SO01 - a.dům					
2607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI	2	1	0	28.6.21	2.7.21
1	SO01 - a.dům					
2751	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU	2	1	0	7.7.21	9.7.21
1	SO01 - a.dům					
2900	OSTATNÍ PRÁCE SPOD STAV	2	1	2	28.6.21	2.7.21
1	SO01 - a.dům					
3203	ZDI NOSNÉ	4	3	0	28.6.21	16.7.21
1	SO01 - a.dům					
3404	STROPY	5	3	0	28.6.21	16.7.21
1	SO01 - a.dům					

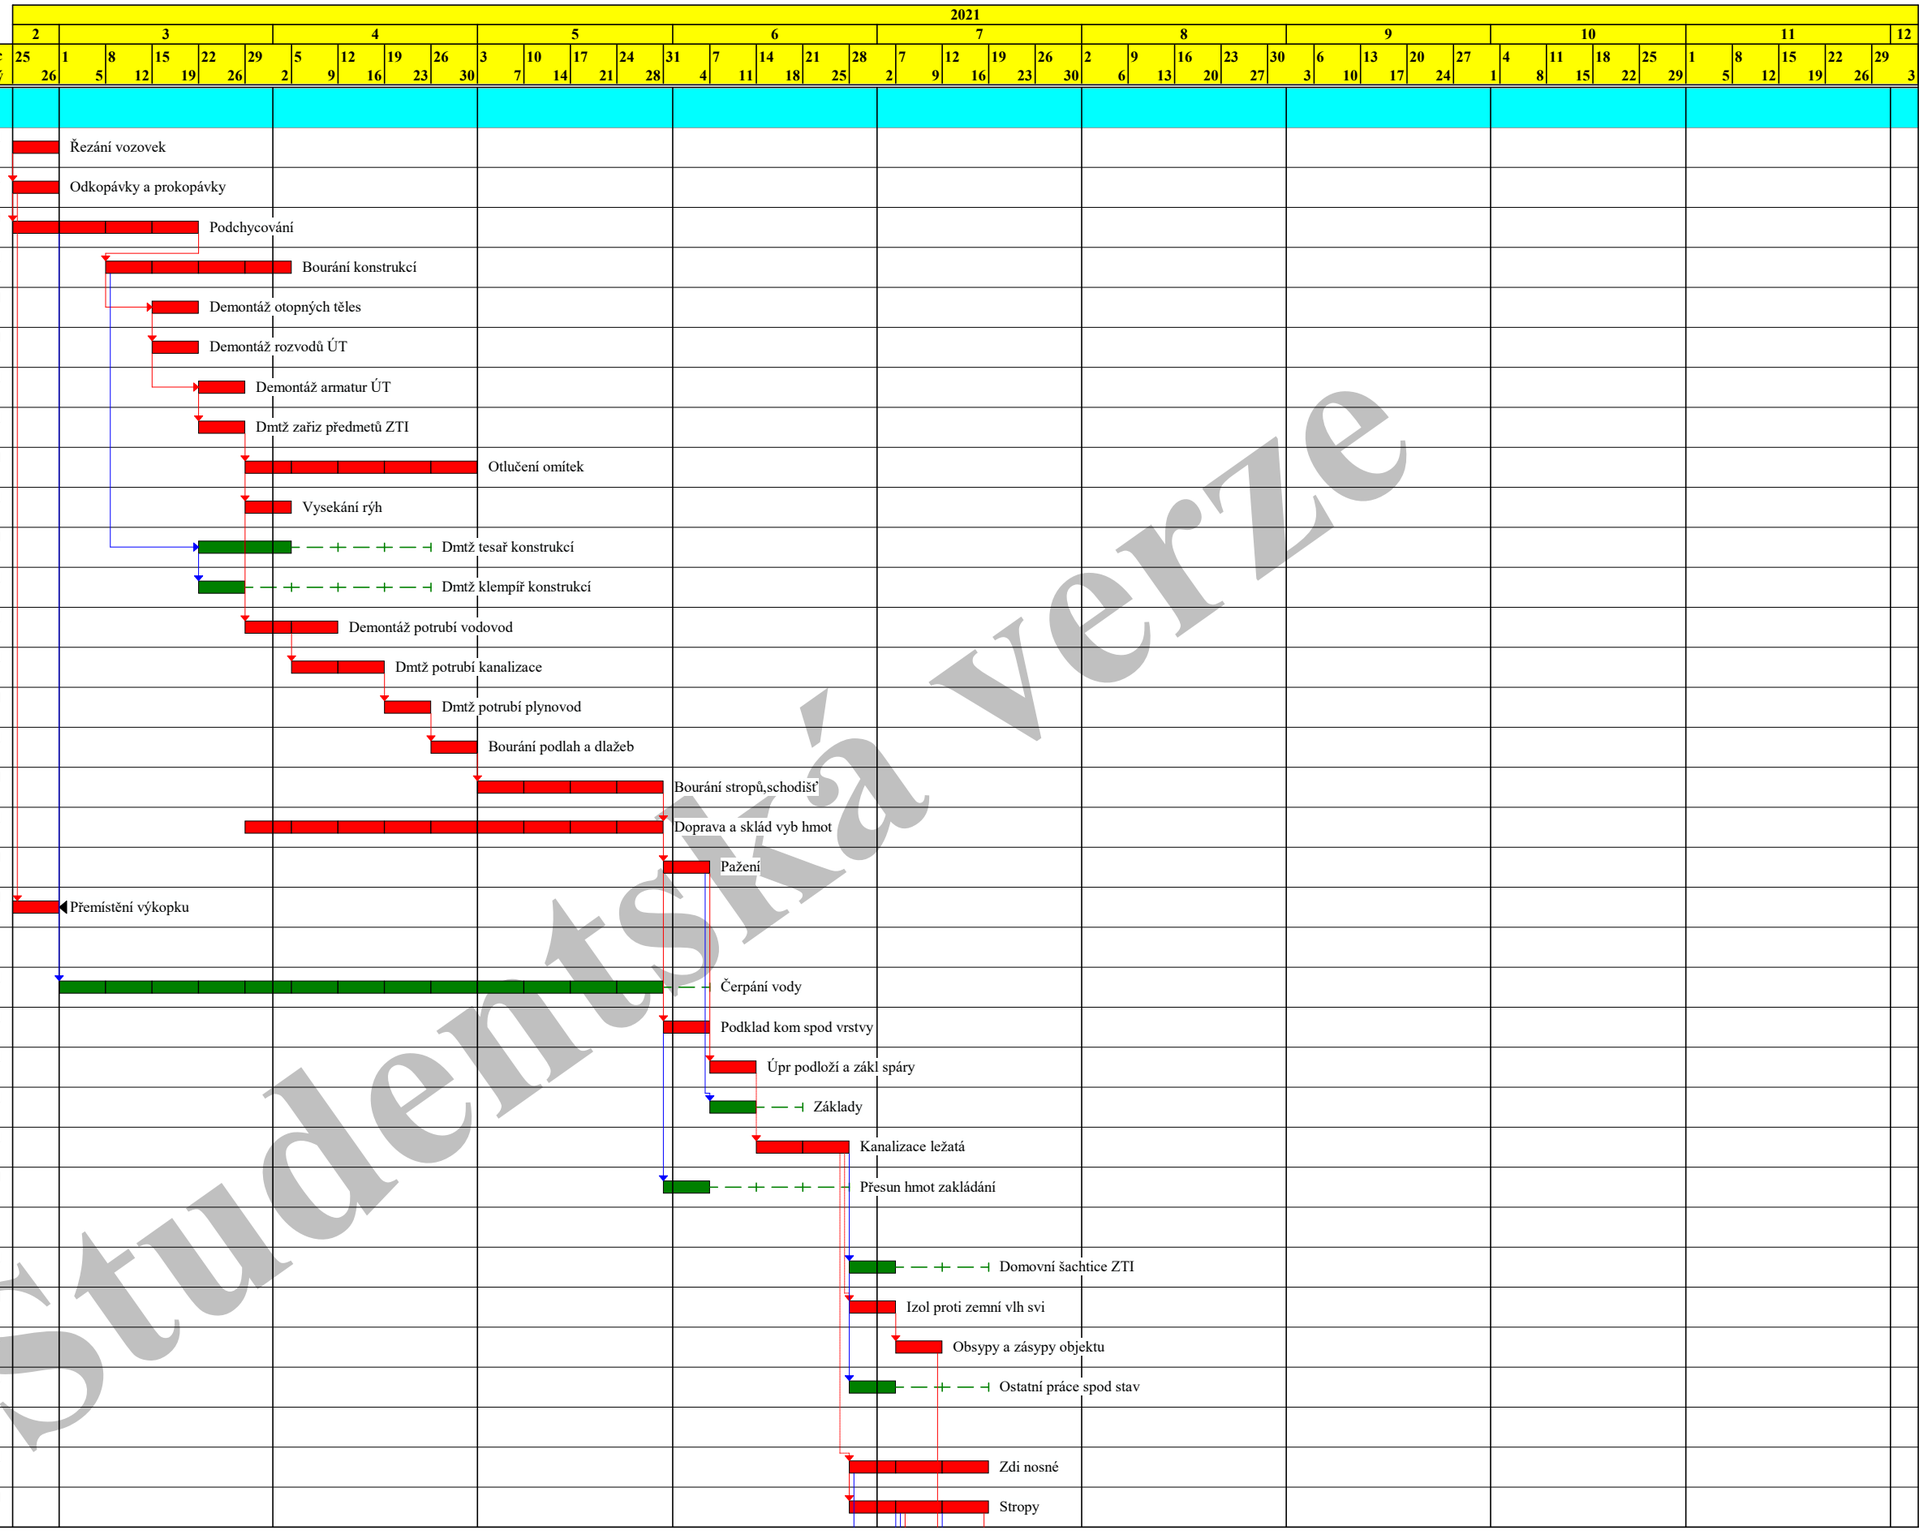

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný
3706	TESAŘI STĚNY A STROPY	2	3	6	12.7.21	30.7.21
	1 SO01 - a.dům					
3809	OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR	2	1	6	7.7.21	9.7.21
	1 SO01 - a.dům					
3859	PŘESUN HMOT TE 3	3	5	4	28.6.21	30.7.21
	1 SO01 - a.dům					
4107	TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV	3	3	5	19.7.21	6.8.21
	1 SO01 - a.dům					
4327	TEPELNÁ IZOLACE STŘECH	2	1	8	9.8.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
4507	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY	1	1	8	9.8.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
4607	TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA	2	1	5	9.8.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
4727	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	3	2	5	16.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
4807	KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY	3	6	8	23.8.21	1.10.21
	1 SO01 - a.dům					
4859	PŘESUN HMOT STŘECHA	2	1	13	19.7.21	23.7.21
	1 SO01 - a.dům					
5123	PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ	3	1	0	26.7.21	30.7.21
	1 SO01 - a.dům					
5187	PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART	3	5	0	12.7.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5306	VÝPLNĚ OTVORŮ	2	1	0	16.8.21	20.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5327	TRUHLÁŘI OKNA	2	1	0	23.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5357	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	2	2	5	23.8.21	3.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5507	KANALIZACE VNITŘNÍ	2	4	0	2.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY	4	4	0	16.8.21	10.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY	2	1	0	16.8.21	20.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5587	ROZVODY ÚT VNITŘNÍ	4	3	3	23.8.21	10.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5607	ARMATURY ÚT	2	1	8	30.8.21	3.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5627	OTOPNÁ TĚLESA	2	1	7	6.9.21	10.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5647	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ	4	1	6	13.9.21	17.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5667	KOTELNY ÚT	2	1	8	13.9.21	17.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT	2	1	8	13.9.21	17.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5727	SILNOPROUD VODIČE	2	4	5	2.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5747	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE	2	1	11	23.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
5767	SLABOPROUD TRUBKY	1	1	5	30.8.21	3.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5787	SLABOPROUD VODIČE	1	1	5	6.9.21	10.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5807	VZDUCHOTECHNIKA	3	3	5	6.9.21	24.9.21
	1 SO01 - a.dům					
5859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	2	1	3	23.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	3	2	6	2.8.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
6306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	4	9	0	23.8.21	22.10.21
	1 SO01 - a.dům					
6407	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA	3	1	10	30.8.21	3.9.21
	1 SO01 - a.dům					

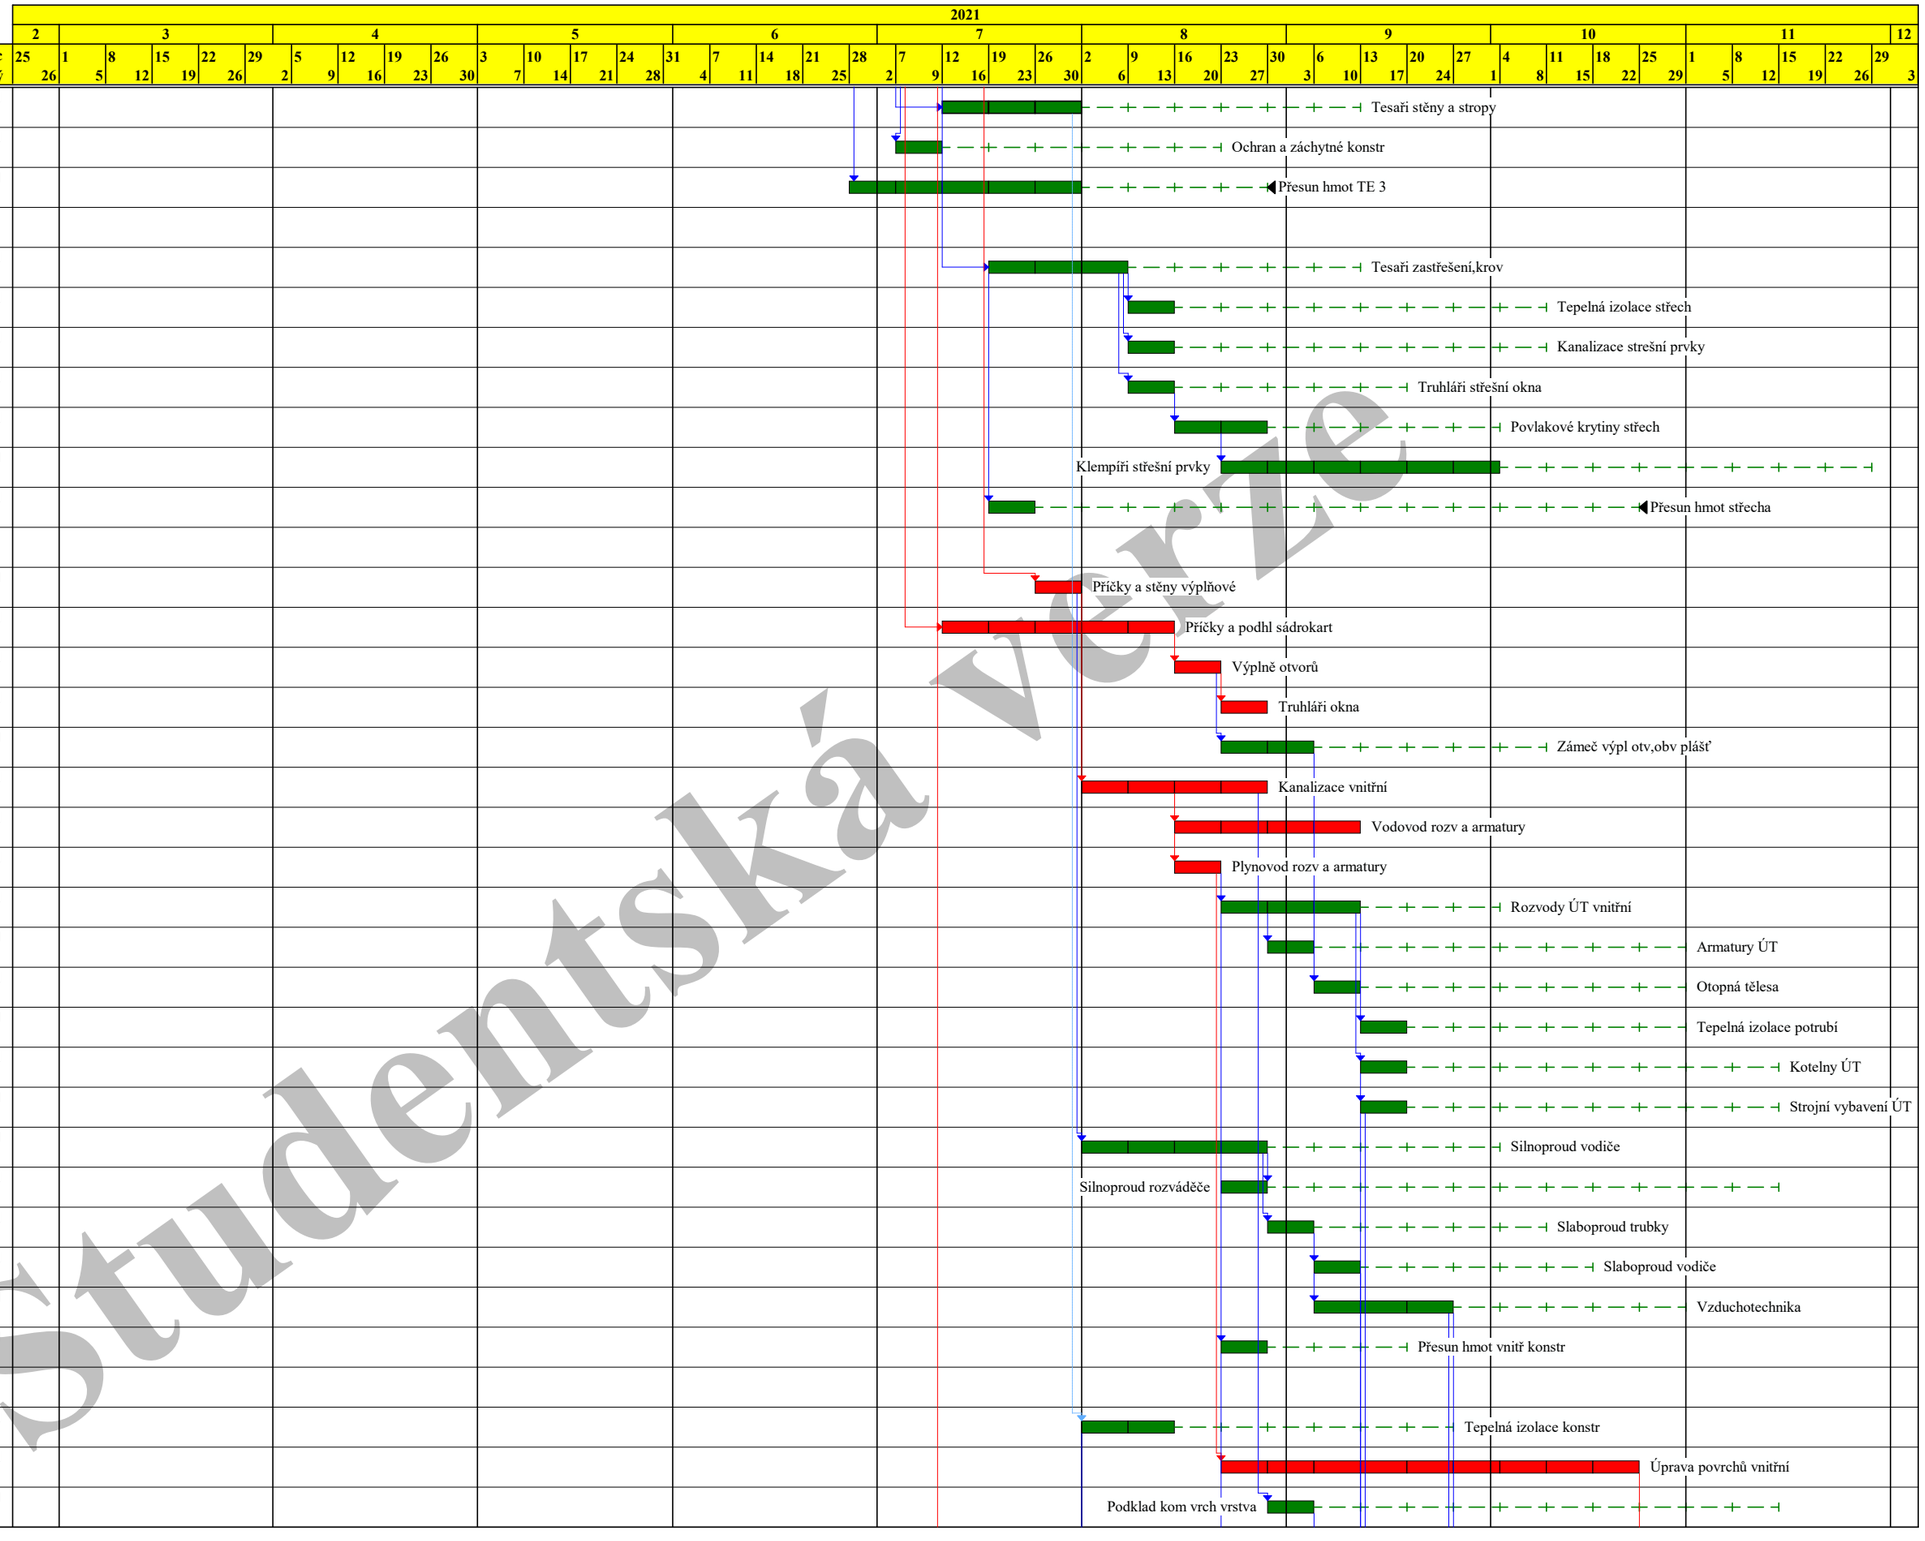

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek	Konec
6507	DLAŽBA KOMUNIKACE	2	2	10	6.9.21	17.9.21
	1 SO01 - a.dům					
6609	DROBNÉ DOPLŇKY VNITŘNÍ	2	1	10	13.9.21	17.9.21
	1 SO01 - a.dům					
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	2	2	0	18.10.21	29.10.21
	1 SO01 - a.dům					
6807	TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ	2	1	6	13.9.21	17.9.21
	1 SO01 - a.dům					
6859	PŘESUN HMOT TE 6	2	1	3	23.8.21	27.8.21
	1 SO01 - a.dům					
7157	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL	2	2	12	2.8.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
7407	OBKLADY VNITŘNÍ	4	3	2	18.10.21	5.11.21
	1 SO01 - a.dům					
7607	PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ	2	3	0	1.11.21	19.11.21
	1 SO01 - a.dům					
7657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	3	1	6	20.9.21	24.9.21
	1 SO01 - a.dům					
7707	MALBY VNITŘNÍ	2	2	0	1.11.21	12.11.21
	1 SO01 - a.dům					
7757	PODLAHY POVLAKOVÉ	2	2	0	8.11.21	19.11.21
	1 SO01 - a.dům					
7859	PŘESUN HMOT POVRCHY	2	1	6	18.10.21	22.10.21
	1 SO01 - a.dům					
8109	VÝTAHY NETECHNOL POVAHY	3	1	8	20.9.21	24.9.21
	1 SO01 - a.dům					
8207	PODLAHY TEXTILNÍ	1	2	1	8.11.21	19.11.21
	1 SO01 - a.dům					
8257	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	1	3	0	8.11.21	26.11.21
	1 SO01 - a.dům					
8457	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI	3	2	0	15.11.21	26.11.21
	1 SO01 - a.dům					
8607	VZDUCHOTECHNIKA KOMPLET	2	3	8	13.9.21	1.10.21
	1 SO01 - a.dům					
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ	1	2	1	8.11.21	19.11.21
	1 SO01 - a.dům					
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE	2	2	0	15.11.21	26.11.21
	1 SO01 - a.dům					
8809	VYČISTĚNÍ OBJEKTU	4	3	0	8.11.21	26.11.21
	1 SO01 - a.dům					
8859	PŘESUN HMOT KOMPLETACE	2	1	3	8.11.21	12.11.21
	1 SO01 - a.dům					
9109	LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ	2	3	0	26.7.21	13.8.21
	1 SO01 - a.dům					
9189	ČISTĚNÍ USAZENIN	1	1	0	16.8.21	20.8.21
	1 SO01 - a.dům					
9207	TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ	2	5	0	23.8.21	24.9.21
	1 SO01 - a.dům					
9226	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	4	6	0	30.8.21	8.10.21
	1 SO01 - a.dům					
9259	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ	1	1	2	20.9.21	24.9.21
	1 SO01 - a.dům					
9307	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ	2	4	6	20.9.21	15.10.21
	1 SO01 - a.dům					
9427	SILNOPROUD KOMPLET VENK	2	1	6	11.10.21	15.10.21
	1 SO01 - a.dům					
9457	SLABOPROUD KOMPLET VENK	1	1	6	11.10.21	15.10.21
	1 SO01 - a.dům					
9527	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	3	7	0	11.10.21	26.11.21
	1 SO01 - a.dům					
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	0	29.11.21	3.12.21
	1 SO01 - a.dům					

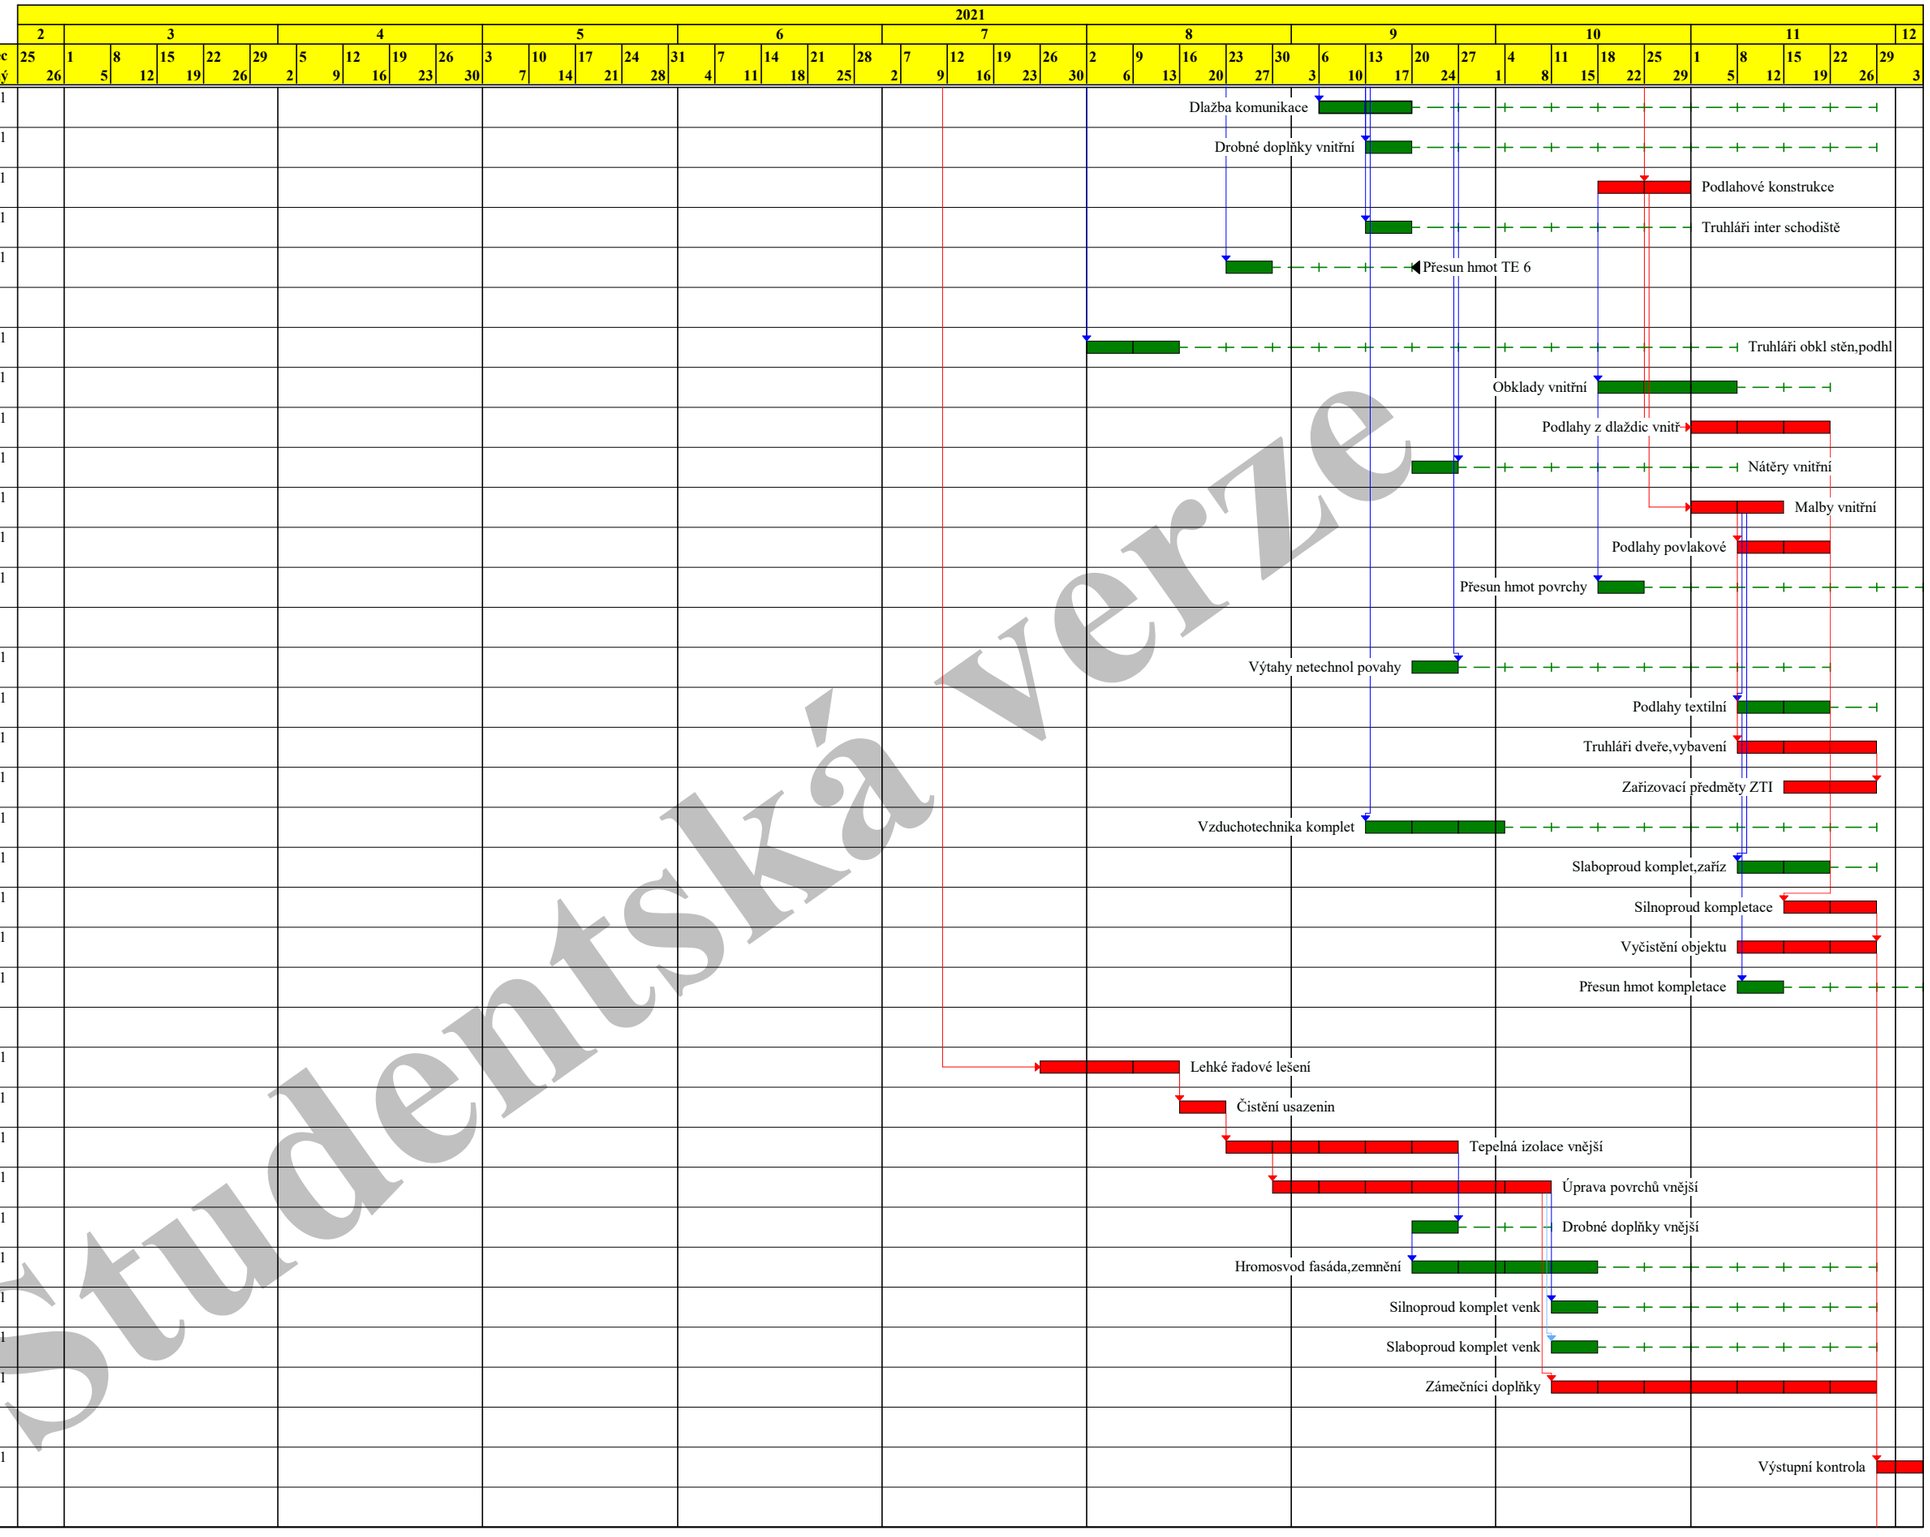

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
SO02 - sklad						
10109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	2	2	2	19.7.21	30.7.21
	1 SO02 - sklad					
10159	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE	4	1	2	19.7.21	23.7.21
	1 SO02 - sklad					
10257	ODSTR POVL KRYTIN STŘECH	2	1	3	19.7.21	23.7.21
	1 SO02 - sklad					
10277	DMTŽ TESAŘ KONSTRUKCÍ	2	1	3	19.7.21	23.7.21
	1 SO02 - sklad					
10367	OTLUČENÍ OMÍTEK	2	1	3	19.7.21	23.7.21
	1 SO02 - sklad					
10569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	3	2	2	19.7.21	30.7.21
	1 SO02 - sklad					
11302	ZÁKLADY	3	1	2	2.8.21	6.8.21
	1 SO02 - sklad					
11607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD	2	1	3	16.8.21	20.8.21
	1 SO02 - sklad					
11859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ	3	1	3	16.8.21	20.8.21
	1 SO02 - sklad					
13354	STROPY	2	2	2	16.8.21	27.8.21
	1 SO02 - sklad					
13859	PŘESUN HMOT TE 3	3	1	7	23.8.21	27.8.21
	1 SO02 - sklad					
14707	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH	3	1	10	6.9.21	10.9.21
	1 SO02 - sklad					
14859	PŘESUN HMOT STŘECHA	2	1	11	6.9.21	10.9.21
	1 SO02 - sklad					
15103	ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ	3	1	5	6.9.21	10.9.21
	1 SO02 - sklad					
15287	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	2	2	2	6.9.21	17.9.21
	1 SO02 - sklad					
15859	PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR	2	1	11	6.9.21	10.9.21
	1 SO02 - sklad					
16306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ	3	3	2	13.9.21	1.10.21
	1 SO02 - sklad					
16706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE	2	1	2	4.10.21	8.10.21
	1 SO02 - sklad					
17657	NÁTĚRY VNITŘNÍ	3	1	5	18.10.21	22.10.21
	1 SO02 - sklad					
17707	MALBY VNITŘNÍ	4	1	5	25.10.21	29.10.21
	1 SO02 - sklad					
19306	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	3	3	2	18.10.21	5.11.21
	1 SO02 - sklad					
19607	PODLAHY Z KAMENE VNĚJŠÍ	3	1	2	8.11.21	12.11.21
	1 SO02 - sklad					
19707	NÁTĚRY VENKOVNÍ	1	1	2	8.11.21	12.11.21
	1 SO02 - sklad					
19801	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	2	1	2	15.11.21	19.11.21
	1 SO02 - sklad					
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	1	22.11.21	26.11.21
	1 SO02 - sklad					

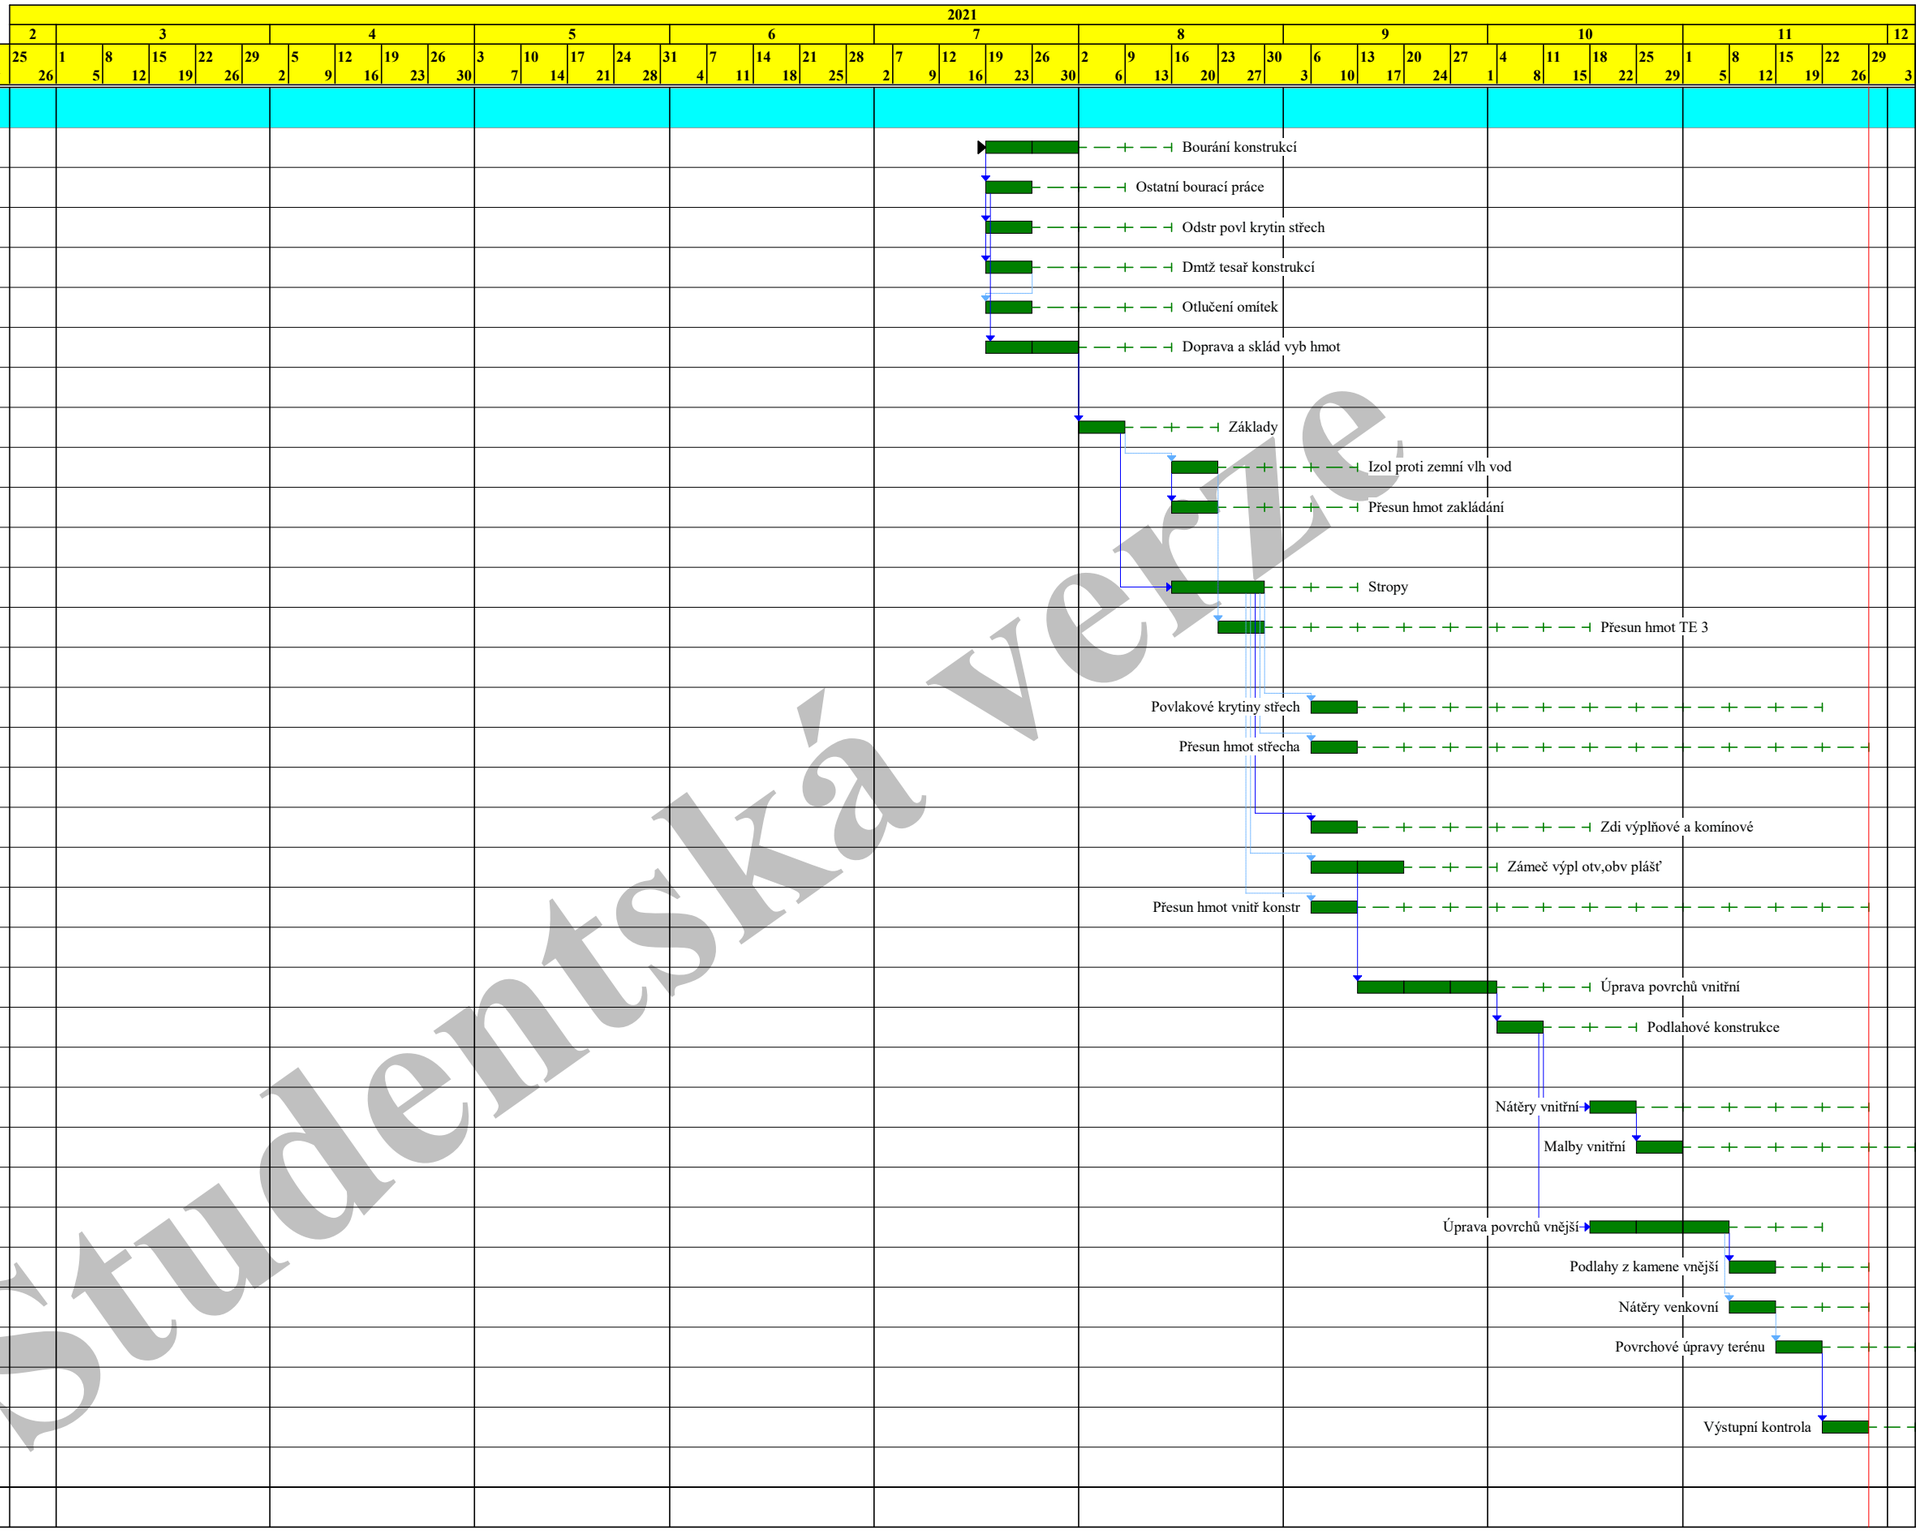

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
SO03 - schodiště						
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO03 - schodiště	3	1	0	28.6.21	2.7.21
20409	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 SO03 - schodiště	2	2	0	28.6.21	9.7.21
20459	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 SO03 - schodiště	3	1	2	28.6.21	2.7.21
20751	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 SO03 - schodiště	2	1	0	12.7.21	16.7.21
23222	ZÁKLADY 1 SO03 - schodiště	3	1	0	19.7.21	23.7.21
23253	ZDI NOSNÉ 1 SO03 - schodiště	4	1	0	2.8.21	6.8.21
23301	STROPY 1 SO03 - schodiště	5	1	0	16.8.21	20.8.21
23459	SCHODIŠTĚ 1 SO03 - schodiště	4	1	0	23.8.21	27.8.21
23602	TRATIVODY 1 SO03 - schodiště	2	1	2	23.8.21	27.8.21
23859	PŘESUN HMOT TE 3 1 SO03 - schodiště	2	2	0	30.8.21	10.9.21
26255	SCHODIŠŤ STUPNĚ NA TERÉN 1 SO03 - schodiště	3	1	1	23.8.21	27.8.21
26305	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 SO03 - schodiště	4	1	0	6.9.21	10.9.21
29109	TRUHLÁŘI OBKL STĚN,PODHL 1 SO03 - schodiště	2	1	0	6.9.21	10.9.21
29129	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ 1 SO03 - schodiště	2	1	0	6.9.21	10.9.21
29459	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ 1 SO03 - schodiště	4	1	0	13.9.21	17.9.21
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO03 - schodiště	1	1	0	13.9.21	17.9.21
SO04 - rampa						
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 SO04 - rampa	3	1	0	28.6.21	2.7.21
30501	ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY 1 SO04 - rampa	2	1	1	28.6.21	2.7.21
30601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 SO04 - rampa	4	1	0	28.6.21	2.7.21
30701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 SO04 - rampa	1	1	6	28.6.21	2.7.21
30720	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 SO04 - rampa	2	1	1	21.6.21	25.6.21
30802	KANALIZACE LEŽATÁ 1 SO04 - rampa	2	1	1	28.6.21	2.7.21
30859	PŘESUN HMOT TE 0 1 SO04 - rampa	1	1	10	28.6.21	2.7.21
33101	ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1 SO04 - rampa	2	1	0	28.6.21	2.7.21
33122	ZÁKLADY 1 SO04 - rampa	3	1	0	7.7.21	9.7.21
33155	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ 1 SO04 - rampa	2	2	0	19.7.21	30.7.21
33207	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 SO04 - rampa	2	1	0	9.8.21	13.8.21
33234	ZDI NOSNÉ 1 SO04 - rampa	2	2	0	23.8.21	3.9.21

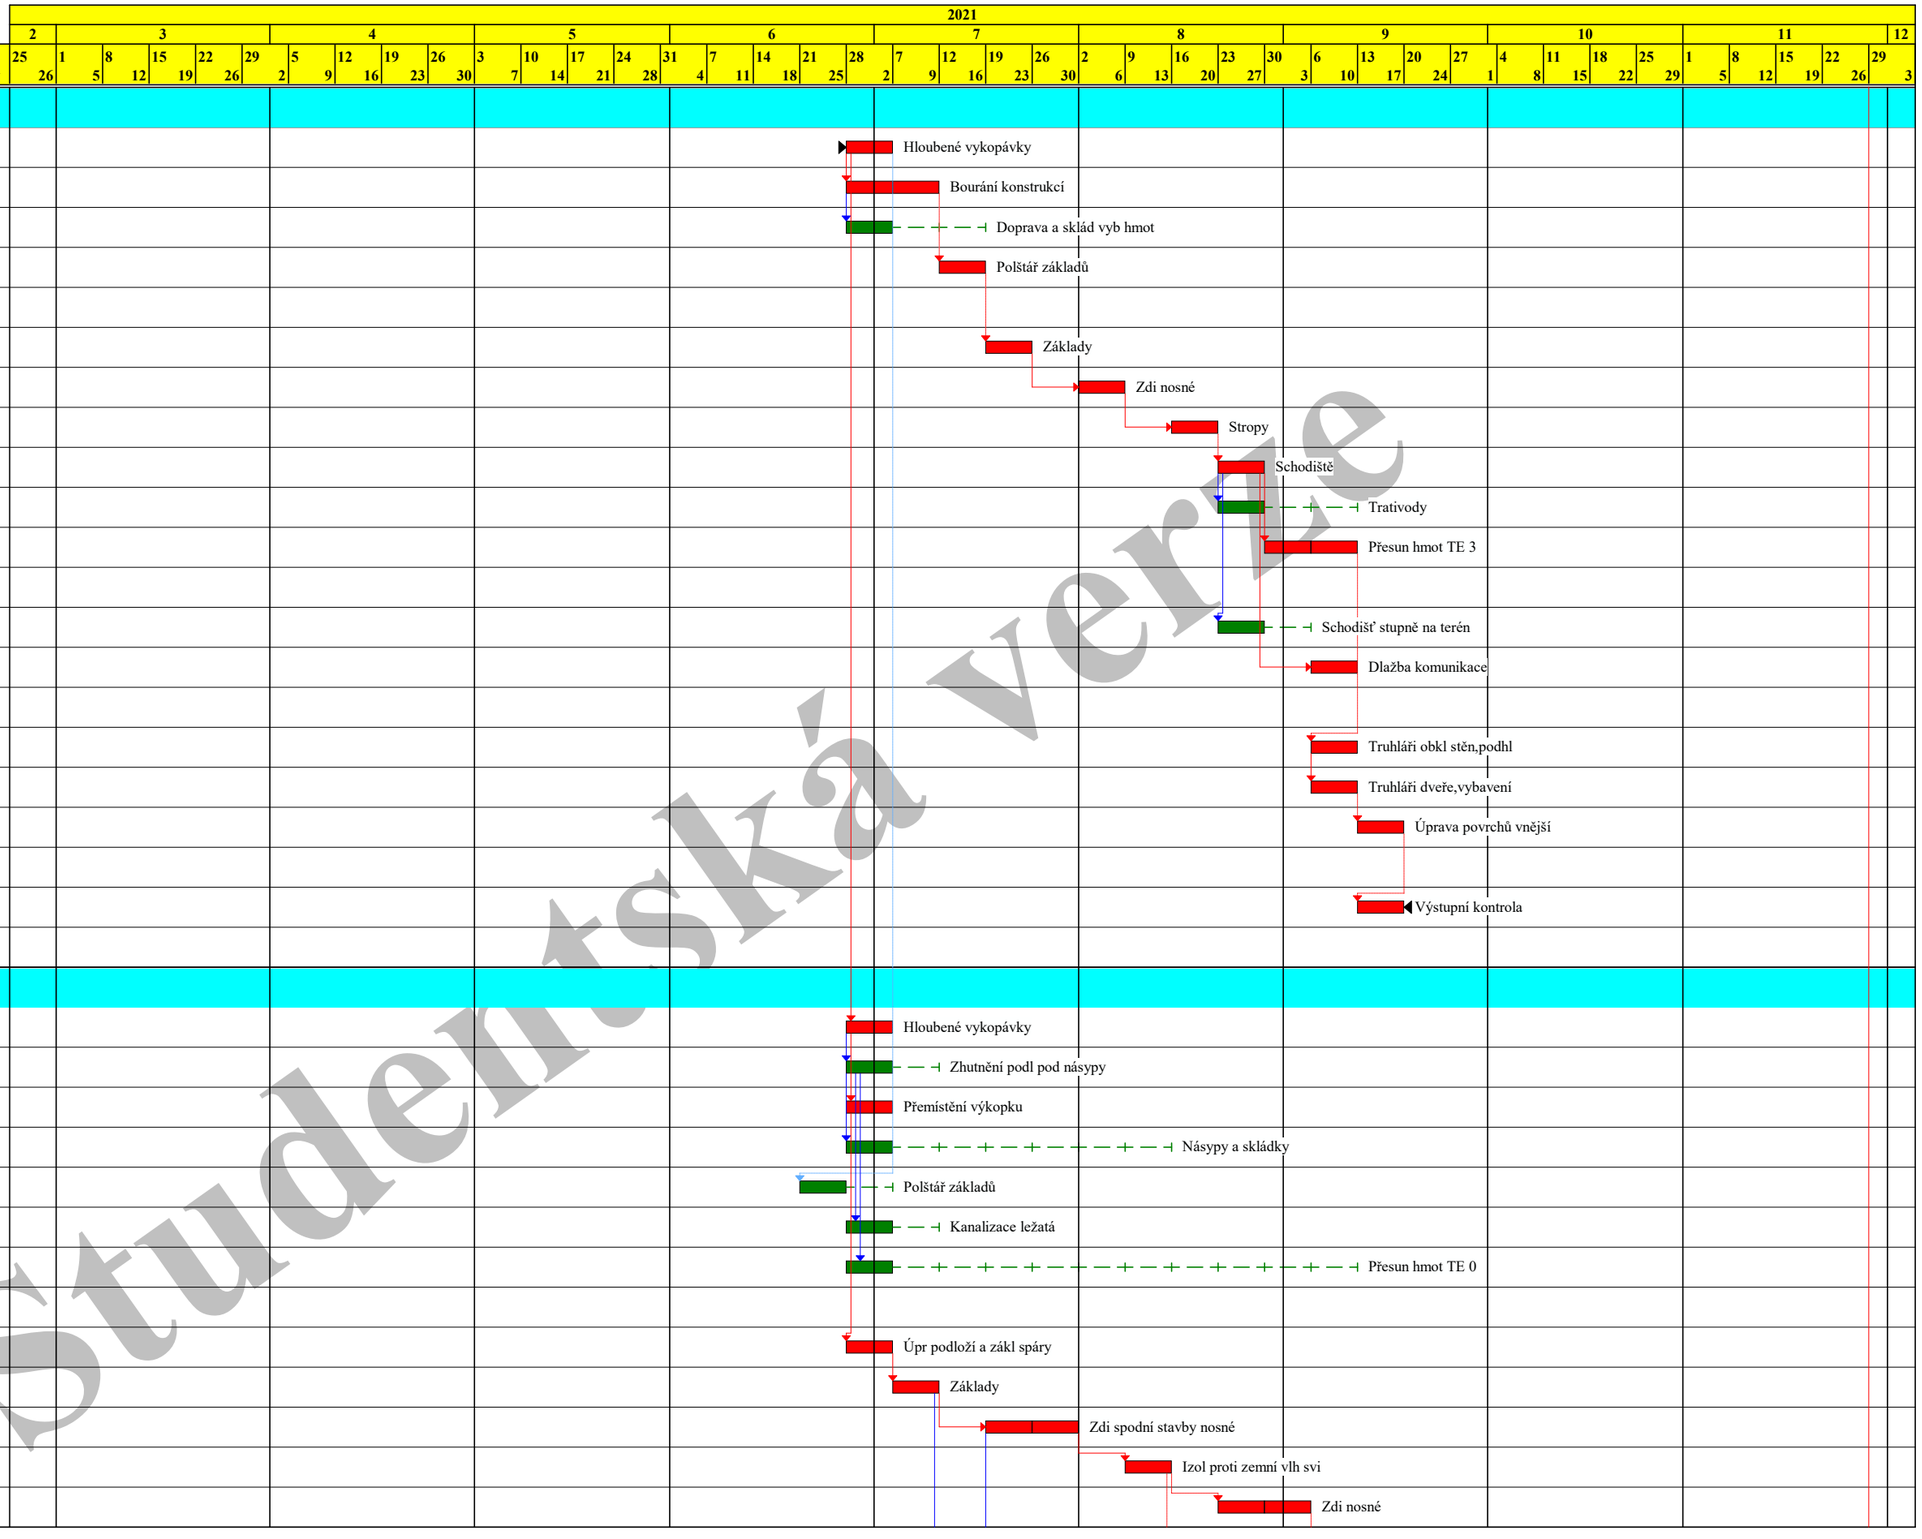

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez. možný	Začátek možný	Konec možný
33301	SCHODIŠTĚ	2	2	2	19.7.21	30.7.21
	1 SO04 - rampa					
33758	ŠACHTY NA POTRUBÍ	3	4	0	16.8.21	10.9.21
	1 SO04 - rampa					
33859	PŘESUN HMOT TE 3	3	1	8	19.7.21	23.7.21
	1 SO04 - rampa					
36305	DLAŽBA KOMUNIKACE	1	2	4	2.8.21	13.8.21
	1 SO04 - rampa					
36409	SILNOPROUD VODIČE	1	1	0	13.9.21	17.9.21
	1 SO04 - rampa					
36709	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR	3	1	1	13.9.21	17.9.21
	1 SO04 - rampa					
36807	OTEVŘENÉ STOKY A ŽLABY	3	1	0	13.9.21	17.9.21
	1 SO04 - rampa					
36859	PŘESUN HMOT TE 6	2	1	0	13.9.21	17.9.21
	1 SO04 - rampa					
39209	TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ	2	1	2	20.9.21	24.9.21
	1 SO04 - rampa					
39307	SILNOPROUD KOMPLET VENK	2	1	1	13.9.21	17.9.21
	1 SO04 - rampa					
39601	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ	2	2	0	20.9.21	1.10.21
	1 SO04 - rampa					
39759	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	2	2	0	20.9.21	1.10.21
	1 SO04 - rampa					
39900	OSTATNÍ PRÁCE TE 9	2	1	1	13.9.21	17.9.21
	1 SO04 - rampa					
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	0	27.9.21	1.10.21
	1 SO04 - rampa					
SO05 - oplocení						
40409	BOURÁNÍ ZDIVA A PILÍŘŮ	3	1	1	30.8.21	3.9.21
	1 SO05 - oplocení					
40459	PŘISEKÁVÁNÍ,OSEKÁV ZDIVA	2	4	1	30.8.21	24.9.21
	1 SO05 - oplocení					
40468	DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONSTR	2	1	4	30.8.21	3.9.21
	1 SO05 - oplocení					
40469	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT	3	1	5	30.8.21	3.9.21
	1 SO05 - oplocení					
40859	PŘESUN HMOT TE 0	1	1	7	30.8.21	3.9.21
	1 SO05 - oplocení					
43401	ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ	3	2	1	27.9.21	8.10.21
	1 SO05 - oplocení					
43503	ZDI NOSNÉ	2	2	1	27.9.21	8.10.21
	1 SO05 - oplocení					
49206	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ	4	6	1	18.10.21	26.11.21
	1 SO05 - oplocení					
49357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY	2	2	5	18.10.21	29.10.21
	1 SO05 - oplocení					
49457	NÁTĚRY VENKOVNÍ	2	1	5	25.10.21	29.10.21
	1 SO05 - oplocení					
49657	ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ	4	1	2	15.11.21	19.11.21
	1 SO05 - oplocení					
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	1	22.11.21	26.11.21
	1 SO05 - oplocení					

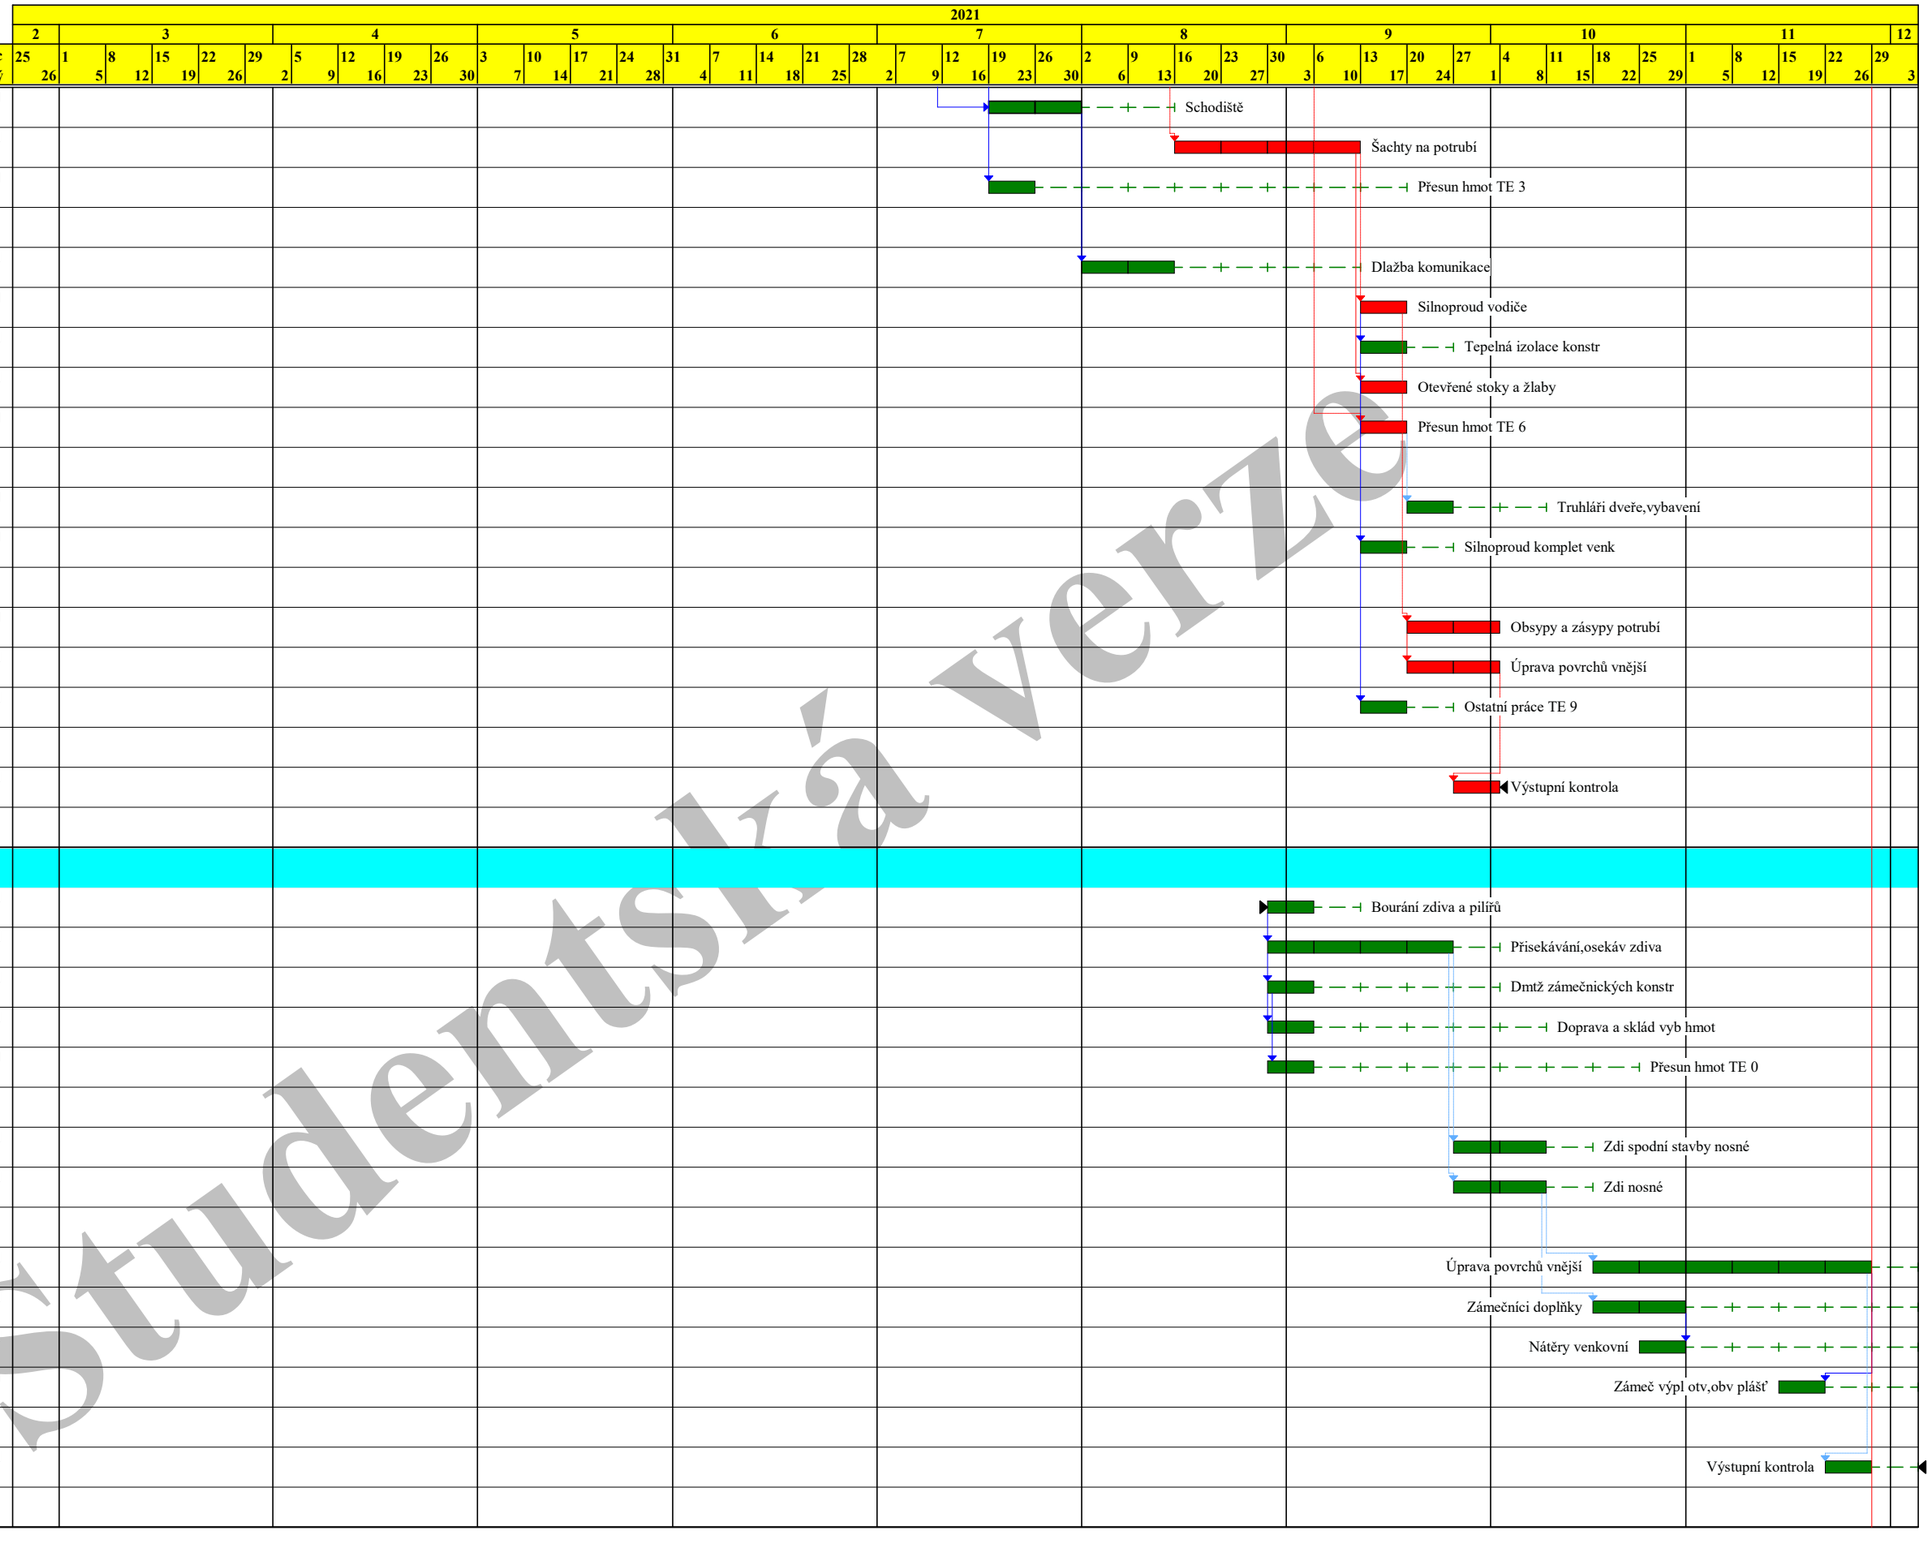

Studentská verze

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index / Dodav.	Název činnosti / Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
SO09 - zeleň						
50101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE	2	1	1	4.10.21	8.10.21
1	SO09 - zeleň					
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY	3	1	1	4.10.21	8.10.21
1	SO09 - zeleň					
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	2	1	2	4.10.21	8.10.21
1	SO09 - zeleň					
53101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ	3	1	1	11.10.21	15.10.21
1	SO09 - zeleň					
56859	PŘESUN HMOT TE 6	2	1	3	18.10.21	22.10.21
1	SO09 - zeleň					
59101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU	4	3	2	18.10.21	5.11.21
1	SO09 - zeleň					
59253	ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ	2	2	1	18.10.21	29.10.21
1	SO09 - zeleň					
59309	PŘÍSTŘEŠEK NA POPELNICE	3	1	1	25.10.21	29.10.21
1	SO09 - zeleň					
59405	VENKOVNÍ UČEBNA	2	2	1	1.11.21	12.11.21
1	SO09 - zeleň					
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA	1	1	1	8.11.21	12.11.21
1	SO09 - zeleň					
60000	PŘEJÍMKA	1	1	0	29.11.21	3.12.21
1						

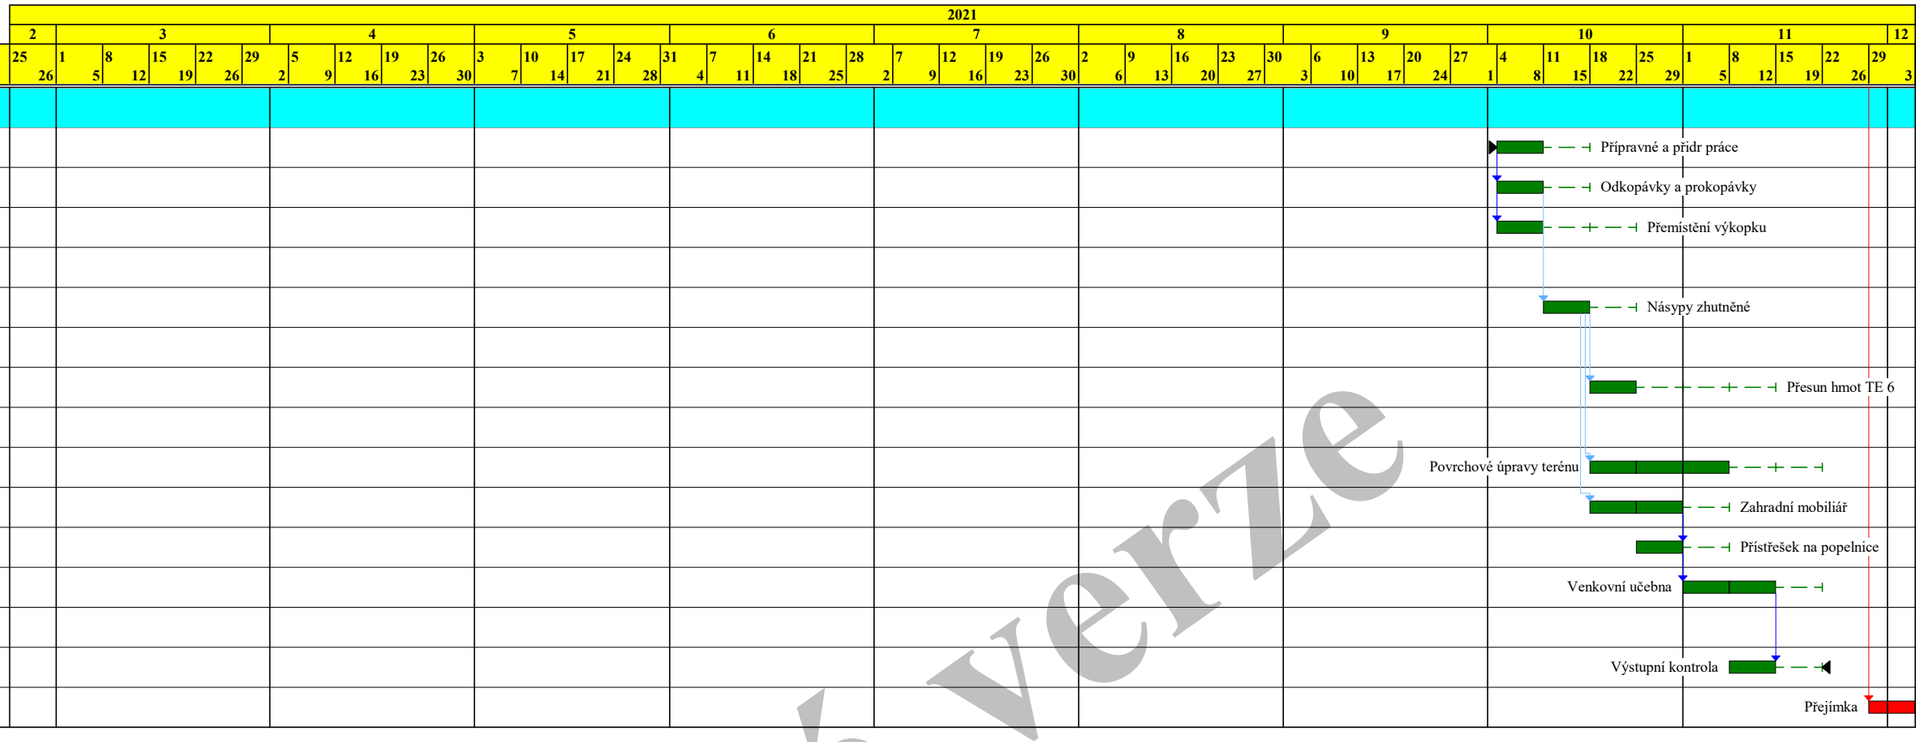

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

1

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze
