

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, JINCE

4 ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

2023

DAVID MARČEK

**VEDOUcí BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. MARTIN HLAVA, PH.D.**


Obsah

4.1 Časoprostorový graf


4.2 Graf nasazení pracovníků, strojů a spotřeby materiálu

4.3 Harmonogram


NASAZENI PRACOVNIKŮ

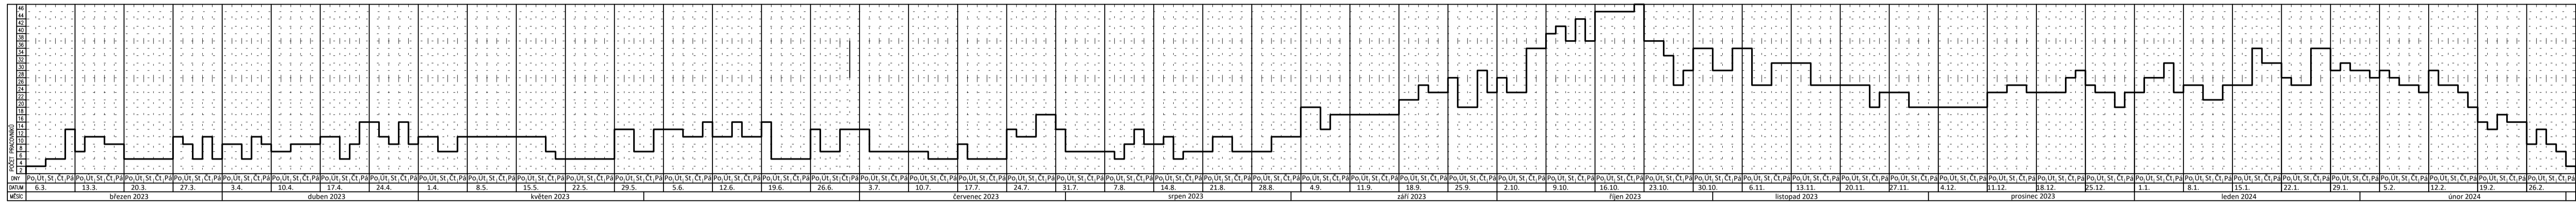


NASAZENI STROJŮ

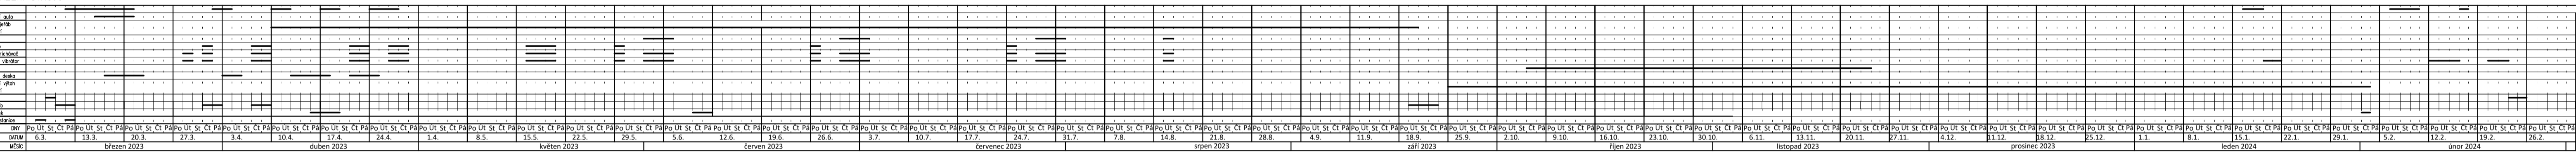

SPOTŘEBA MATERIÁLU

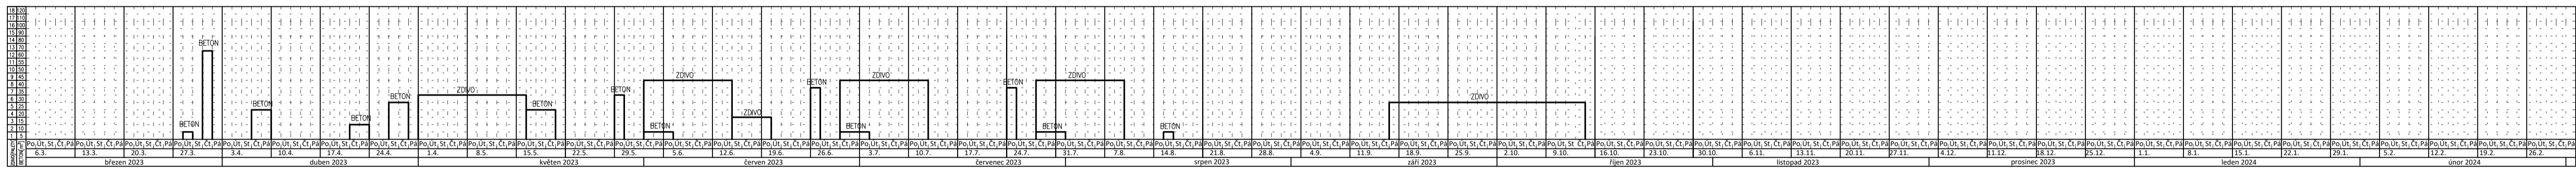

SPOTŘEBA MATERIÁLU

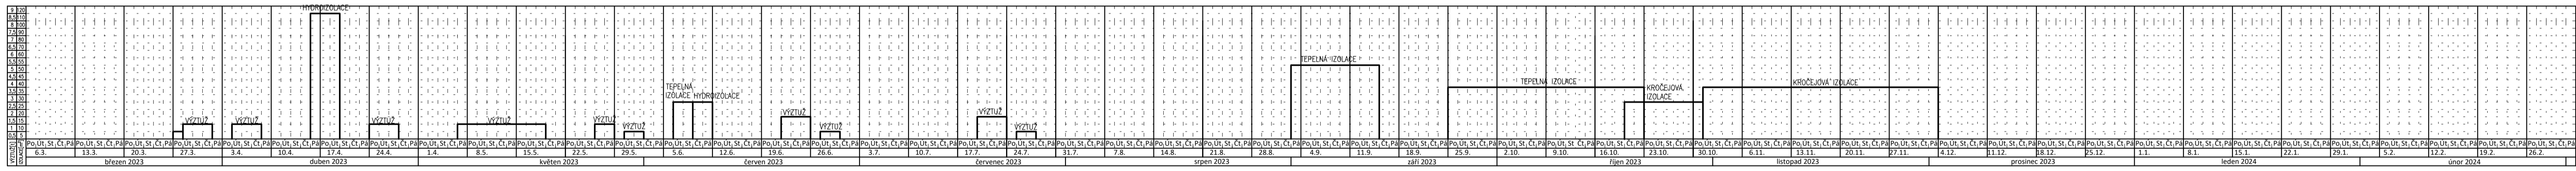

VYPRACOVAL: David Marček	FAKULTA STAVĚBNÍ
KATEGORIE: K122	ČVUT VĚPRAKĚ
VEDOUČÍ: Ing. Martin Hlava, Ph.D.	DATUM: 5/2023
PŘEDMĚT: Bakalářská práce L	STUPĚŇ PD:
OBSAH: Graf nasazení pracovníků, strojů a spotřeby materiálů	PARALELKA:
	MĚŘÍTKO: C VÝKRESU: 4.2

HARMONOGRAM

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2023																							
							or 2023 06.II	březen 2023 20.II	06.III	20.III	duben 2023 03.IV	17.IV	květen 2023 01.V	15.V	červen 2023 29.V	12.VI	červenec 2023 26.VI	10.VII	24.VII	srpen 2023 07.VIII	21.VIII	04.IX	18.IX	říjen 2023 02.X	16.X	listopad 2023 30.X	13.XI	prosinec 2023 27.XI	11.XII	leden 2024 25.XII
1	→	Novostavba bytového domu - Jince	260 dny	06.03. 23	01.03. 24																									
2	→	Přípravné práce	11 dny	06.03. 23	20.03. 23																									
3	→	Převzetí staveniště	1 den	06.03. 23	06.03. 23																									
4	→	Geodetické práce	1 den	07.03. 23	07.03. 23	3																								
5	→	Skrývka ornice + přemístění	1 den	08.03. 23	08.03. 23	4																								
6	→	Zařízení staveniště	2 dny	09.03. 23	10.03. 23	5																								
7	→	Hloubení IS pro ZS	4 dny	10.03. 23	15.03. 23	6FS-50%																								
8	→	Montáž IS pro ZS	3 dny	14.03. 23	16.03. 23	7FS-50%																								
9	→	Obsyp, zásyp + zhutněná zemina	3 dny	16.03. 23	20.03. 23	8FS-1 den																								
10	→	Výkopové práce	249 dny	10.03. 23	21.02. 24																									
11	→	Geodetické práce	1 den	10.03. 23	10.03. 23	6FS-50%																								
12	→	Výkopové práce	7 dny	10.03. 23	20.03. 23	11SS																								
13	→	Odvoz výkopku na skládku	3 dny	16.03. 23	20.03. 23	12FS-3 dny																								
14	→	Vodorovné přemístění výkopků na staveništi	1 den	15.03. 23	15.03. 23	12SS+3 dny																								
15	→	Hutněný podsyp - štěrk	1 den	21.03. 23	21.03. 23	13																								
16	→	Realizace drenáže + odvodnění	2 dny	22.03. 23	23.03. 23	15																								
17	→	Inž. sítě - splašková kanalizace	7 dny	07.04. 23	17.04. 23																									
18	→	Výkop přípojky a rýhy	3 dny	07.04. 23	11.04. 23	46FS-1 den																								
19	→	Podsyp + přípojka, potrubí	4 dny	10.04. 23	13.04. 23	18SS+1 den																								
20	→	Obsyp, zásyp + zhutněná zemina	4 dny	12.04. 23	17.04. 23	19FS-2 dny																								
21	→	Inž. sítě - dešťová kanalizace	7 dny	06.02. 24	14.02. 24																									
22	→	Výkop přípojky a rýhy	3 dny	06.02. 24	08.02. 24	221																								
23	→	Podsyp + přípojka, potrubí	3 dny	08.02. 24	12.02. 24	22FS-1 den																								
24	→	Obsyp, zásyp + zhutněná zemina	3 dny	12.02. 24	14.02. 24	23FS-1 den																								
25	→	Inž. sítě - pitná voda	6 dny	17.04. 23	24.04. 23																									
26	→	Výkop přípojky a rýhy	2 dny	17.04. 23	18.04. 23	20FS-1 den																								
27	→	Podsyp + přípojka	3 dny	18.04. 23	20.04. 23	26FS-50%																								
28	→	Obsyp, zásyp + zhutněná zemina	3 dny	20.04. 23	24.04. 23	27FS-1 den																								
29	→	Inž. sítě - užitková voda	5 dny	15.02. 24	21.02. 24																									
30	→	Výkop přípojky a rýhy	1 den	15.02. 24	15.02. 24	24																								
31	→	Podsyp + přípojka, potrubí	2 dny	16.02. 24	19.02. 24	30																								
32	→	Obsyp, zásyp + zhutněná zemina	2 dny	20.02. 24	21.02. 24	31																								
33	→	Inž. sítě - elektro silnoproud + slaboproud	7 dny	24.04. 23	02.05. 23																									
34	→	Výkop přípojky a rýhy	3 dny	24.04. 23	26.04. 23	28FS-1 den																								
35	→	Podsyp + přípojka	3 dny	26.04. 23	28.04. 23	34FS-1 den																								
36	→	Obsyp, zásyp + zhutněná zemina	3 dny	28.04. 23	02.05. 23	35FS-1 den																								
37	→	Základové konstrukce	26 dny	24.03. 23	28.04. 23																									
38	→	Zemní pásy	2 dny	24.03. 23	27.03. 23	16																								
39	→	Realizace základů jeřábu	2 dny	27.03. 23	28.03. 23	38SS+1 den																								
40	→	Montáž stavebního jeřábu	2 dny	10.04. 23	11.04. 23	39FS+8 dny																								
41	→	Armování základových pasů	3 dny	28.03. 23	30.03. 23	39FS-1 den																								

Projekt: 4_Harmonogram
Datum: 20.05. 23

Úkol	[Solid Blue Bar] Neaktivní úkol	[White Bar] Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	[Green Bar] Vnější milník	[Red Arrow] Průběh ručně zadaného úkolu
Rozdělení	[Dotted Blue Bar] Neaktivní milník	[White Diamond] Ruční souhrn	[Green Bracket] Konečný termín	[Green Arrow] Průběh
Milník	[Blue Diamond] Neaktivní souhrn	[White Bar] Pouze zahájení	[Blue Bracket] Kritický	[Red Bar] Kritické rozdělení
Souhrnný	[Blue Bracket] Ruční úkol	[Green Bar] Pouze s datem dokončení	[Blue Bracket] Kritické rozdělení	[Red Dotted Bar] Průběh
Souhrn projektu	[White Bar] Pouze s dobou trvání	[Green Bar] Vnější úkoly	[Blue Bar] Průběh	

