

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	červen														
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P		
1		Převzetí staveniště	8 hodin	22.5. 17	22.5. 17		2															
2		Vytyčení staveniště	8 hodin	23.5. 17	23.5. 17	1	3															
3		Vytyčení stavby	20 hodin	24.5. 17	26.5. 17	2	4															
4		Odstranění křovin a porostu	30 hodin	26.5. 17	1.6. 17	3	5															
5		Sejmutí ornice	15 hodin	1.6. 17	5.6. 17	4	6;7;9															
6		Oplocení staveniště	15 hodin	5.6. 17	6.6. 17	5	7															
7		Zřízení staveniště	5 hodin	7.6. 17	7.6. 17	6;5	8															
8		Napojení na ing. Sítě	4 hodin	7.6. 17	8.6. 17	7	9															
9		Vytyčení stavební jámy	2 hodin	8.6. 17	8.6. 17	8;5	10															
10		Výkop stavební jámy	3 hodin	8.6. 17	8.6. 17	9	11;13;16															

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci														červen			
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P				
11		Uložení výkopku na staveništi	2 hodin	8.6. 17	8.6. 17	10	12																	
12		Vytyčení vnitřní ležaté kanalizace	1 hodina	9.6. 17	9.6. 17	11	13																	
13		Výkop rozvodu kanalizace	1 hodina	9.6. 17	9.6. 17	12;10	14																	
14		Výkop pro vnější kanalizace	3,5 hodin	9.6. 17	9.6. 17	13	15																	
15		Vytyčení vrtů pro ohř 2 hodin	2 hodin	9.6. 17	9.6. 17	14	16																	
16		Výkop vrtů pro ohřev	3,2 hodin	9.6. 17	12.6. 17	15;10	17																	
17		Pískové lože pod rozvod od vrtů	1 hodina	12.6. 17	12.6. 17	16	18																	
18		Pískové lože pod ležatý rozvod	1 hodina	12.6. 17	12.6. 17	17	19																	
19		Osazení vnější revizní šachry	1 hodina	12.6. 17	12.6. 17	18	20																	
20		Montáž rozvodů od v	7 hodin	12.6. 17	13.6. 17	19	21																	

Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci														
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	
21		Montáž ležatého rozvodu kanalizace	5 hodin	13.6. 17	14.6. 17	20	22														
22		Zásyp potrubí ležatého rozvodu	2 hodin	14.6. 17	14.6. 17	21	23														
23		Zásyp vnější revizní šachty	0,1 hodin	14.6. 17	14.6. 17	22	24														
24		Zásyp rozvodů od vrtů	1 hodina	14.6. 17	14.6. 17	23	25														
25		hutnění zásypových rýh a šachet ležatého rozvodu	1,4 hodin	14.6. 17	14.6. 17	24	26														
26		Uzemnění hromosvod	0,81 hodin	14.6. 17	14.6. 17	25	27														
27		Provedení drenáže	0,8 hodin	14.6. 17	14.6. 17	26	28														
28		Provedení drenážní vrstvy ze štěrku	4 hodin	14.6. 17	15.6. 17	27	29														
29		Provedení podkladu z pěnového skla	4 hodin	15.6. 17	15.6. 17	28	30														
30		Armování desky	22,5 hodin	15.6. 17	20.6. 17	29	31														

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	červen															
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P			
31		Betonování desky	12 hodin	20.6. 17	22.6. 17	30	32																
32		Vyměření stěn	6,4 hodin	22.6. 17	23.6. 17	31	33																
33		Montáž prefabrikovaných stěnových dílců	30 hodin	23.6. 17	28.6. 17	32	34																
34		Montáž vnitřních příč	25 hodin	28.6. 17	3.7. 17	33	35																
35		Postavení vrcholové vaznice	0,82 hodin	3.7. 17	4.7. 17	34	36																
36		Zavětrování vrcholové vaznice	8 hodin	4.7. 17	5.7. 17	35	37																
37		Montáž I-nosníků	34,5 hodin	5.7. 17	11.7. 17	36	38																
38		Montáž OSB desek	10 hodin	11.7. 17	12.7. 17	37	39																
39		Montáž kontralatí	8 hodin	12.7. 17	13.7. 17	38	40																
40		Montáž latí	34,5 hodin	13.7. 17	19.7. 17	39	41																

Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	červen															
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P			
41		Střešní krytina	10 hodin	19.7. 17	21.7. 17	40	42SS;43SS;44SS																
42		Instalace solárních panelů	15 hodin	19.7. 17	21.7. 17	41SS	43																
43		Osazení oken	6 hodin	21.7. 17	24.7. 17	42;41SS	44																
44		Osazení dveří	1 hodina	24.7. 17	24.7. 17	43;41SS	45																
45		Montáž garážových v	2 hodin	24.7. 17	24.7. 17	44	46																
46		Vyplnění instalační mezery TI	10 hodin	24.7. 17	26.7. 17	45	47																
47		Osazení OSB desek	30 hodin	26.7. 17	31.7. 17	46	48																
48		Vzduchotěsná izolace	30 hodin	31.7. 17	4.8. 17	47	49																
49		Rozvody voda	25 hodin	4.8. 17	9.8. 17	48	50SS;51SS																
50		Kanalizace	21,5 hodin	4.8. 17	9.8. 17	49SS	51																

Projekt: BP harmless
Datum: 27.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	červen																	
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P					
51		Vytápění	34 hodin	9.8. 17	15.8. 17	50;49SS	52																		
52		Rozvody elektřina	5 hodin	15.8. 17	16.8. 17	51	53SS																		
53		Rozvody VZT	10 hodin	15.8. 17	16.8. 17	52SS	54																		
54		Vnitřní omítka	63 hodin	16.8. 17	28.8. 17	53	55SS																		
55		Keramické obklady koupelna + WC	7 hodin	16.8. 17	17.8. 17	54SS	56																		
56		Hydroizolace	34,7 hodin	17.8. 17	24.8. 17	55	57																		
57		Cementová mazanina	48 hodin	24.8. 17	1.9. 17	56	58																		
58		Lehká plovoucí podlaha	42 hodin	1.9. 17	8.9. 17	57	59																		
59		Kompletace sanita	3,75 hodin	8.9. 17	8.9. 17	58	60																		
60		Zkouška vodovodu	2 hodin	8.9. 17	11.9. 17	59	61SS																		

Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17

- Úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Rozdělení Ruční souhrn
- Milník Pouze zahájení
- Souhrnný Pouze s datem dokončení
- Souhrn projektu Vnější úkoly
- Neaktivní úkol Vnější milník
- Neaktivní milník Konečný termín
- Neaktivní souhrn Průběh
- Ruční úkol Průběh ručně zadaného úkolu
- Pouze s dobou trvání

ID	i	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci													červen Č P		
									N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S				
61			Zkouška kanalizace	2 hodin	8.9. 17	11.9. 17	60SS	62															
62			Zkouška vzduchotěsnosti	2 hodin	11.9. 17	11.9. 17	61	63															
63			Kompletace elektro	2 hodin	11.9. 17	11.9. 17	62	64															
64			Malířské práce	15,82 hodin	11.9. 17	13.9. 17	63	65															
65			Zkouška topení	8 hodin	13.9. 17	14.9. 17	64	66															
66			Montáž dveřních kříd	0,8 hodin	14.9. 17	14.9. 17	65	67															
67			Montáž prahů	1,5 hodin	14.9. 17	14.9. 17	66	68															
68			Zábradlí	2 hodin	14.9. 17	15.9. 17	67	69															
69			Čištění objektu	30 hodin	15.9. 17	20.9. 17	68	70															
70			Montáž tepelné izolace	45 hodin	20.9. 17	28.9. 17	69	71															


Projekt: BP harmless
Datum: 27.5. 17




















Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci													červen								
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P								
71		Montáž fasády	32 hodin	28.9. 17	4.10. 17	70	72																					
72		Soklový obklad	21 hodin	4.10. 17	9.10. 17	71	73																					
73		Klempířské práce	4,3 hodin	9.10. 17	9.10. 17	72	74																					
74		Hromosvod	0,6 hodin	9.10. 17	9.10. 17	73	75																					
75		Demontáž zařízení staveniště	8 hodin	9.10. 17	10.10. 17	74	76																					
76		Dláždění chodníku	26 hodin	10.10. 17	13.10. 17	75	77																					
77		Příjezdová cesta do garáže	8 hodin	13.10. 17	16.10. 17	76	78																					
78		Demontáž oplocení stavby	2,2 hodin	16.10. 17	17.10. 17	77	79																					
79		Úprava terénu + osetí	6 hodin	17.10. 17	17.10. 17	78	80																					
80		Vysazení keřů	4 hodin	17.10. 17	18.10. 17	79	81																					

Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17


Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	červen														
								N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P		
81		Předání stavby	1 hodina	18.10. 17	18.10. 17	80																


Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

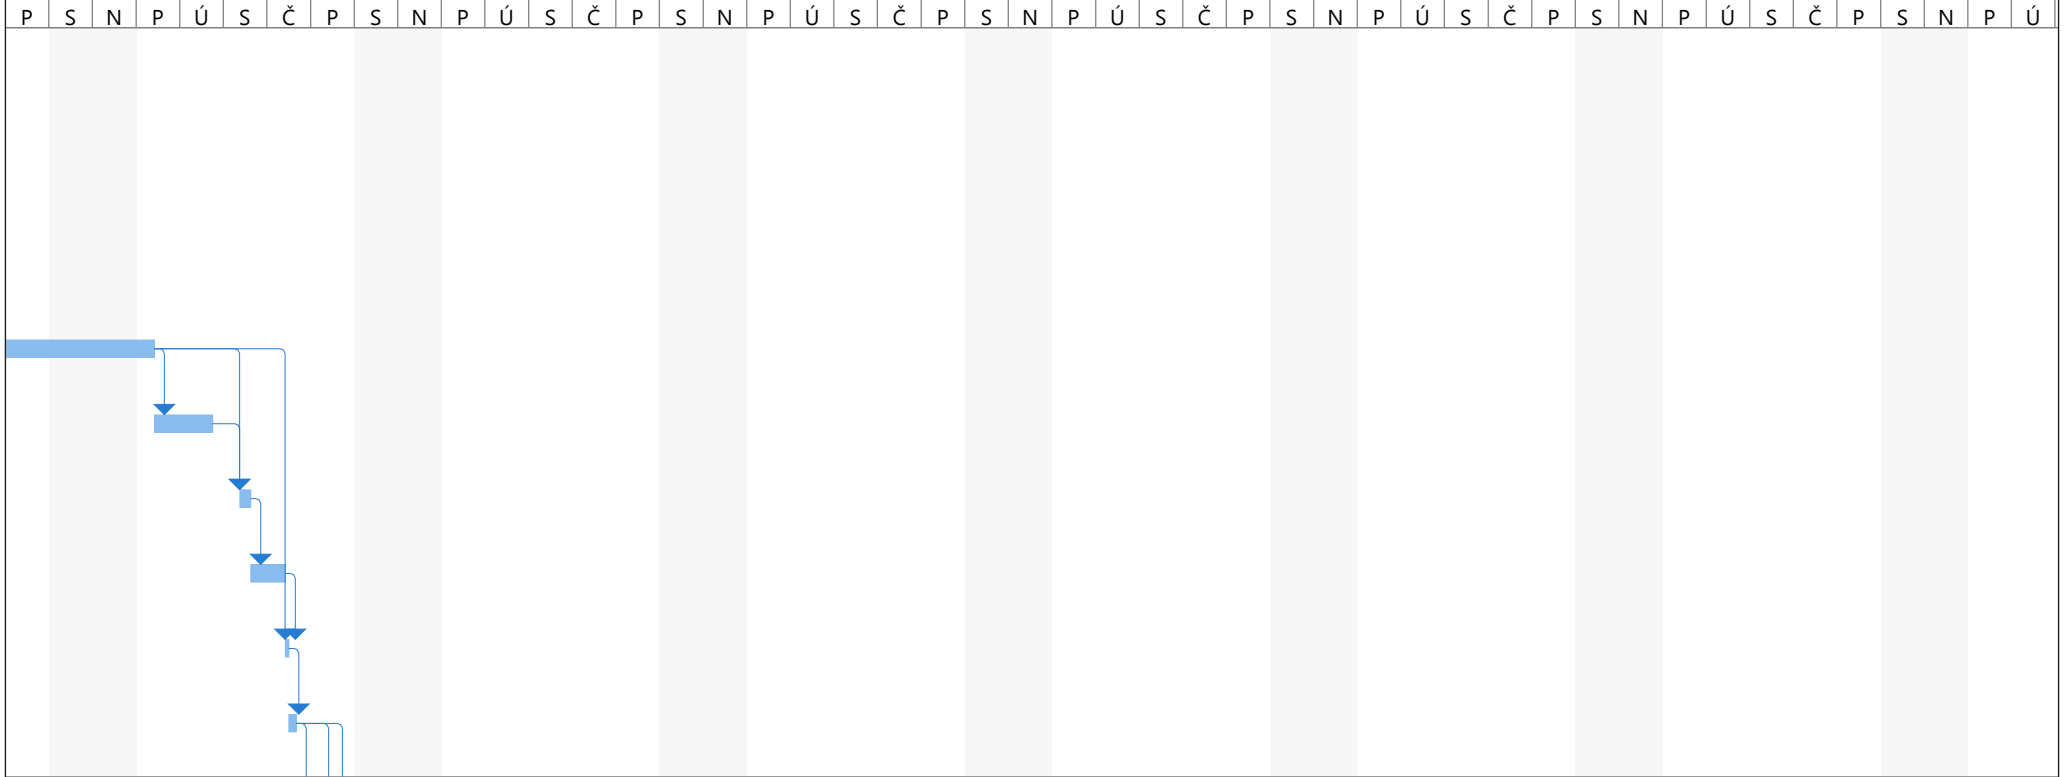


Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

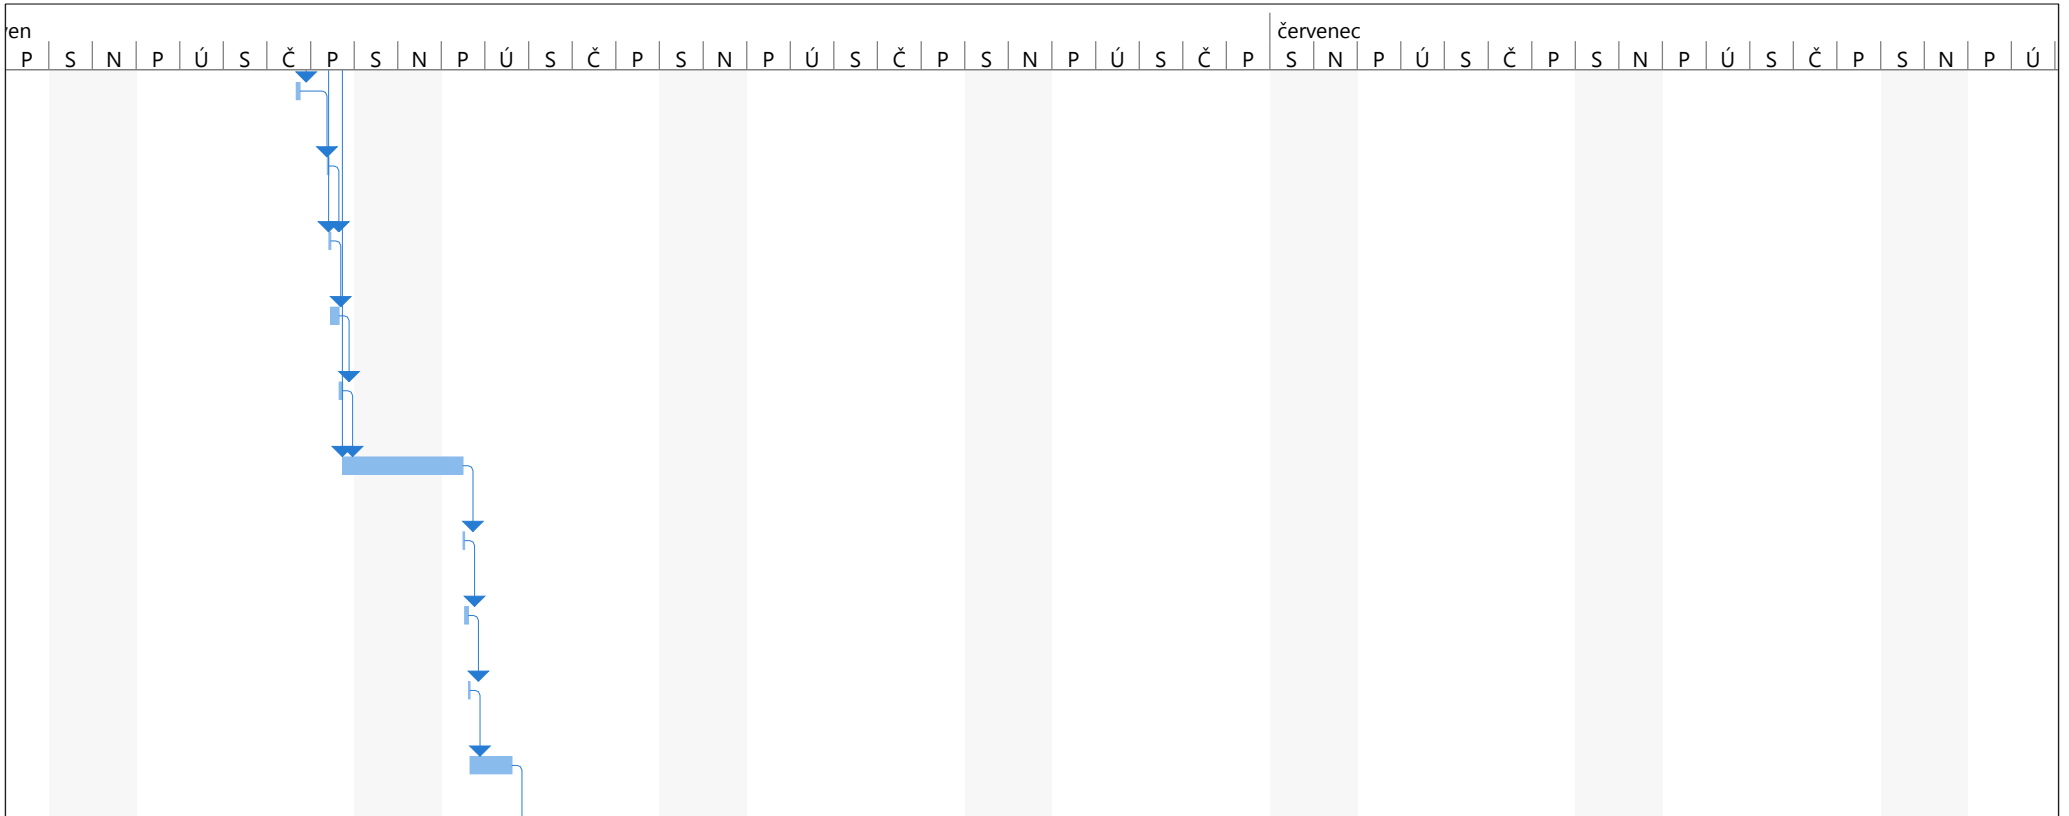


Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkol	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

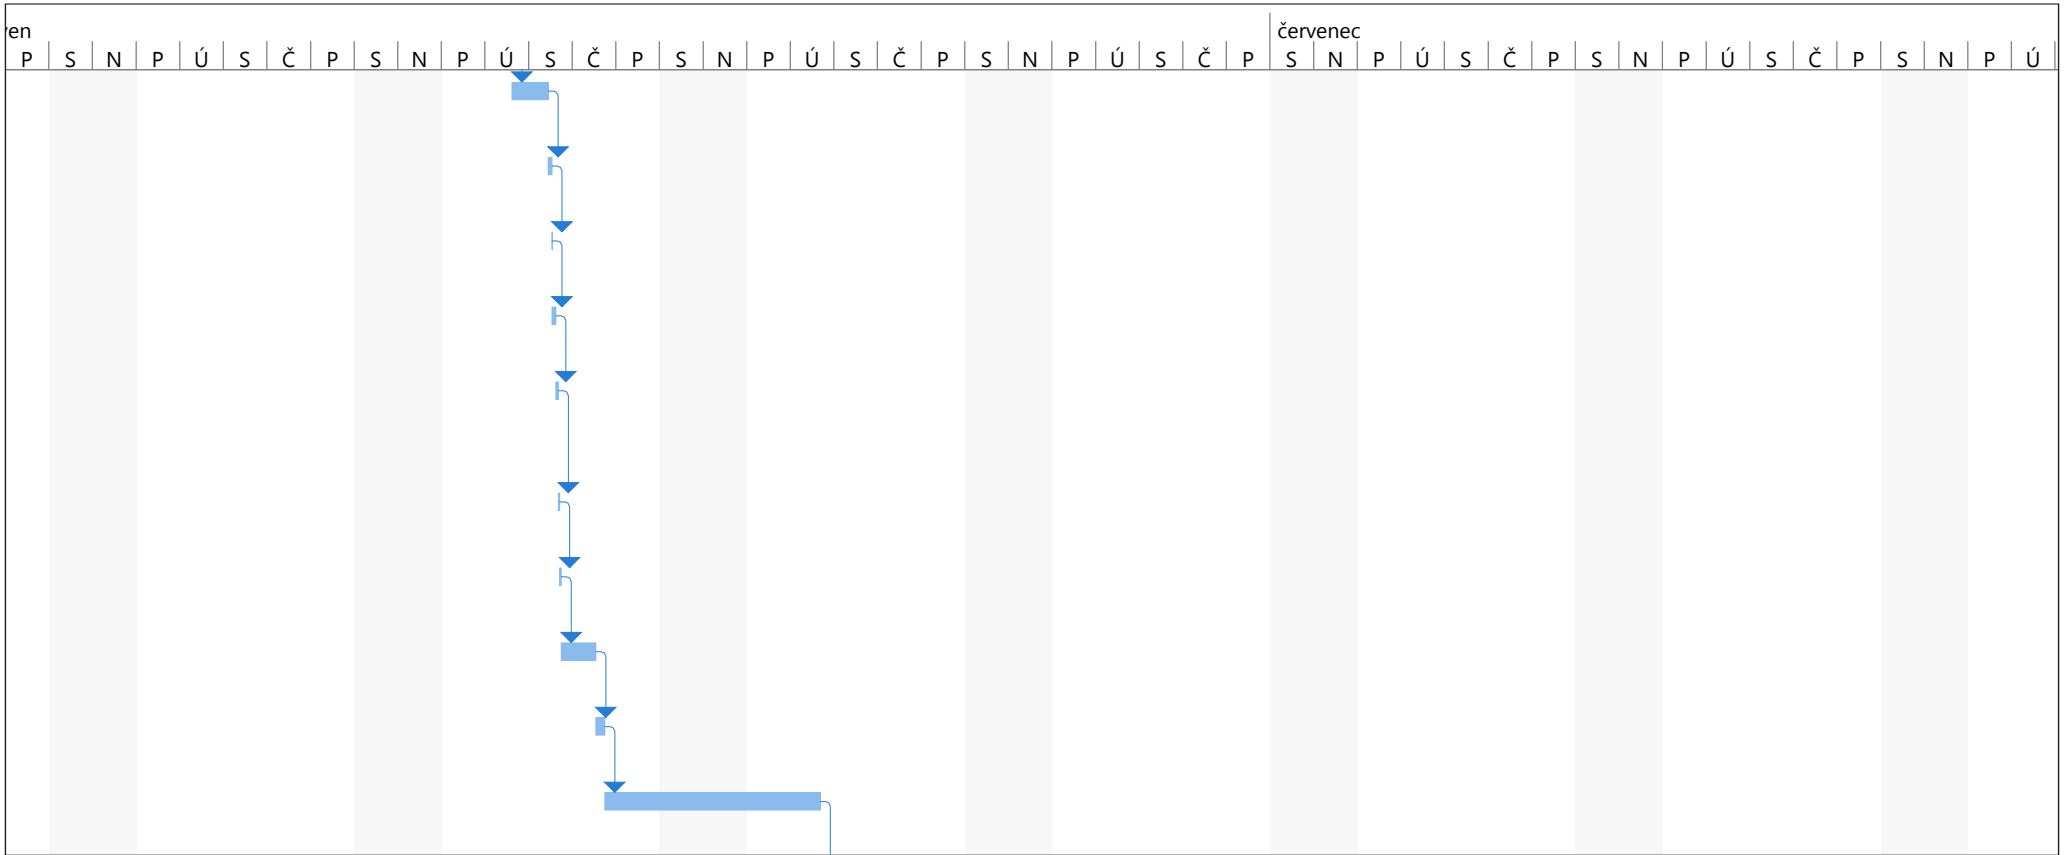


Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

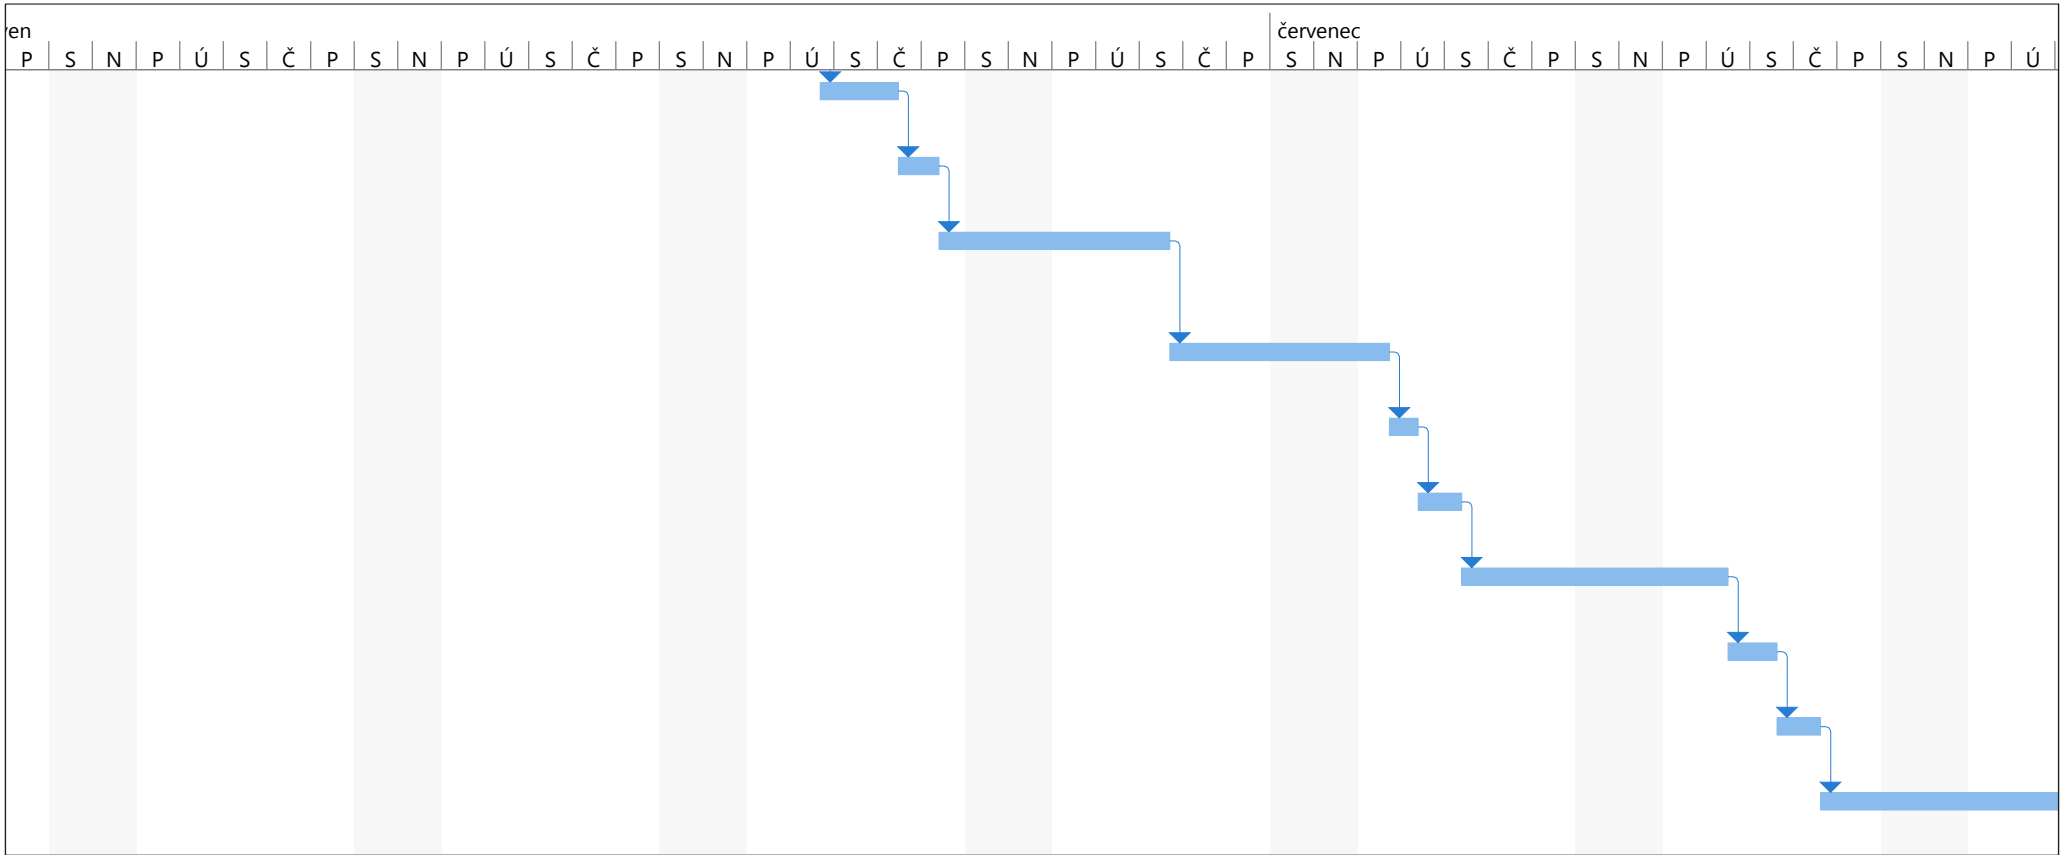

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkol	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

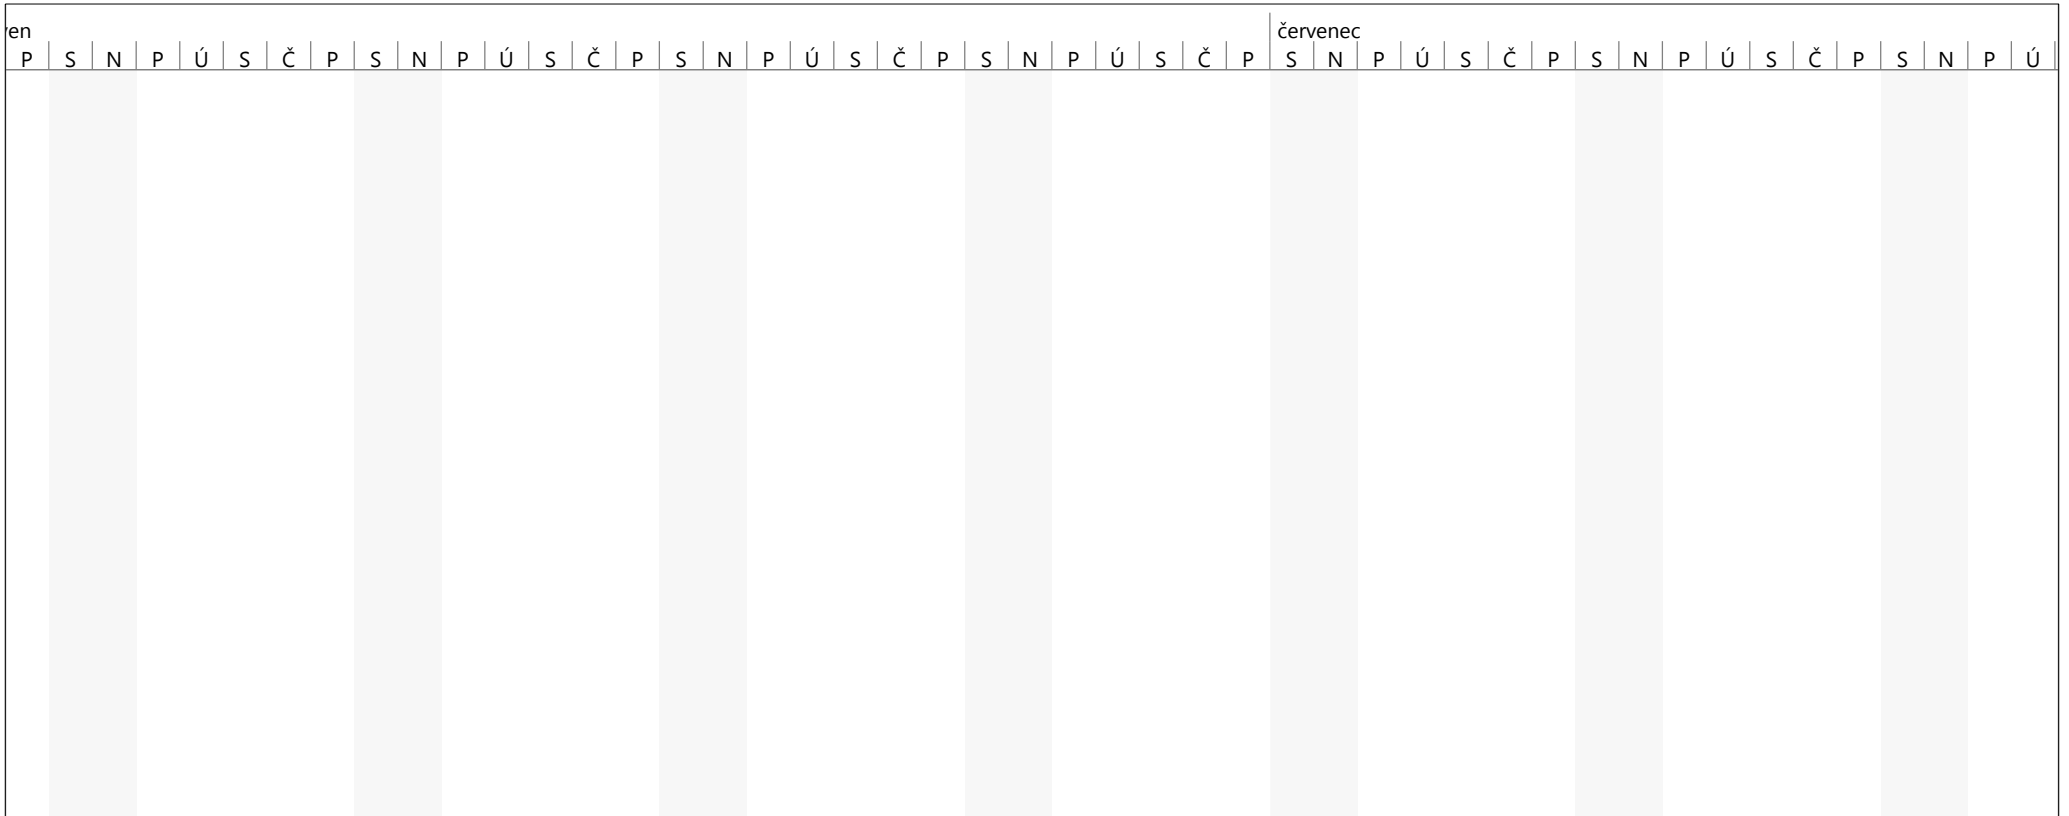


Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkol	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

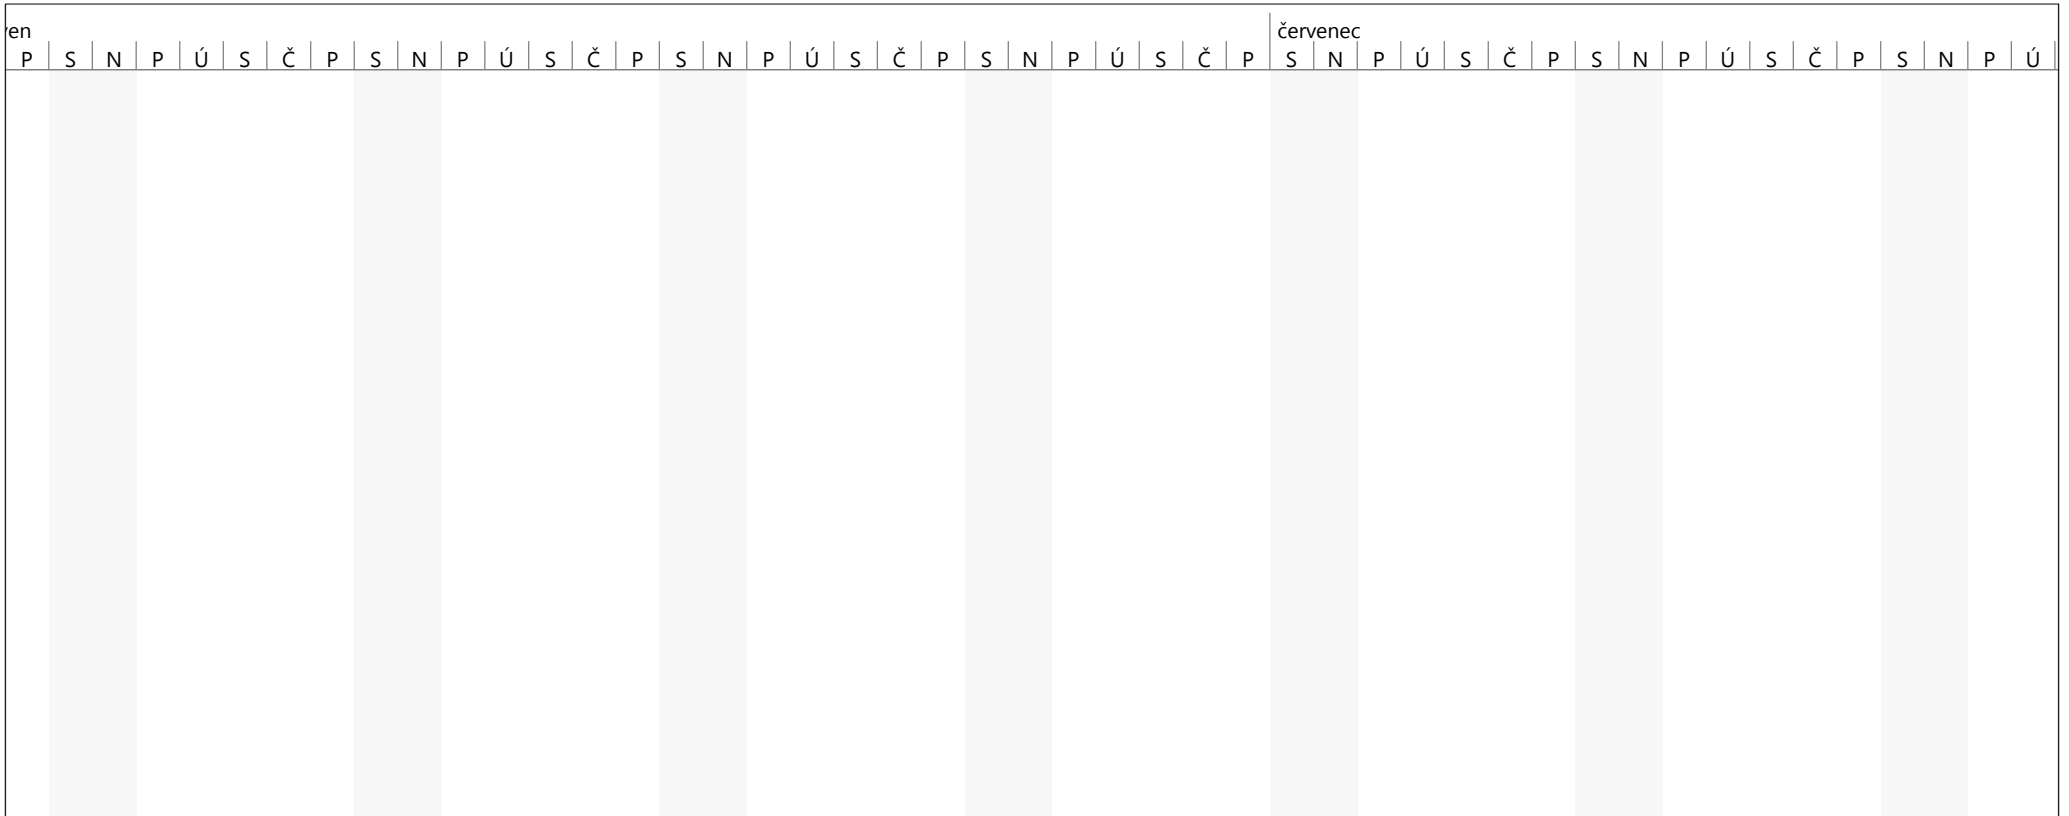

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkol	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

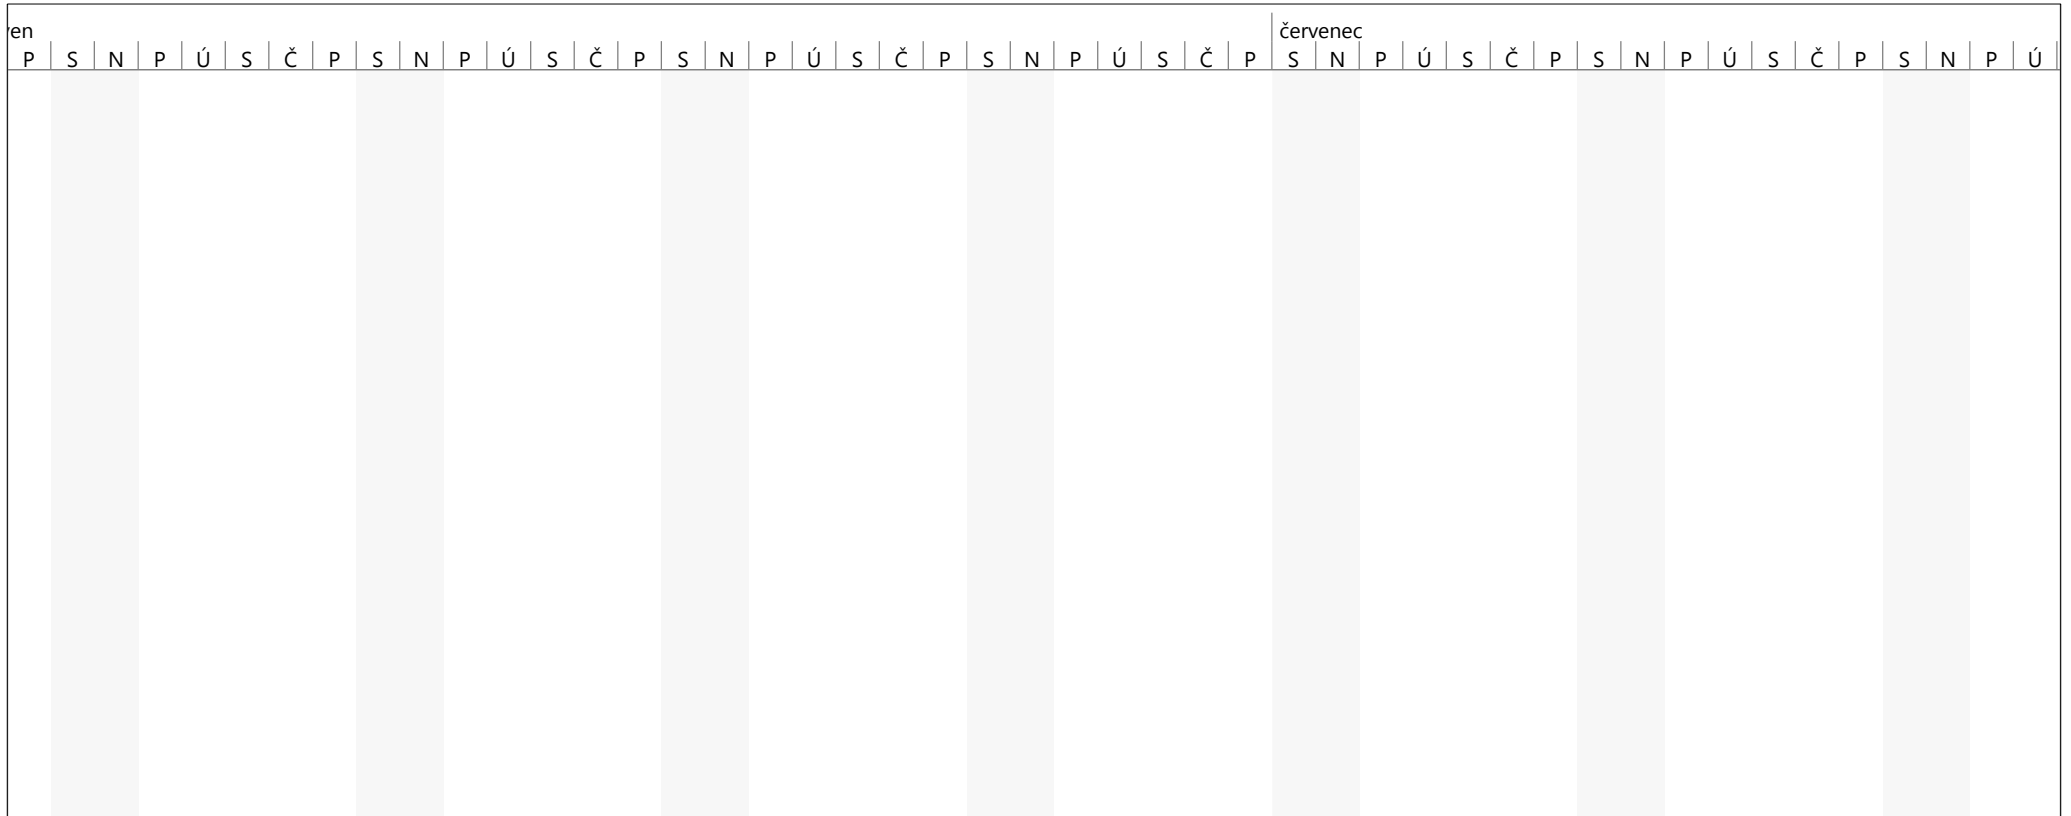

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			


P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkol	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			




Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17


Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

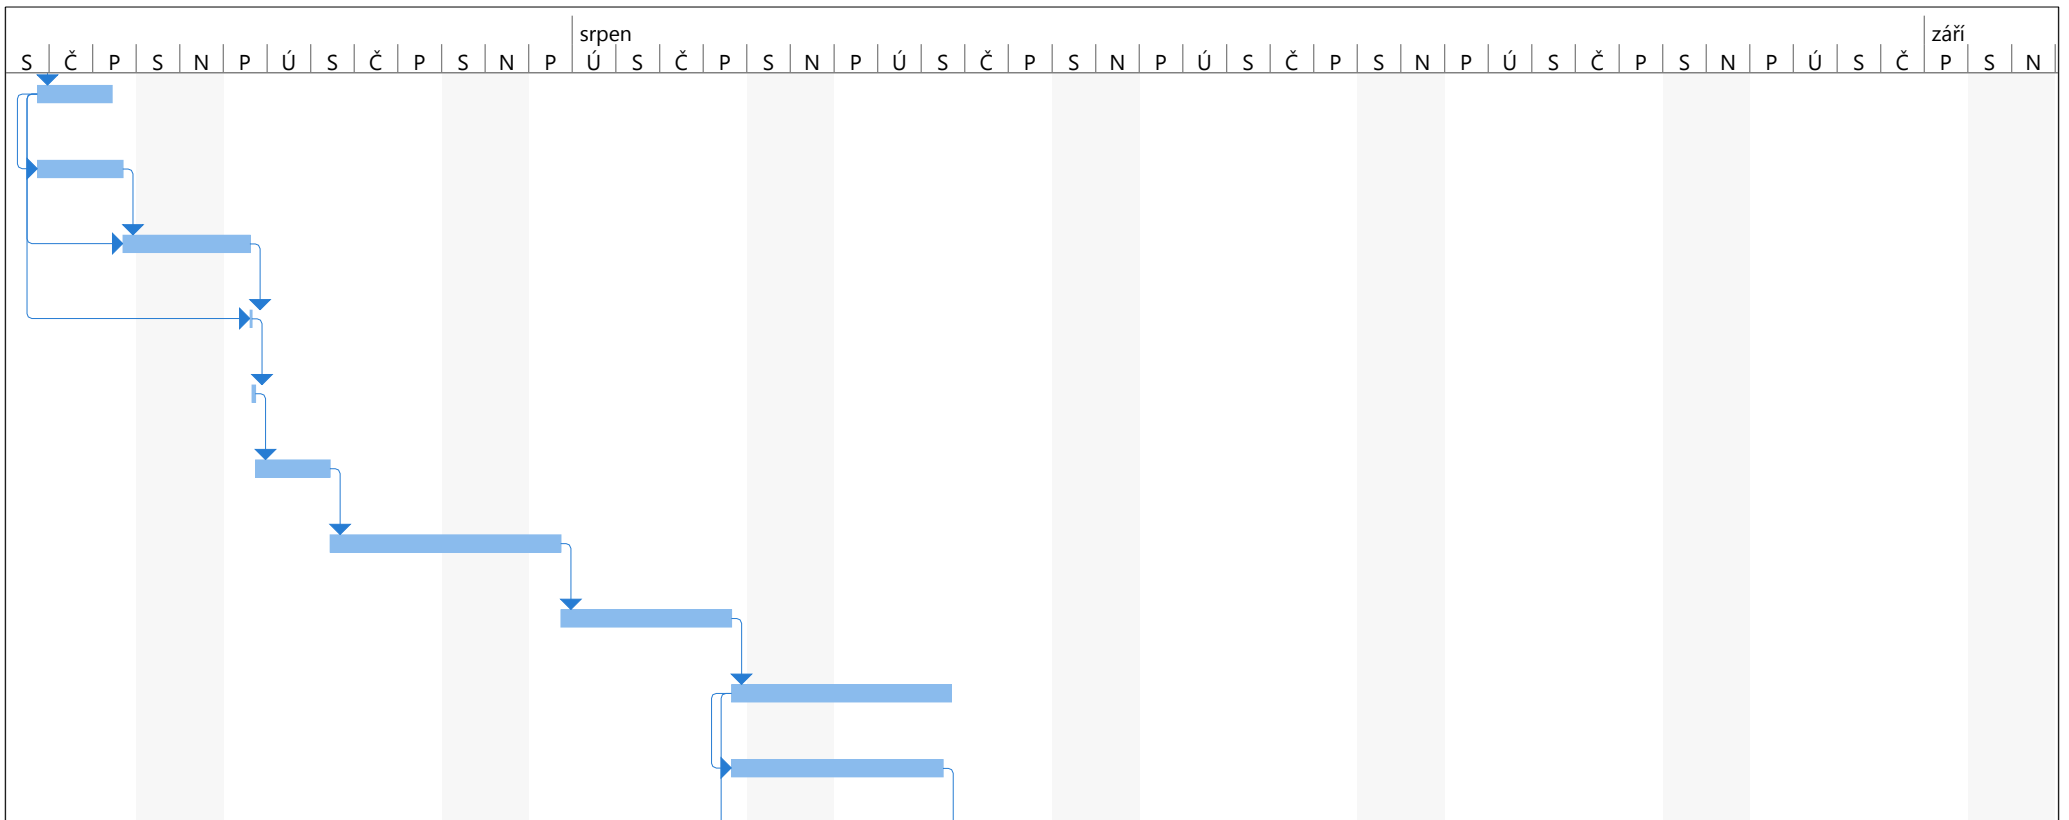

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

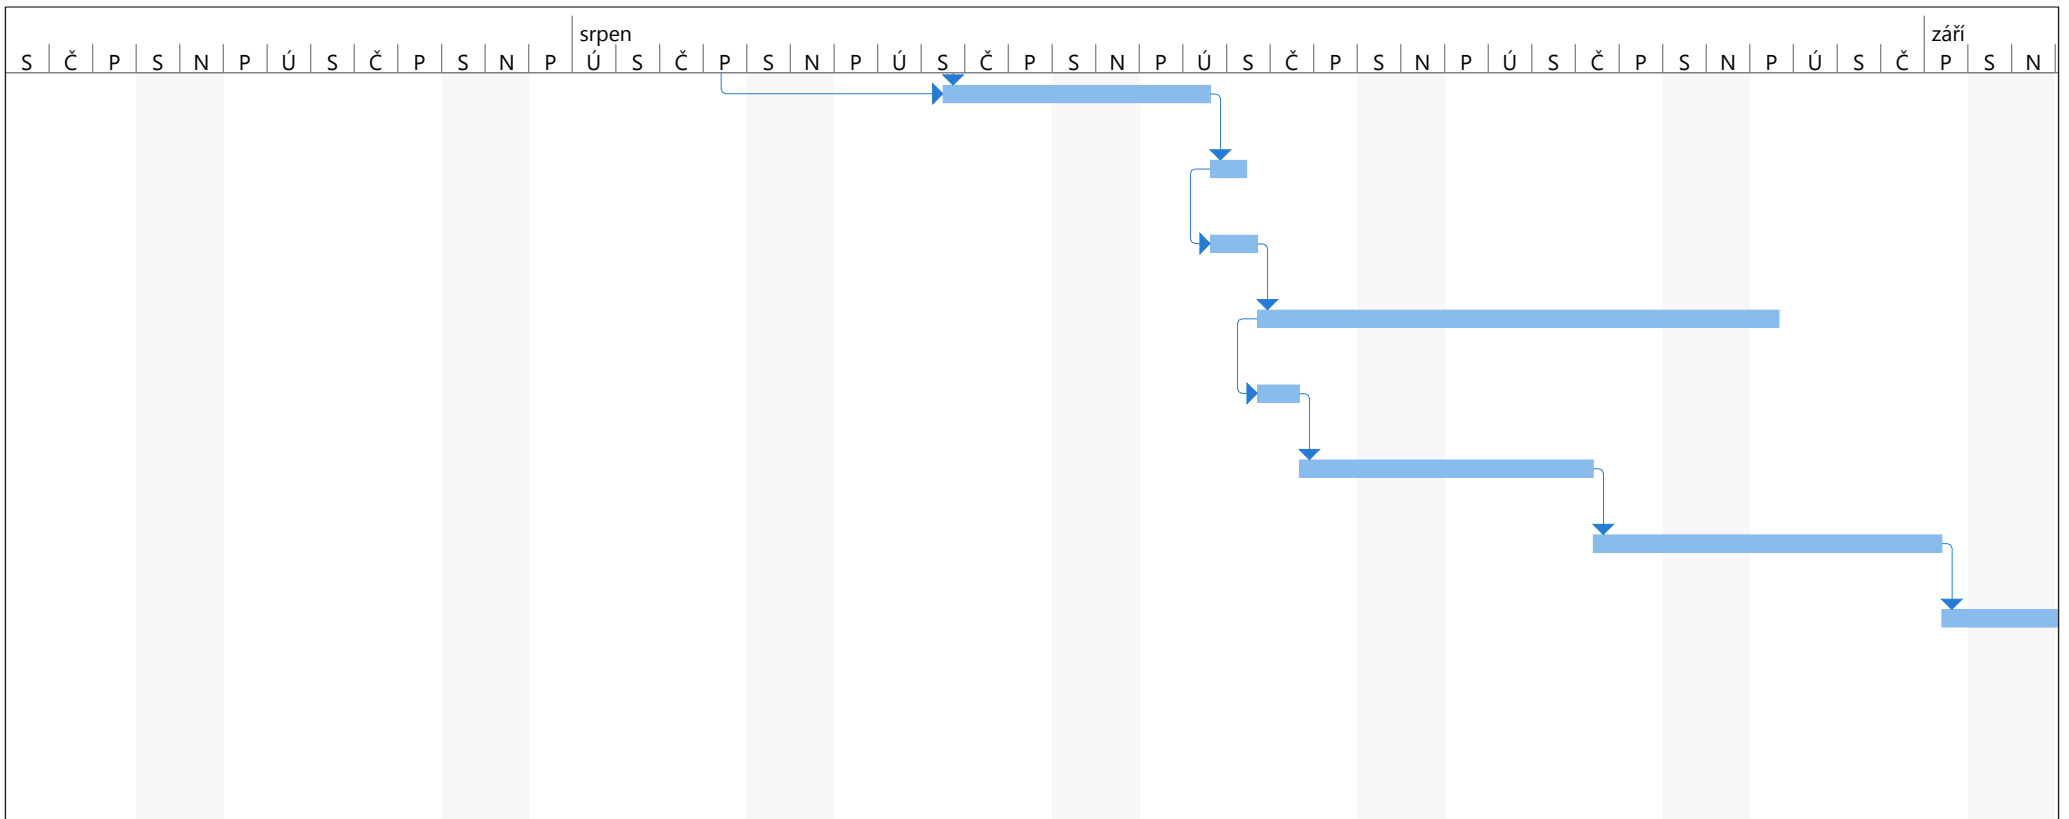


Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkol	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			




Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkol	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

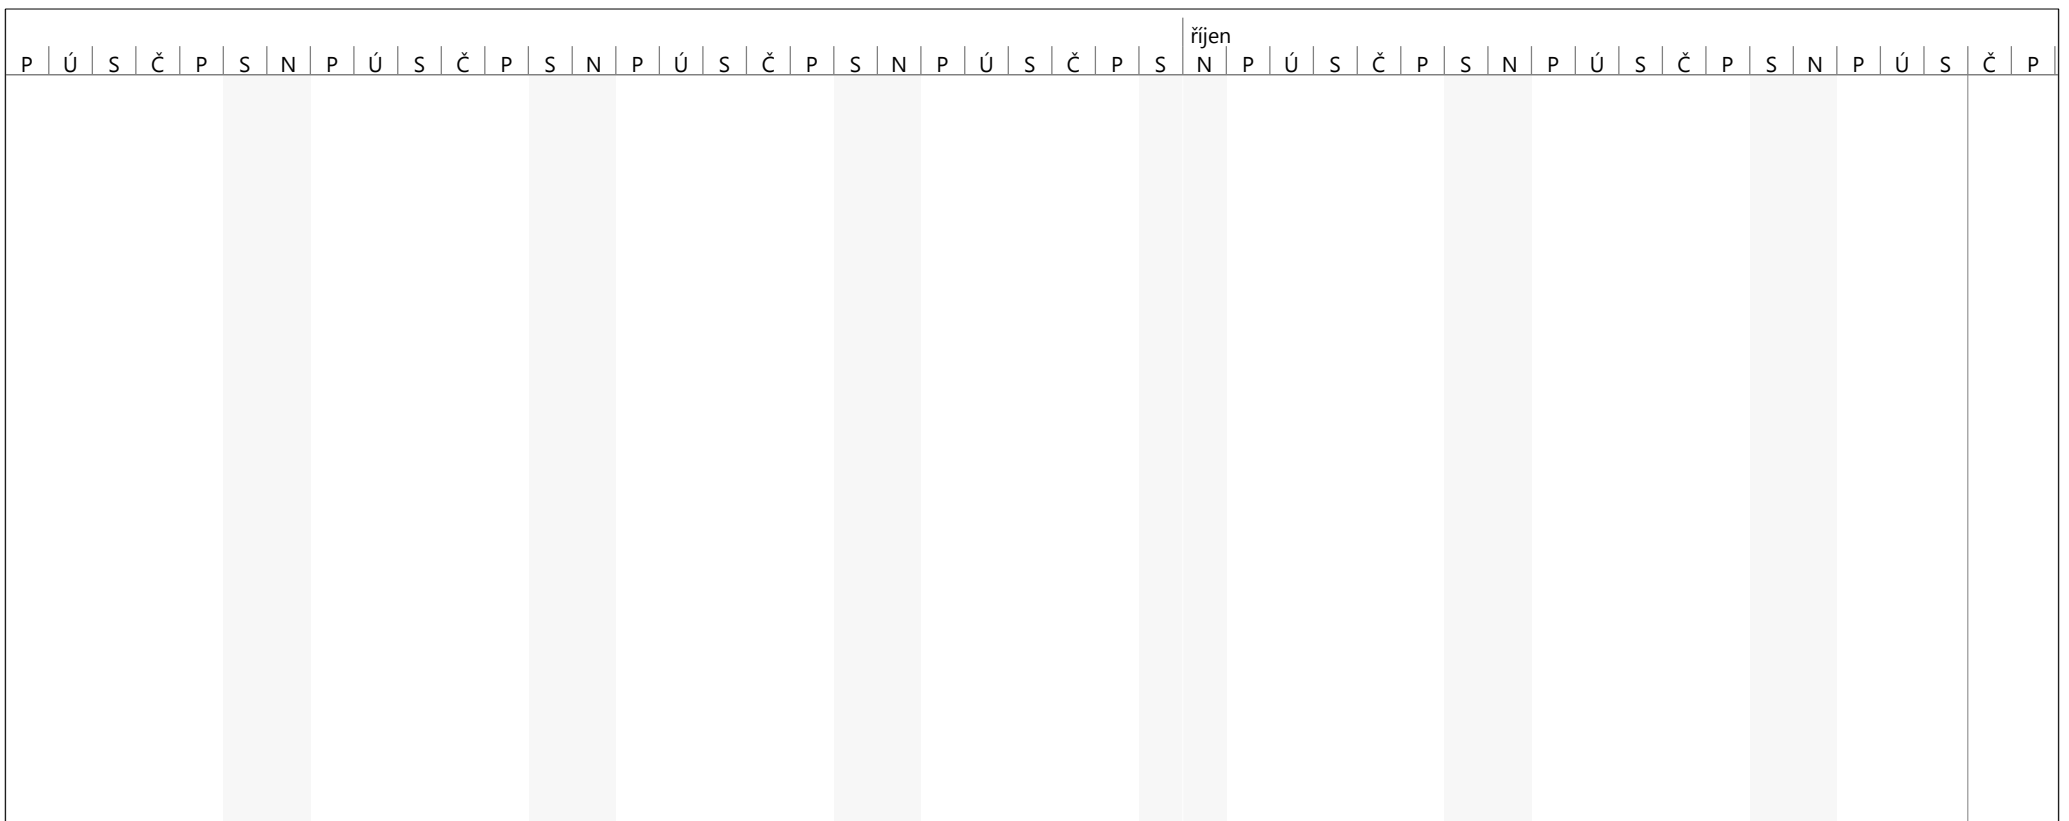

Projekt: BP harmless Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

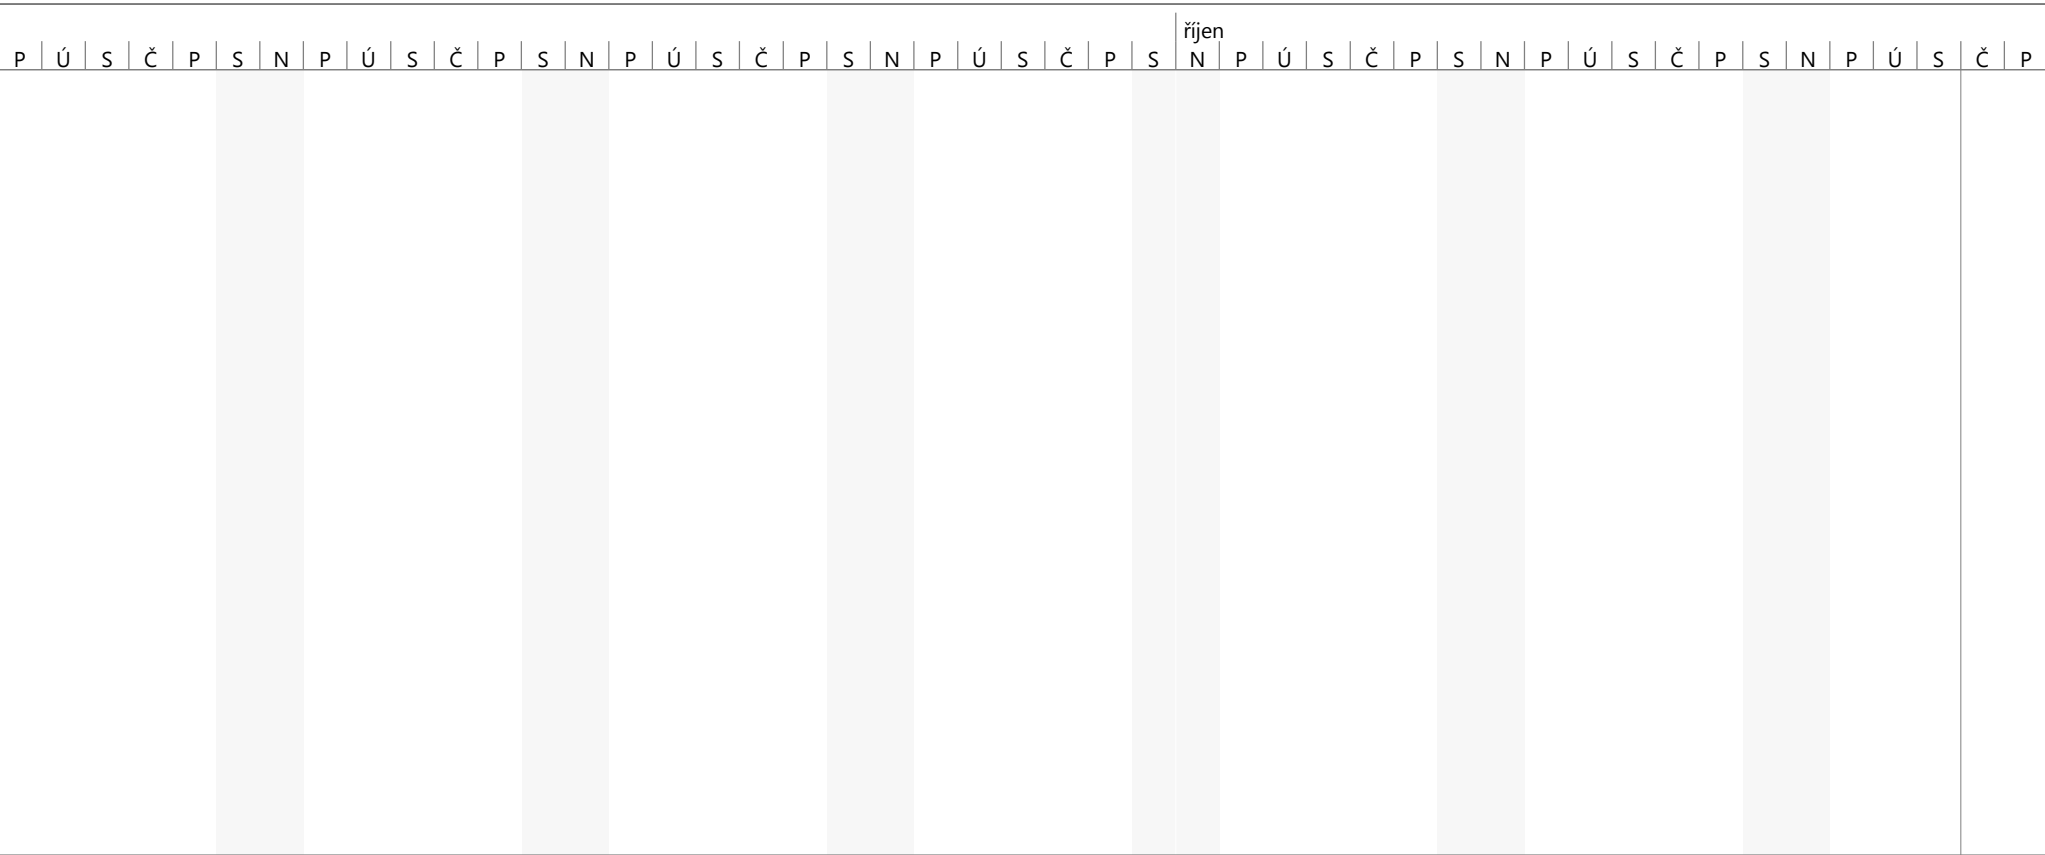

Projekt: BP harmless
Datum: 27.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



<p>Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17</p>	<p>Úkol </p> <p>Rozdělení </p> <p>Milník </p> <p>Souhrnný </p> <p>Souhrn projektu </p> <p>Neaktivní úkol </p> <p>Neaktivní milník </p> <p>Neaktivní souhrn </p> <p>Ruční úkol </p> <p>Pouze s dobou trvání </p>	<p> Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu</p> <p> Ruční souhrn</p> <p> Pouze zahájení</p> <p> Pouze s datem dokončení</p> <p> Vnější úkoly</p> <p> Vnější milník</p> <p> Konečný termín</p> <p> Průběh</p> <p> Průběh ručně zadaného úkolu</p> <p></p>
--	---	---




Projekt: BP harmless Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			




Projekt: BP harmous
Datum: 27.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

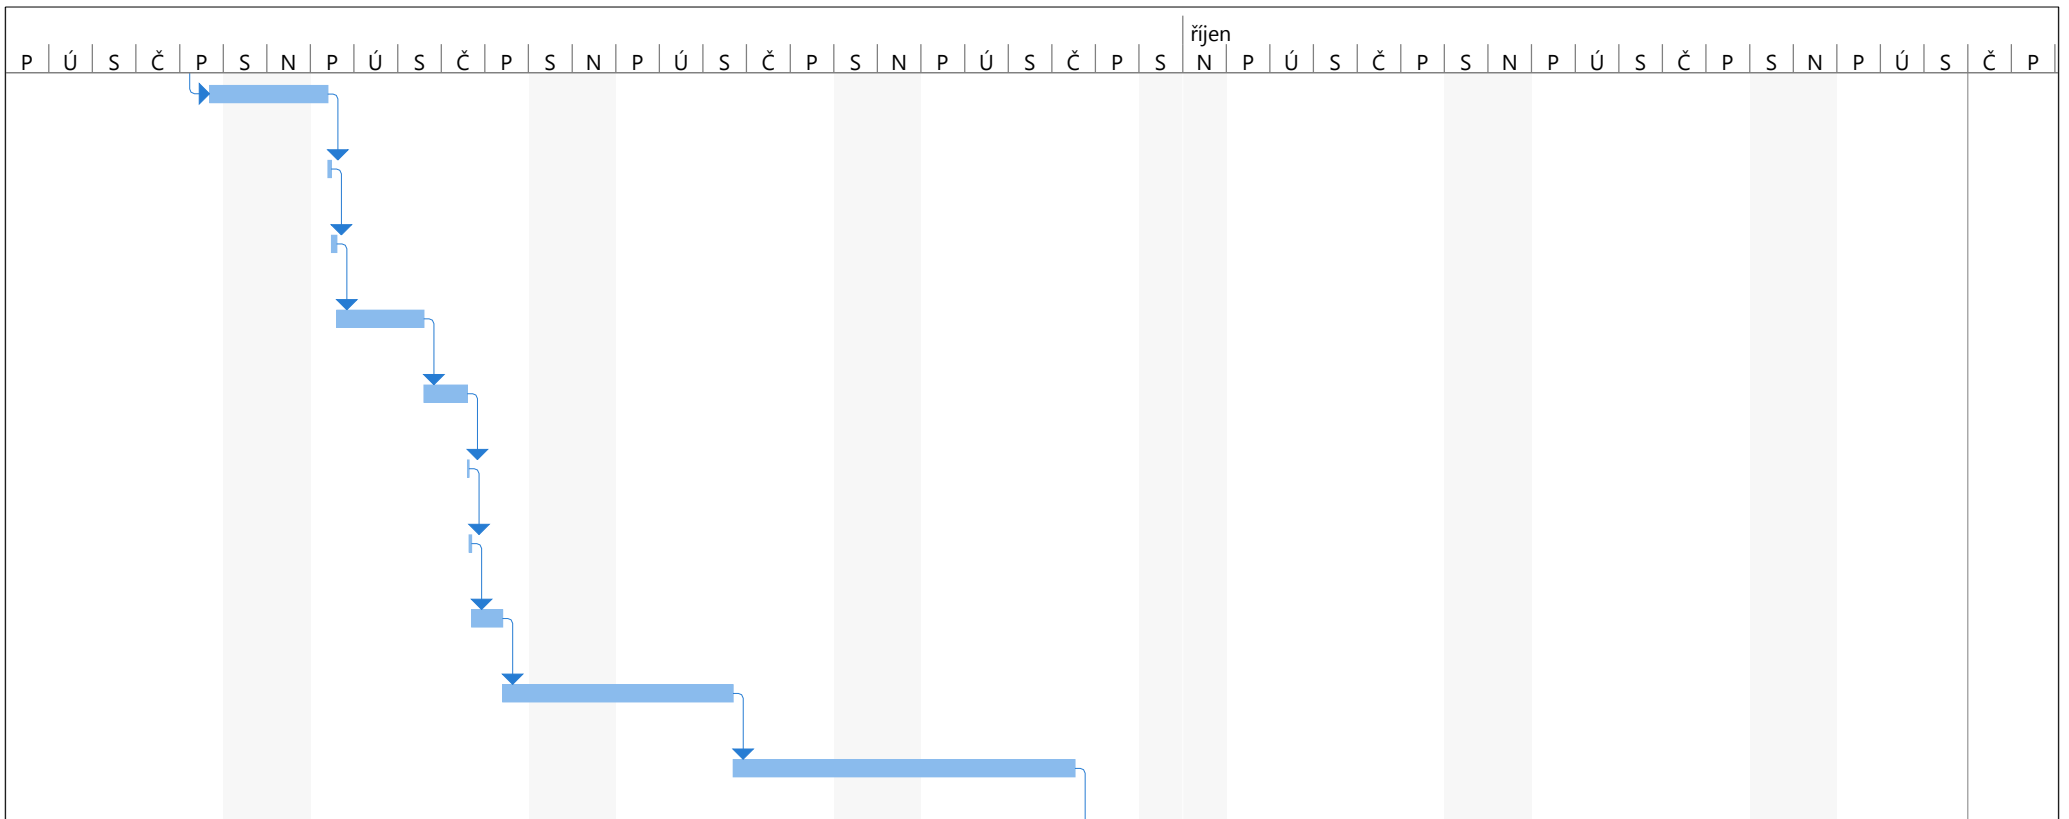

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

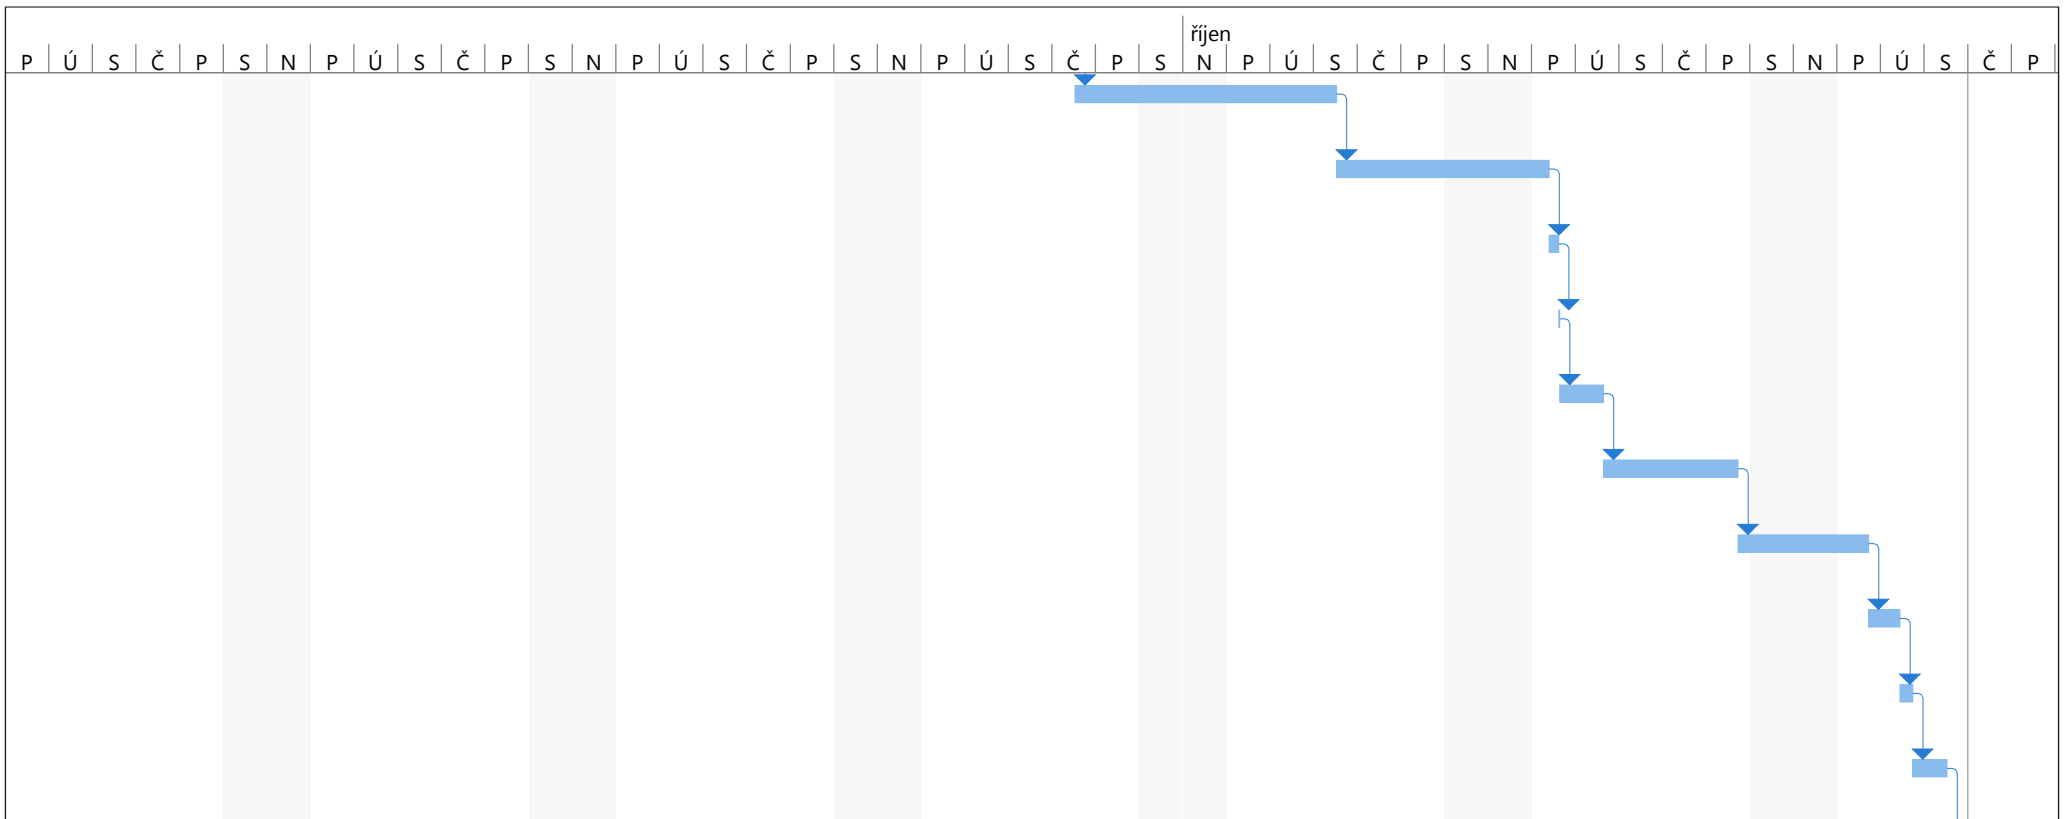

Projekt: BP harmous Datum: 27.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

