

**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra technologie staveb**



**DIPLOMOVÁ PRÁCE
Stavebně technologický projekt –
Bytový dům – Prosek I – B1-B2**

4. Řešení časové struktury

**Bc. Karolína Pechlátová
2019**

Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico



Obsah

- 4.1 ČASOPROSTOROVÝ GRAF vč. grafu nasazení pracovníků a vybraných strojů
- 4.2 HARMONOGRAM (5 stran)







Table with columns for ID, Název úkolu, Doba trvání, Začátek, Dokončení, Přeběhy, Následí, and Názy zámě. It lists various construction tasks such as 'Provedení stoupačho potrubí - voda-hydrant' and 'Osazení oken' across multiple dates from 2019 to 2022.



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přechůběž	Následníci	Název zprávy
657	Demontáž lešení	5 dny	22.07.21	28.07.21	656		Lešení
658	Demontáž stavebního výstupu	1 den	01.03.22	01.03.22	608,602	647	Specialisté na stavební výtah
659	INFASÁDA B2	39 dny	28.02.22	22.04.22			
660	Provedení svléké izolace suterénu z SBS modif. asfaltových pásů	1 den	11.04.22	11.04.22	270	661	Hydroizolace
661	Provedení tepelné izolace suterénu z extrudovaného polystyrenu tl. 120mm lepením	1 den	12.04.22	12.04.22	660	662	Tepelné izolace
662	Provedení síťové omítky	1 den	13.04.22	13.04.22	661	663	Specialisté na ETICS
663	Provedení hutného zášypu stěn suterénu	6 dny	14.04.22	22.04.22	662		Pomocné pracovní síly
664	Montáž lešení	9 dny	28.02.22	10.03.22	247	665	Lešení
665	Provedení tepelné izolace z mineralních vláken tl. 160mm (vč. kotvení)	10 dny	11.03.22	24.03.22	664	666	Specialisté na ETICS
666	Osazení vnitřních parapetů	2 dny	25.03.22	28.03.22	665	667	Klíč
667	Montážbleskovodu	1 den	29.03.22	29.03.22	666	668	Specialisté - elektro
668	Provedení svodného dešťového potrubí	2 dny	30.03.22	31.03.22	667	669	Specialisté - voda, kanalizace
669	Provedení vnější omítky (vč. stěrky s tkaninou)	6 dny	01.04.22	08.04.22	668	670	Specialisté na ETICS
670	Demontáž lešení	4 dny	11.04.22	14.04.22	669	673,694,685	Lešení
671	Demontáž stavebního výstupu	1 den	01.03.22	01.03.22	608,602		Specialisté na stavební výtah
672	PŘÍPOJKY SÍŤ - RETENČNÍ NÁDRŽ	32 dny	15.04.22	31.05.22			
673	Vytváření vnitřních objektů	1 den	15.04.22	15.04.22	670	674	Geočetl
674	Vytváření přípojok	2 dny	19.04.22	20.04.22	673	675,676	Geočetl
675	Mloubení základových jam (v hor.tř.3.)	1 den	21.04.22	21.04.22	674	68355	Mloubení základových jam - strojí
676	Provedení přípojky kanalizace splaškové	7 dny	21.04.22	29.04.22	674	677	Přípojka kanalizace
677	Provedení přípojky kanalizace dešťové	9 dny	02.05.22	12.05.22	676	678	Přípojka kanalizace
678	Provedení přípojky horkovodu	2 dny	13.05.22	16.05.22	677	679	Přípojka horkovodu
679	Provedení přípojky vodovodu	6 dny	17.05.22	24.05.22	678	680	Přípojka vodovodu
680	Provedení přípojky silnoproudu	2 dny	25.05.22	26.05.22	679	681	Přípojka elektro (B,S,L)
681	Provedení přípojky slaboproudu	1 den	27.05.22	27.05.22	680	682	Přípojka elektro (B,S,L)
682	Zášyp jam a rýh	2 dny	30.05.22	31.05.22	681		Pomocné pracovní síly
683	Uložení výkopku na skládku	2 dny	21.04.22	22.04.22	67555		Pomocné pracovní síly
684	OKOLI	279 dny	26.08.21	23.09.22			
685	Chodníky a stání z betonové dlažby	9 dny	03.08.22	15.08.22	670,694,556	686	Dlaždič
686	Chodník mlátový/štěrkový	6 dny	16.08.22	23.08.22	685	687	Pomocné pracovní síly
687	Kryt rampy betonový	1 den	24.08.22	24.08.22	686	689	Pomocné pracovní síly
688	Montáž vjezdových vrat do suterénu	1 den	26.08.21	26.08.21	469		Zámečnick
689	Rozpoštění omeze	13 dny	25.08.22	08.09.22	687	690	Pomocné pracovní síly
690	Osazení ostatního vybavení	2 dny	09.09.22	12.09.22	689	691	Zámečnick
691	Sádové úpravy	2 dny	13.09.22	14.09.22	690	692	Zahradnick
692	Závěrečné terénní úpravy	2 dny	15.09.22	16.09.22	691	693	Zahradnick
693	Zátravní	1 den	19.09.22	19.09.22	692	695	Zahradnick
694	Odstranění zařízení staveniště (1/2)	4 dny	15.04.22	21.04.22	670	695,685	Zařízení staveniště
695	Odstranění zařízení staveniště (2/2)	4 dny	20.09.22	23.09.22	694,693		Zařízení staveniště
696	REVIZE A ZÁKLUČKY B1	159 dny	21.07.21	02.08.22			
697	Revize - Mař	1 den	22.07.21	22.07.21	376		Specialisté - elektro
698	Revize - VZT	1 den	21.07.21	21.07.21	375		Specialisté - vzduchotechnika
699	Revize - kanalizace	1 den	05.08.21	05.08.21	368		Specialisté - voda, kanalizace
700	Revize - vytápění	2 dny	06.08.21	08.08.21	368		Specialisté - vytápění
701	Revize - vodovod	1 den	07.09.21	07.09.21	370		Specialisté - voda, kanalizace
702	Revize - ES, ESL	2 dny	01.03.22	02.03.22	608		Specialisté - elektro
703	Revize - PBR	1 den	01.03.22	01.03.22	608		Specialisté - elektro
704	REVIZE A ZÁKLUČKY B2	132 dny	28.03.22	28.09.22			
705	Revize - Mař	1 den	28.03.22	28.03.22	455		Specialisté - elektro
706	Revize - VZT	1 den	25.05.22	25.05.22	454		Specialisté - vzduchotechnika
707	Revize - kanalizace	1 den	18.05.22	18.05.22	447		Specialisté - voda, kanalizace
708	Revize - vytápění	2 dny	20.05.22	31.05.22	448		Specialisté - vytápění
709	Revize - vodovod	1 den	25.05.22	25.05.22	449		Specialisté - voda, kanalizace
710	Revize - ES, ESL	2 dny	27.09.22	28.09.22	645		Specialisté - elektro
711	Revize - PBR	1 den	27.09.22	27.09.22	645		Specialisté - elektro
712	Úklid objektu B1	6 dny	01.03.22	08.03.22	608,602	715	Úklid
713	Úklid objektu B2	4 dny	27.09.22	30.09.22	645,639	719	Úklid
714	PŘEDÁNÍ OBJEKTU B1	15 dny	09.03.22	29.03.22			
715	Předání stavby B1	5 dny	09.03.22	15.03.22	712	716	Přidání stavby B1
716	Odstranění vad a nedodělků (B1)	5 dny	16.03.22	22.03.22	715	717	Odstranění vad a nedodělků (B1)
717	Finální předání stavby B1	5 dny	23.03.22	29.03.22	716		Finální předání stavby B1
718	PŘEDÁNÍ OBJEKTU B2	15 dny	03.10.22	21.10.22			
719	Předání stavby B2	5 dny	03.10.22	07.10.22	713	720	Přidání stavby B2
720	Odstranění vad a nedodělků (B2)	5 dny	10.10.22	14.10.22	719	721	Odstranění vad a nedodělků (B2)
721	Finální předání stavby B2	5 dny	17.10.22	21.10.22	720		Finální předání stavby B2

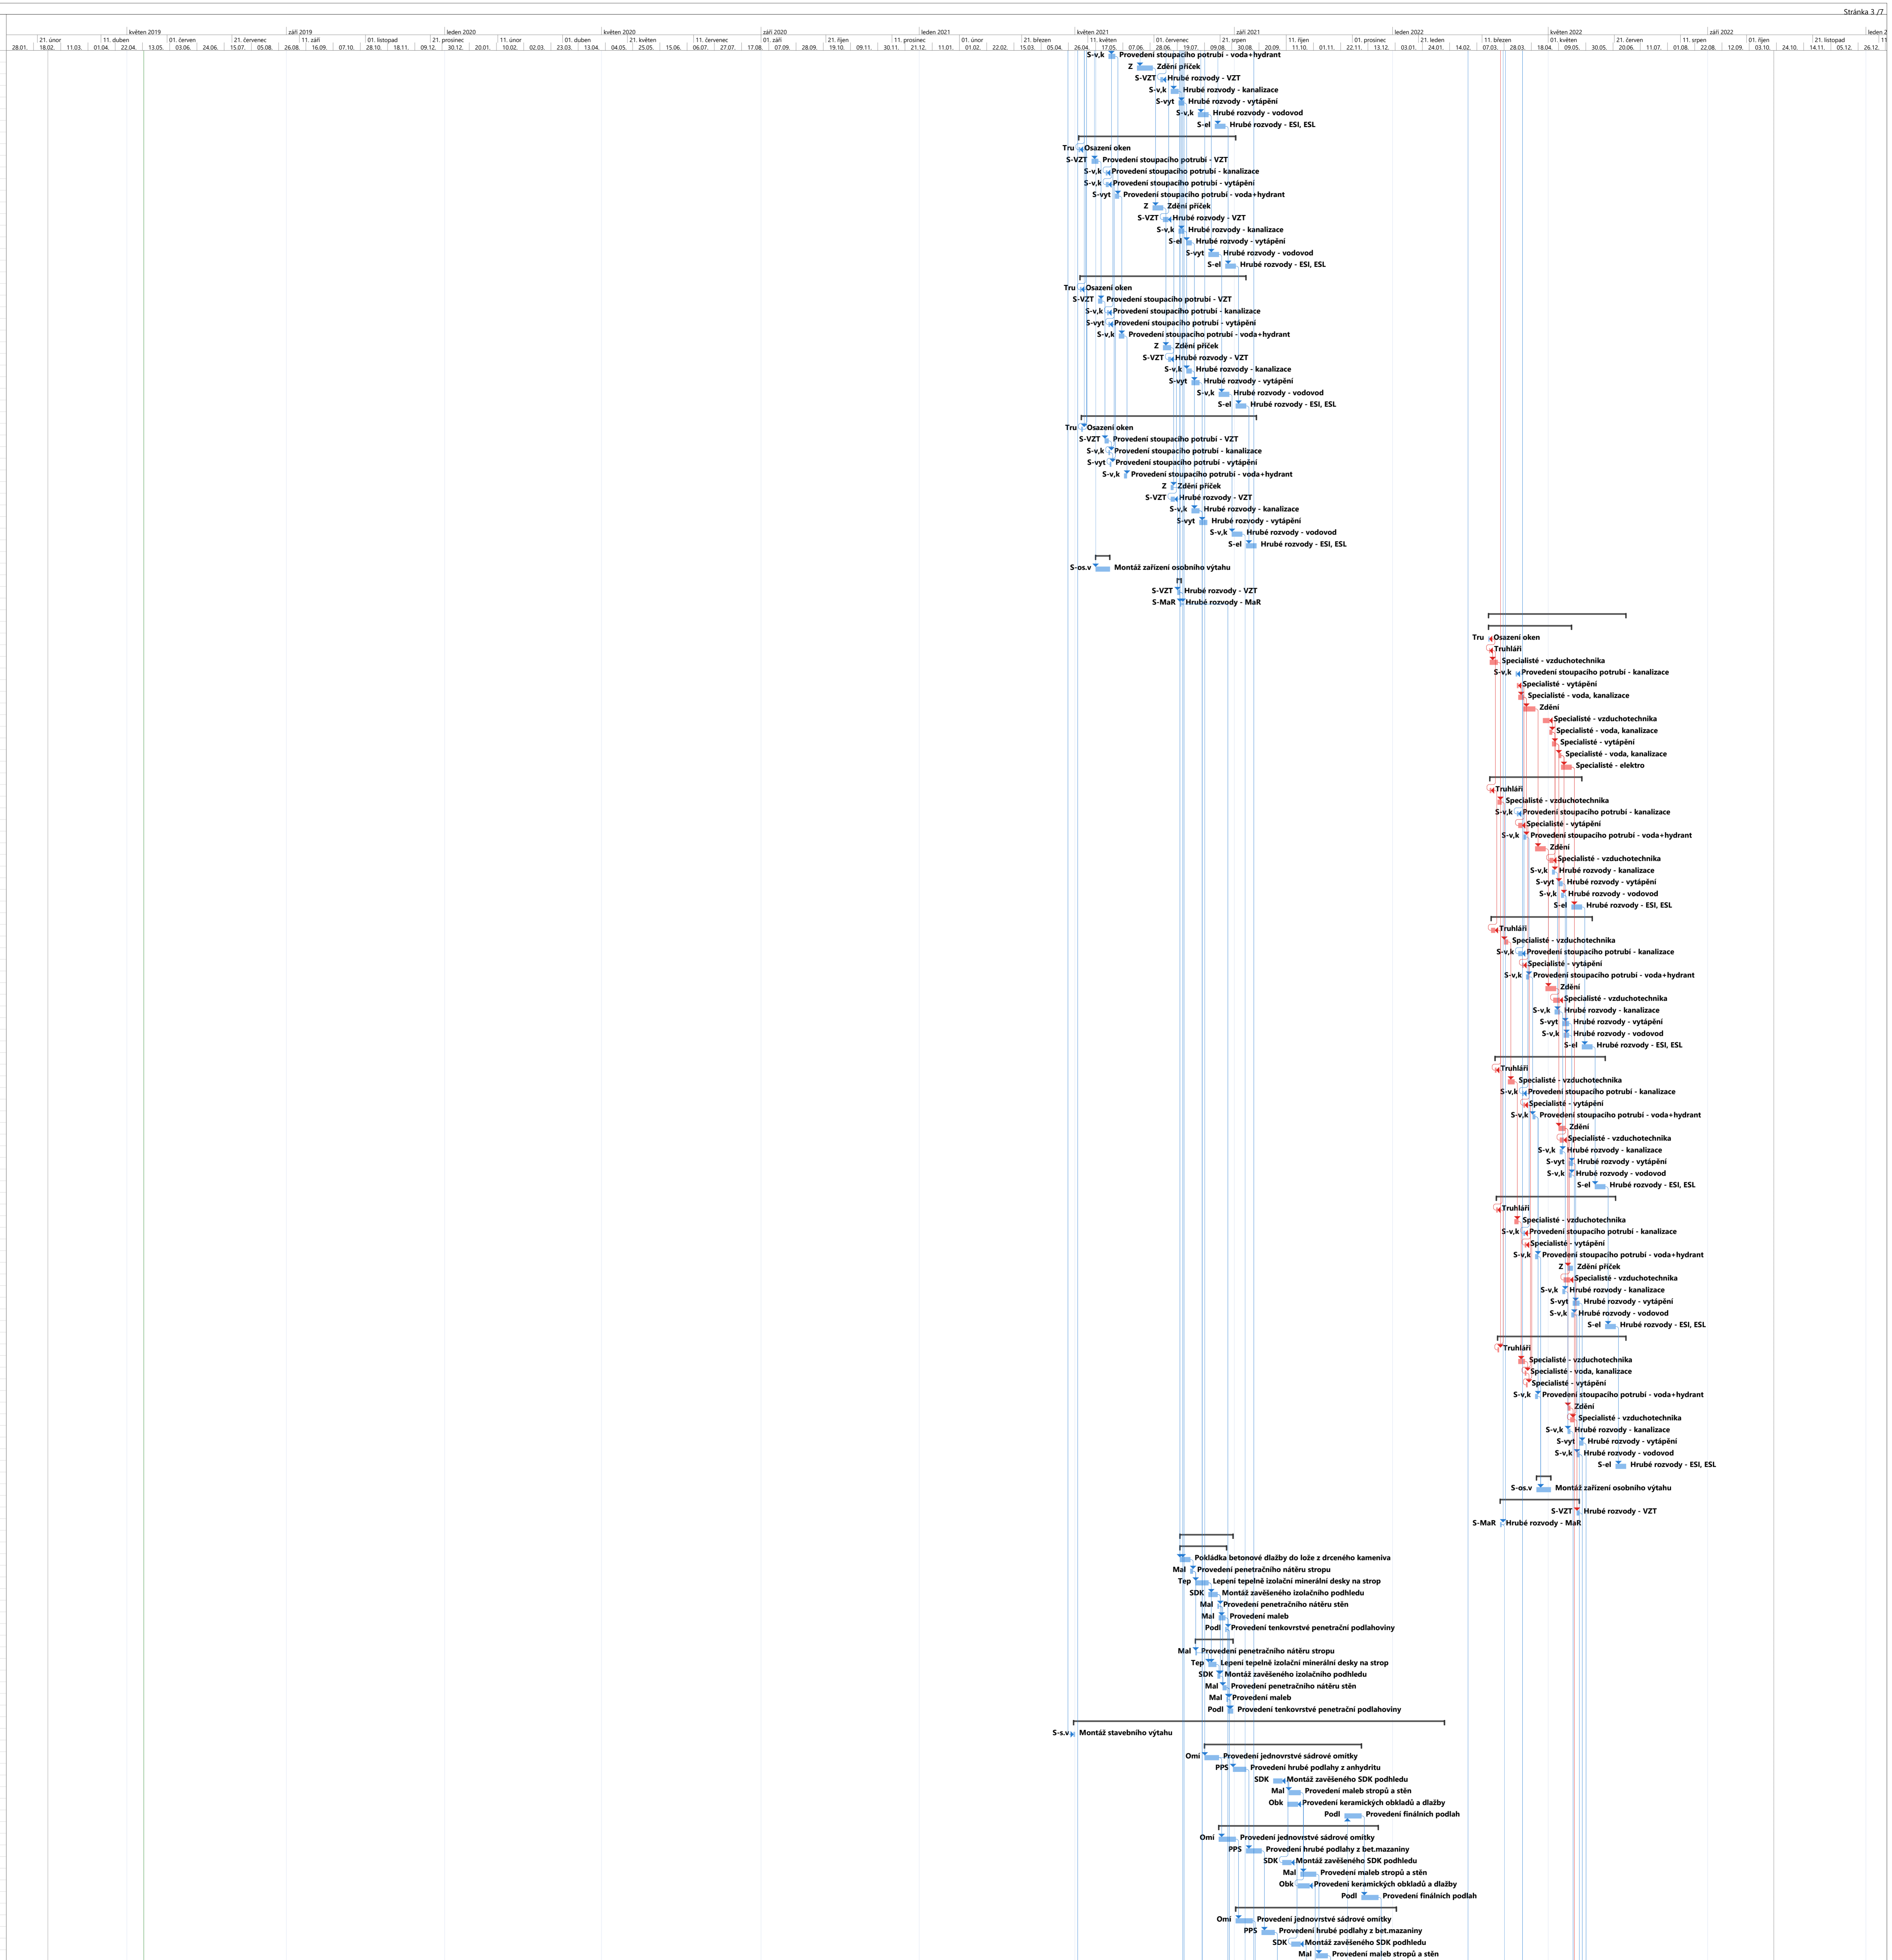
