


ID	Re úk	Název	Vy- - zp	Doba - trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
1		Stavba základní školy		0 233 ny dny?	30.9. 19	19.8. 20			p1	p2	p1
2		Přípravné práce		0 10 dny ny	30.9. 19	11.10. 19					
3		Převzetí staveniště + průzkumy		0 2 dny ny	30.9. 19	1.10. 19 4					
4		Vytyčení staveniště		0 1 den ny	2.10. 19	2.10. 19 5		3			
5		Sejmutí ornice		ny 2 dny	3.10. 19	4.10. 19 6SS+1 den		4			
6		Oplocení staveniště		0 1 den ny	4.10. 19	4.10. 19 7SS+1 den		5SS+1 den			
7		Zařízení staveniště + úpravy		0 4 dny ny	7.10. 19	10.10. 8SS+1 den;10 19		6SS+1 den			
8		Napojení zařízení staveniště na síť		0 4 dny ny	8.10. 19	11.10. 11 19		7SS+1 den			
9		Zemní práce		0 29 dny ny	11.10. 19	20.11. 19					
10		Výkop stavební jámy		0 20 dny ny	11.10. 19	7.11. 19 17FS+3 dny		7			
11		Záporové pažení		0 21 dny ny	14.10. 19	11.11. 12FF+1 den 19		8			
12		Demontáž stávajících přípojek		0 4 dny ny	7.11. 19	12.11. 13;17 19		11FF+1 den			
13		Vytyčení šachet kolektoru + šachty dojezdu výtahu		0 1 den ny	13.11. 19	13.11. 14 19		12			
14		Přípojka dešťové kanalizace - pod objektem		0 4 dny ny	14.11. 19	19.11. 15SS+1 den 19		13			
15		Přípojka splaškové kanalizace - pod objektem		0 4 dny ny	15.11. 19	20.11. 55 19		14SS+1 den			
16		Základové konstrukce		0 26 ny dny?	13.11. 19	18.12. 19					
17		Zhotovení opěrné zdi		0 3 dny ny	13.11. 19	15.11. 18FS+1 den 19		12;10FS+3 dny			
18		Odbednění opěrné zdi		0 1 den ny	19.11. 19	19.11. 19		17FS+1 den			

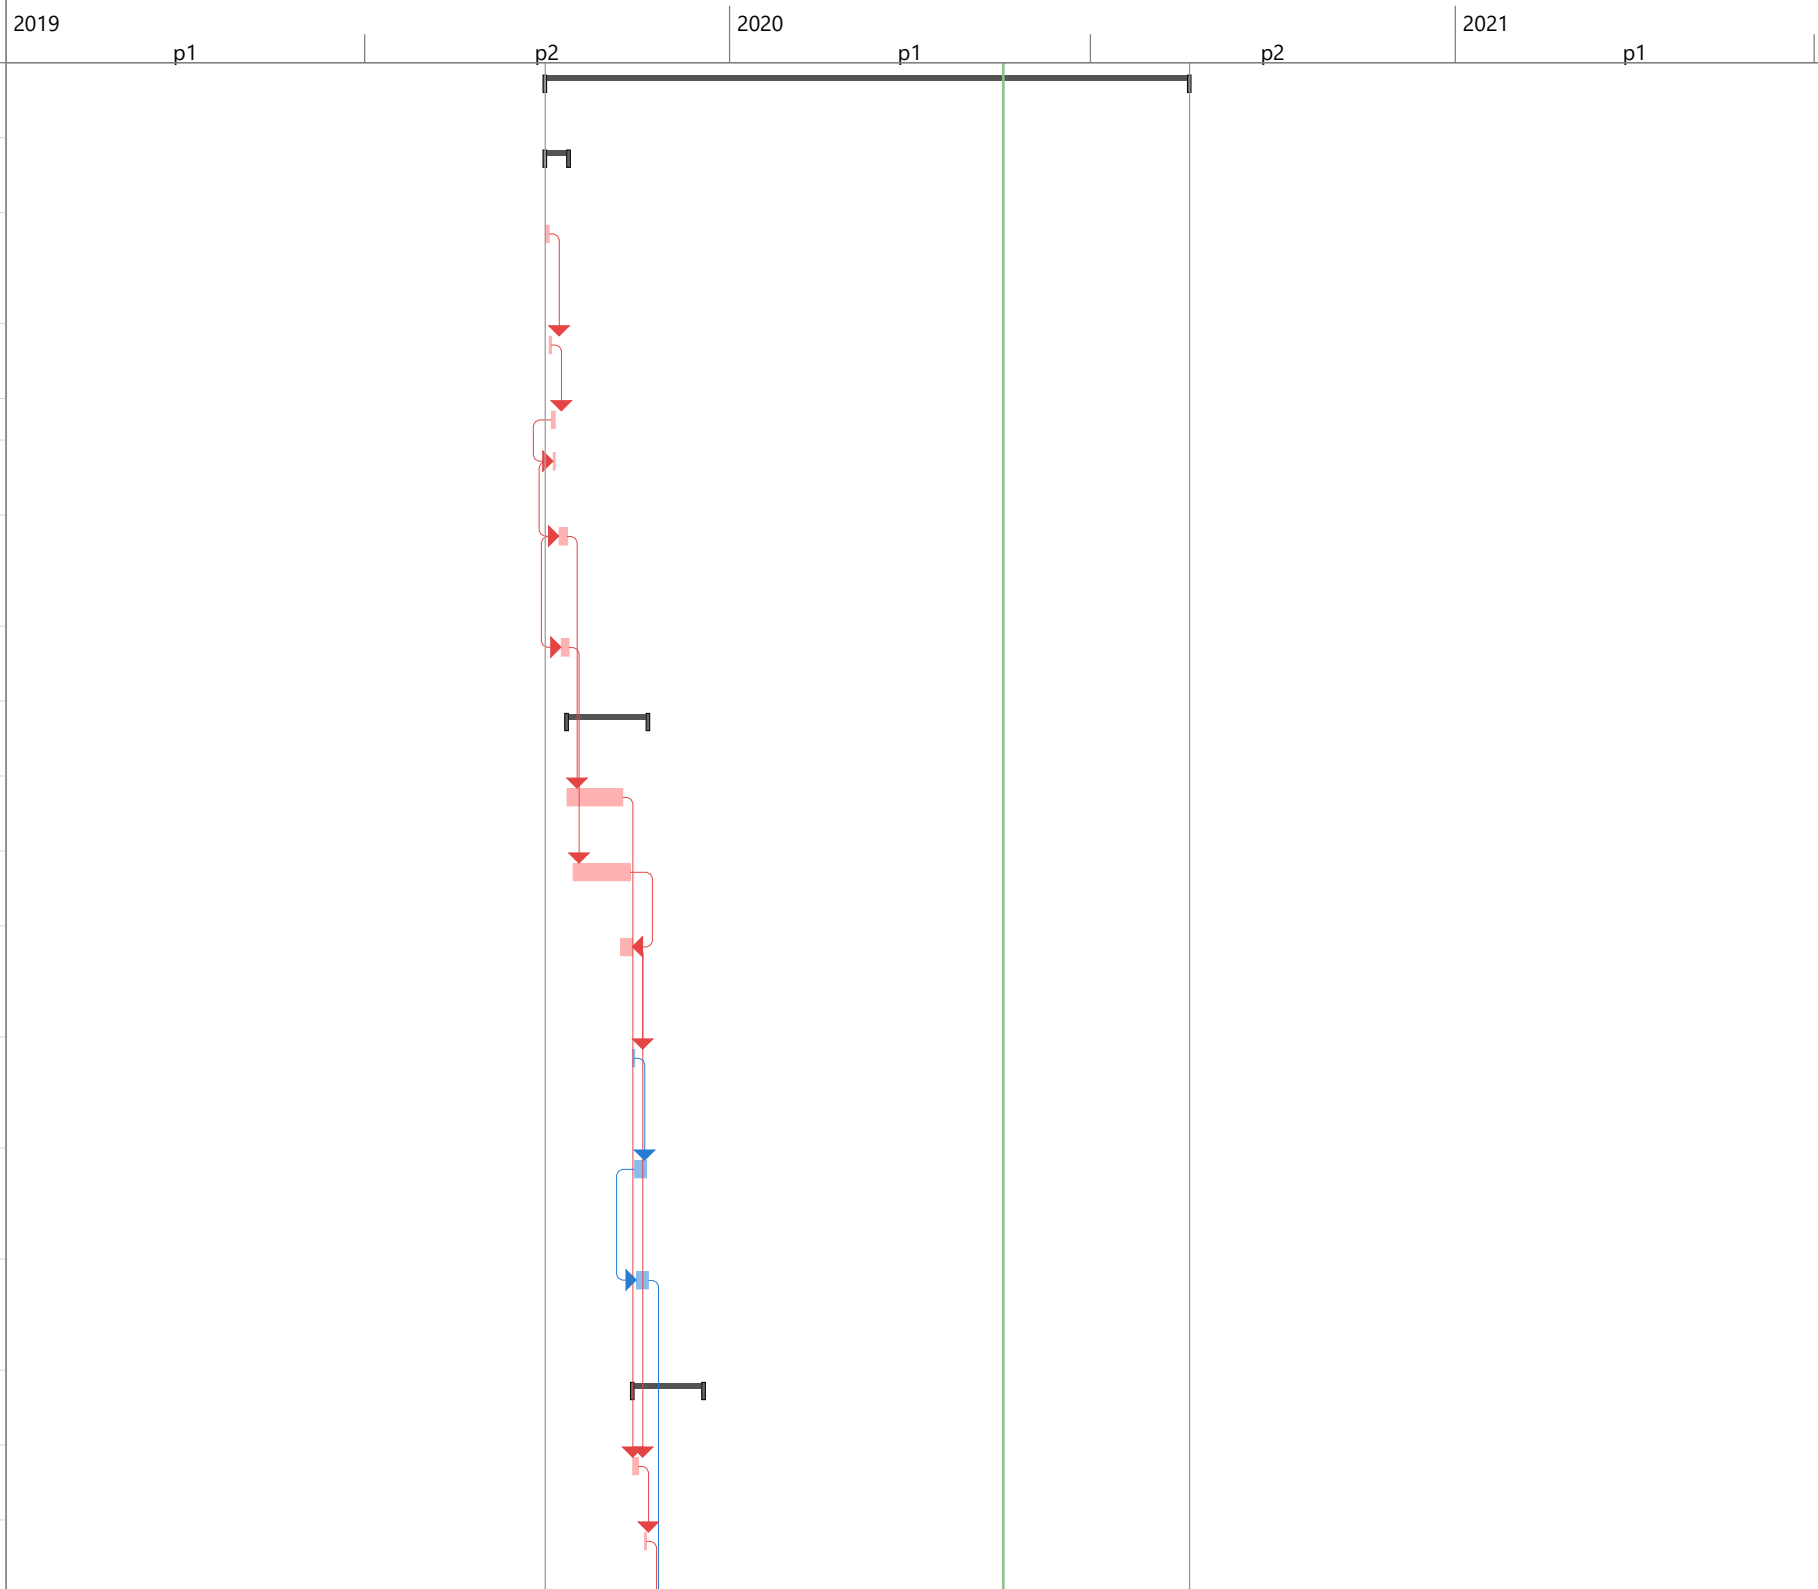


Kritický		Skurz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy - trvání zp	Doba	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
19		Vytyčení dojezdu výtahové šachty a šachet kolektoru	01 den	ny	20.11. 19	20.11. 2019	18		p1	p2	
20		Provádění základové desky dojezdu výtahové šachty a kolektoru	03 dny	ny	21.11. 19	25.11. 2019	21FS+2 dny; 22FF+2 dny	19			
21		Odbednění základové desky dojezdu výtahové šachty a kolektoru	01 den	ny	28.11. 19	28.11. 2019	20FS+2 dny; 22			p1	
22		Uzemnění hromosvodu	03 dny	ny	25.11. 19	27.11. 2019	20FF+2 dny				
23		Provádění stěn dojezdu výtahové šachty a kolektoru	02 dny	ny	29.11. 19	2.12. 2019	24FS+2 dny; 25FS+1 den	21			
24		Odbednění stěn dojezdu výtahové šachty a kolektoru	01 den	ny	5.12. 19	5.12. 2019	26FS+1 den	23FS+2 dny; 25			
25		Betonáž podkladního betonu	01 den	ny	4.12. 19	4.12. 2019	24	23FS+1 den			
26		Bednění základové desky	01 den	ny	9.12. 19	9.12. 2019	27	24FS+1 den			
27		Armování základové desky	05 dny	ny	10.12. 19	16.12. 2019	28FF+1 den	26			
28		Betonáž základové desky	02 dny	ny	16.12. 19	17.12. 2019	29	27FF+1 den			
29		Odbednění základové desky	01 den	ny	18.12. 19	18.12. 2019	41	28			
30		Bourací práce	09 dny?	ny	6.12. 19	18.12. 2019					175 dny?
31		Vybourání schodiště, dveří	01 den	ny	6.12. 19	6.12. 2019	32	58			
32		Osazení nových dveří	01 den	ny	9.12. 19	9.12. 2019	33	31			
33		Zazdění okenního otvoru	01 den	ny	10.12. 19	10.12. 2019	34	32			
34		Vybourání okenního otvoru, stěny	01 den	ny	11.12. 19	11.12. 2019	35	33			
35		Osazení nových dveří	01 den	ny	12.12. 19	12.12. 2019	36	34			


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
57		Přípojka splaškové kanalizace	ny	05 dny	27.11. 19	3.12. 19	58FS-2 dny	56SS+2 dny			
58		Retenční nádrže	ny	04 dny	2.12. 19	5.12. 19	31	57FS-2 dny			
59		Hrubá vrchní stavba - 1.NP	ny	036 dny	22.1. 20	11.3. 20					
60		Vytyčení nosných stěn a otvorů 1.NP	ny	01 den	22.1. 20	22.1. 20	61	50FS+1 den			
61		Zřízení bednění nosných stěn	ny	04 dny	23.1. 20	28.1. 20	62SS+2 dny	60			
62		Armování nosných stěn	ny	06 dny	27.1. 20	3.2. 20	63SS+5 dny	61SS+2 dny			
63		Dobednění nosných stěn	ny	03 dny	3.2. 20	5.2. 20	64SS+2 dny	62SS+5 dny;52FS+1			
64		Betonáž nosných stěn	ny	03 dny	5.2. 20	7.2. 20	65SS+1 den	63SS+2 dny			
65		Odbedňování nosných stěn	ny	04 dny	6.2. 20	11.2. 20	66SS+1 den	64SS+1 den			
66		Zřízení bednění stropní konstrukce	ny	08 dny	7.2. 20	18.2. 20	67SS+2 dny	65SS+1 den			
67		Armování stropní konstrukce	ny	011 dny	11.2. 20	25.2. 20	68SS+10 dny	66SS+2 dny			
68		Betonáž stropní konstrukce	ny	02 dny	25.2. 20	26.2. 20	77FS+1 den;71FS+4 dny	67SS+10 dny			
69		Odbednění stropní konstrukce	ny	04 dny	5.3. 20	10.3. 20	70SS+3 dny	71			
70		Osazení prefabrikovaného schodiště	ny	02 dny	10.3. 20	11.3. 20	81	69SS+3 dny			
71		Osazení ocelového schodiště	ny	01 den	4.3. 20	4.3. 20	72;69	68FS+4 dny			
72		Ochrana nosných stěn v suterénu	ny	05 dny	5.3. 20	11.3. 20	74SS+2 dny	71			
73		Zemní práce	ny	13 dny	9.3. 20	25.3. 20					
74		Demontáž záporového pažení	ny	012 dny	9.3. 20	24.3. 20	75FF+1 den	72SS+2 dny			
75		Zásyp a hutnění stavební jámy	ny	04 dny	20.3. 20	25.3. 20		74FF+1 den			
76		Hrubá vrchní stavba - 2.NP	ny	032 dny	28.2. 20	13.4. 20					
77		Vytyčení nosných stěn	ny	01 den	28.2. 20	28.2. 20	78	68FS+1 den			
78		Bednění nosných stěn	ny	04 dny	2.3. 20	5.3. 20	79SS+2 dny	77			

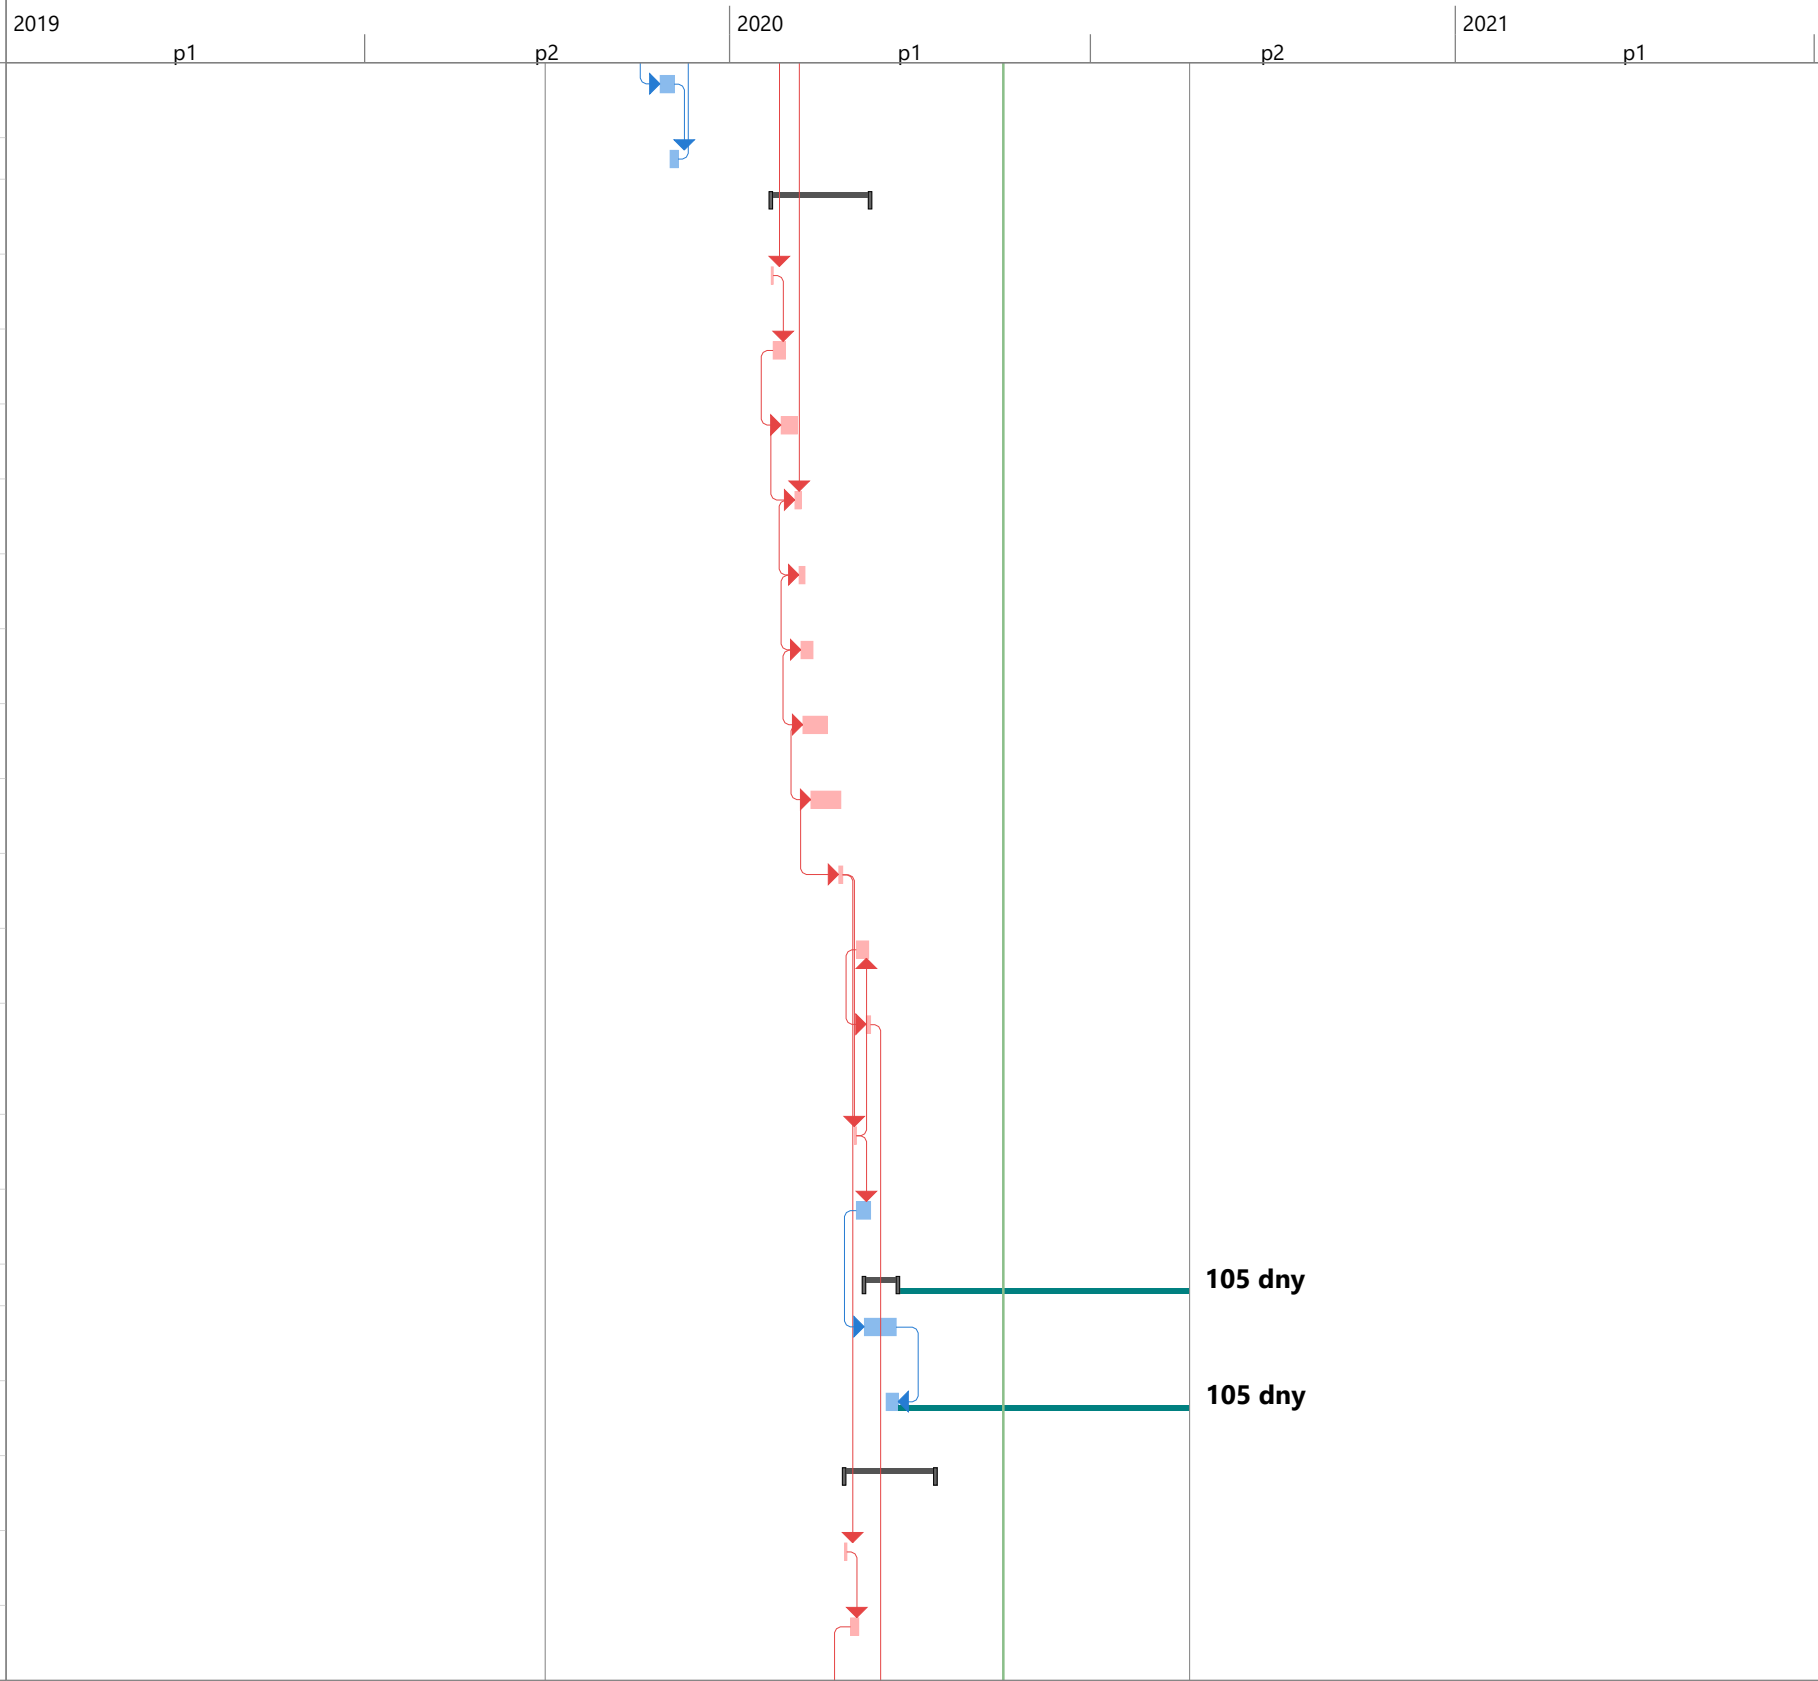


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
79		Armování nosných stěn	05 dny		4.3. 20	10.3. 20	80SS+3 dny	78SS+2 dny			
80		Dobednění nosných stěn	03 dny		9.3. 20	11.3. 20	81	79SS+3 dny			
81		Betonáž nosných stěn	02 dny		12.3. 20	13.3. 20	82SS+1 den;117SS	80;70			
82		Odbednění nosných stěn	04 dny		13.3. 20	18.3. 20	83SS+2 dny	81SS+1 den			
83		Bednění stropní konstrukce	05 dny		17.3. 20	23.3. 20	84SS+2 dny	82SS+2 dny			
84		Armování stropní konstrukce	08 dny		19.3. 20	30.3. 20	85FS-1 den	83SS+2 dny			
85		Betonáž stropní konstrukce	02 dny		30.3. 20	31.3. 20	90FS+1 den;88FS+4 dny	84FS-1 den			
86		Odbednění stropní konstrukce	03 dny		8.4. 20	10.4. 20	87SS+2 dny	88			
87		Osazení prefabrikovaného schodiště	02 dny		10.4. 20	13.4. 20	94	86SS+2 dny			
88		Osazení ocelového schodiště	01 den		7.4. 20	7.4. 20	86	85FS+4 dny			
89		Hrubá vrchní stavba - 3.NP	026 dny		2.4. 20	7.5. 20					
90		Vytyčení nosných stěn	01 den		2.4. 20	2.4. 20	91	85FS+1 den			
91		Bednění nosných stěn	03 dny		3.4. 20	7.4. 20	92SS+2 dny	90			
92		Armování nosných stěn	04 dny		7.4. 20	10.4. 20	93SS+3 dny	91SS+2 dny			
93		Dobednění nosných stěn	02 dny		10.4. 20	13.4. 20	94	92SS+3 dny			
94		Betonáž nosných stěn	01 den		14.4. 20	14.4. 20	95SS+1 den;118SS	93;87			
95		Odbednění nosných stěn	03 dny		15.4. 20	17.4. 20	96SS+2 dny	94SS+1 den			
96		Bednění stropní konstrukce	03 dny		17.4. 20	21.4. 20	97SS+2 dny;100SS-1 den	95SS+2 dny			
97		Armování stropní konstrukce	05 dny		21.4. 20	27.4. 20	98	96SS+2 dny			
98		Betonáž stropní konstrukce	01 den		28.4. 20	28.4. 20	99SS+6 dny;103;143	97			
99		Odbednění stropní konstrukce	02 dny		6.5. 20	7.5. 20		98SS+6 dny			

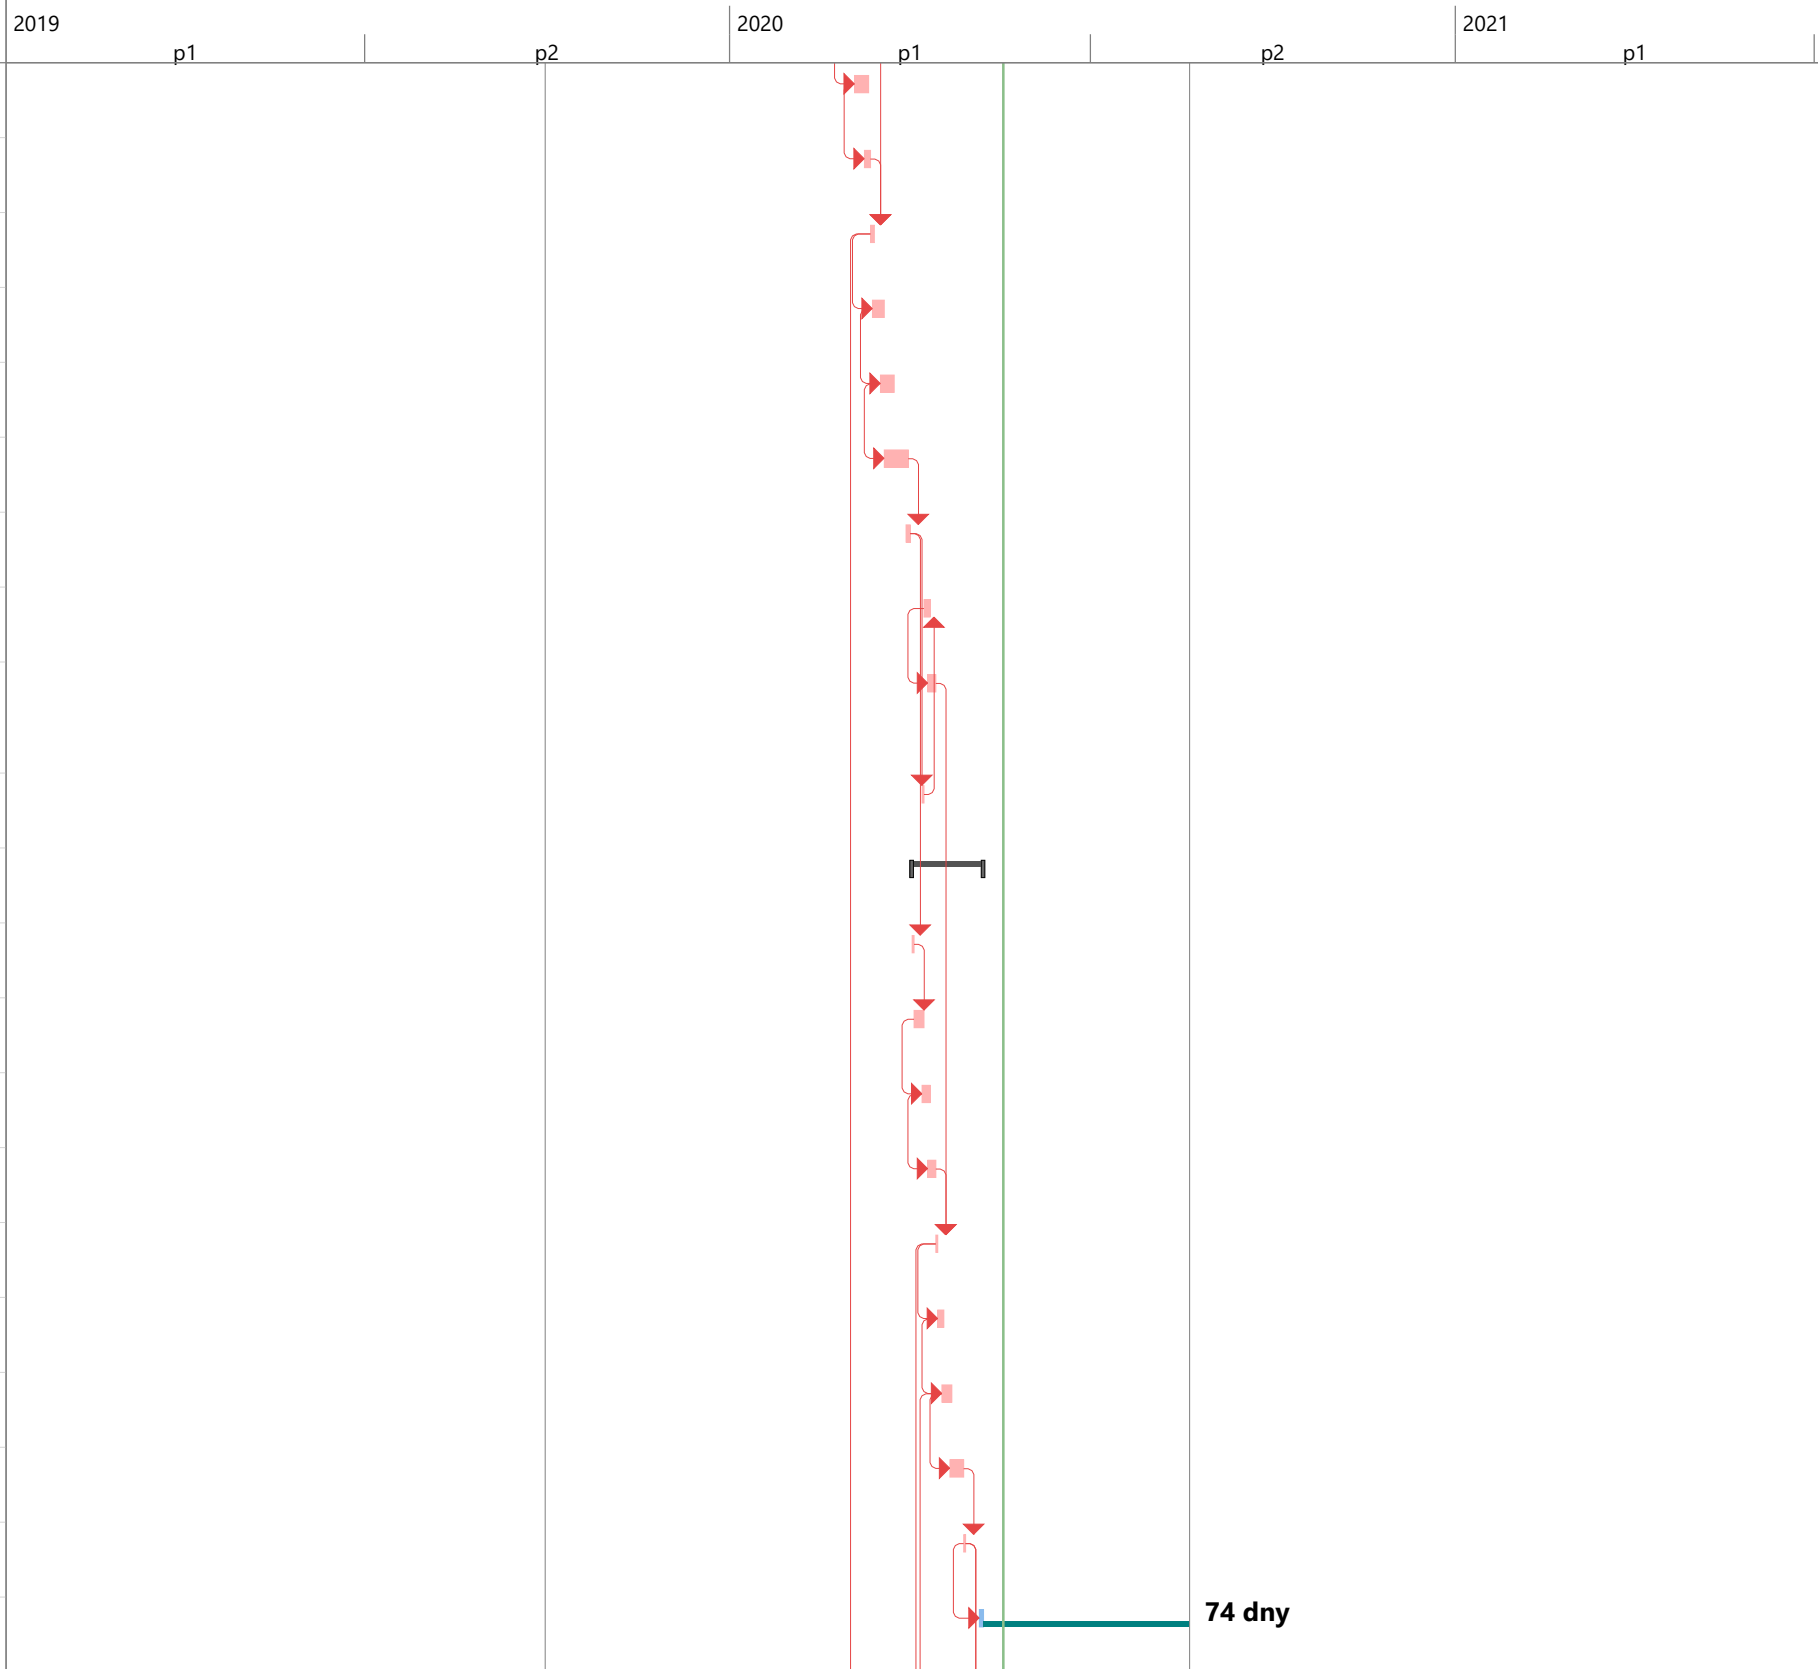


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení		
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly		
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník		
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín		
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh		

ID	Re úk	Název	Vy- - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
100		Odstranění stojek bednění	01 den	ny	16.4. 20	16.4. 20		96SS-1 den			
101		Lehký obvodový plášť	024 dny	ny	29.4. 20	1.6. 20					
102		Osazení lehkého obvodového pláště	015 dny	ny	12.5. 20	1.6. 20		111SS			
103		Provizorní zakrytí	ny1 den		29.4. 20	29.4. 20	104;152SS	98			
104		Montáž ochranného zábradlí po obvodě	01 den	ny	30.4. 20	30.4. 20	105	103			
105		Osazení střešních vstupů	01 den	ny	1.5. 20	1.5. 20	107	104			
106		Zastřešení	ny19 dny	ny	4.5. 20	28.5. 20					
107		Vytyčení atiky	ny1 den		4.5. 20	4.5. 20	108	105			
108		Bednění atiky	ny2 dny		5.5. 20	6.5. 20	109	107			
109		Betonáž atiky	ny1 den		7.5. 20	7.5. 20	110FS+1 den	108			
110		Odbednění atiky	ny1 den		11.5. 20	11.5. 20	111	109FS+1 den			
111		Skladba střechy	ny11 dny		12.5. 20	26.5. 20	112FS-1 den;102SS	110			
112		Oplechování atiky	ny2 dny		26.5. 20	27.5. 20	113SS+1 den	111FS-1 den			
113		Instalace hromosvodu	02 dny	ny	27.5. 20	28.5. 20		112SS+1 den			
114		Hrubé vnitřní práce - 1.PP	036 dny	ny	12.3. 20	30.4. 20					
115		Osazení vzduchotechnické jednotky	02 dny	ny	21.4. 20	22.4. 20	123SS+1 den	120			
116		Provedení stoupačích potrubí	03 dny	ny	28.4. 20	30.4. 20		122SS+1 den			
117		Osazení oken	ny1 den		12.3. 20	12.3. 20	125	81SS			
118		Osazení ocelových zárubní	01 den	ny	14.4. 20	14.4. 20	126;119	94SS			
119		Příčky	ny2 dny		15.4. 20	16.4. 20	121	118			
120		Osazení instalačních dvířek	01 den	ny	20.4. 20	20.4. 20	115	121			
121		Osazení nenosných překladů	01 den	ny	17.4. 20	17.4. 20	120	119			
122		Hrubé rozvody (silnoproud, slaboproud)	04 dny	ny	27.4. 20	30.4. 20	130;116SS+1 den	123SS+3 dny			
123		Hrubé rozvody vzduchotechniky	05 dny	ny	22.4. 20	28.4. 20	122SS+3 dny;131	115SS+1 den			

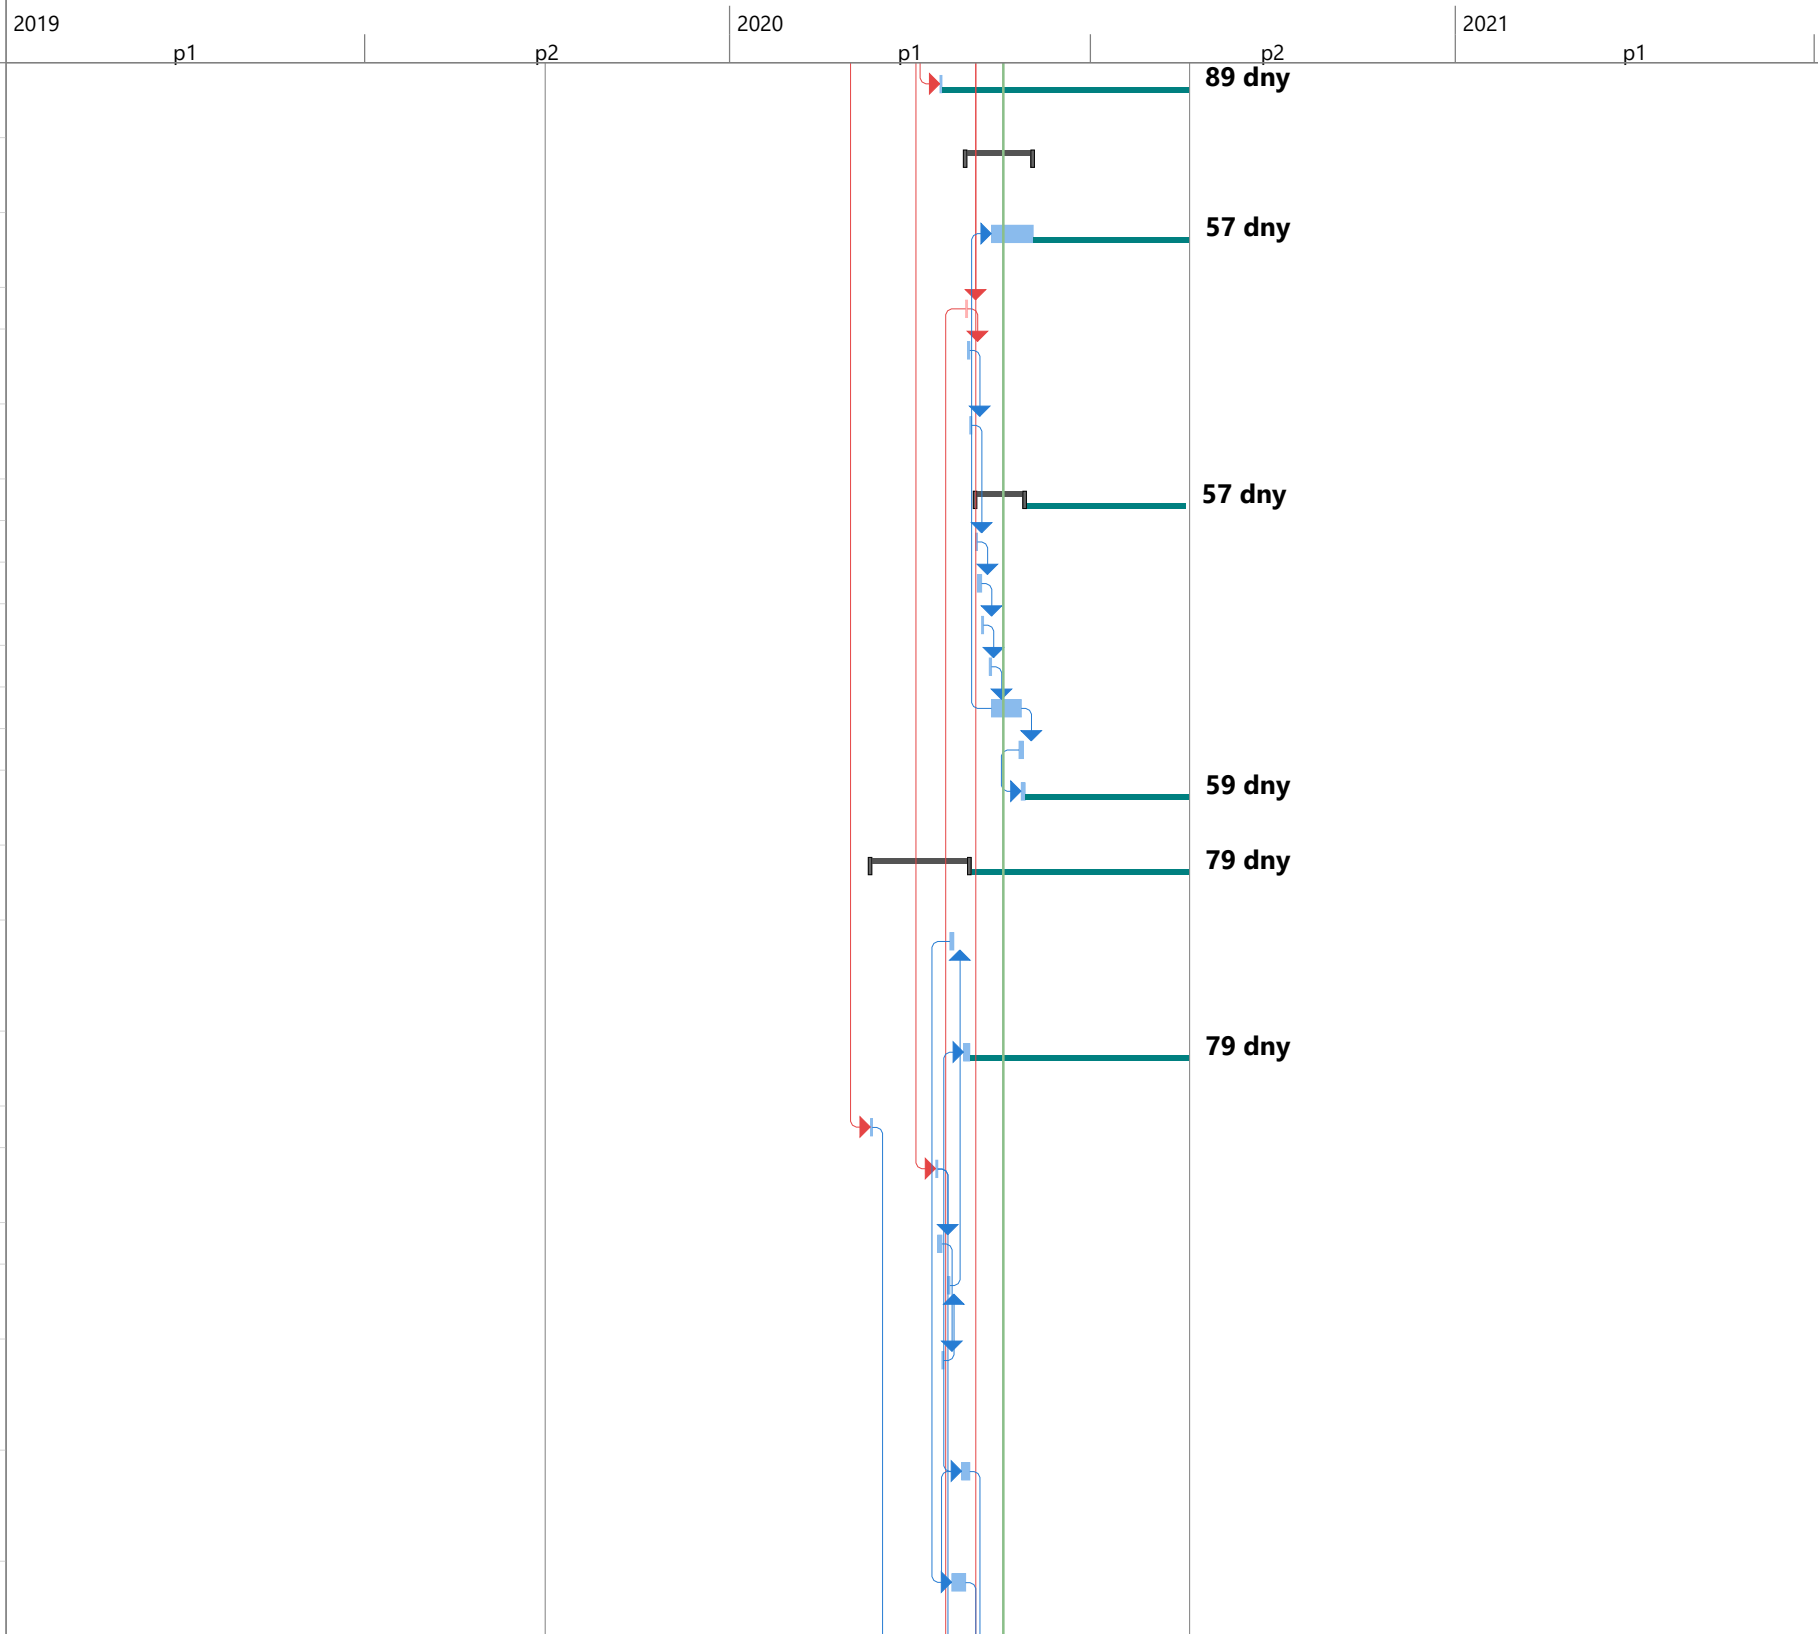


Kritický		Skruz		Neaktivní milník		Pouze zahájení		Vnější úkoly
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení		
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější milník		Konečný termín
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Ruční souhrn		
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh		

ID	Re úk	Název	Vy- - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
124		Hrubé vnitřní práce - 1.NP	0 39 dny		13.3. 20	6.5. 20					
125		Osazení oken	ny 3 dny		13.3. 20	17.3. 20		117			
126		Osazení ocelových zárubní	ny 0 1 den		15.4. 20	15.4. 20	127FS+1 den;134SS	118			
127		Příčky	ny 2 dny		17.4. 20	20.4. 20	129	126FS+1 den			
128		Osazení instalačních dvířek	ny 0 1 den		22.4. 20	22.4. 20	132	129			
129		Osazení nenosných překladů	ny 0 1 den		21.4. 20	21.4. 20	128	127			
130		Hrubé rozvody (silnoproud, slaboproud)	ny 0 4 dny		1.5. 20	6.5. 20		122;131SS+2 dny			
131		Hrubé rozvody vzduchotechniky	ny 0 4 dny		29.4. 20	4.5. 20	130SS+2 dny;135	123;132SS+3 dny			
132		Rozvody připojovacího potrubí	ny 0 4 dny		23.4. 20	28.4. 20	131SS+3 dny	128			
133		Hrubé vnitřní práce - 2.NP	0 27 dny?		15.4. 20	21.5. 20					
134		Osazení oken	ny 1 den		15.4. 20	15.4. 20		126SS			
135		Osazení ocelových zárubní	ny 0 1 den?		5.5. 20	5.5. 20	136FS+1 den;144	131			
136		Příčky	ny 2 dny		7.5. 20	8.5. 20	138	135FS+1 den			
137		Osazení instalačních dvířek	ny 0 1 den		12.5. 20	12.5. 20	141	138			
138		Osazení nenosných překladů	ny 0 1 den		11.5. 20	11.5. 20	137	136			
139		Hrubé rozvody (silnoproud, slaboproud)	ny 0 4 dny		18.5. 20	21.5. 20	148	140SS+1 den			
140		Hrubé rozvody vzduchotechniky	ny 0 4 dny		15.5. 20	20.5. 20	149;139SS+1 den	141SS+2 dny			
141		Rozvody připojovacího potrubí	ny 0 3 dny		13.5. 20	15.5. 20	150;140SS+2 dny	137			
142		Hrubé vnitřní práce - 3.NP	0 21 dny		29.4. 20	27.5. 20					
143		Osazení oken	ny 1 den		29.4. 20	29.4. 20		98			
144		Osazení ocelových zárubní	ny 0 1 den		6.5. 20	6.5. 20	145FS+2 dny	135			

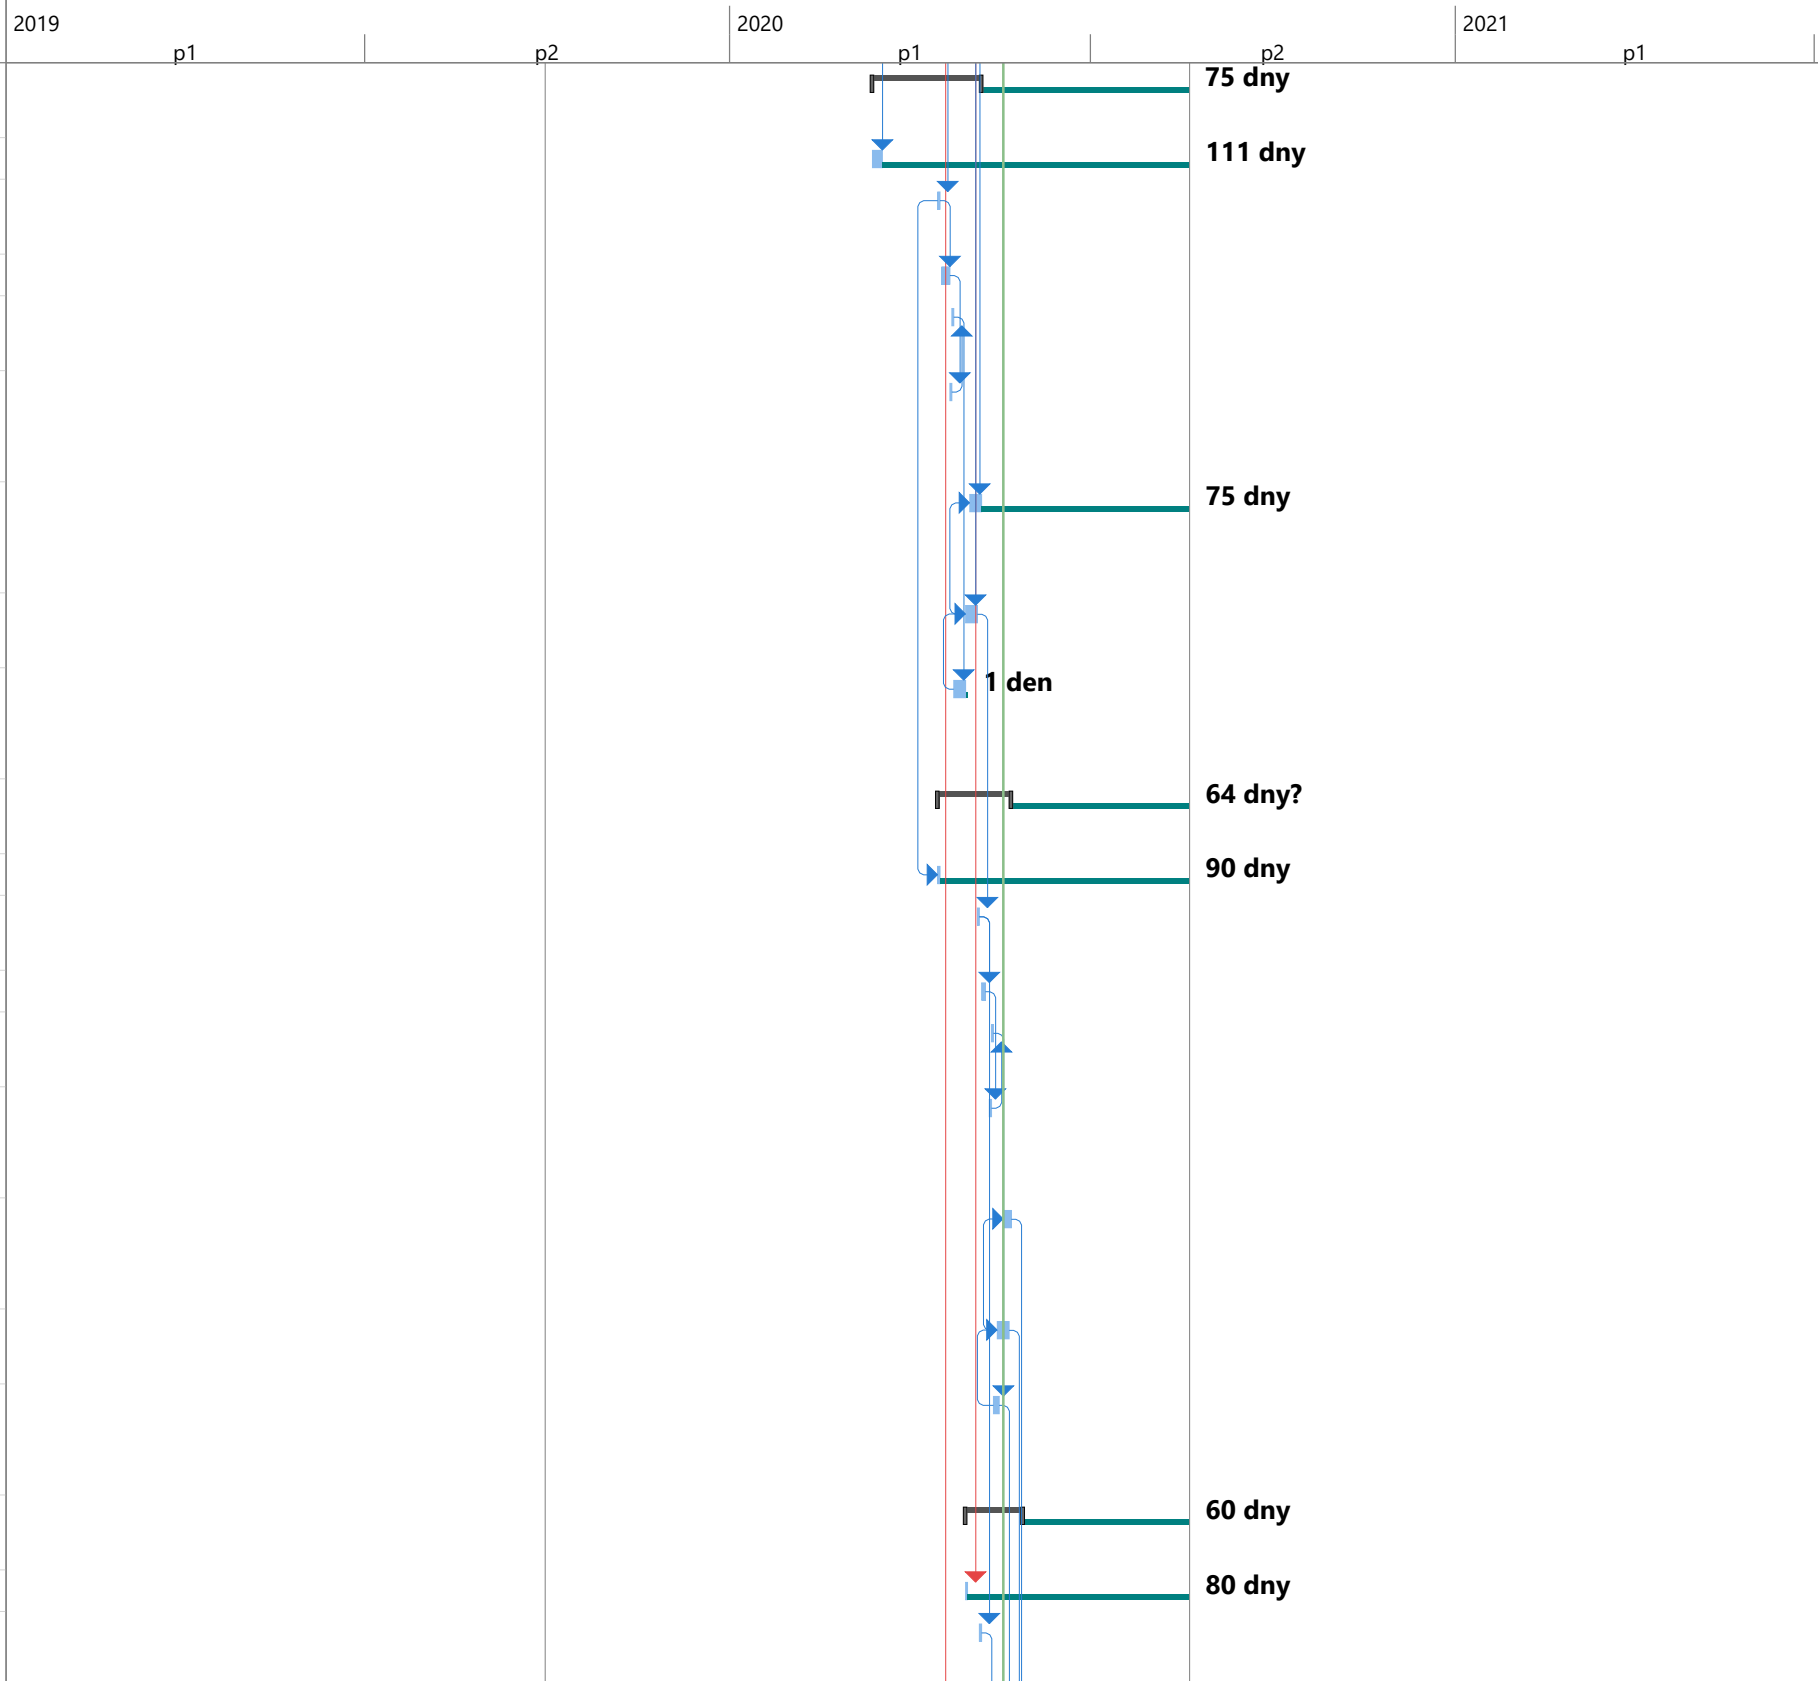


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy - trvání zp	Doba	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
									p1	p2	p1
145		Příčky	ny 1 den		11.5. 20	11.5. 20	147	144FS+2 dny			
146		Osazení instalačních dvířek	0 1 den ny		13.5. 20	13.5. 20		147			
147		Osazení nenosných překladů	0 1 den ny		12.5. 20	12.5. 20	146	145			
148		Hrubé rozvody (silnoproud, slaboproud)	0 4 dny ny		22.5. 20	27.5. 20		139			
149		Hrubé rozvody vzduchotechniky	0 4 dny ny		21.5. 20	26.5. 20		140			
150		Rozvody připojovacího potrubí	0 3 dny ny		18.5. 20	20.5. 20		141			
151		Hrubé úpravy - 1.PP	ny 47 dny		29.4. 20	2.7. 20					
152		Provedení omítky	ny 7 dny		29.4. 20	7.5. 20	153FF+5 dny;160	103SS			
153		Hrubé rozvody vytápění	0 3 dny ny		12.5. 20	14.5. 20	155SS+1 den;161	152FF+5 dny			
154		Teraco	ny 6 dny		22.5. 20	29.5. 20		156FS+1 den			
155		Hrubé podlahy	ny 5 dny		13.5. 20	19.5. 20	162;156FS-1 den;	153SS+1 den			
156		Provedení SDK přesazených stěn	0 2 dny ny		19.5. 20	20.5. 20	164;154FS+1 den	155FS-1 den			
157		Provedení SDK podhledu	0 3 dny ny		27.5. 20	29.5. 20	165	164			
158		Montáž požárních hydrantů	0 3 dny ny		30.6. 20	2.7. 20	166	198FS+1 den			
159		Hrubé úpravy - 1.PP , TĚLOCVIČNA	0 43 dny ny		8.5. 20	7.7. 20					
160		Provedení omítky	ny 7 dny		8.5. 20	18.5. 20	176	152			
161		Hrubé rozvody vytápění	0 3 dny ny		15.5. 20	19.5. 20	162	153			
162		Hrubá podlaha	ny 1 den		20.5. 20	20.5. 20	164	155;161			
163		Podlaha	ny 11 dny		12.6. 20	26.6. 20	198FF	165FS-3 dny			
164		Provedená SDK přesazených stěn	0 4 dny ny		21.5. 20	26.5. 20	157	156;162			
165		Provedení SDK podhledu	0 12 dny ny		1.6. 20	16.6. 20	163FS-3 dny;172;201FF	157			
166		Montáž požárních hydrantů	0 3 dny ny		3.7. 20	7.7. 20	212FS-1 den	158			
167		Hrubé úpravy - 1.NP	0 35 dny ny		13.5. 20	30.6. 20					
168		Provedení omítky	ny 8 dny		13.5. 20	22.5. 20	169FF;184	155SS			

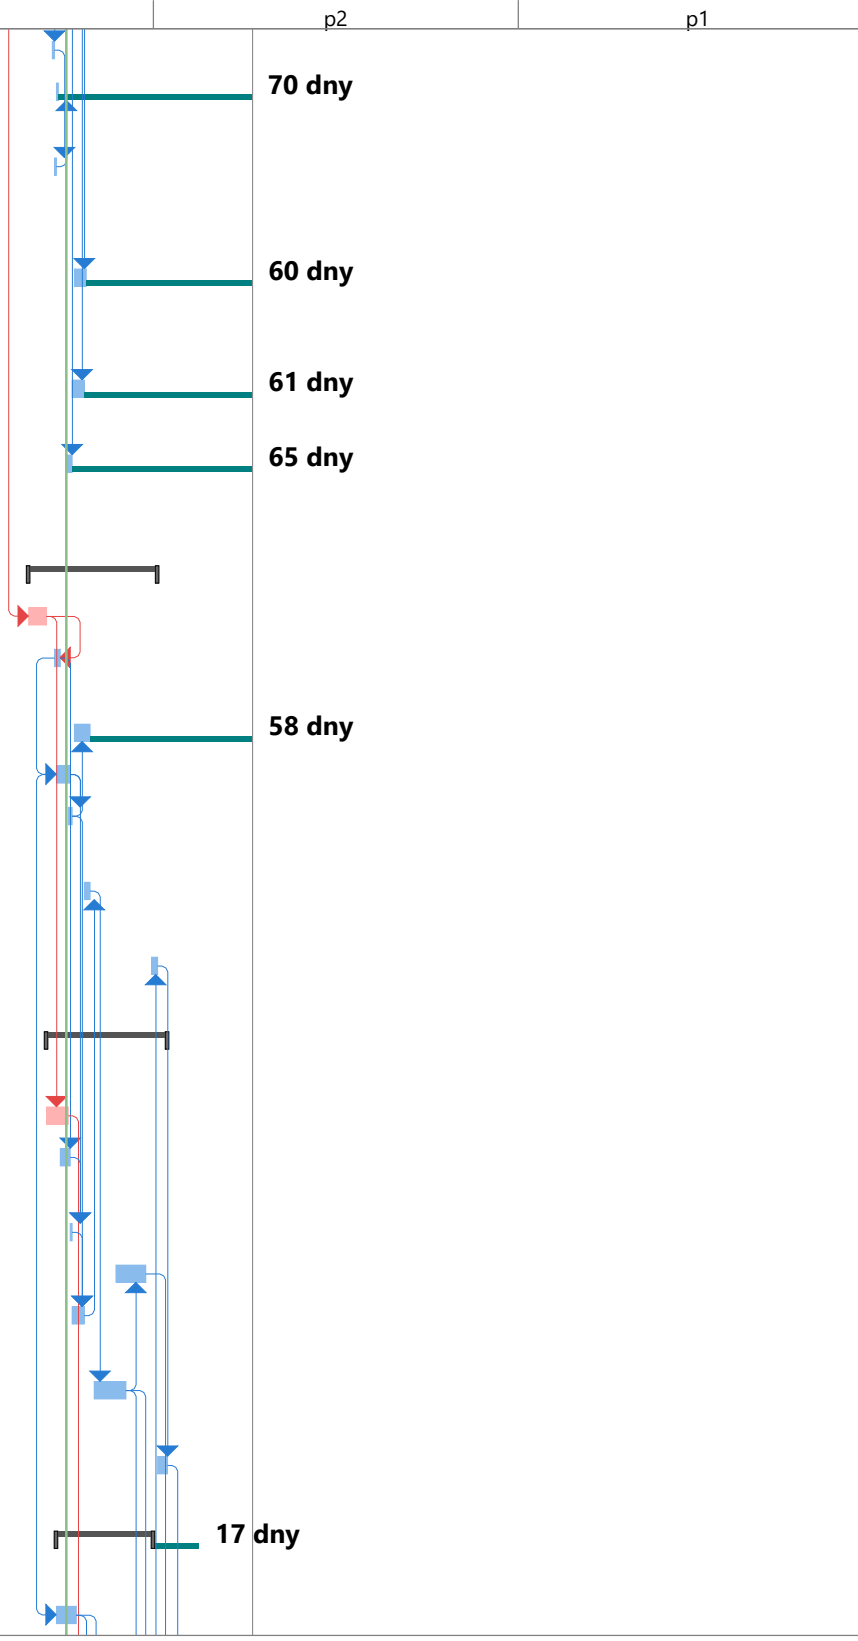


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re-úk	Název	Vy- - zp	Doba - trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
169		Hrubé rozvody vytápění	ny	05 dny	18.5. 20	22.5. 20	171SS+1 den	168FF			
170		Teraco	ny	5 dny	28.5. 20	3.6. 20	218	171FS+2 dny			
171		Hrubá podlaha	ny	5 dny	19.5. 20	25.5. 20	170FS+2 dny	169SS+1 den			
172		Provedení SDK přesazených stěn	ny	02 dny	17.6. 20	18.6. 20	173	165			
173		Provedení SDK podhledu	ny	04 dny	19.6. 20	24.6. 20	174FS+1 den;219FS-1 den	172			
174		Montáž požárních hydrantů	ny	03 dny	26.6. 20	30.6. 20	224SS+2 dny	173FS+1 den			
175		Hrubé úpravy - 2.NP	ny	39 dny	19.5. 20	10.7. 20					
176		Provedení omítky	ny	12 dny	19.5. 20	3.6. 20	177FF+1 den	160			
177		Hrubé rozvody vytápění	ny	05 dny	29.5. 20	4.6. 20	179SS-1 den	176FF+1 den			
178		Teraco	ny	7 dny	15.6. 20	23.6. 20	180FS+1 den	233FS+1 den			
179		Hrubá podlaha	ny	8 dny	28.5. 20	8.6. 20	231;192	177SS-1 den			
180		Provedení SDK přesazených stěn	ny	02 dny	25.6. 20	26.6. 20	181	178FS+1 den			
181		Provedení SDK podhledu	ny	06 dny	29.6. 20	6.7. 20	234SS-1 den;188;182FS+1	180			
182		Montáž požárních hydrantů	ny	03 dny	8.7. 20	10.7. 20	237SS+2 dny	181FS+1 den			
183		Hrubé úpravy - 3.NP	ny	42 dny	25.5. 20	21.7. 20					
184		Provedení omítky	ny	8 dny	25.5. 20	3.6. 20	185FF+1 den;257	168			
185		Hrubé rozvody vytápění	ny	05 dny	29.5. 20	4.6. 20	187SS+2 dny	184FF+1 den			
186		Teraco	ny	6 dny	15.6. 20	22.6. 20	246	244FS+2 dny			
187		Hrubá podlaha	ny	5 dny	2.6. 20	8.6. 20	244FS+1 den	185SS+2 dny			
188		Provedení SDK přesazených stěn	ny	02 dny	7.7. 20	8.7. 20	189	181			
189		Provedení SDK podhledu	ny	03 dny	9.7. 20	13.7. 20	245;190FS+3 dny	188			
190		Montáž požárních hydrantů	ny	03 dny	17.7. 20	21.7. 20	249FS-1 den	189FS+3 dny			
191		Přípojky - vodovod,horkovod	ny	13 dny	9.6. 20	25.6. 20					
192		Demolice silnice	ny	1 den	9.6. 20	9.6. 20	193	179			
193		Přípojka vodovodu	ny	3 dny	10.6. 20	12.6. 20	194	192			
194		Přípojka horkovodu	ny	4 dny	15.6. 20	18.6. 20	195FF+1 den	193			
195		Osazení vodoměrné šachty	ny	02 dny	18.6. 20	19.6. 20	196	194FF+1 den			

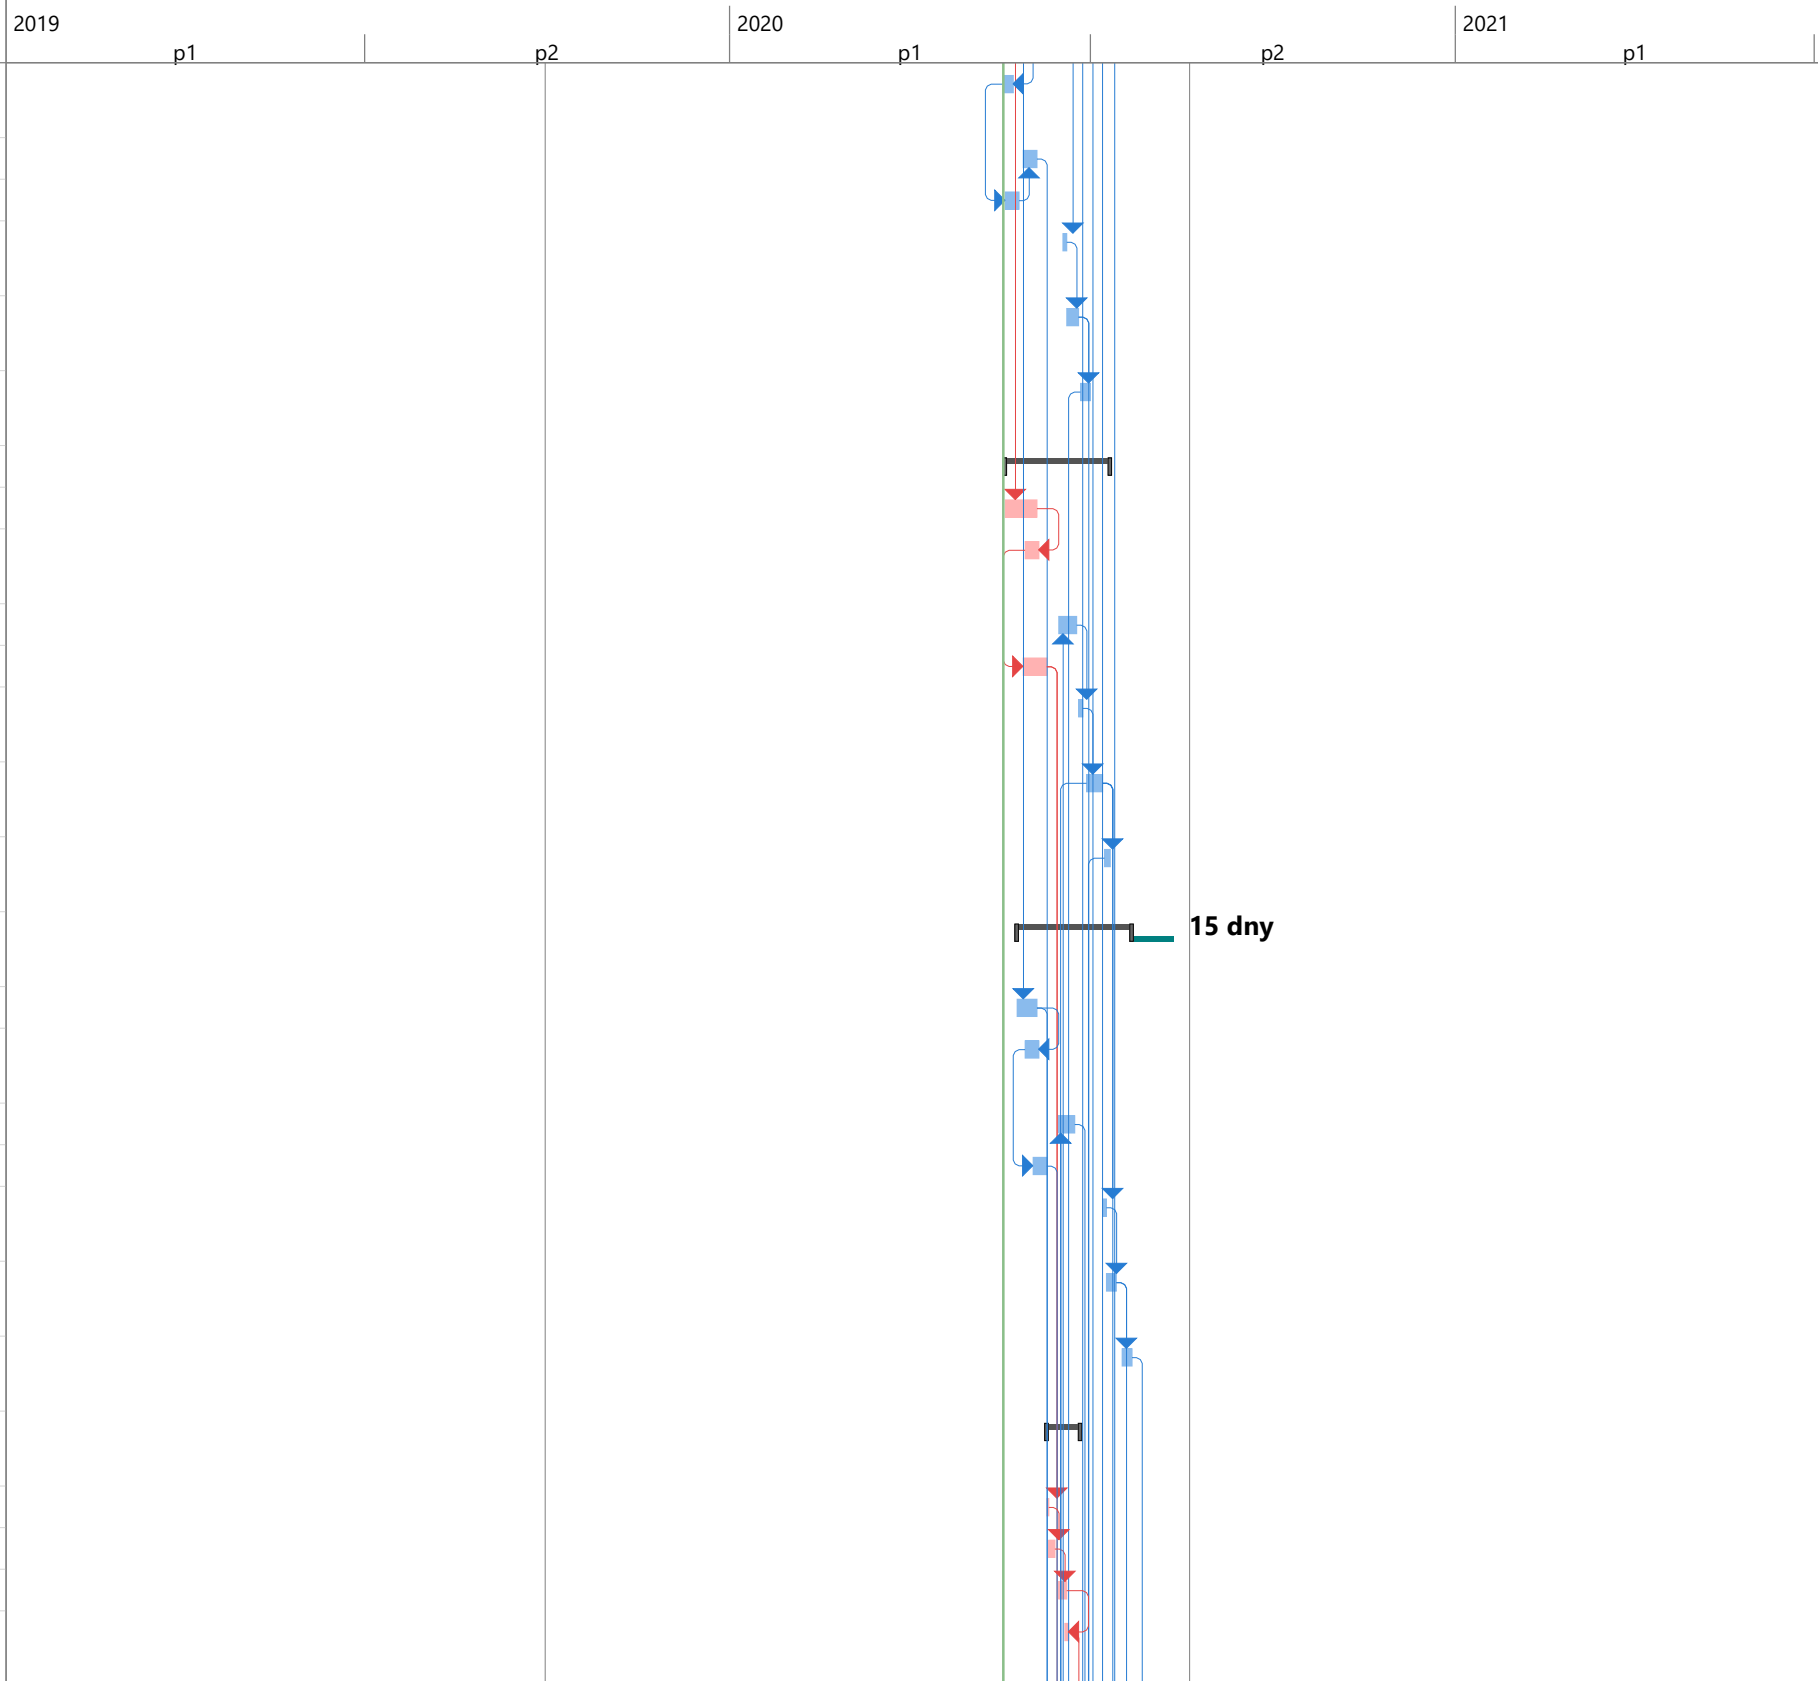


Kritický		Skruz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021
222		Finální úprava teraca	03 dny		1.7. 20	3.7. 20	223FF+1 den	224SS+1 den	p1	p2	p1
223		Osazení dveří	02 dny		3.7. 20	6.7. 20	225	224FS+1 den;222FF+1			
224		Lepení PVC	02 dny		30.6. 20	1.7. 20	223FS+1 den;222SS+1 den	219FS+1 den;174SS+2			
225		Montáž ZTI + otopných těles	01 den		7.7. 20	7.7. 20	226	223			
226		Kompletace elektro + svítidla	01 den		8.7. 20	8.7. 20	227	225			
227		Kopletace vzduchotechniky	04 dny		9.7. 20	14.7. 20	228	226			
228		Kompletace topení	01 den		15.7. 20	15.7. 20	229	227			
229		Úklid podlaží	ny3 dny		16.7. 20	20.7. 20		228			
230		Dokončovací práce a kompletace - 2.NP	050 dny		9.6. 20	17.8. 20					
231		Osazení vnitřních parapetů	01 den		9.6. 20	9.6. 20	233	179			
232		Malířské práce	ny4 dny		6.7. 20	9.7. 20	237	181FS-1 den			
233		Ocelové zábradlí	ny2 dny		10.6. 20	11.6. 20	178FS+1 den	231			
234		Provedení dlažeb + obkladů	06 dny		26.6. 20	3.7. 20		181SS-1 den			
235		Finální úprava teraca	03 dny		15.7. 20	17.7. 20	238FS+1 den	237FS-2 dny			
236		Osazení dveří	ny3 dny		16.7. 20	20.7. 20	238	237FF+2 dny			
237		Lepení PVC	ny5 dny		10.7. 20	16.7. 20	236FF+2 dny;235	232;182SS+2 c			
238		Montáž ZTI + otopných těles	02 dny		21.7. 20	22.7. 20	239SS	236;235FS+1 den			
239		Kompletace elektro + svítidla	07 dny		21.7. 20	29.7. 20	240FF+1 den	238SS			
240		Kompletace vzduchotechniky	04 dny		27.7. 20	30.7. 20	241	239FF+1 den			
241		Kompletace topení	ny1 den		31.7. 20	31.7. 20	242	240			
242		Úklid podlaží	ny5 dny		3.8. 20	7.8. 20	254FS+1 den	241			
243		Dokončovací práce a kompletace 3.NP	01 den		10.6. 20	10.6. 20					
244		Osazení vnitřních parapetů	01 den		10.6. 20	10.6. 20	186FS+2 dny	187FS+1 den			
245		Malířské práce	04 dny		14.7. 20	17.7. 20	249FF+4 dny	189			

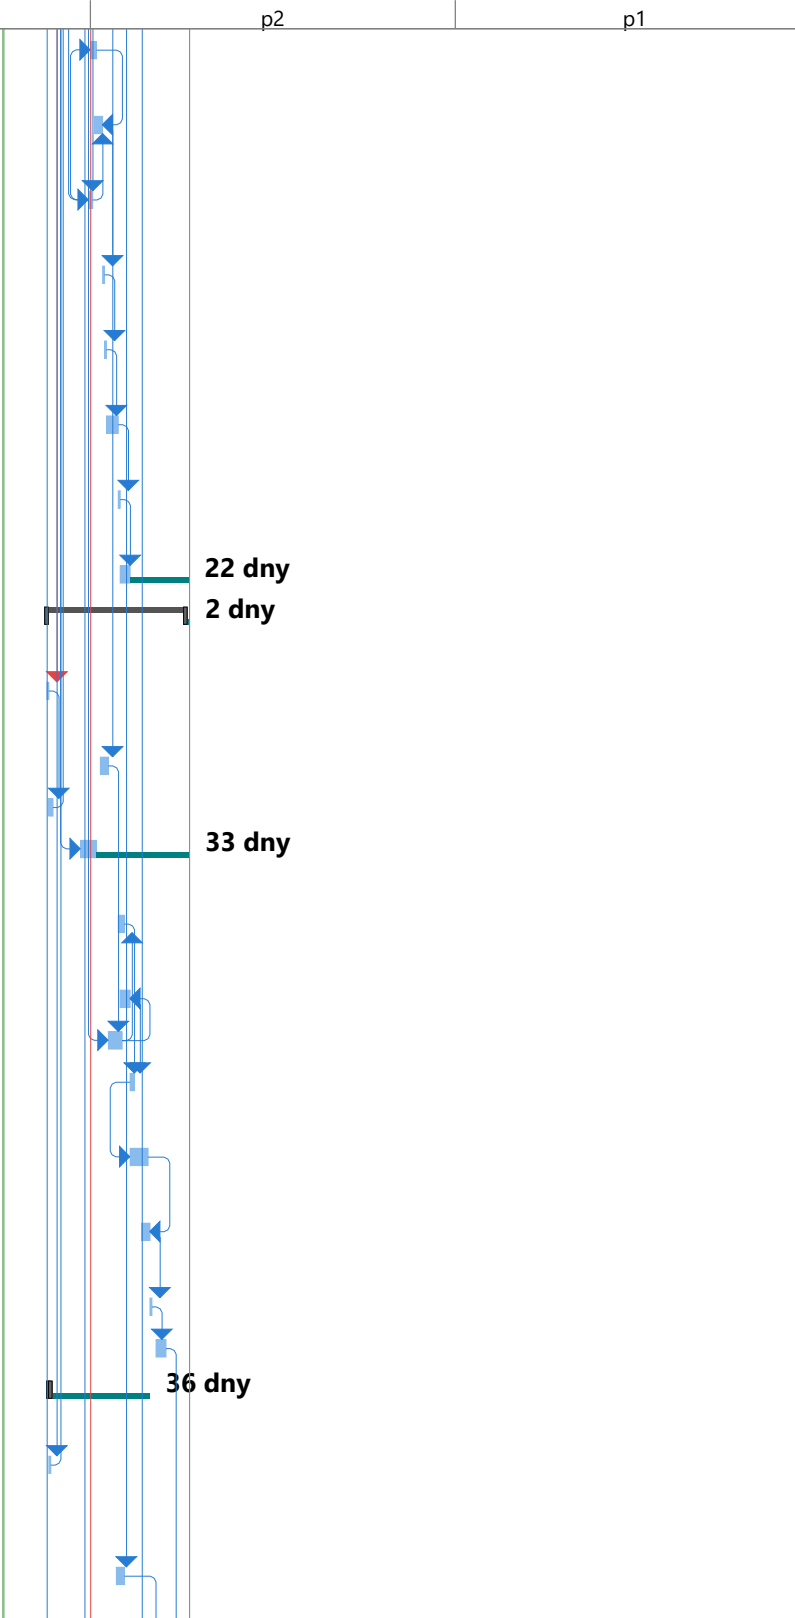


Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy- - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019				2020				2021							
									p1				p2				p1				p2			
246		Provedení dlažeb + obkladů		06 dny	23.6.20	30.6.20		186																
247		Finální úprava teraca		03 dny	22.7.20	24.7.20		249SS+1 den																
248		Osazení dveří		02 dny	24.7.20	27.7.20	250	249																
249		Lepení PVC		03 dny	21.7.20	23.7.20	248;247SS+1 den	245FF+4 dny;190FS-1																
250		Montáž ZTI + otopných těles		01 den	28.7.20	28.7.20	251SS	248																
251		Kompletace elektro + svítidla		07 dny	28.7.20	5.8.20	252FF+1 den	250SS																
252		Kopletace vzduchotechniky		04 dny	3.8.20	6.8.20	253	251FF+1 den																
253		Kompletace topení		ny1 den	7.8.20	7.8.20	255	252																
254		Úklid schodiště		ny5 dny	11.8.20	17.8.20		242FS+1 den																
255		Úklid podlaží		ny3 dny	10.8.20	12.8.20		253																
256		Fasádní úpravy		ny38 dny	4.6.20	27.7.20																		
257		Montáž zábradlí na terase		01 den	4.6.20	4.6.20	258	184																
258		Skladba terasy		ny6 dny	5.6.20	12.6.20	259SS+2 dny	257																
259		Montáž lešení		ny5 dny	9.6.20	15.6.20	260SS+2 dny	258SS+2 dny																
260		Kontaktní zateplovací systém		010 dny	11.6.20	24.6.20	261;263FF	259SS+2 dny																
261		Provedení fasádní omítky		08 dny	25.6.20	6.7.20	262FS-2 dny	260;263																
262		Montáž elektrotechnických žaluzií		08 dny	3.7.20	14.7.20	264	261FS-2 dny																
263		Osazení venkovních parapetů		01 den	24.6.20	24.6.20	261	260FF																
264		Kotvení hromosvodu		01 den	15.7.20	15.7.20	265	262																
265		Demontáž lešení		ny5 dny	16.7.20	22.7.20	266	264																
266		Provedení soklu		ny3 dny	23.7.20	27.7.20		265																
267		Komunikace na pozemku		020 dny	26.6.20	23.7.20																		
268		Výkop komunikace		ny1 den	26.6.20	26.6.20	269	196																

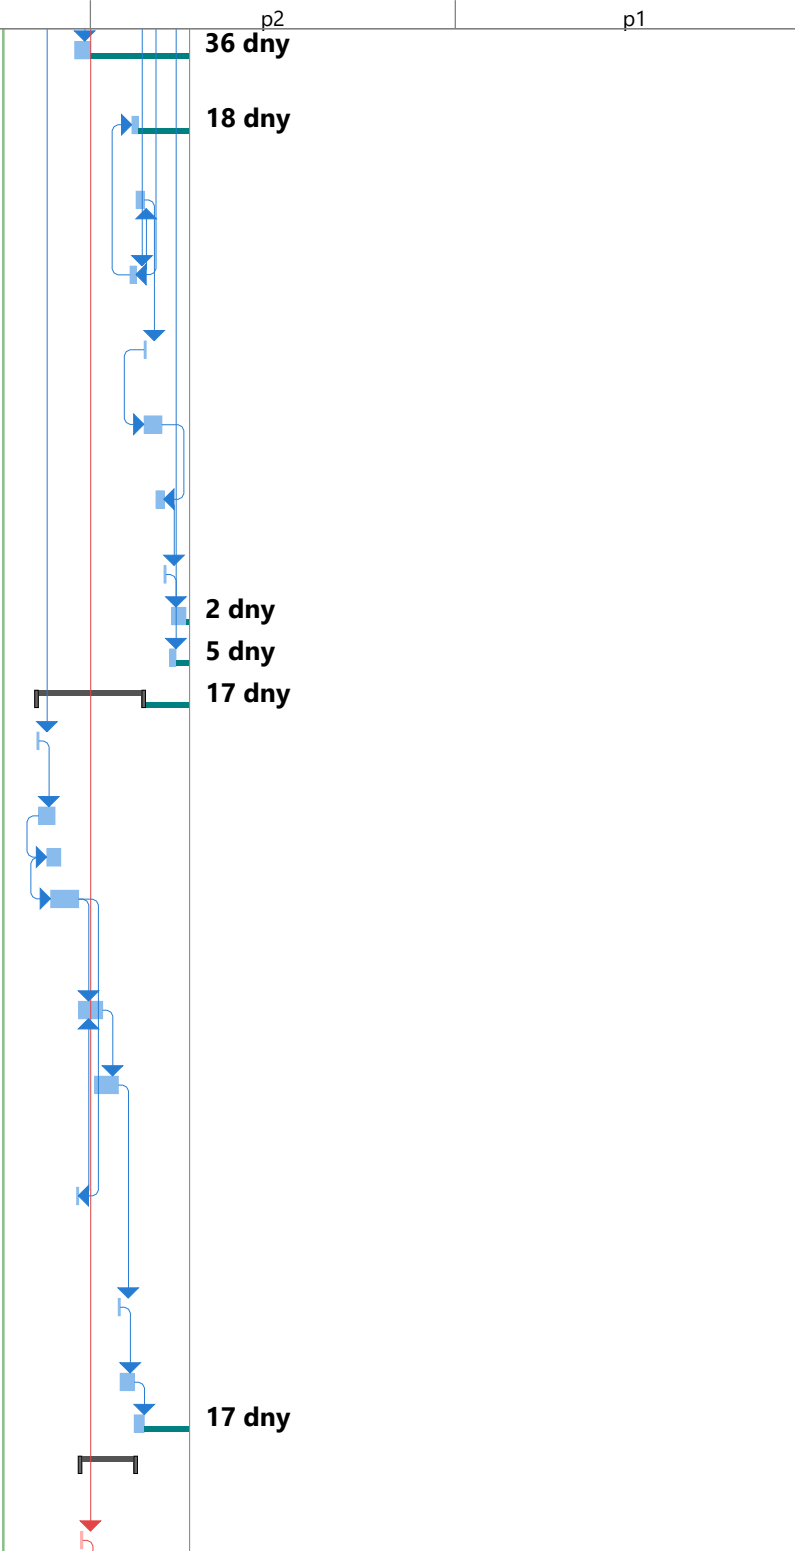

Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy- - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	2019	2020	2021		
									p1	p2	p1	p2	p1
269		Provedení komunikací na pozemku	04 dny		29.6. 20	2.7. 20	270FF	268					
270		Zřízení ocelového zábradlí u vstupu do budovy	01 den		2.7. 20	2.7. 20	272SS	269FF					
271		Drenáž komunikace	016 dny		2.7. 20	23.7. 20							
272		Bourání stávajících komunikací	04 dny		2.7. 20	7.7. 20	273	270SS					
273		Výkop zeminy + uložení drenážního potrubí	01 den		8.7. 20	8.7. 20	274	272					
274		Úprava pláň	ny 2 dny		9.7. 20	10.7. 20	276	273					
275		Komunikace mimo pozemek	09 dny		13.7. 20	23.7. 20							
276		Výkop komunikace	01 den		13.7. 20	13.7. 20	277SS	274					
277		Osazení obrubníků	02 dny		13.7. 20	14.7. 20	278SS+1 den;280	276SS					
278		Provedení komunikace mimo pozemek	08 dny		14.7. 20	23.7. 20	284FS-2 dny	277SS+1 den					
279		Parkovací stání	ny 4 dny		15.7. 20	20.7. 20							
280		Výkop komunikace (parkovacího stání)	01 den		15.7. 20	15.7. 20	281	277					
281		Osazení obrubníků	01 den		16.7. 20	16.7. 20	282	280					
282		Provedení parkovacích stání	02 dny		17.7. 20	20.7. 20		281					
283		Provedení plotu	ny 13 dny		22.7. 20	7.8. 20							
284		Betonáž sloupků pro plot	01 den		22.7. 20	22.7. 20	285	278FS-2 dny					
285		Osazení sloupků	ny 4 dny		23.7. 20	28.7. 20	286SS+2 dny	284					
286		Natažení pletiva	ny 4 dny		27.7. 20	30.7. 20	287FS-1 den	285SS+2 dny					
287		Výkop rýhy pro plot	ny 2 dny		30.7. 20	31.7. 20	288	286FS-1 den					

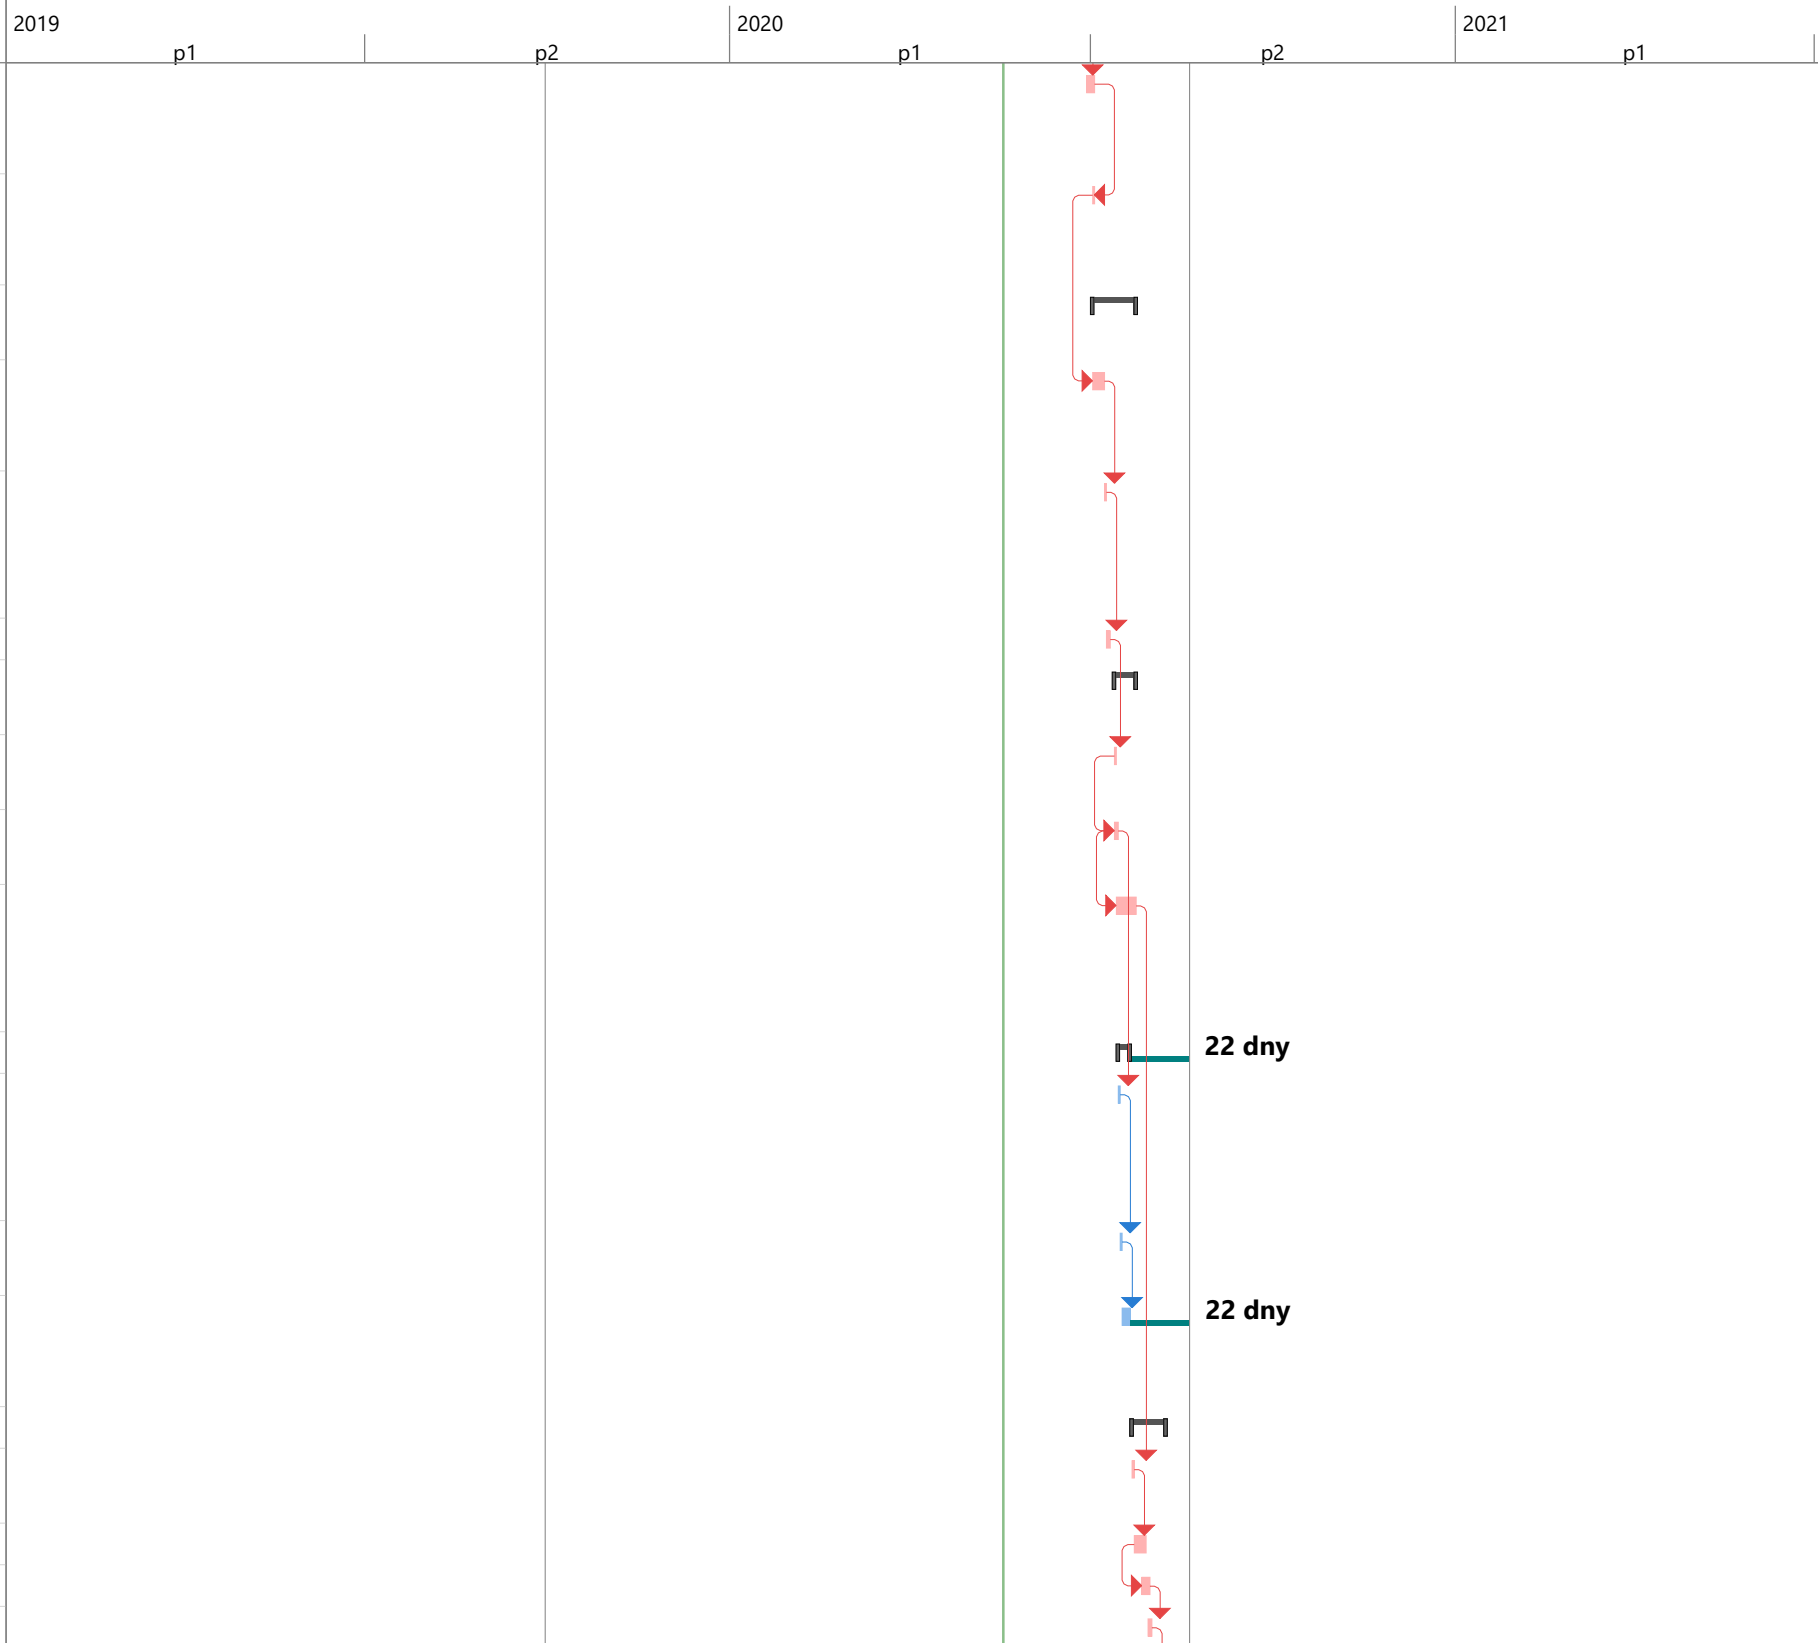

Kritický		Skruz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	

ID	Re úk	Název	Vy - trvání zp	Doba trvání	Zahájení	Dokončen	Následníci	Předchůdci	
									2019 p1 2020 p1 2021 p1
288		Zdění z prolévaných tvárnic	ny	0 1 den	3.8. 20	3.8. 20	289	287	
289		Armování plotu	ny	1 den	4.8. 20	4.8. 20	290	288	
290		Provedení omítky plotu	ny	0 3 dny	5.8. 20	7.8. 20	292SS+1 den	289	
291		Konečné úpravy	ny	10 dny	6.8. 20	19.8. 20			
292		Terénní úpravy	ny	3 dny	6.8. 20	10.8. 20	293SS+1 den	290SS+1 den	
293		Úklid staveniště	ny	7 dny	7.8. 20	17.8. 20	294	292SS+1 den	
294		Kolaudace	ny	1 den	18.8. 20	18.8. 20	295	293	
295		Předání stavby	ny	1 den	19.8. 20	19.8. 20		294	

Kritický		Skluz		Neaktivní milník		Pouze zahájení	
Rozdělení kritického úkolu		Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze s datem dokončení	
Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Vnější úkoly	
Rozdělení		Zahrnutý kritický		Pouze s dobou trvání		Vnější milník	
Milník		Rozdělení zahrnutého kritického úkolu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Konečný termín	
Časová rezerva		Neaktivní úkol		Ruční souhrn		Průběh	
