

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**

**FAKULTA
STAVEBNÍ
KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB**



**DIPLOMOVÁ
PRÁCE**

**Stavebně technologický projekt
Základní škola U Elektry**

4 Řešení časové struktury

**2021
Bc.
MARTIN
KAMENICKÝ**

**VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
ING. PAVEL NEUMANN**

OBSAH:

4	ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY.....	1
4.1	ČASOVÝ PLÁN OBJEKTOVÝ	3
4.2	ČASOVÝ PLÁN ETAPOVÝ	3
4.3	ČASOPROSTOROVÝ GRAF DÍLČÍ.....	3
4.4	ČASOVÝ GRAF KOMPLEXNÍ	3
4.5	GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ.....	3
4.6	GRAF POTŘEBY FINANCÍ	3
4.7	POUŽITÉ ZDROJE.....	3

4.1 Časový plán objektový

Viz. Příloha 4.1

4.2 Časový plán etapový

Viz. Příloha 4.2

4.3 Časoprostorový graf dílčí

Viz. Příloha 4.3

4.4 Časový graf komplexní

Viz. Příloha 4.4

4.5 Graf nasazení pracovníků

Viz. příloha 4.5

4.6 Graf potřeby financí

Viz. Příloha 4.6

4.7 Použité zdroje

Přílohy zpracované pomocí programu CONTEC

Příloha 4.4 Časoprostorový graf komplexní



CONTEC - PG akece: 00010000 ZTMU Elektrý-komplet

Podpis inmostí



- 5 SO341-p íp.voda
- Zemní práce, bourání, SO341-p íp.voda
- 30 Hrubá vrchní stavba, SO341-p íp.voda
- 60 Omítky a pot. ry, SO341-p íp.voda
- 90 Vn í-4 úpravy, SO341-p íp.voda
- 95 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO341-p íp.voda
- 10005 Zemní práce, bourání, SO301-p íp.kanal
- 10030 POKLAD A VEDL. KONSTR. IS, SO301-p íp.kanal
- 10060 Omítky a pot. ry, SO301-p íp.kanal
- 10090 Vn í-4 úpravy, SO301-p íp.kanal
- 10095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO301-p íp.kanal
- 20005 Zemní práce, bourání, SO511-p íp.plyn
- 20030 Hrubá vrchní stavba, SO511-p íp.plyn
- 20050 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU, SO511-p íp.plyn
- 20060 Omítky a pot. ry, SO511-p íp.plyn
- 20090 Vn í-4 úpravy, SO511-p íp.plyn
- 20095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, SO511-p íp.plyn
- 30005 Zemní práce, bourání, ZTM
- 30010 Zakládání, ZTM
- 30020 Spodní stavba, ZTM
- 30030 Hrubá vrchní stavba, ZTM
- 30040 St echa, ZTM
- 30050 P í ky, hrubé instalace, ZTM
- 30060 Omítky a pot. ry, ZTM
- 30070 Podlahy, povrchy, techn., ZTM
- 30080 Vnit. ní komplety, ZTM
- 30090 Vn í-4 úpravy, ZTM
- 30095 VÝSTUPNÍ KONTROLA, ZTM
- 40060 SLOUPY VENKOVNÍ, S0703-oplocení
- 40090 ZÁME NÍCI DOPL. KY, S0703-oplocení
- 50005 P ÍPRAVNĚ A P ÍDR PRÁCE, SO101-komunikace
- 50030 Hrubá vrchní stavba, SO101-komunikace
- 50060 Omítky a pot. ry, SO101-komunikace
- 50090 Vn í-4 úpravy, SO101-komunikace

- imost kritická
- imost zpozdí ná
- imost s rezervou
- míník
- v nejd íve molých termínech




CONTEC
STAVBA:

ASOPROSTOROVÝ GRAF
00010000 ZTMU Elektrý-komplet

Příloha 4.5 Graf potřeby pracovníků


Graf potřeby pracovníků celkem v m sících [Pracovník] - pr b fn

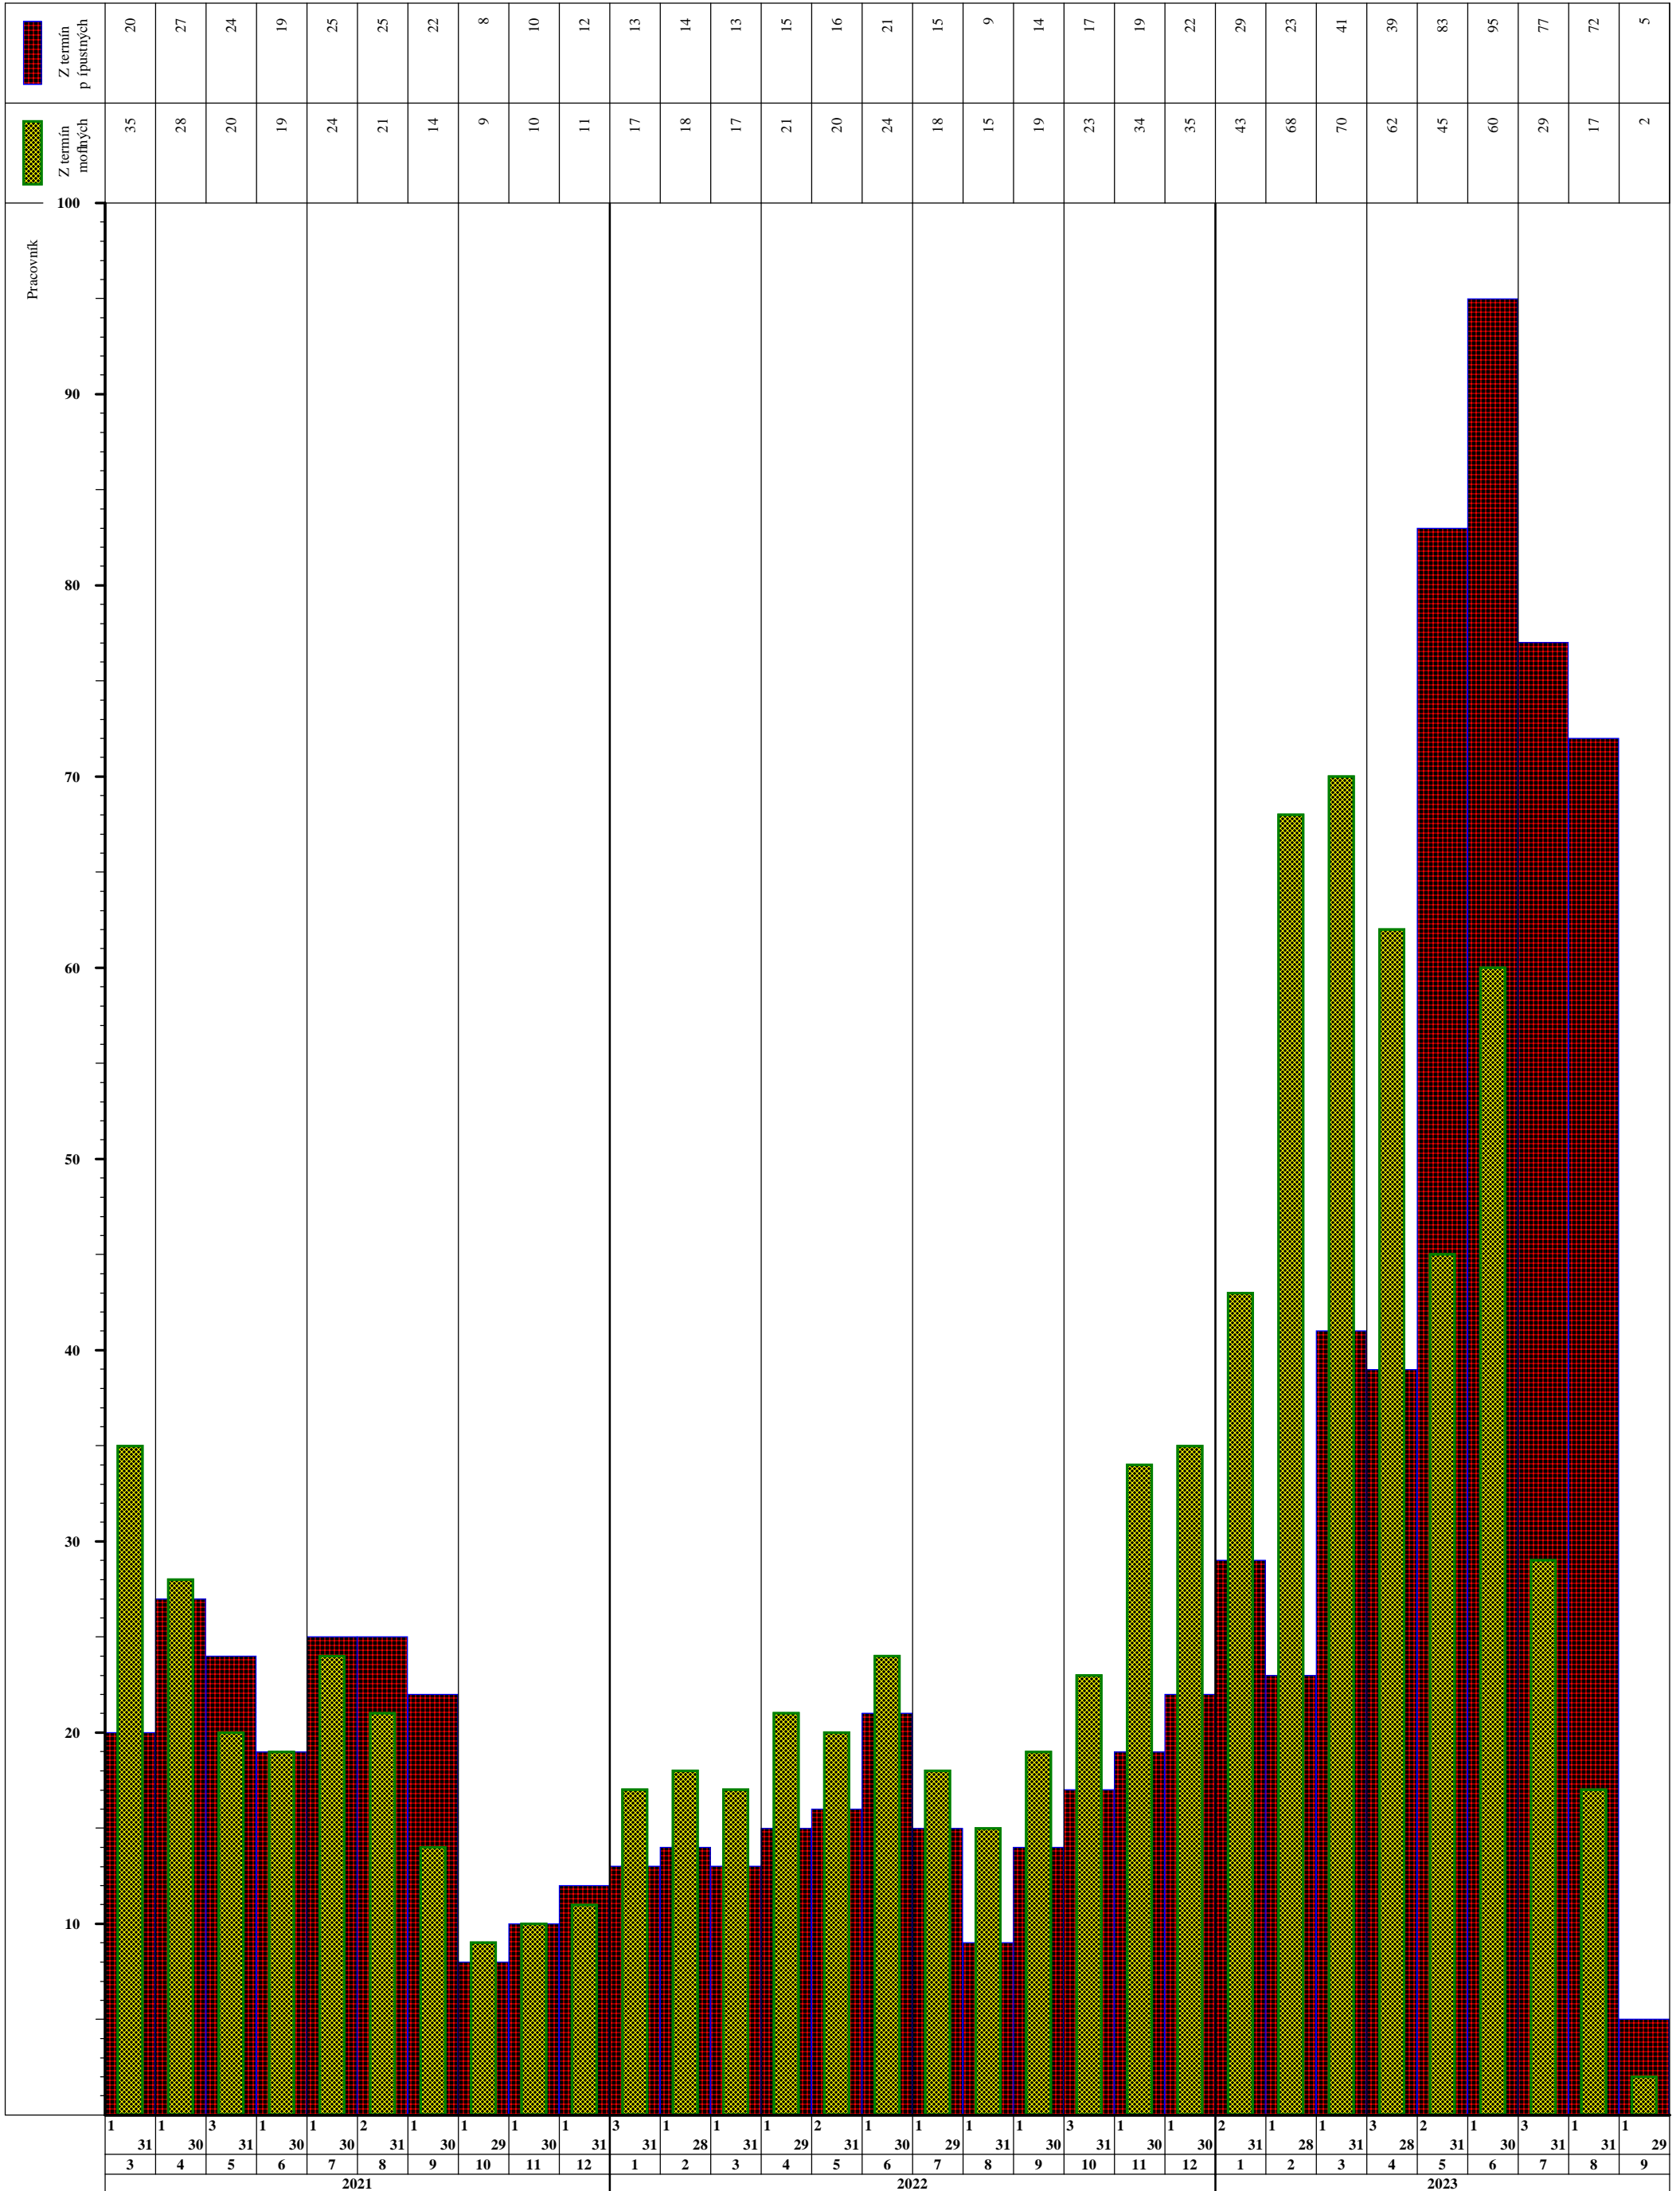

Příloha 4.6 Graf čerpání financí

3.1.21

Graf potřeby rozpočtové ceny celkem v m sících [Tisíc Kč] - pr b fn

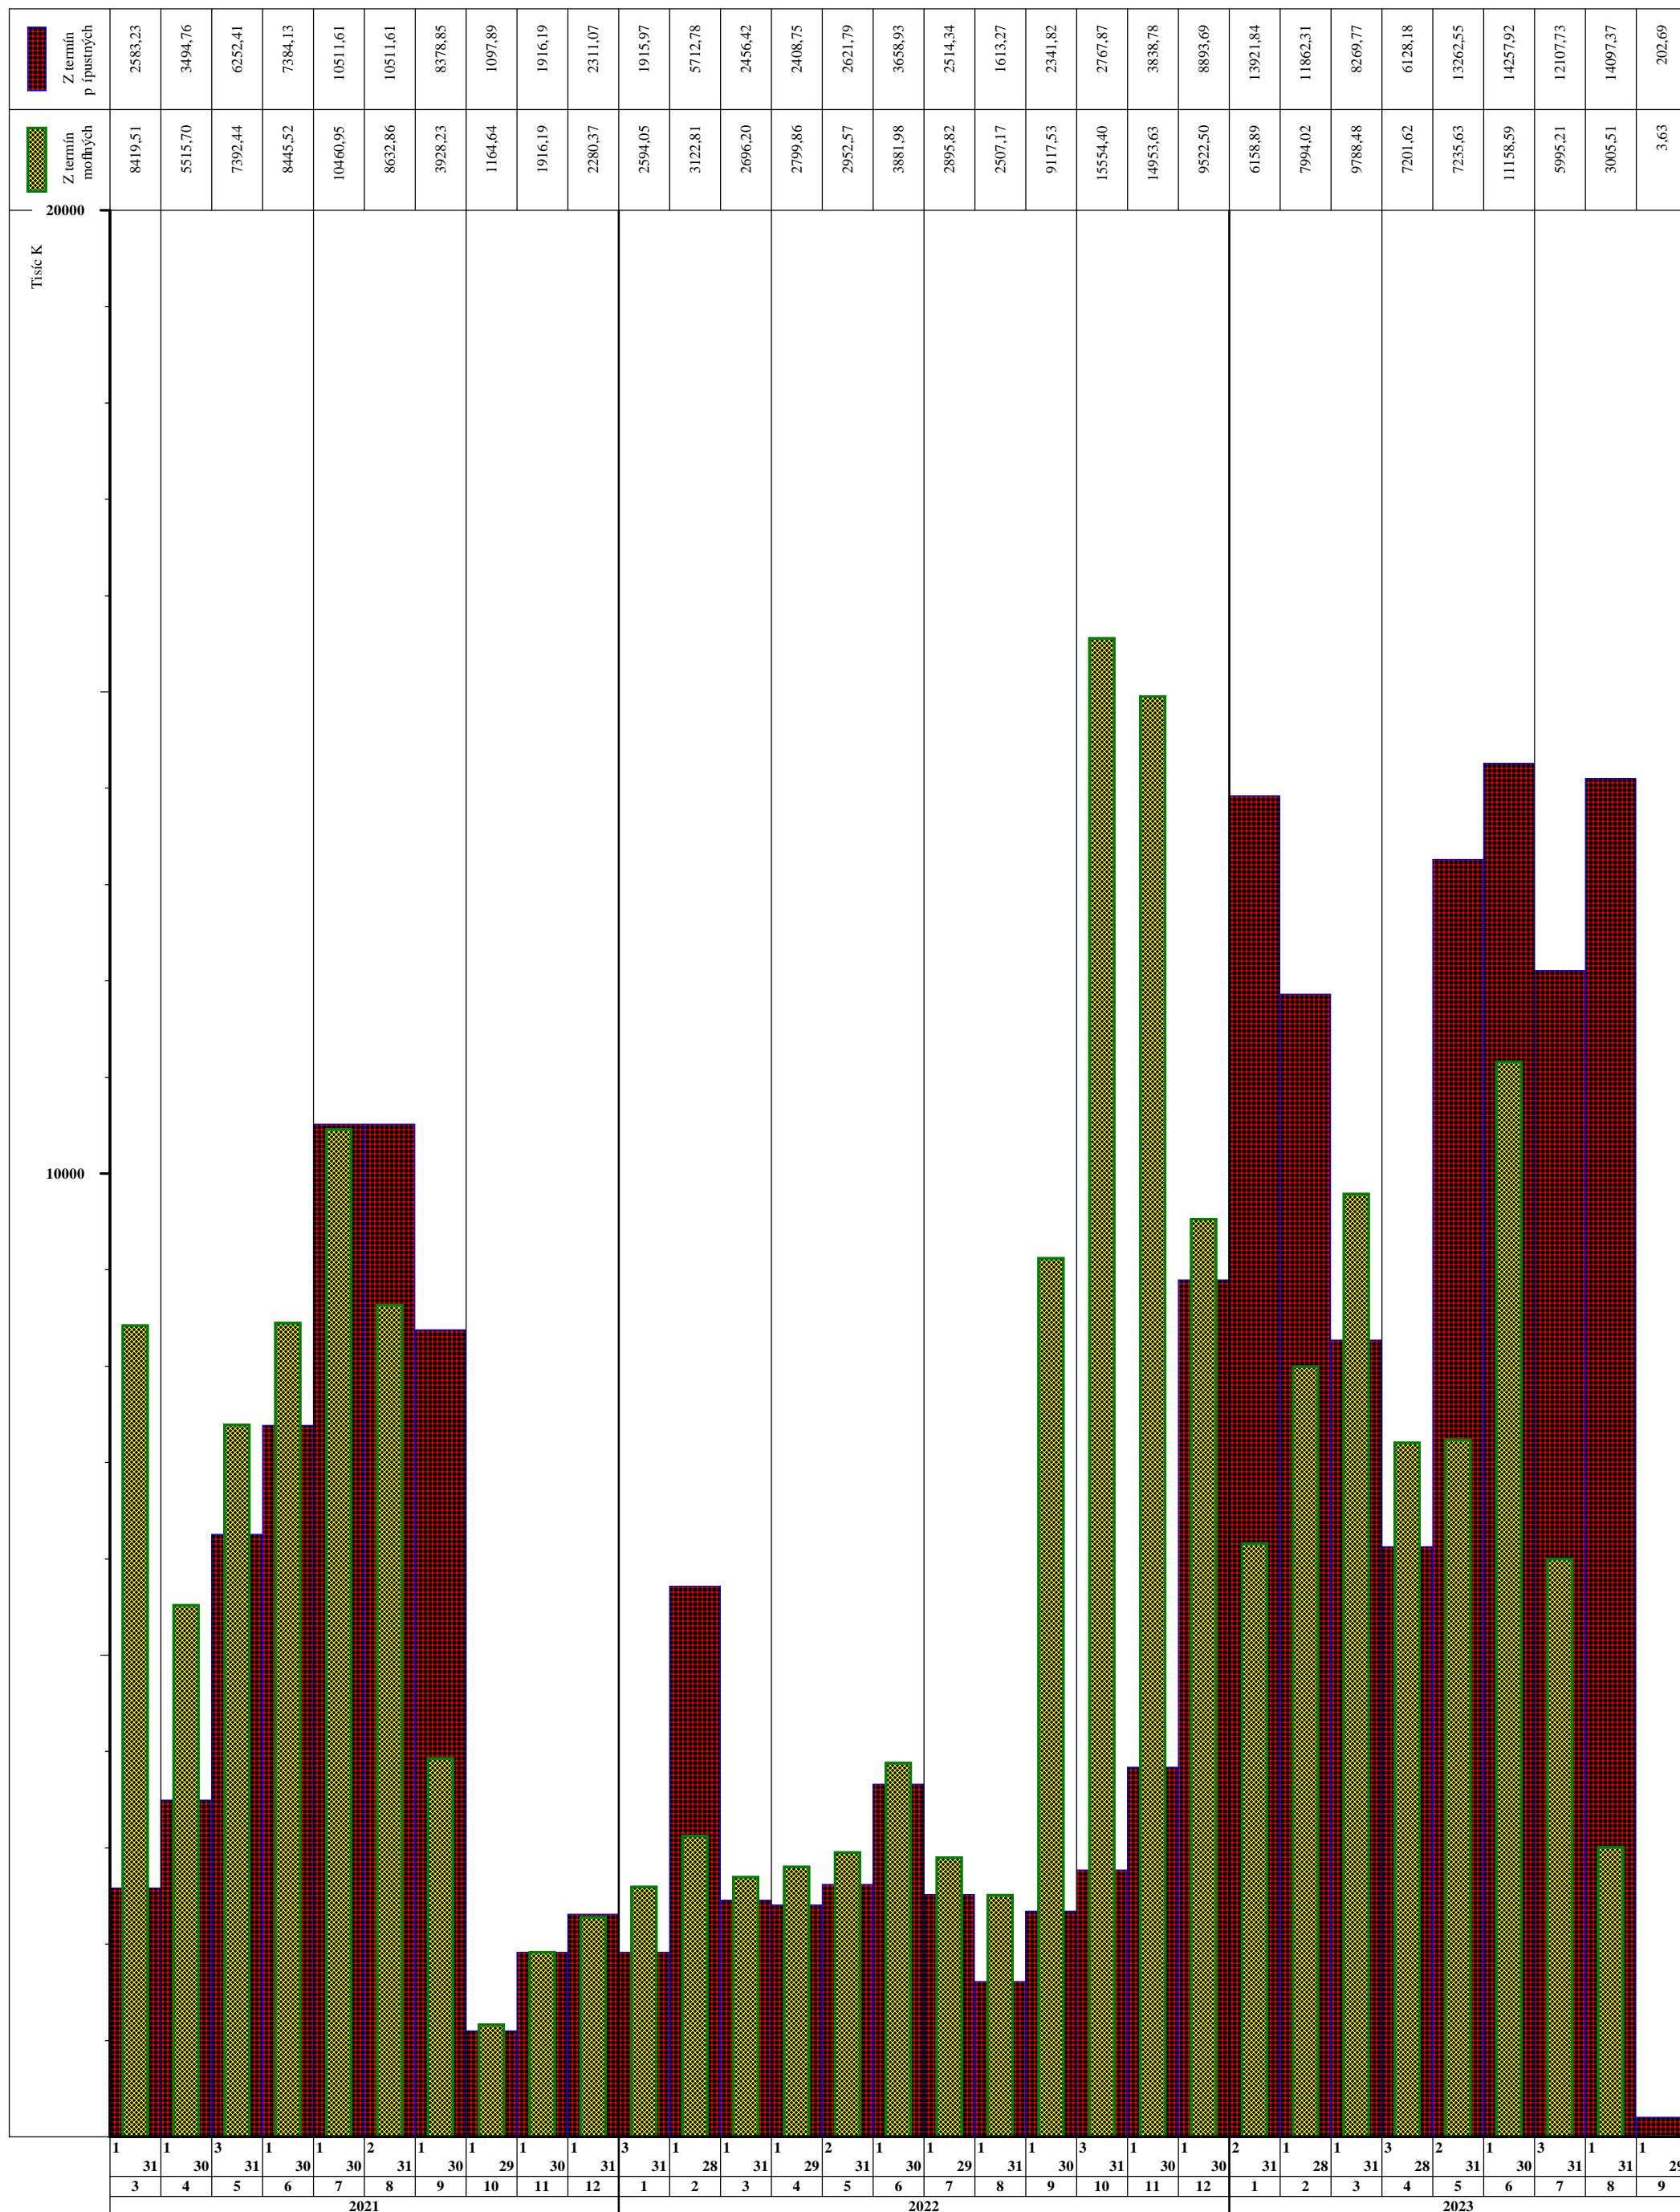

Graf pot eby rozpo tové ceny celkem v m sících [Tisíc K] - nas ítan

