




5.12.20

							2021																																								
							3				4				5				6				7				8				9				10				11								
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek	Konec		1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	4	11	18	25	1	8
Dodav.	Směnnost		[týd.]	možný	možný		5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12				
Haly																																															
5	Zemní práce, bourání 1 Haly	7	5	8	1.3.21	2.4.21																	Zemní práce, bourání																								
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Haly	5	4	0	1.3.21	26.3.21																	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																								
551	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM 1 Haly	2	3	0	8.3.21	26.3.21																	ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM																								
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Haly	1	4	9	1.3.21	26.3.21																	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																								
650	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ 1 Haly	2	1	8	29.3.21	2.4.21																	IZOL PROTI TLAKOVÉ VODĚ																								
10 Zakládání																																															
1 Haly																																															
1252	VRTY PRO PILOTY 1 Haly	7	3	0	29.3.21	16.4.21																	VRTY PRO PILOTY																								
1302	PILOTY 1 Haly	10	4	0	5.4.21	30.4.21																	PILOTY																								
1399	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY 1 Haly	6	2	0	3.5.21	14.5.21																	PODKL VRSTVY SPOD STAVBY																								
1400	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 Haly	6	2	2	10.5.21	21.5.21																	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD																								
1402	ZÁKLADY 1 Haly	4	2	2	17.5.21	28.5.21																	ZÁKLADY																								
1757	KANALIZACE LEŽATÁ /KANAL 1 Haly	3	3	5	26.4.21	14.5.21																	KANALIZACE LEŽATÁ																								
20 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU																																															
1 Haly																																															
9210	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 Haly	2	3	7	23.8.21	10.9.21																	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU																								
30 Hrubá vrchní stavba																																															
1 Haly																																															
3303	SLOUPY A PILÍŘE 1 Haly	1	3	0	17.5.21	4.6.21																	SLOUPY A PILÍŘE																								
3404	STROPY 1 Haly	2	3	0	31.5.21	18.6.21																	STROPY																								
3504	SCHODIŠTĚ 1 Haly	1	3	0	31.5.21	18.6.21																	SCHODIŠTĚ																								
3859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Haly	4	7	9	26.4.21	11.6.21																	PŘESUN HMOT TE 3																								

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynučený termín -



5.12.20

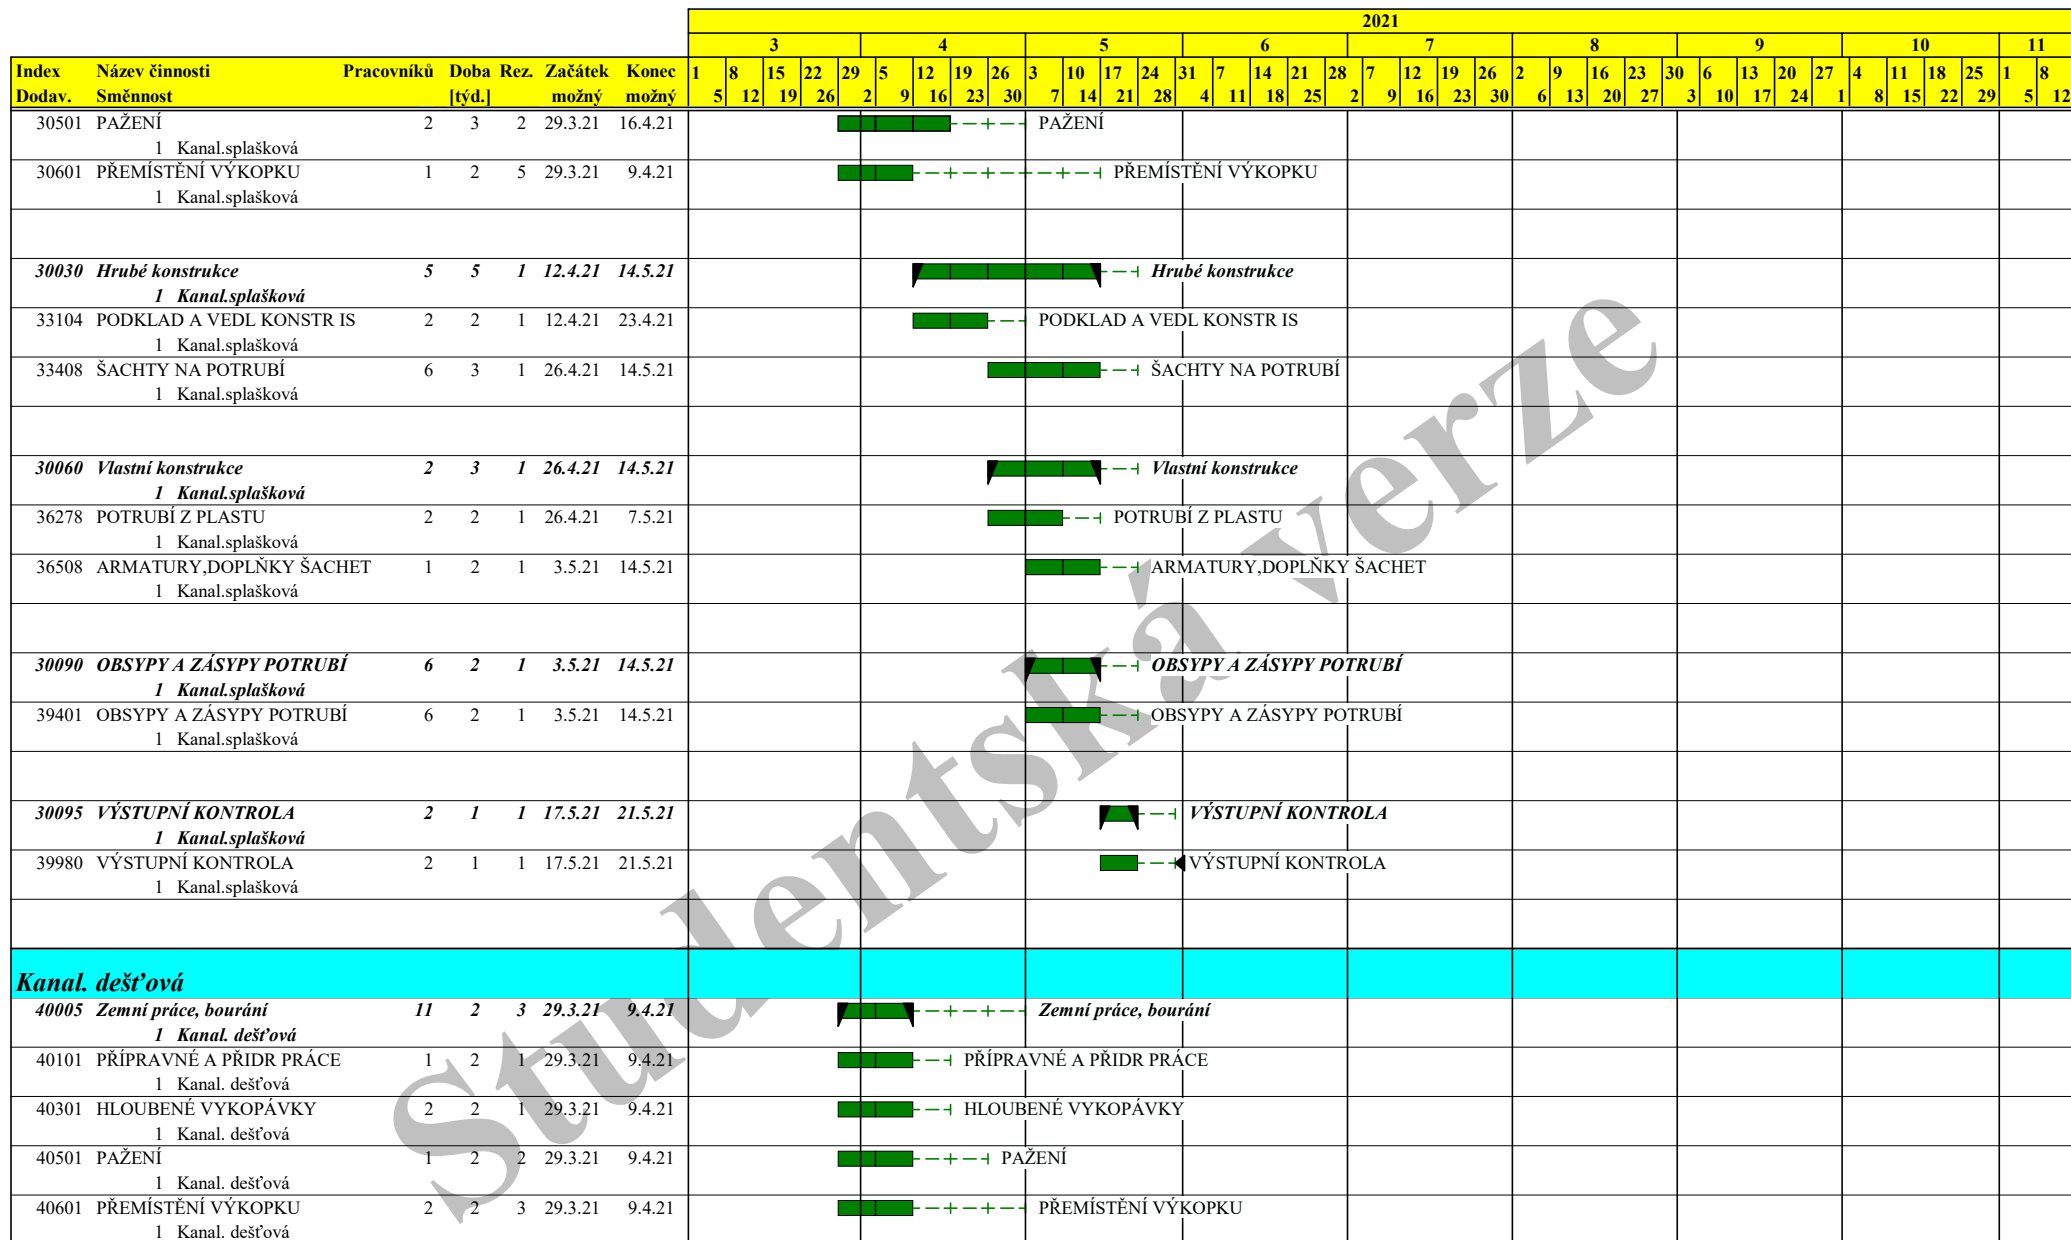

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -



5.12.20

							2021																																														
							3				4				5				6				7				8				9				10				11														
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek	Konec		1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	4	11	18	25	1	8	5	12							
Dodav.	Směnnost		[týd.]	možný	možný		5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	4	11	18	25	1	8	5	12								
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Plynovod venkov.	2	1	3	12.4.21	16.4.21																																															
50030	Hrubé konstrukce 1 Plynovod venkov.	5	3	1	19.4.21	7.5.21																																															
53104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Plynovod venkov.	2	1	2	19.4.21	23.4.21																																															
53300	ZÁKLADY IS 1 Plynovod venkov.	3	1	1	19.4.21	23.4.21																																															
53301	ZDI NOSNÉ 1 Plynovod venkov.	4	1	1	26.4.21	30.4.21																																															
53303	STROPY 1 Plynovod venkov.	5	1	1	3.5.21	7.5.21																																															
50060	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 Plynovod venkov.	2	1	1	3.5.21	7.5.21																																															
56207	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 Plynovod venkov.	2	1	1	3.5.21	7.5.21																																															
50090	Dokončovací konstrukce 1 Plynovod venkov.	3	2	1	10.5.21	21.5.21																																															
59301	PLYNOVOD PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 Plynovod venkov.	2	1	1	10.5.21	14.5.21																																															
59501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Plynovod venkov.	4	1	1	17.5.21	21.5.21																																															
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Plynovod venkov.	1	1	1	24.5.21	28.5.21																																															
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Plynovod venkov.	1	1	1	24.5.21	28.5.21																																															
Stanice dusíku																																																					
60005	Zemní práce, bourání 1 Stanice dusíku	4	2	2	9.8.21	20.8.21																																															
60101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Stanice dusíku	2	1	1	9.8.21	13.8.21																																															
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Stanice dusíku	3	1	1	16.8.21	20.8.21																																															
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Stanice dusíku	2	1	2	16.8.21	20.8.21																																															

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynučený termín -



5.12.20

						2021																																															
						3					4					5				6				7				8				9				10				11													
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	4	11	18	25	1	8					
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12										
60030	ZÁKLADY IS 1 Stanice dusíku	3	1	1	23.8.21	27.8.21																																															
63152	ZÁKLADY IS 1 Stanice dusíku	3	1	1	23.8.21	27.8.21																																															
60060	Omítky a potěry 1 Stanice dusíku	3	2	1	23.8.21	3.9.21																																															
66254	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 Stanice dusíku	2	1	1	30.8.21	3.9.21																																															
66307	POTRUBÍ OCELOVÉ 1 Stanice dusíku	3	1	1	23.8.21	27.8.21																																															
60090	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 Stanice dusíku	3	1	1	30.8.21	3.9.21																																															
69405	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 Stanice dusíku	3	1	1	30.8.21	3.9.21																																															
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Stanice dusíku	1	1	1	6.9.21	10.9.21																																															
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Stanice dusíku	1	1	1	6.9.21	10.9.21																																															
NN venk. rozvody																																																					
70005	Zemní práce, bourání 1 NN venk. rozvody	9	1	2	19.4.21	23.4.21																																															
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 NN venk. rozvody	2	1	1	19.4.21	23.4.21																																															
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 NN venk. rozvody	3	1	1	19.4.21	23.4.21																																															
70509	PAŽENÍ 1 NN venk. rozvody	2	1	2	19.4.21	23.4.21																																															
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 NN venk. rozvody	2	1	2	19.4.21	23.4.21																																															
70030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 NN venk. rozvody	2	1	1	26.4.21	30.4.21																																															
73104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 NN venk. rozvody	2	1	1	26.4.21	30.4.21																																															



5.12.20

							2021																																																	
							3					4					5					6					7					8					9					10					11									
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný		1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12								
Dodav.	Směnnost		[týd.]				5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12													
70060	Vlastní konstrukce 1 NN venk. rozvody	2	2	1	3.5.21	14.5.21																																																		
76207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 NN venk. rozvody	2	1	1	3.5.21	7.5.21																																																		
76601	ZÁSYPY 1 NN venk. rozvody	2	1	1	10.5.21	14.5.21																																																		
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 NN venk. rozvody	1	1	1	17.5.21	21.5.21																																																		
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 NN venk. rozvody	1	1	1	17.5.21	21.5.21																																																		
Sděl. rozv. ven.																																																								
80005	Zemní práce, bourání 1 Sděl. rozv. ven.	9	1	2	19.4.21	23.4.21																																																		
80101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Sděl. rozv. ven.	2	1	1	19.4.21	23.4.21																																																		
80301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Sděl. rozv. ven.	3	1	1	19.4.21	23.4.21																																																		
80509	PAŽENÍ 1 Sděl. rozv. ven.	2	1	2	19.4.21	23.4.21																																																		
80601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Sděl. rozv. ven.	2	1	2	19.4.21	23.4.21																																																		
80030	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Sděl. rozv. ven.	5	1	1	26.4.21	30.4.21																																																		
83104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Sděl. rozv. ven.	5	1	1	26.4.21	30.4.21																																																		
80060	Vlastní konstrukce 1 Sděl. rozv. ven.	5	2	2	3.5.21	14.5.21																																																		
86207	SLABOPROUD VEDENÍ KABEL 1 Sděl. rozv. ven.	2	1	1	3.5.21	7.5.21																																																		
86408	DROBNÉ ZÁKLADY 1 Sděl. rozv. ven.	3	1	1	10.5.21	14.5.21																																																		
86456	SLOUPY VENKOVNÍ 1 Sděl. rozv. ven.	3	1	2	10.5.21	14.5.21																																																		
86501	ZÁSYPY 1 Sděl. rozv. ven.	2	1	2	10.5.21	14.5.21																																																		



5.12.20

							2021																																																				
							3				4				5				6				7				8				9				10				11																				
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba	Rez.	Začátek	Konec	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	7	14	21	28	7	14	21	28	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12		
Dodav.	Směnnost		[týd.]		možný	možný	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12											
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Sděl. rozv. ven.	1	1	1	17.5.21	21.5.21																																																					
89980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Sděl. rozv. ven.	1	1	1	17.5.21	21.5.21																																																					
90005	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Oplocení	3	1	1	26.7.21	30.7.21																																																					
90301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Oplocení	3	1	1	26.7.21	30.7.21																																																					
90060	Omítky a potěry 1 Oplocení	9	2	1	2.8.21	13.8.21																																																					
96103	SLOUPY VENKOVNÍ 1 Oplocení	3	2	1	2.8.21	13.8.21																																																					
96203	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 Oplocení	6	2	1	2.8.21	13.8.21																																																					
90090	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Oplocení	2	1	1	16.8.21	20.8.21																																																					
99357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 Oplocení	2	1	1	16.8.21	20.8.21																																																					
90095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Oplocení	1	1	1	16.8.21	20.8.21																																																					
99980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Oplocení	1	1	1	16.8.21	20.8.21																																																					
Vegetace																																																											
100005	Zemní práce, bourání 1 Vegetace	6	1	1	23.8.21	27.8.21																																																					
100101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Vegetace	2	1	1	23.8.21	27.8.21																																																					
100301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Vegetace	3	1	1	23.8.21	27.8.21																																																					
100701	NÁSPY A SKLÁDKY 1 Vegetace	1	1	1	23.8.21	27.8.21																																																					
100090	Dokončovací konstrukce 1 Vegetace	9	3	1	30.8.21	17.9.21																																																					

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -



5.12.20

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný	2021																																													
							3					4					5					6					7					8					9					10					11					
							1	8	15	22	29	5	12	19	26	30	3	10	17	24	28	31	7	14	21	25	2	9	16	23	30	2	9	16	23	30	6	13	20	27	30	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15
109101	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU 1 Vegetace	6	3	1	30.8.21	17.9.21	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU																																													
109709	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ 1 Vegetace	4	2	1	6.9.21	17.9.21	DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ																																													
100095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Vegetace	1	1	1	13.9.21	17.9.21	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																													
109980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Vegetace	1	1	1	13.9.21	17.9.21	VÝSTUPNÍ KONTROLA																																													
Věř. osvětlení																																																				
110005	Zemní práce, bourání 1 Věř. osvětlení	7	1	16	24.5.21	28.5.21	Zemní práce, bourání																																													
110101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Věř. osvětlení	2	1	15	24.5.21	28.5.21	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE																																													
110301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Věř. osvětlení	3	1	15	24.5.21	28.5.21	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY																																													
110601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Věř. osvětlení	2	1	16	24.5.21	28.5.21	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU																																													
110030	Hrubé konstrukce 1 Věř. osvětlení	3	3	15	31.5.21	18.6.21	Hrubé konstrukce																																													
113104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Věř. osvětlení	2	1	15	31.5.21	4.6.21	PODKLAD A VEDL KONSTR IS																																													
113403	ZÁKLADY IS 1 Věř. osvětlení	3	1	15	7.6.21	11.6.21	ZÁKLADY IS																																													
113807	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY 1 Věř. osvětlení	3	1	15	14.6.21	18.6.21	ZÁMEČNÍCI KONSTR PRVKY																																													
110060	Vlastní konstrukce 1 Věř. osvětlení	1	18	1	7.6.21	8.10.21	Vlastní konstrukce																																													
116207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 Věř. osvětlení	2	1	16	7.6.21	11.6.21	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU																																													
116307	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY 1 Věř. osvětlení	3	1	1	27.9.21	1.10.21	VEŘEJ OSVĚTLENÍ STOŽÁRY																																													
116357	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS 1 Věř. osvětlení	2	1	1	27.9.21	1.10.21	SILNOPROUD ROZVÁDĚČE IS																																													
116601	ZÁSYPY 1 Věř. osvětlení	2	1	1	4.10.21	8.10.21	ZÁSYPY																																													

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

