


Ekonomické zhodnocení


Recyklace na místě stavby - V2 - Recyklační linka - Harmonogram



Příloha 5.1

| ID | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Náklady | říjen 2018 | | | | | | | | | | | | listopad 2018 | | | | | | | | | | | | prosinec 2018 | | | | | | | | | | | | leden 2019 | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | 26 | 28 | 30 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 0 | | Demoliční fáze ČZU FTZ | 75,63 dny | 01.10. 18 | 16.12. 18 | 2 688 355,24 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | Zařízení staveniště | 16 dny | 01.10. 18 | 16.10. 18 | 562 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | A.1 | Zahájení etapy SEO | 0 dny | 01.10. 18 | 01.10. 18 | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | A.2 | Převzetí staveniště | 1 den | 01.10. 18 | 01.10. 18 | 20 900,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | A.3 | Vytyčení staveniště | 1 den | 01.10. 18 | 01.10. 18 | 62 700,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | A.4 | Oplocení staveniště | 1 den | 02.10. 18 | 02.10. 18 | 180 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | A.5 | Vytvoření podkladu zařízení staveniště | 1 den | 03.10. 18 | 03.10. 18 | 25 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | A.6 | Vybudování zařízení staveniště | 2 dny | 04.10. 18 | 05.10. 18 | 75 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | A.7 | Zábor komunikace | 1 den | 05.10. 18 | 05.10. 18 | 16 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | A.8 | Napojení ZS - Vytyčení přípojky kanalizace | 1 den | 06.10. 18 | 06.10. 18 | 15 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | A.9 | Napojení ZS - Výkop rýh přípojky kanalizace | 1 den | 07.10. 18 | 07.10. 18 | 5 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | A.10 | Napojení ZS - Příložné pažení a rozepření stěn rýh hloubky do 2 m | 2 dny | 08.10. 18 | 09.10. 18 | 5 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | A.11 | Napojení ZS - Pískové lože pro přípojku kanalizace | 1 den | 09.10. 18 | 09.10. 18 | 4 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | A.12 | Napojení ZS - Pokládka potrubí a výstražné fólie | 2 dny | 10.10. 18 | 11.10. 18 | 4 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | A.13 | Napojení zařízení staveniště na kanalizaci | 1 den | 12.10. 18 | 12.10. 18 | 3 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A.14 | Napojení ZS - Pískový zásyp rýh přípojky kanalizace a odstranění příložného pažení | 2 dny | 13.10. 18 | 14.10. 18 | 5 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | A.15 | Napojení ZS - Zásyp rýh přípojky kanalizace hutněný | 2 dny | 15.10. 18 | 16.10. 18 | 3 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | A.16 | Napojení ZS - Vytyčení přípojky vodovodu | 1 den | 07.10. 18 | 07.10. 18 | 15 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | A.17 | Napojení ZS - Výkop rýh přípojky vodovodu | 2 dny | 08.10. 18 | 09.10. 18 | 5 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | A.18 | Napojení ZS - Příložné pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | 2 dny | 09.10. 18 | 10.10. 18 | 3 600,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | A.19 | Napojení ZS - Pískové lože pro přípojku vodovodu | 1 den | 11.10. 18 | 11.10. 18 | 4 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | A.20 | Napojení ZS - Pokládka potrubí, včetně osazení vodoměru a položení výstražné fólie | 2 dny | 12.10. 18 | 13.10. 18 | 5 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | A.21 | Napojení zařízení staveniště na vodovod | 1 den | 14.10. 18 | 14.10. 18 | 3 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | A.22 | Napojení ZS - Pískový zásyp přípojky vodovodu a odstranění příložného pažení | 2 dny | 15.10. 18 | 16.10. 18 | 3 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | A.23 | Napojení ZS - Zásyp rýh přípojky vodovodu hutněný | 1 den | 16.10. 18 | 16.10. 18 | 2 800,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | A.24 | Napojení ZS - Hlavní rozvaděč | 1 den | 07.10. 18 | 07.10. 18 | 2 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | A.25 | Napojení ZS - Vedení elektro | 2 dny | 08.10. 18 | 09.10. 18 | 5 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | A.26 | Montáž provizorních dopravních značek a osvětlení | 1 den | 10.10. 18 | 10.10. 18 | 62 700,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | A.27 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10m | 3 dny | 11.10. 18 | 13.10. 18 | 21 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | A.28 | Dokončení ZS | 0 dny | 16.10. 18 | 16.10. 18 | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | B | Kácení dřevin | 9 dny | 17.10. 18 | 25.10. 18 | 178 950,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | B.1 | Zřízení ochrany stromů | 2 dny | 17.10. 18 | 18.10. 18 | 59 900,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | B.2 | Odstranění křovin a stromů | 3 dny | 19.10. 18 | 21.10. 18 | 89 100,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | B.3 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů. | 2 dny | 22.10. 18 | 23.10. 18 | 29 950,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | B.4 | Zpracování dřeva | 2 dny | 24.10. 18 | 25.10. 18 | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | B.5 | Konec kácení dřevin | 0 dny | 25.10. 18 | 25.10. 18 | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



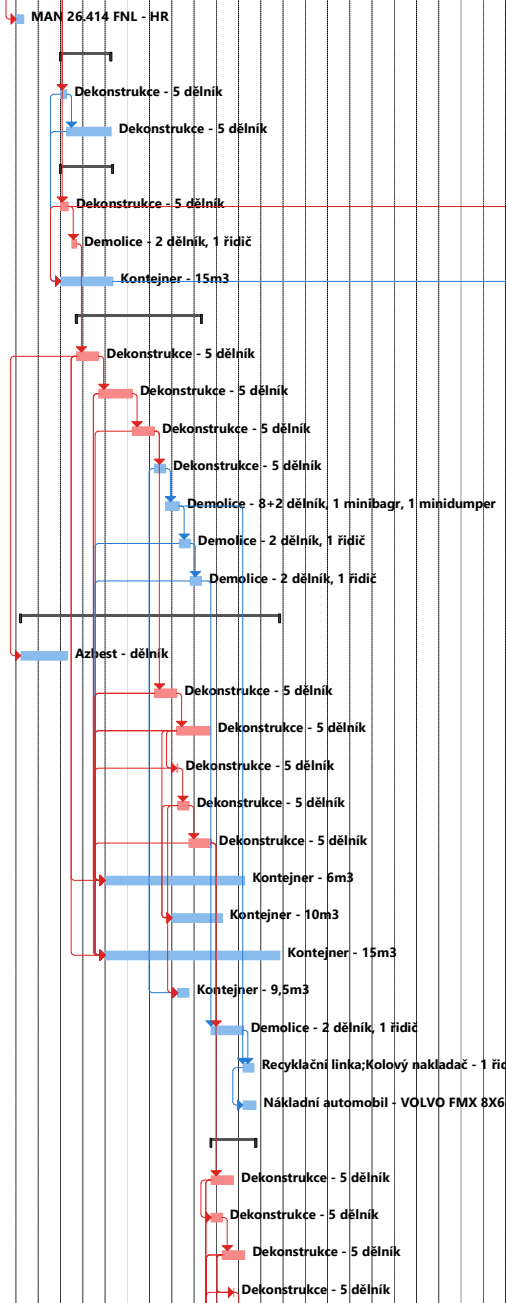

| ID | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Náklady | říjen 2018 | | | | | | | | | | | | | | | listopad 2018 | | | | | | | | | | | | | prosinec 2018 | | | | | | | | | | | | leden 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 26 | 28 | 30 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | C | Unimobuňky, plechový sklad a ocelové pláty | 1 den | 22.10.18 | 22.10.18 | 4 782,60 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | C.1 | Naložení a odvoz | 1 den | 22.10.18 | 22.10.18 | 4 782,60 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | D | Oplocení - pletivo | 4,5 dny | 26.10.18 | 30.10.18 | 39 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | D.1 | Demontáž vrat | 0,5 dny | 26.10.18 | 26.10.18 | 5 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | D.2 | Rozebrání plotu tyčového s pletivem | 4 dny | 26.10.18 | 30.10.18 | 33 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | E | Garáž s přístřeškem | 5 dny | 26.10.18 | 30.10.18 | 20 030,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | E.1 | Demontáž a demolice konstrukcí lehkou mechanizací | 1 den | 26.10.18 | 26.10.18 | 9 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | E.2 | Demolice základové konstrukce těžkou mechanizací | 0,25 dny | 27.10.18 | 27.10.18 | 8 100,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | E.3 | Naložení a odvoz Železný odpad | 5 dny | 26.10.18 | 30.10.18 | 2 430,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | F | Garáže a sklady - SEVER | 11,63 dny | 27.10.18 | 07.11.18 | 158 650,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | F.1 | Odstranění vnitřního vybavení | 2 dny | 27.10.18 | 29.10.18 | 17 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | F.2 | Odstranění výplní otvorů | 3 dny | 29.10.18 | 01.11.18 | 25 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | F.3 | Odstranění klempířských kčí | 2 dny | 01.11.18 | 03.11.18 | 17 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | F.4 | Odstranění střešní konstrukce | 1 den | 03.11.18 | 04.11.18 | 9 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | F.5 | Demolice výplňové konstrukce lehkou mechanizací | 1,63 dny | 04.11.18 | 05.11.18 | 41 850,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | F.6 | Demolice střešní konstrukce těžkou mechanizací | 1 den | 05.11.18 | 06.11.18 | 23 400,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | F.7 | Demolice ocelové konstrukce těžkou mechanizací | 1 den | 06.11.18 | 07.11.18 | 23 400,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | G | Garáže a sklady - JIH | 23,75 dny | 22.10.18 | 14.11.18 | 287 767,35 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | G.1 | Odstranění azbestu | 4,5 dny | 22.10.18 | 26.10.18 | 69 286,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | G.2 | Odstranění vnitřního vybavení | 2 dny | 03.11.18 | 05.11.18 | 17 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | G.3 | Odstranění výplní otvorů | 3 dny | 05.11.18 | 08.11.18 | 25 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | G.4 | Odstranění nášlapných vrstev | 0,25 dny | 05.11.18 | 05.11.18 | 3 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | G.5 | Odstranění střešní konstrukce | 1 den | 05.11.18 | 06.11.18 | 9 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | G.6 | Odstranění klempířských kčí | 2 dny | 06.11.18 | 08.11.18 | 17 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | G.7 | Naložení a odvoz SDO | 12,5 dny | 30.10.18 | 11.11.18 | 2 638,16 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | G.8 | Naložení a odvoz Dřevní odpad | 4,5 dny | 05.11.18 | 09.11.18 | 5 484,07 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | G.9 | Naložení a odvoz Železný odpad | 16 dny | 30.10.18 | 14.11.18 | 5 060,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | G.10 | Naložení a odvoz NO | 1 den | 05.11.18 | 06.11.18 | 12 080,95 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | G.11 | Demolice konstrukce těžkou mechanizací | 2,63 dny | 08.11.18 | 11.11.18 | 56 550,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | G.12 | Zpracování sutě recyklační linkou | 1 den | 11.11.18 | 12.11.18 | 48 460,83 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | G.13 | Naložení a odvoz recyklatu | 1,38 dny | 11.11.18 | 12.11.18 | 14 707,34 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | H | Údržba 2.NP | 4,13 dny | 08.11.18 | 12.11.18 | 83 600,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | H.1 | Odstranění vnitřního vybavení | 2 dny | 08.11.18 | 10.11.18 | 17 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | H.2 | Odstranění klempířských kčí | 1 den | 08.11.18 | 09.11.18 | 9 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | H.3 | Odstranění výplní otvorů | 2 dny | 09.11.18 | 11.11.18 | 17 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | H.4 | Odstranění nášlapných vrstev | 0,13 dny | 10.11.18 | 10.11.18 | 2 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







| | | | únor 2019 | | | | | | | březen 2019 | | | | | | | duben 2019 | | | | | | | květen 2019 | | | | | | | červen 2019 | | | | | | | červenec 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 12m3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,414 FNL - HR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Projekt: Demoliční fáze ČZU FTZ
Datum: 29.12. 20

Úkol
Rozdělení
Mílník
Souhrmný

 Souhrn projektu
 Neaktivní úkol
 Neaktivní mílník
 Neaktivní souhrn

 Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu
 Ruční souhrn

 Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly
 Vnější mílník

 Konečný termin
 Kritický
 Kritické rozdělení
 Průběh

 Průběh ručně zadaného úkolu

