




Příloha č. 3_HMG realizace 1. etapy

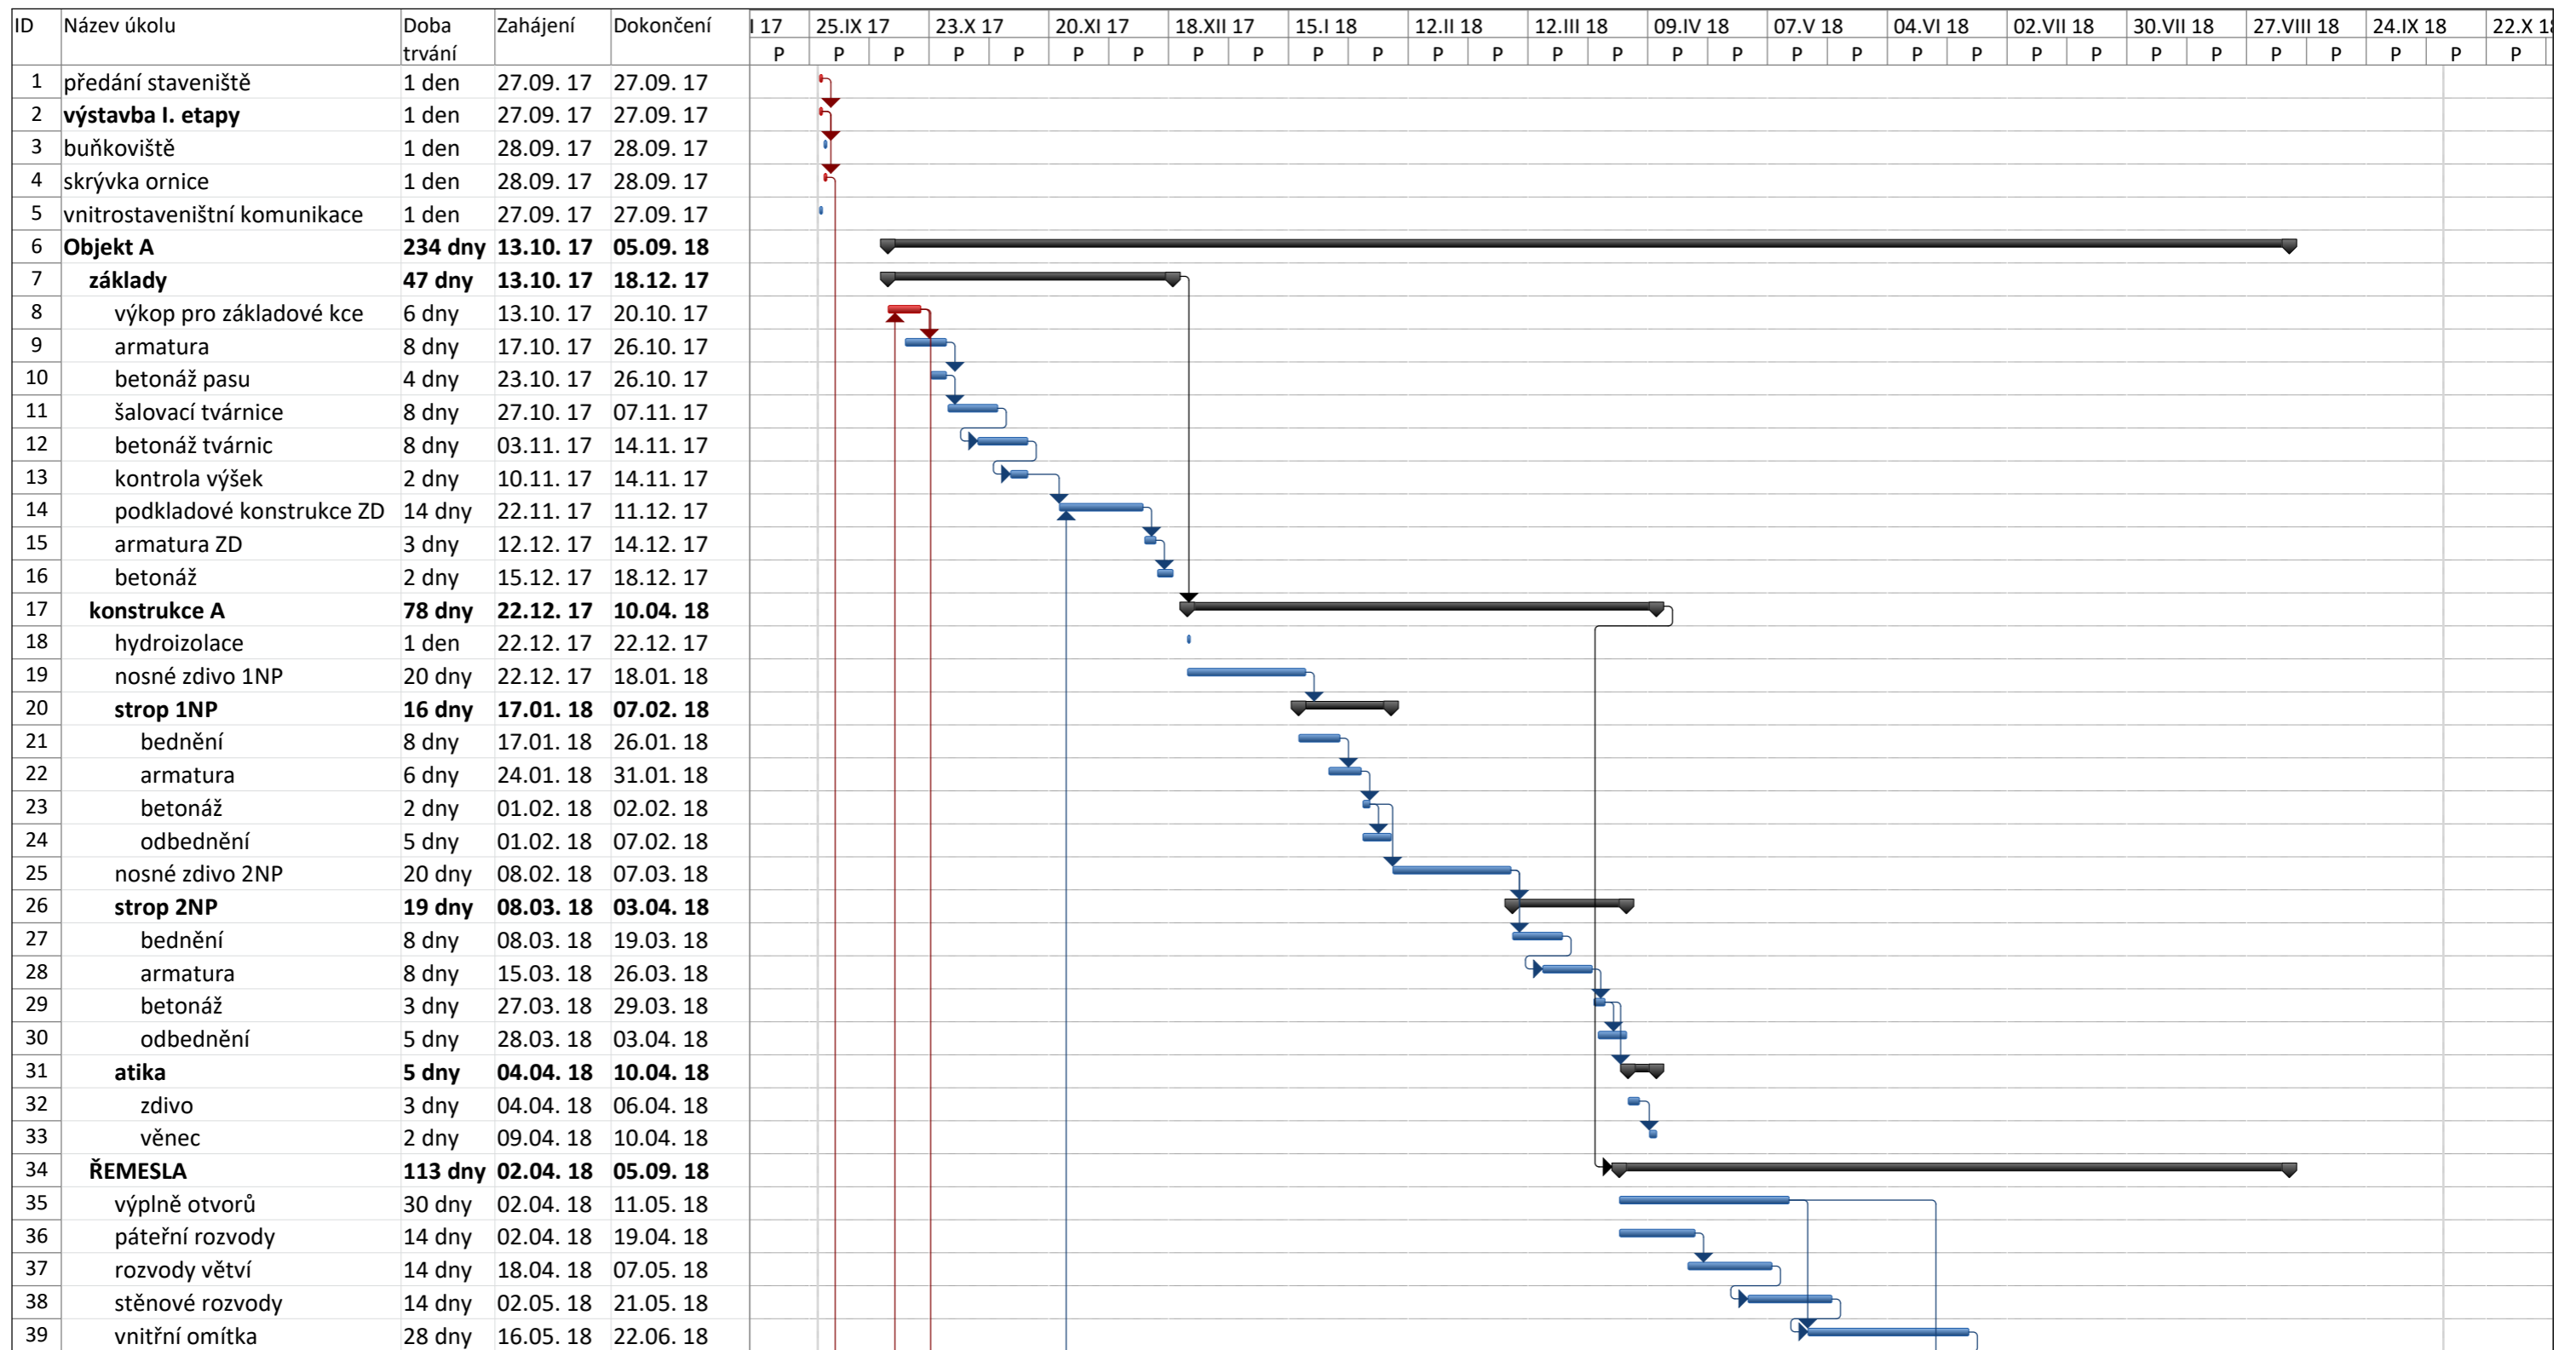

Projekt: DP_HMG realizace 1 etap Datum: 05.01. 20	Úkol		Neaktivní milník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Kritický	
	Milník		Ruční úkol		Kritické rozdělení	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Směrný plán	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Milník podle směrného plánu	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn		Souhrnný úkol směrného plánu	
	Vnější milník		Pouze zahájení		Průběh	
Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení				

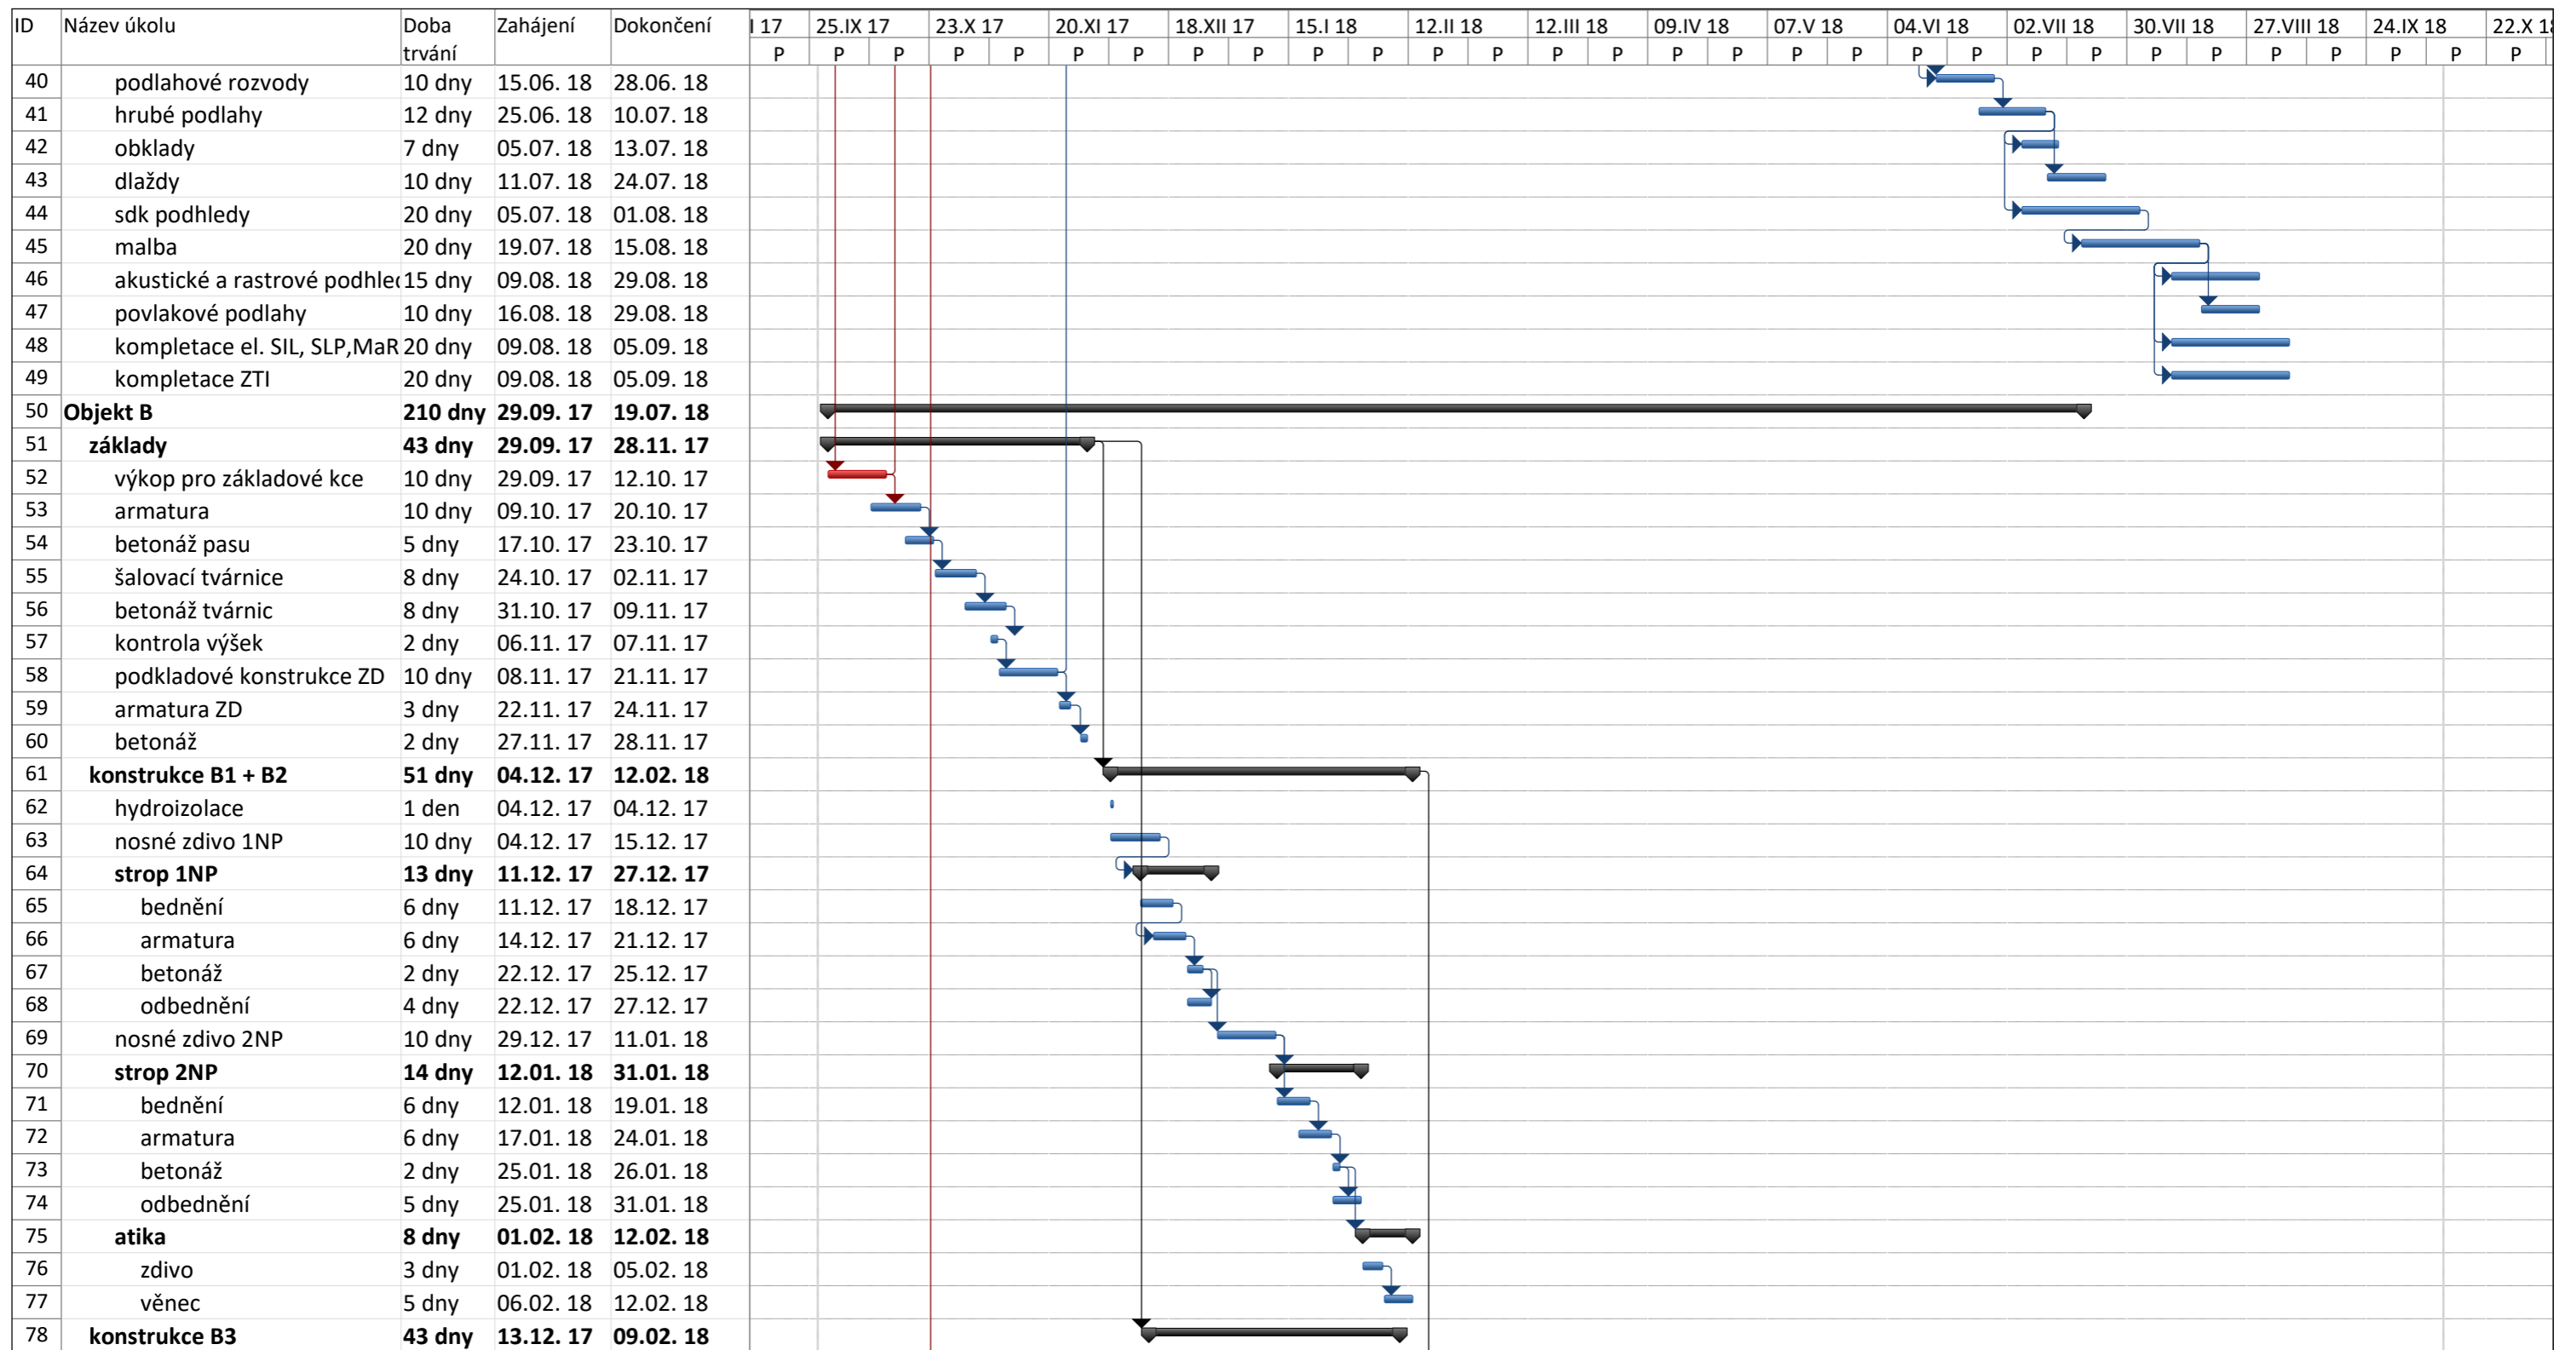

Projekt: DP_HMG realizace 1 etap Datum: 05.01. 20	Úkol		Neaktivní milník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Kritický	
	Milník		Ruční úkol		Kritické rozdělení	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Směrný plán	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Milník podle směrného plánu	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn		Souhrnný úkol směrného plánu	
	Vnější milník		Pouze zahájení		Průběh	
	Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení			

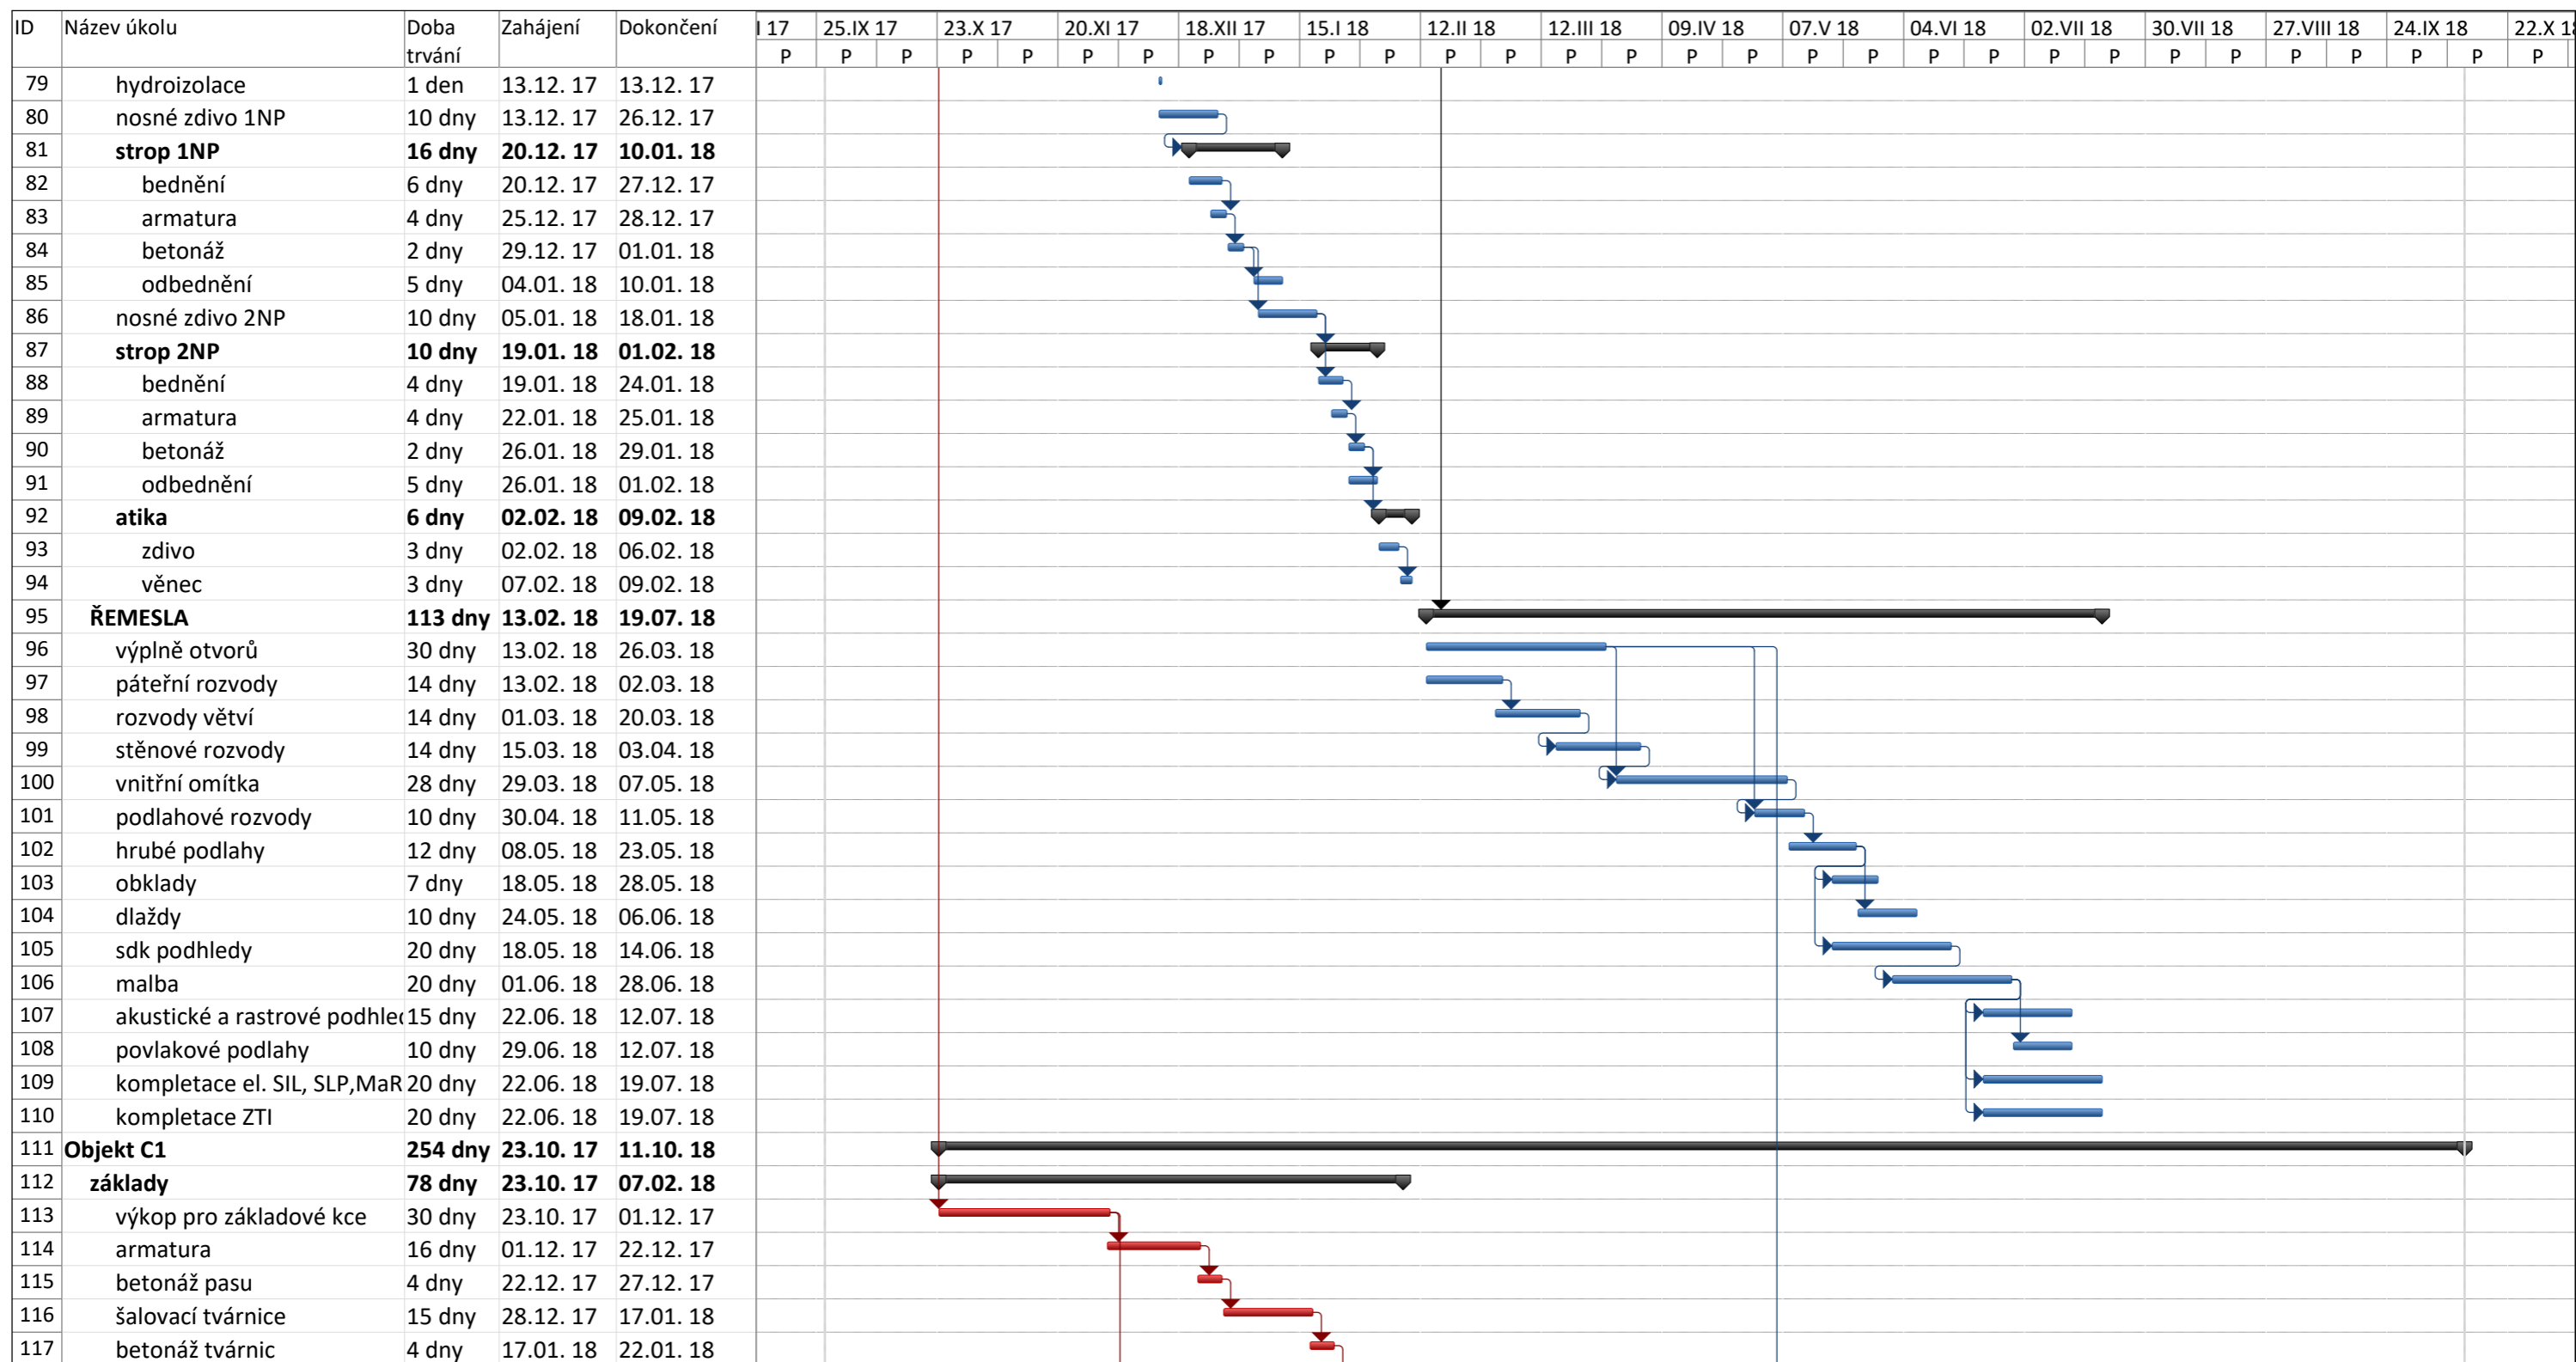

Projekt: DP_HMG realizace 1 etap Datum: 05.01. 20	Úkol		Neaktivní milník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Kritický	
	Milník		Ruční úkol		Kritické rozdělení	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Směrný plán	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Milník podle směrného plánu	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn		Souhrnný úkol směrného plánu	
	Vnější milník		Pouze zahájení		Průběh	
Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení				

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	17	25.IX 17			23.X 17		20.XI 17		18.XII 17		15.I 18		12.II 18		12.III 18		09.IV 18		07.V 18		04.VI 18		02.VII 18		30.VII 18		27.VIII 18		24.IX 18		22.X 18			
					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
118	kontrola výšek	2 dny	23.01. 18	24.01. 18																																		
119	podkladové konstrukce ZD	5 dny	25.01. 18	31.01. 18																																		
120	armatura ZD	3 dny	01.02. 18	05.02. 18																																		
121	betonáž	2 dny	06.02. 18	07.02. 18																																		
122	konstrukce C1	63 dny	08.02. 18	07.05. 18																																		
123	hydroizolace	1 den	08.02. 18	08.02. 18																																		
124	nosné zdivo 1NP	16 dny	08.02. 18	01.03. 18																																		
125	strop 1NP	13 dny	23.02. 18	13.03. 18																																		
126	bednění	6 dny	23.02. 18	02.03. 18																																		
127	armatura	6 dny	28.02. 18	07.03. 18																																		
128	betonáž	2 dny	08.03. 18	09.03. 18																																		
129	odbednění	4 dny	08.03. 18	13.03. 18																																		
130	nosné zdivo 2NP	16 dny	15.03. 18	05.04. 18																																		
131	strop 2NP	14 dny	06.04. 18	25.04. 18																																		
132	bednění	6 dny	06.04. 18	13.04. 18																																		
133	armatura	6 dny	11.04. 18	18.04. 18																																		
134	betonáž	2 dny	19.04. 18	20.04. 18																																		
135	odbednění	5 dny	19.04. 18	25.04. 18																																		
136	atika	8 dny	26.04. 18	07.05. 18																																		
137	zdivo	3 dny	26.04. 18	30.04. 18																																		
138	věnc	5 dny	01.05. 18	07.05. 18																																		
139	ŘEMESLA	113 dny	08.05. 18	11.10. 18																																		
140	výplně otvorů	30 dny	08.05. 18	18.06. 18																																		
141	páteřní rozvody	14 dny	08.05. 18	25.05. 18																																		
142	rozvody větví	14 dny	24.05. 18	12.06. 18																																		
143	stěnové rozvody	14 dny	07.06. 18	26.06. 18																																		
144	vnitřní omítka	28 dny	21.06. 18	30.07. 18																																		
145	podlahové rozvody	10 dny	23.07. 18	03.08. 18																																		
146	hrubé podlahy	12 dny	31.07. 18	15.08. 18																																		
147	obklady	20 dny	10.08. 18	06.09. 18																																		
148	dlaždy	15 dny	16.08. 18	05.09. 18																																		
149	sdk podhledy	20 dny	10.08. 18	06.09. 18																																		
150	malba	20 dny	24.08. 18	20.09. 18																																		
151	akustické a rastrové podhledy	15 dny	14.09. 18	04.10. 18																																		
152	povlakové podlahy	10 dny	21.09. 18	04.10. 18																																		
153	kompletace el. SIL, SLP, MaR	20 dny	14.09. 18	11.10. 18																																		
154	kompletace ZTI	20 dny	14.09. 18	11.10. 18																																		
155	Objekt C2	189 dny	04.12. 17	23.08. 18																																		
156	základy	74 dny	04.12. 17	15.03. 18																																		

Projekt: DP_HMG realizace 1 etap Datum: 05.01. 20	Úkol		Neaktivní milník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Kritický	
	Milník		Ruční úkol		Kritické rozdělení	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Směrný plán	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Milník podle směrného plánu	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn		Souhrnný úkol směrného plánu	
	Vnější milník		Pouze zahájení		Průběh	
Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení				

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	17	25.IX 17			23.X 17		20.XI 17		18.XII 17		15.I 18		12.II 18		12.III 18		09.IV 18		07.V 18		04.VI 18		02.VII 18		30.VII 18		27.VIII 18		24.IX 18		22.X 18
					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
157	výkop pro základové kce	20 dny	04.12. 17	29.12. 17																															
158	armatura	10 dny	29.12. 17	11.01. 18																															
159	betonáž	5 dny	11.01. 18	17.01. 18																															
160	zpětný zásyp	8 dny	18.01. 18	29.01. 18																															
161	kontrola výšek	2 dny	30.01. 18	31.01. 18																															
162	podkladové konstrukce ZD	20 dny	01.02. 18	28.02. 18																															
163	armatura ZD	8 dny	01.03. 18	12.03. 18																															
164	betonáž	3 dny	13.03. 18	15.03. 18																															
165	konstrukce C2	100 dny	16.03. 18	02.08. 18																															
166	dřevěná konstrukce	15 dny	16.03. 18	05.04. 18																															
167	hydroizolace	4 dny	06.04. 18	11.04. 18																															
168	nosné zdivo 1NP	25 dny	12.04. 18	16.05. 18																															
169	strop 1NP - věnec	6 dny	17.05. 18	24.05. 18																															
170	bednění	3 dny	17.05. 18	21.05. 18																															
171	armatura	3 dny	17.05. 18	21.05. 18																															
172	betonáž	3 dny	22.05. 18	24.05. 18																															
173	odbednění	2 dny	23.05. 18	24.05. 18																															
174	nosné zdivo 2NP	25 dny	30.05. 18	03.07. 18																															
175	strop 2NP - věnec	14 dny	04.07. 18	23.07. 18																															
176	bednění	6 dny	04.07. 18	11.07. 18																															
177	armatura	6 dny	09.07. 18	16.07. 18																															
178	betonáž	2 dny	17.07. 18	18.07. 18																															
179	odbednění	5 dny	17.07. 18	23.07. 18																															
180	atika	8 dny	24.07. 18	02.08. 18																															
181	zdivo	3 dny	24.07. 18	26.07. 18																															
182	věnec	5 dny	27.07. 18	02.08. 18																															
183	střecha	15 dny	03.08. 18	23.08. 18																															
184	Ostatní práce	66 dny	07.05. 18	06.08. 18																															
185	provedení střech od 7.5.18	65 dny	07.05. 18	03.08. 18																															
186	fasáda od 15.5.18	60 dny	15.05. 18	06.08. 18																															

Projekt: DP_HMG realizace 1 etap Datum: 05.01. 20	Úkol		Neaktivní milník		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní souhrn		Kritický	
	Milník		Ruční úkol		Kritické rozdělení	
	Souhrnný		Pouze s dobou trvání		Směrný plán	
	Souhrn projektu		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Milník podle směrného plánu	
	Vnější úkoly		Ruční souhrn		Souhrnný úkol směrného plánu	
	Vnější milník		Pouze zahájení		Průběh	
Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení				
