


**ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ**

**V PRAZE**

**FAKULTA STAVEBNÍ**

**K122 – Katedra technologie staveb**



**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE**

**Stavebně technologický projekt**

**Bytový dům – Pardubice, Ohrazenice**

**4. Řešení časové struktury**

**Ondřej Klapka**


**2022**

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hlava, Ph.D.

## **OBSAH**

- 4.1 Časoprostorový graf
- 4.2 Graf nasazení pracovníků
- 4.3 Graf nasazení strojů
- 4.4 Graf spotřeby materiálu
- 4.5 Harmonogram

4.1 CASOPROSTOROVÝ GRAF

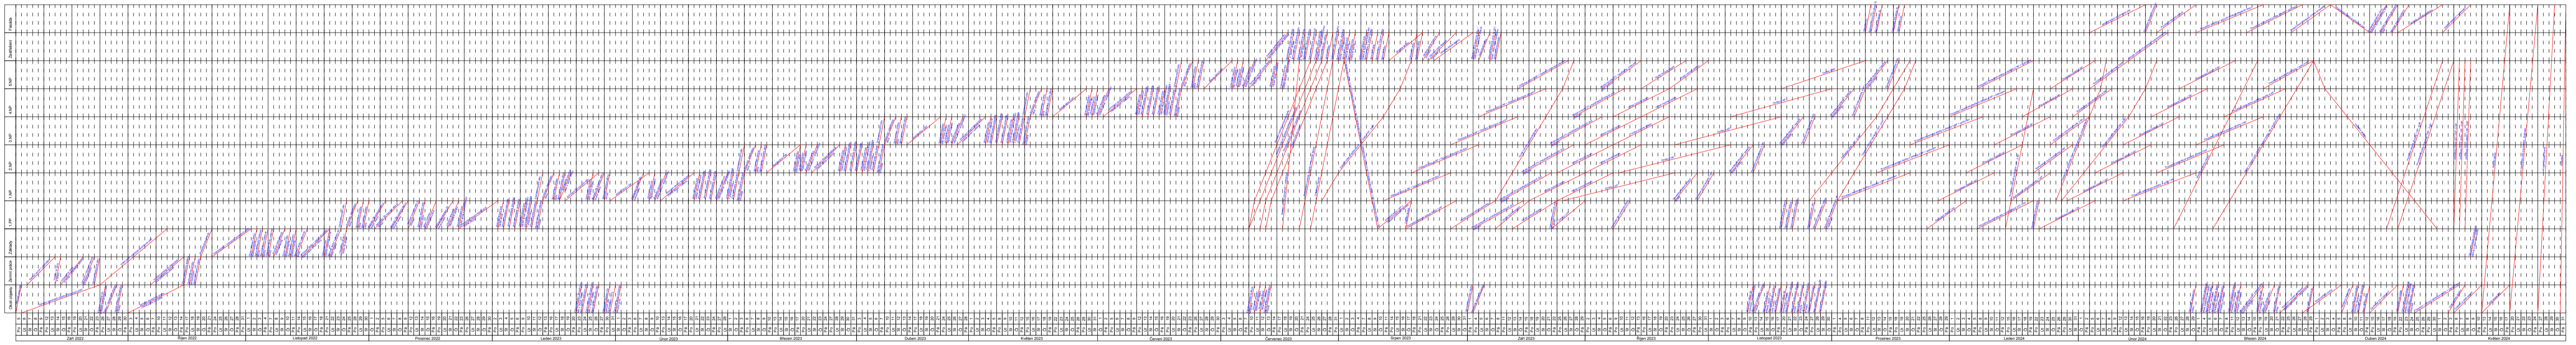


Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION


4.2 GRAF NASAZENI LIDI

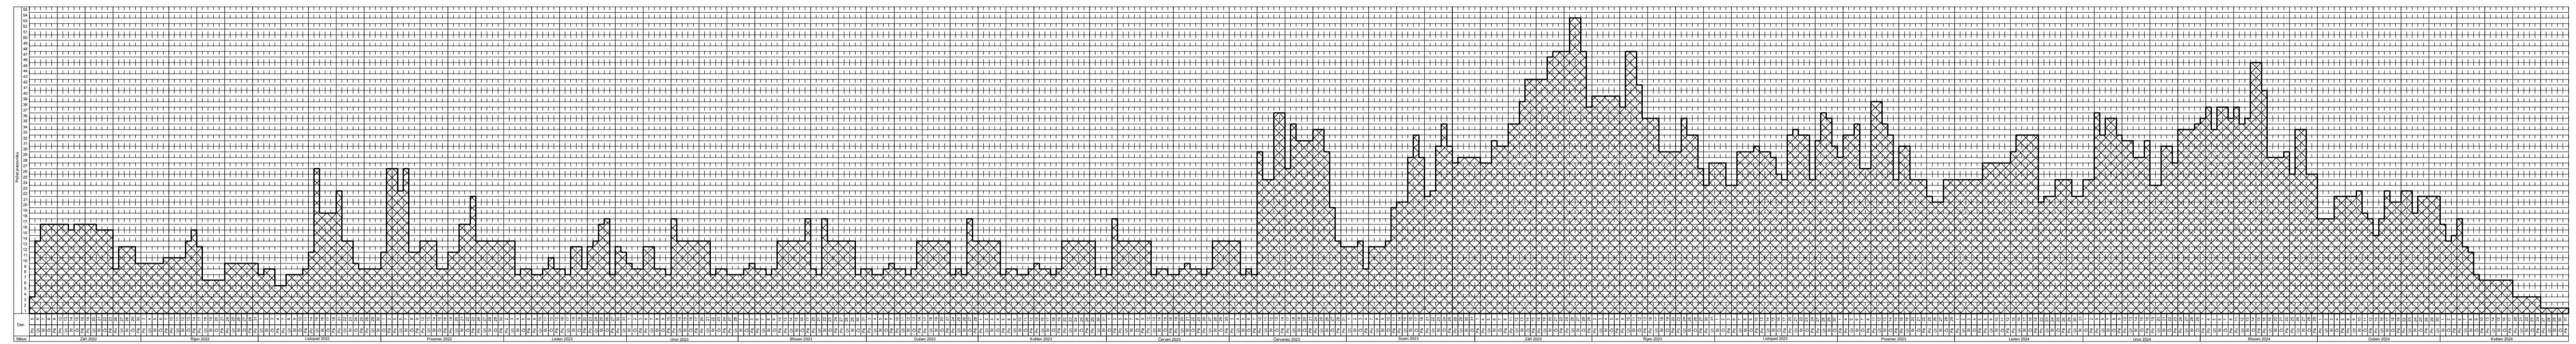

4.3 GRAF NASAZENI STROJŮ

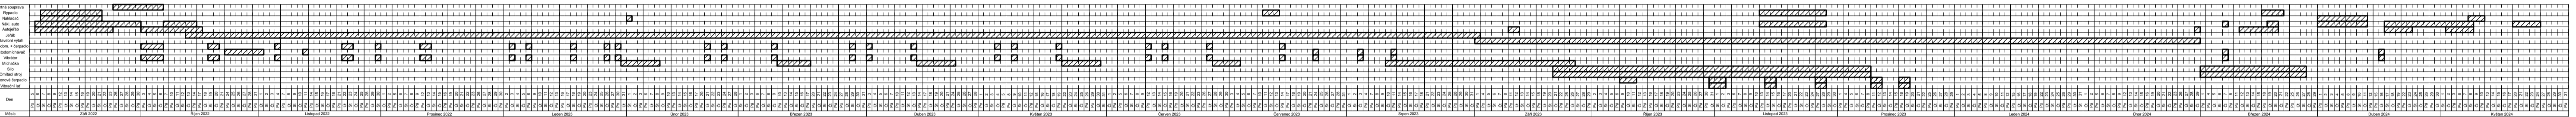

4.4 GRAF SPOTŘEBY MATERIÁLU

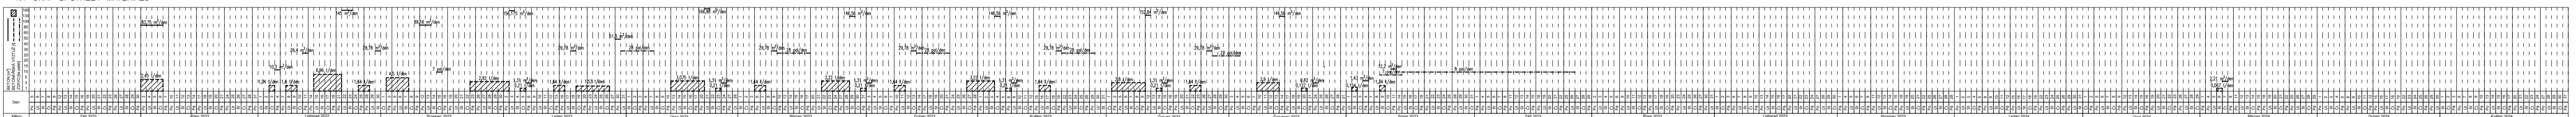



POZ: 2020 = 12 měsíců, 2021 = 11 měsíců, 2022 = 11 měsíců  
 DOKUMENTACE: 12 měsíců, 11 měsíců, 11 měsíců  
 DOKUMENTACE: 12 měsíců, 11 měsíců, 11 měsíců

Objekt	10000	10000	10000
Objektová	10000	10000	10000
Objektová	10000	10000	10000
Objektová	10000	10000	10000


PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

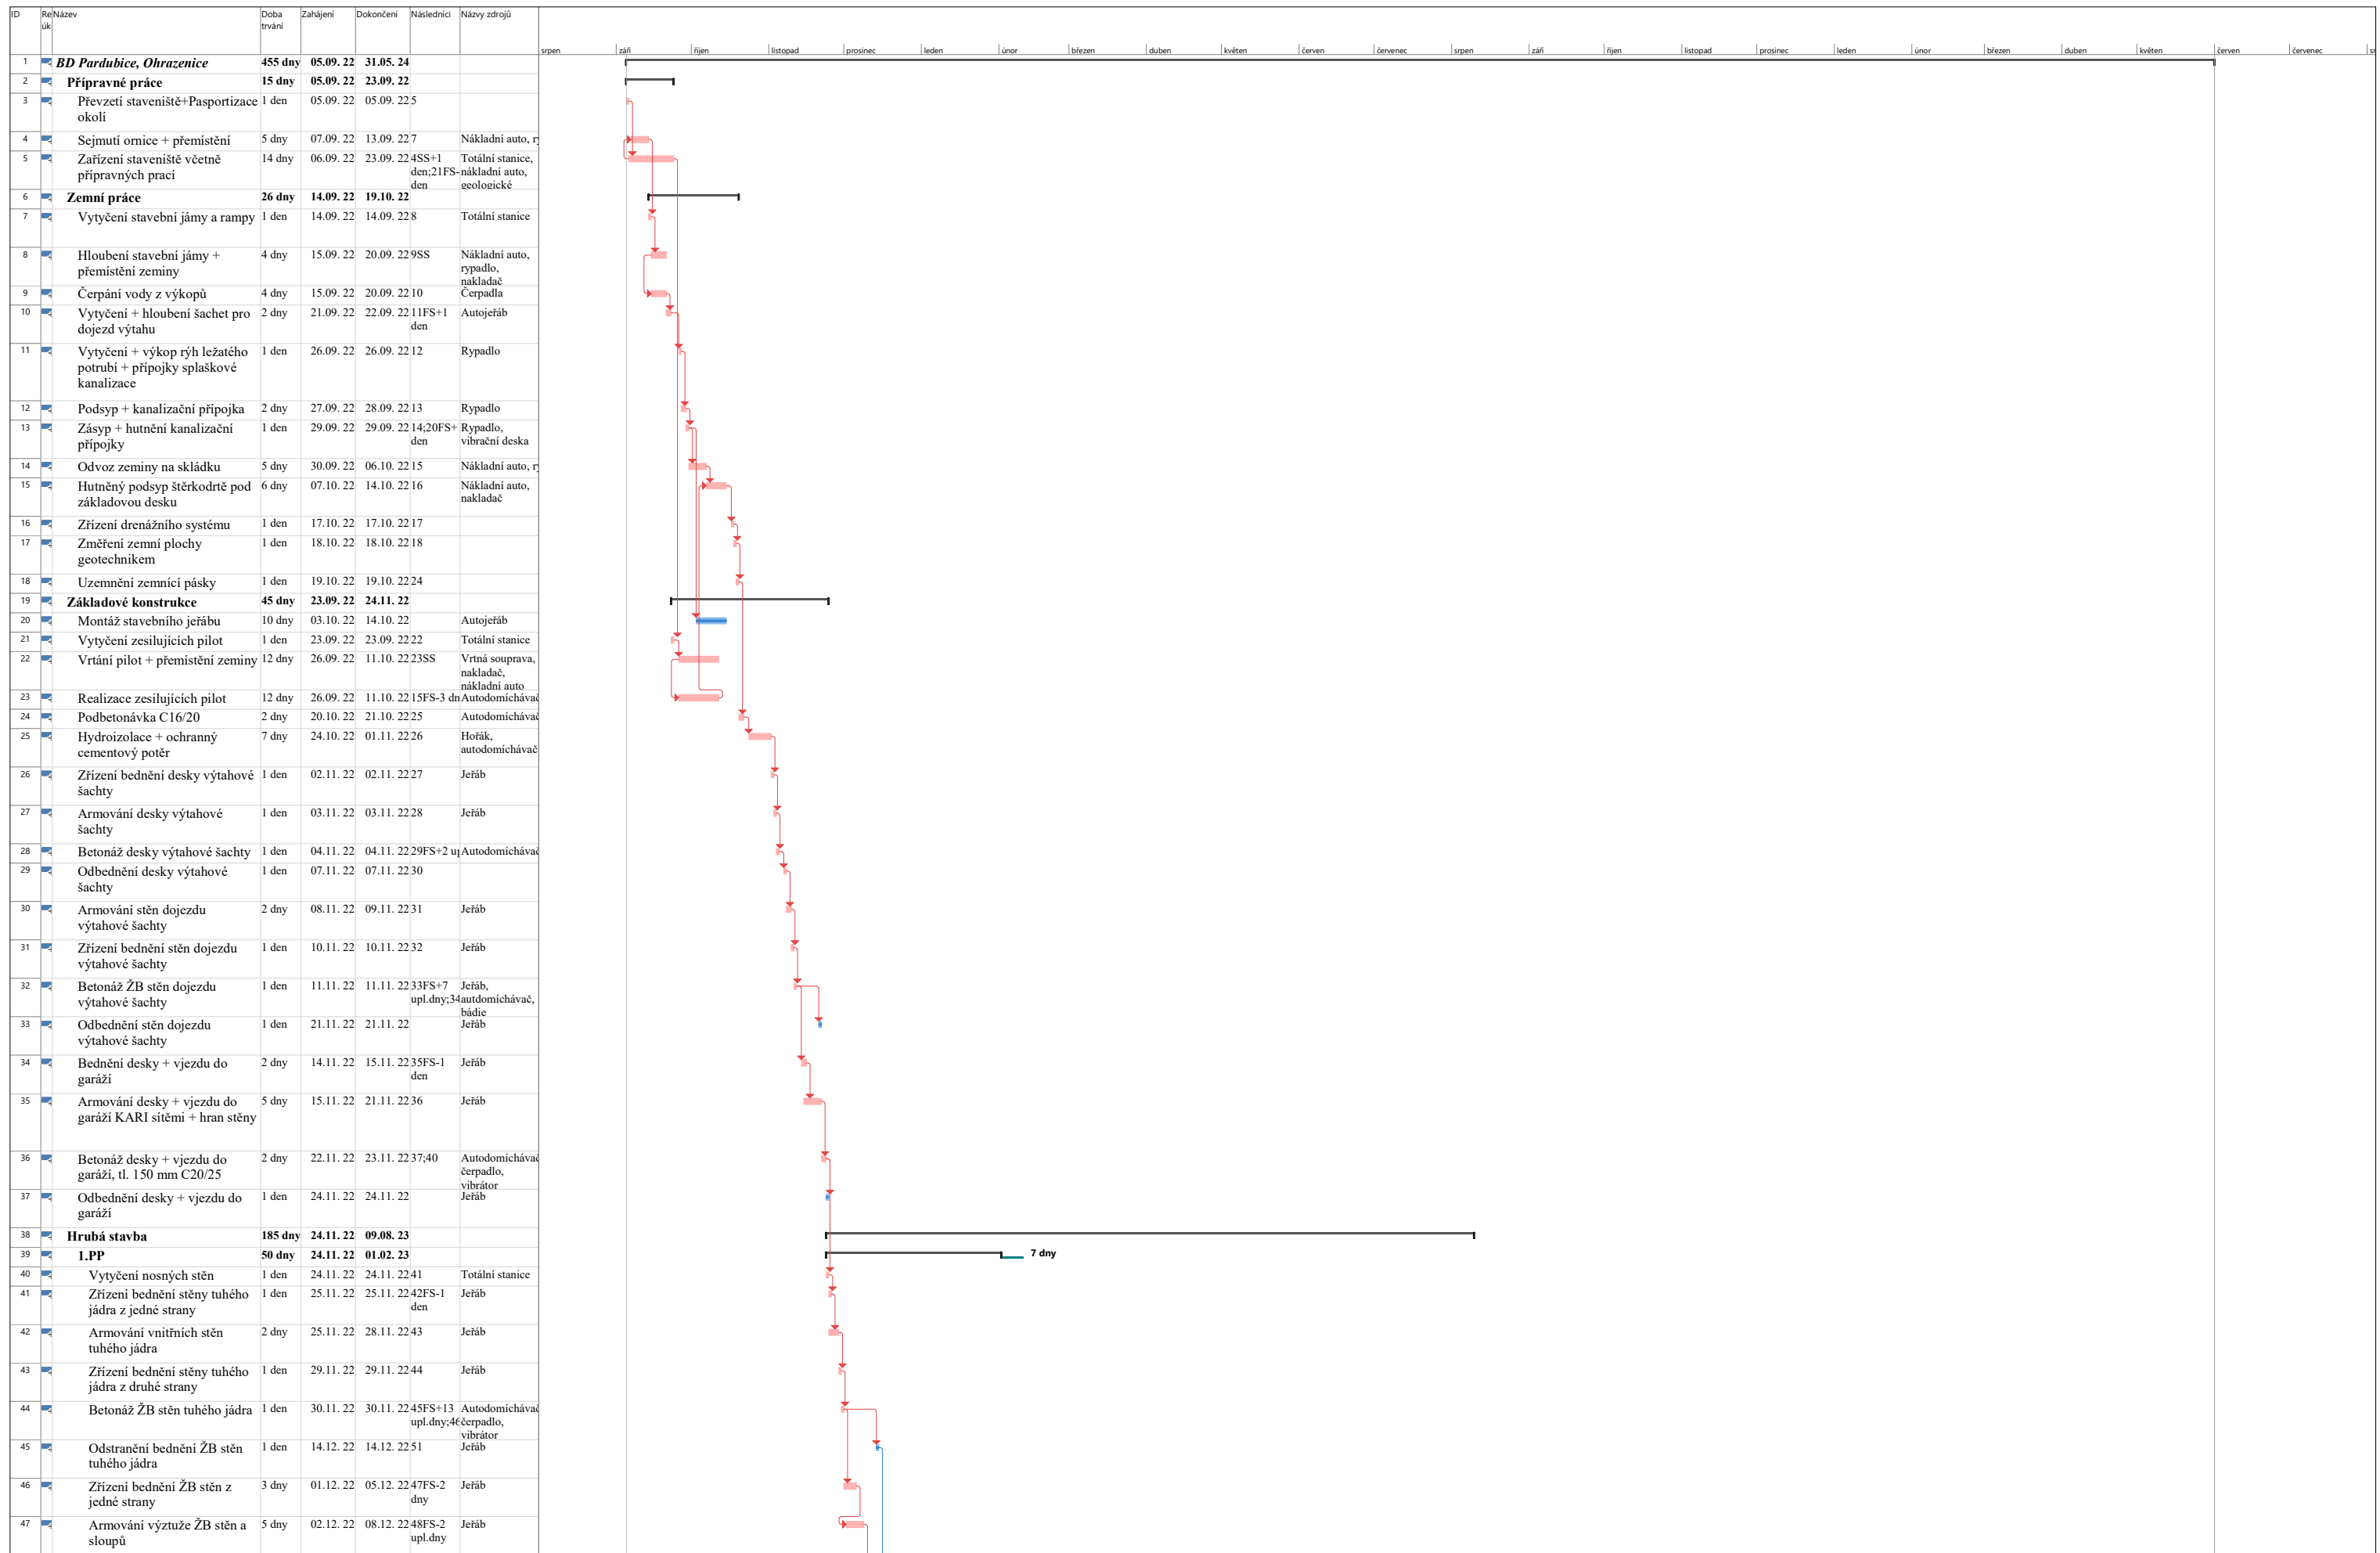

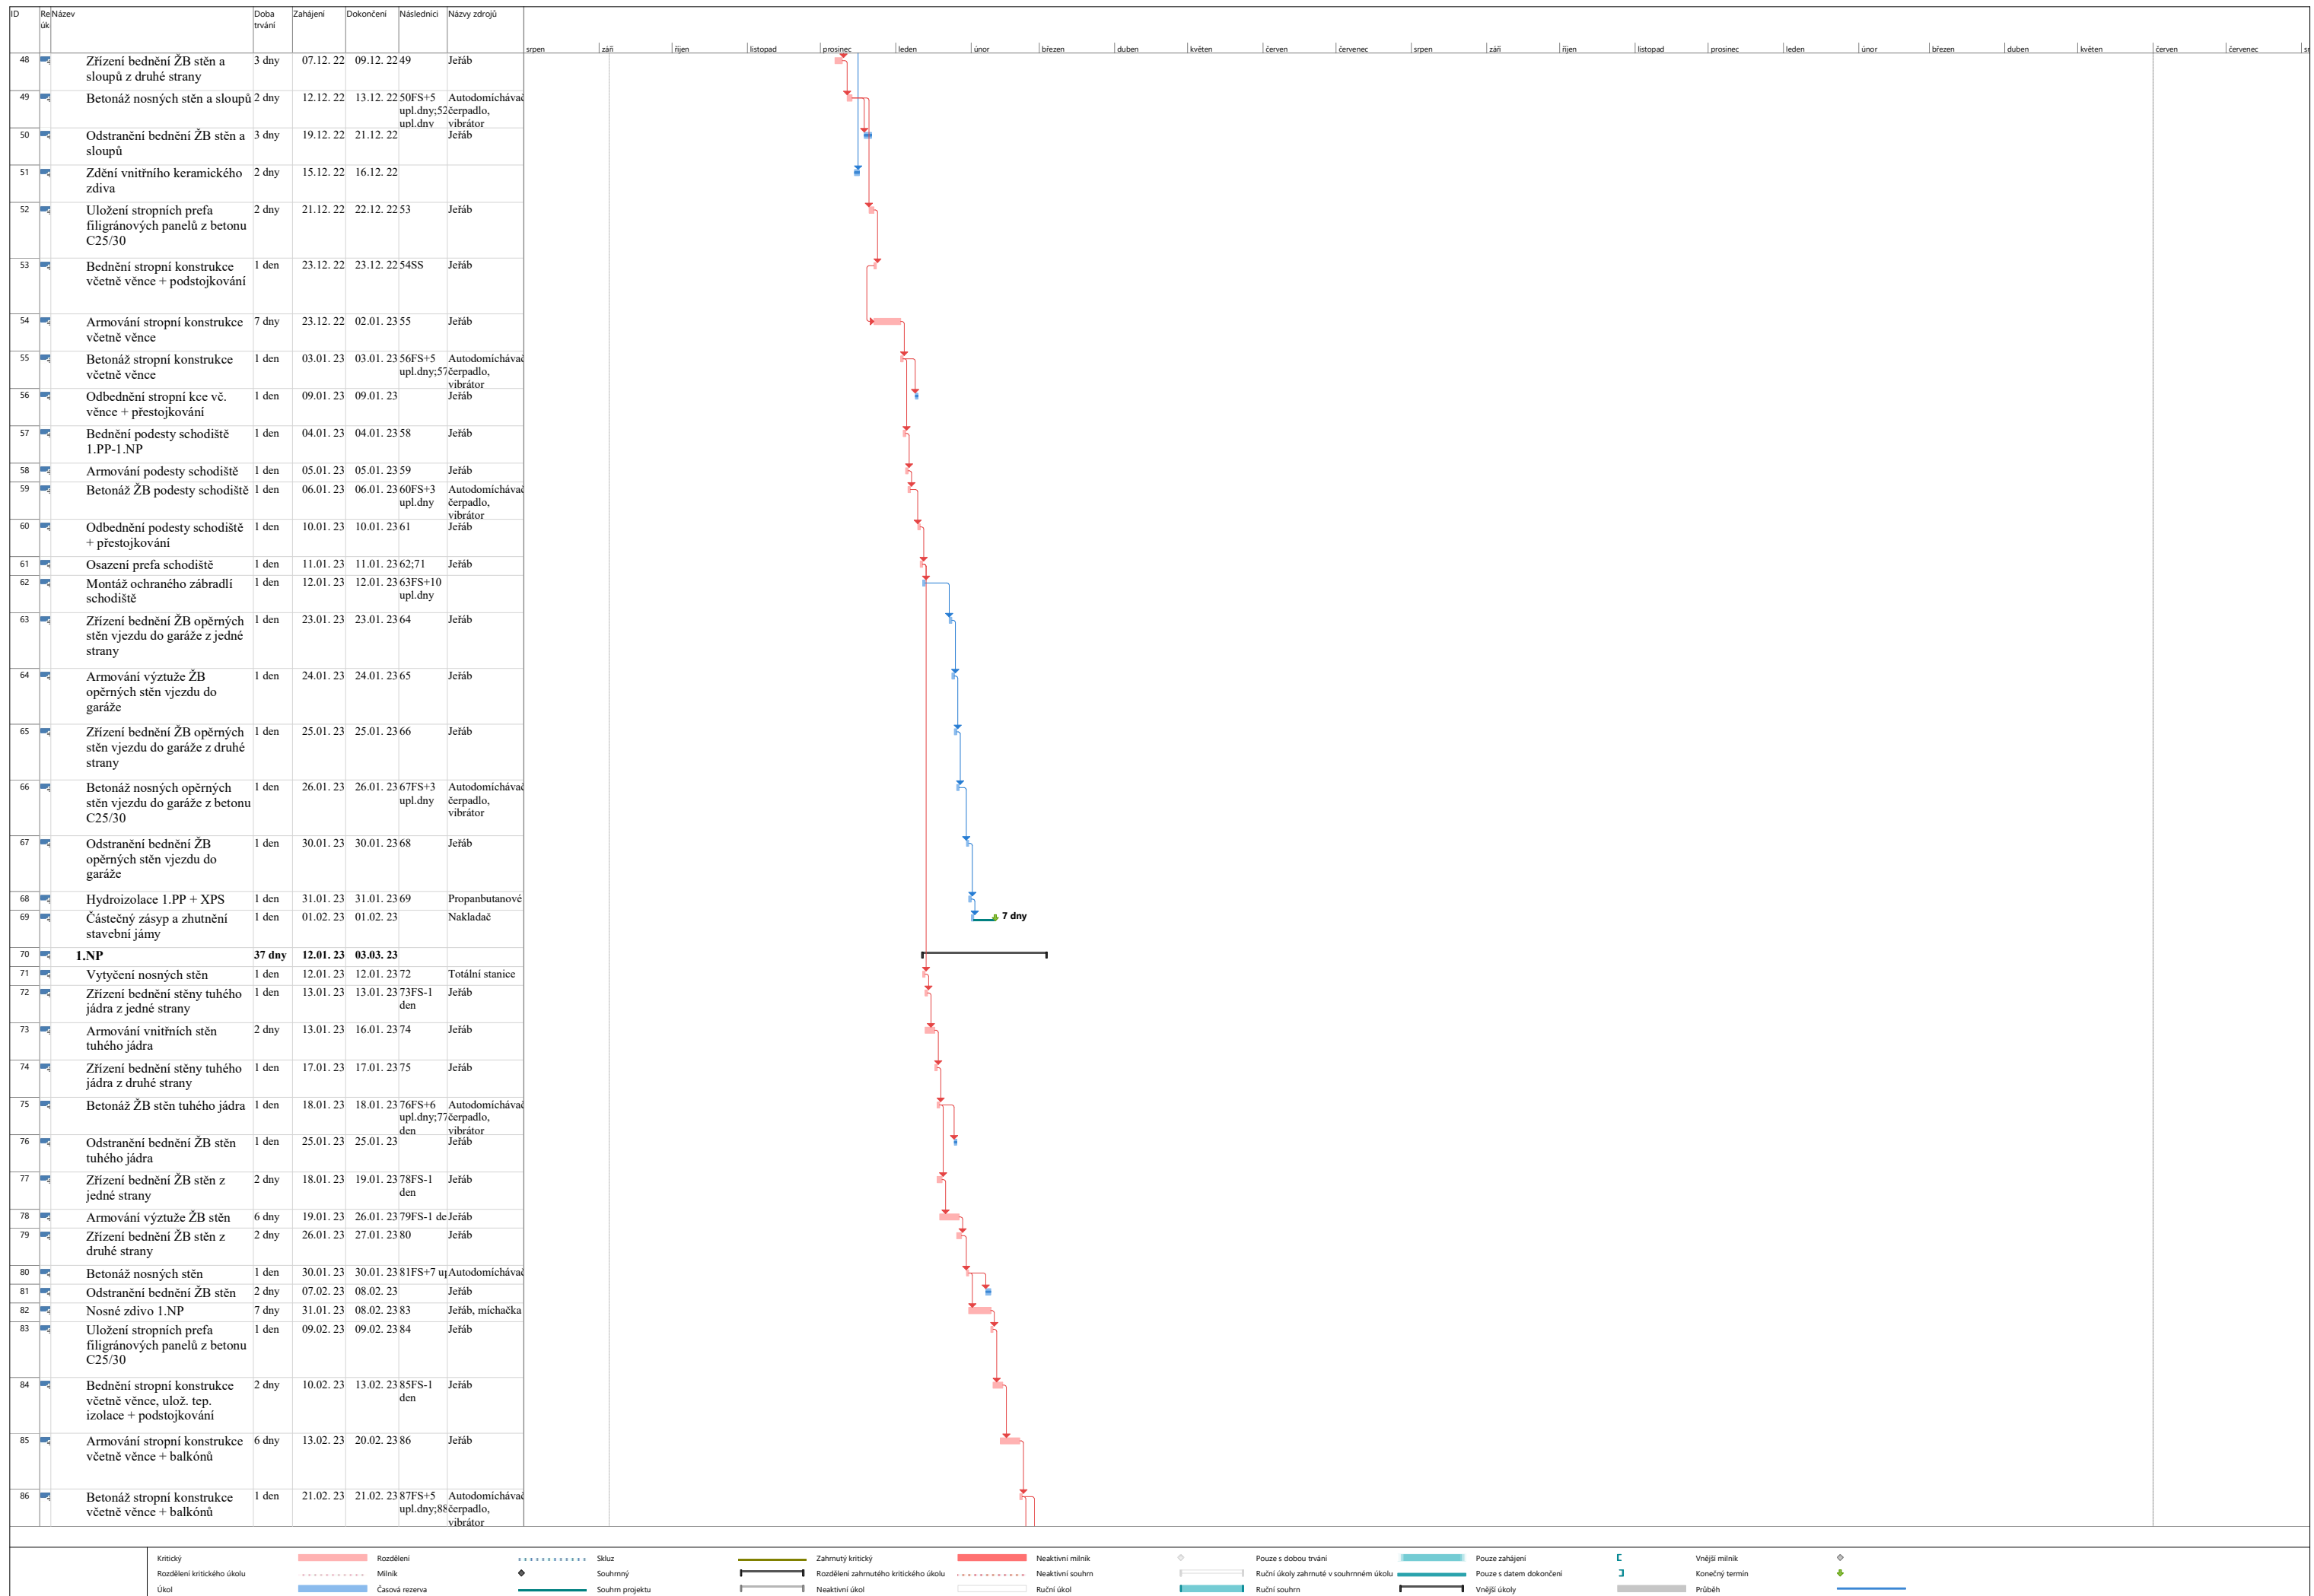


ID	Reč. úk	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Názyv zdrojů
87		Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování	1 den	27.02.23	27.02.23		Jeřáb
88		Bednění podesty schodiště 1.NP-2.NP + podstojkování	1 den	22.02.23	22.02.23	89	Jeřáb
89		Armování podesty schodiště	1 den	23.02.23	23.02.23	90	Jeřáb
90		Betonáž ŽB podesty schodiště	1 den	24.02.23	24.02.23	91FS+4 upl.dny	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor
91		Odbednění podesty schodiště + přestojkování	1 den	01.03.23	01.03.23	92	Jeřáb
92		Osazení prefa schodiště	1 den	02.03.23	02.03.23	93;95	Jeřáb
93		Montáž ochranného zábradlí schodiště	1 den	03.03.23	03.03.23		
94		<b>2.NP</b>	<b>26 dny</b>	<b>03.03.23</b>	<b>07.04.23</b>		
95		Vytyčení nosných stěn	1 den	03.03.23	03.03.23	96	Totální stanice
96		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany	1 den	06.03.23	06.03.23	97FS-1 den	Jeřáb
97		Armování vnitřních stěn tuhého jádra	2 dny	06.03.23	07.03.23	98	Jeřáb
98		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany	1 den	08.03.23	08.03.23	99	Jeřáb
99		Betonáž ŽB stěn tuhého jádra	1 den	09.03.23	09.03.23	100FS+7 upl.dny;1	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor
100		Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra	1 den	17.03.23	17.03.23		Jeřáb
101		Nosné zdívo 2.NP	6 dny	10.03.23	17.03.23	102	Jeřáb, mičačka
102		Uložení stropních prefa filigránových panelů z betonu C25/30	1 den	20.03.23	20.03.23	103	Jeřáb
103		Bednění stropní konstrukce včetně věnce, uloř. tep. izolace + podstojkování	2 dny	21.03.23	22.03.23	104FS-1 upl.den	Jeřáb
104		Armování stropní konstrukce včetně věnce + balkónů	5 dny	22.03.23	28.03.23	105	Jeřáb
105		Betonáž stropní konstrukce včetně věnce + balkónů	1 den	29.03.23	29.03.23	106FS+5 upl.dny;1	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor
106		Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování	1 den	04.04.23	04.04.23		Jeřáb
107		Bednění podesty schodiště 2.NP-3.NP + podstojkování	1 den	30.03.23	30.03.23	108	Jeřáb
108		Armování podesty schodiště	1 den	31.03.23	31.03.23	109	Jeřáb
109		Betonáž ŽB podesty schodiště	1 den	03.04.23	03.04.23	110FS+1 den	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor
110		Odbednění podesty schodiště + přestojkování	1 den	05.04.23	05.04.23	111	Jeřáb
111		Osazení prefa schodiště	1 den	06.04.23	06.04.23	112;114	Jeřáb
112		Montáž ochranného zábradlí schodiště	1 den	07.04.23	07.04.23		
113		<b>3.NP</b>	<b>27 dny</b>	<b>07.04.23</b>	<b>15.05.23</b>		
114		Vytyčení nosných stěn	1 den	07.04.23	07.04.23	115	Totální stanice
115		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany	1 den	10.04.23	10.04.23	116FS-1 upl.den	Jeřáb
116		Armování vnitřních stěn tuhého jádra	2 dny	10.04.23	11.04.23	117	Jeřáb
117		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany	1 den	12.04.23	12.04.23	118	Jeřáb
118		Betonáž ŽB stěn tuhého jádra	1 den	13.04.23	13.04.23	119FS+10 upl.dny;12	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor
119		Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra	1 den	24.04.23	24.04.23		Jeřáb
120		Nosné zdívo 3.NP	6 dny	14.04.23	21.04.23	121FS+1	Jeřáb, mičačka
121		Uložení stropních prefa filigránových panelů z betonu C25/30	1 den	25.04.23	25.04.23	122	Jeřáb
122		Bednění stropní konstrukce včetně věnce, uloř. tep. izolace + podstojkování	2 dny	26.04.23	27.04.23	123FS-1 upl.den	Jeřáb
123		Armování stropní konstrukce včetně věnce + balkónů	5 dny	27.04.23	03.05.23	124	Jeřáb
124		Betonáž stropní konstrukce včetně věnce + balkónů	1 den	04.05.23	04.05.23	125FS+5 upl.dny;12	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor
125		Odbednění stropní kce vč. věnce + přestojkování	1 den	10.05.23	10.05.23		Jeřáb
126		Bednění podesty schodiště 3.NP-4.NP + podstojkování	1 den	05.05.23	05.05.23	127	Jeřáb
127		Armování podesty schodiště	1 den	08.05.23	08.05.23	128	Jeřáb
128		Betonáž ŽB podesty schodiště	1 den	09.05.23	09.05.23	129FS+1 den	Autodomíchávač čerpadlo, vibrátor




Kritický	Rozdělení	Skuz	Zahrnutý kritický	Neaktivní mílník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílník
Rozdělení kritického úkolu	Mílník	Souhrmný	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Neaktivní souhrm	Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín
Úkol	Časová rezerva	Souhrm projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrm	Vnější úkoly	Průběh


ID	Reč. úk	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Názvy zdrojů
129		Odbednění podesty schodiště + přestojkování	1 den	11.05.23	11.05.23	130	Jeřáb
130		Osazení prefa schodiště	1 den	12.05.23	12.05.23	131;133	Jeřáb
131		Montáž ochranného zábradlí schodiště	1 den	15.05.23	15.05.23		
132		<b>4.NP</b>	<b>28 dny</b>	<b>15.05.23</b>	<b>21.06.23</b>		
133		Vytyčení nosných stěn	1 den	15.05.23	15.05.23	134	Totální stanice
134		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany	1 den	16.05.23	16.05.23	135FS-1	Jeřáb upl.den
135		Armování vnitřních stěn tuhého jádra	2 dny	16.05.23	17.05.23	136	Jeřáb
136		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany	1 den	18.05.23	18.05.23	137	Jeřáb
137		Betonáž ŽB stěn tuhého jádra	1 den	19.05.23	19.05.23	138FS+10	Autodomichávací upl.dny;13čerpadlo, vibrátor Jeřáb
138		Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra	1 den	30.05.23	30.05.23		
139		Nosné zdívo 4.NP	6 dny	22.05.23	29.05.23	140FS+1	Jeřáb, michačka
140		Uložení stropních prefa filigránových panelů z betonu C25/30	1 den	31.05.23	31.05.23	141	Jeřáb
141		Bednění stropní konstrukce včetně věnce, ulož. tep. izolace + podstojkování	2 dny	01.06.23	02.06.23	142FS-1	Jeřáb upl.den
142		Armování stropní konstrukce včetně věnce + balkónů	6 dny	02.06.23	09.06.23	143	Jeřáb
143		Betonáž stropní konstrukce včetně věnce + balkónů	1 den	12.06.23	12.06.23	144FS+3	Autodomichávací upl.dny;14čerpadlo, vibrátor Jeřáb
144		Odbednění stropní kee vč. věnce + přestojkování	1 den	16.06.23	16.06.23		
145		Bednění podesty schodiště 4.NP-5.NP + podstojkování	1 den	13.06.23	13.06.23	146	Jeřáb
146		Armování podesty schodiště	1 den	14.06.23	14.06.23	147	Jeřáb
147		Betonáž ŽB podesty schodiště	1 den	15.06.23	15.06.23	148FS+3	Autodomichávací čerpadlo, vibrátor Jeřáb
148		Odbednění podesty schodiště + přestojkování	1 den	19.06.23	19.06.23	149	Jeřáb
149		Osazení prefa schodiště	1 den	20.06.23	20.06.23	150;152	Jeřáb
150		Montáž ochranného zábradlí schodiště	1 den	21.06.23	21.06.23		
151		<b>5.NP</b>	<b>36 dny</b>	<b>21.06.23</b>	<b>09.08.23</b>		
152		Vytyčení nosných stěn	1 den	21.06.23	21.06.23	153	Totální stanice
153		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z jedné strany	1 den	22.06.23	22.06.23	154FS-1	Jeřáb upl.den
154		Armování vnitřních stěn tuhého jádra	2 dny	22.06.23	23.06.23	155	Jeřáb
155		Zřízení bednění stěny tuhého jádra z druhé strany	1 den	26.06.23	26.06.23	156	Jeřáb
156		Betonáž ŽB stěn tuhého jádra	1 den	27.06.23	27.06.23	157FS+7	Autodomichávací upl.dny;15čerpadlo, vibrátor Jeřáb
157		Odstranění bednění ŽB stěn tuhého jádra	1 den	05.07.23	05.07.23		
158		Nosné zdívo 5.NP	5 dny	28.06.23	04.07.23	159FS+1	Jeřáb, michačka
159		Uložení stropních prefa filigránových panelů z betonu C25/30	1 den	06.07.23	06.07.23	160	Jeřáb
160		Bednění stropní konstrukce včetně věnce, ulož. tep. izolace + podstojkování	2 dny	07.07.23	10.07.23	161FS-1	Jeřáb upl.den
161		Armování stropní konstrukce včetně věnce	4 dny	10.07.23	13.07.23	162;176FS	Jeřáb den
162		Betonáž stropní konstrukce včetně věnce	1 den	14.07.23	14.07.23	163FS+3	Autodomichávací čerpadlo, vibrátor Jeřáb
163		Odbednění stropní kee vč. věnce + přestojkování	1 den	18.07.23	18.07.23	164FS+10	Jeřáb dny
164		Odstojkování 5.NP	1 den	02.08.23	02.08.23	165;262SI	
165		Odstojkování 4.NP	1 den	03.08.23	03.08.23	166	
166		Odstojkování 3.NP	1 den	04.08.23	04.08.23	167	
167		Odstojkování 2.NP	1 den	07.08.23	07.08.23	168	
168		Odstojkování 1.NP	1 den	08.08.23	08.08.23	169	
169		Odstojkování 1.PP	1 den	09.08.23	09.08.23	216	
170		<b>Připojka dešťové kanalizace</b>	<b>4 dny</b>	<b>10.07.23</b>	<b>13.07.23</b>		
171		Vytyčení přípojky dešťové kanalizace	1 den	10.07.23	10.07.23	172	Totální stanice
172		Výkop rýh přípojky dešťové kanalizace	1 den	11.07.23	11.07.23	173	Rypadlo
173		Podsyp + dešťová kanalizační přípojka	1 den	12.07.23	12.07.23	174	Rypadlo

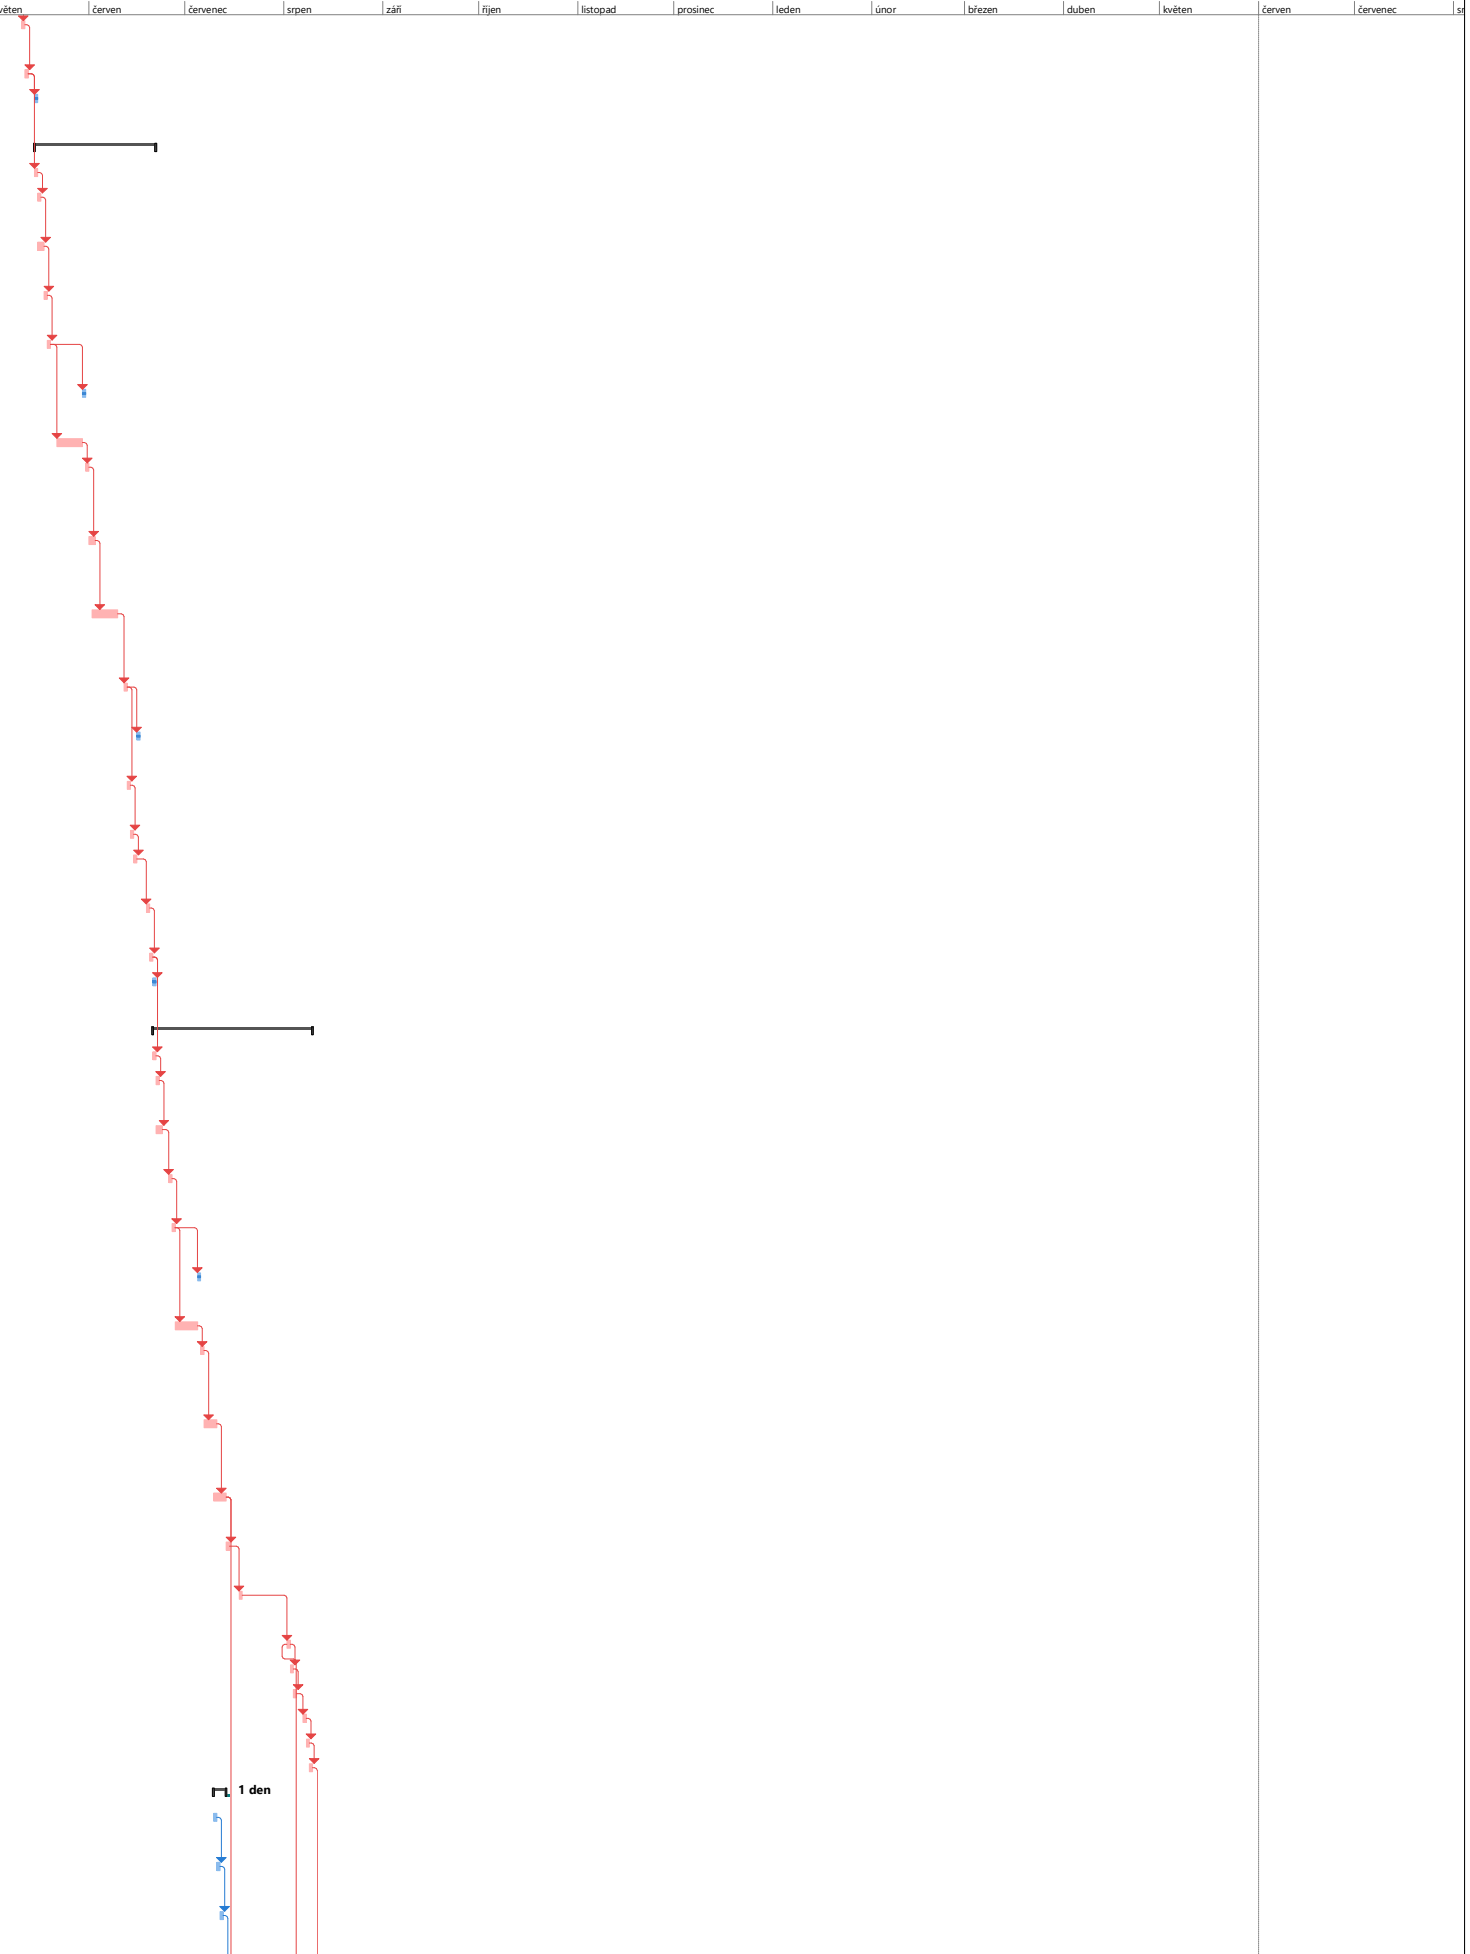


Kritický	Rozdělení	Skuz	Zahmry kritický	Neaktivní mílník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílník
Rozdělení kritického úkolu	Mílník	Souhrmný	Rozdělení zahmrtého kritického úkolu	Neaktivní souhrm	Ruční úkoly zahmrté v souhrmném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termin
Úkol	Časová rezerva	Souhrm projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrm	Vnější úkoly	Průběh



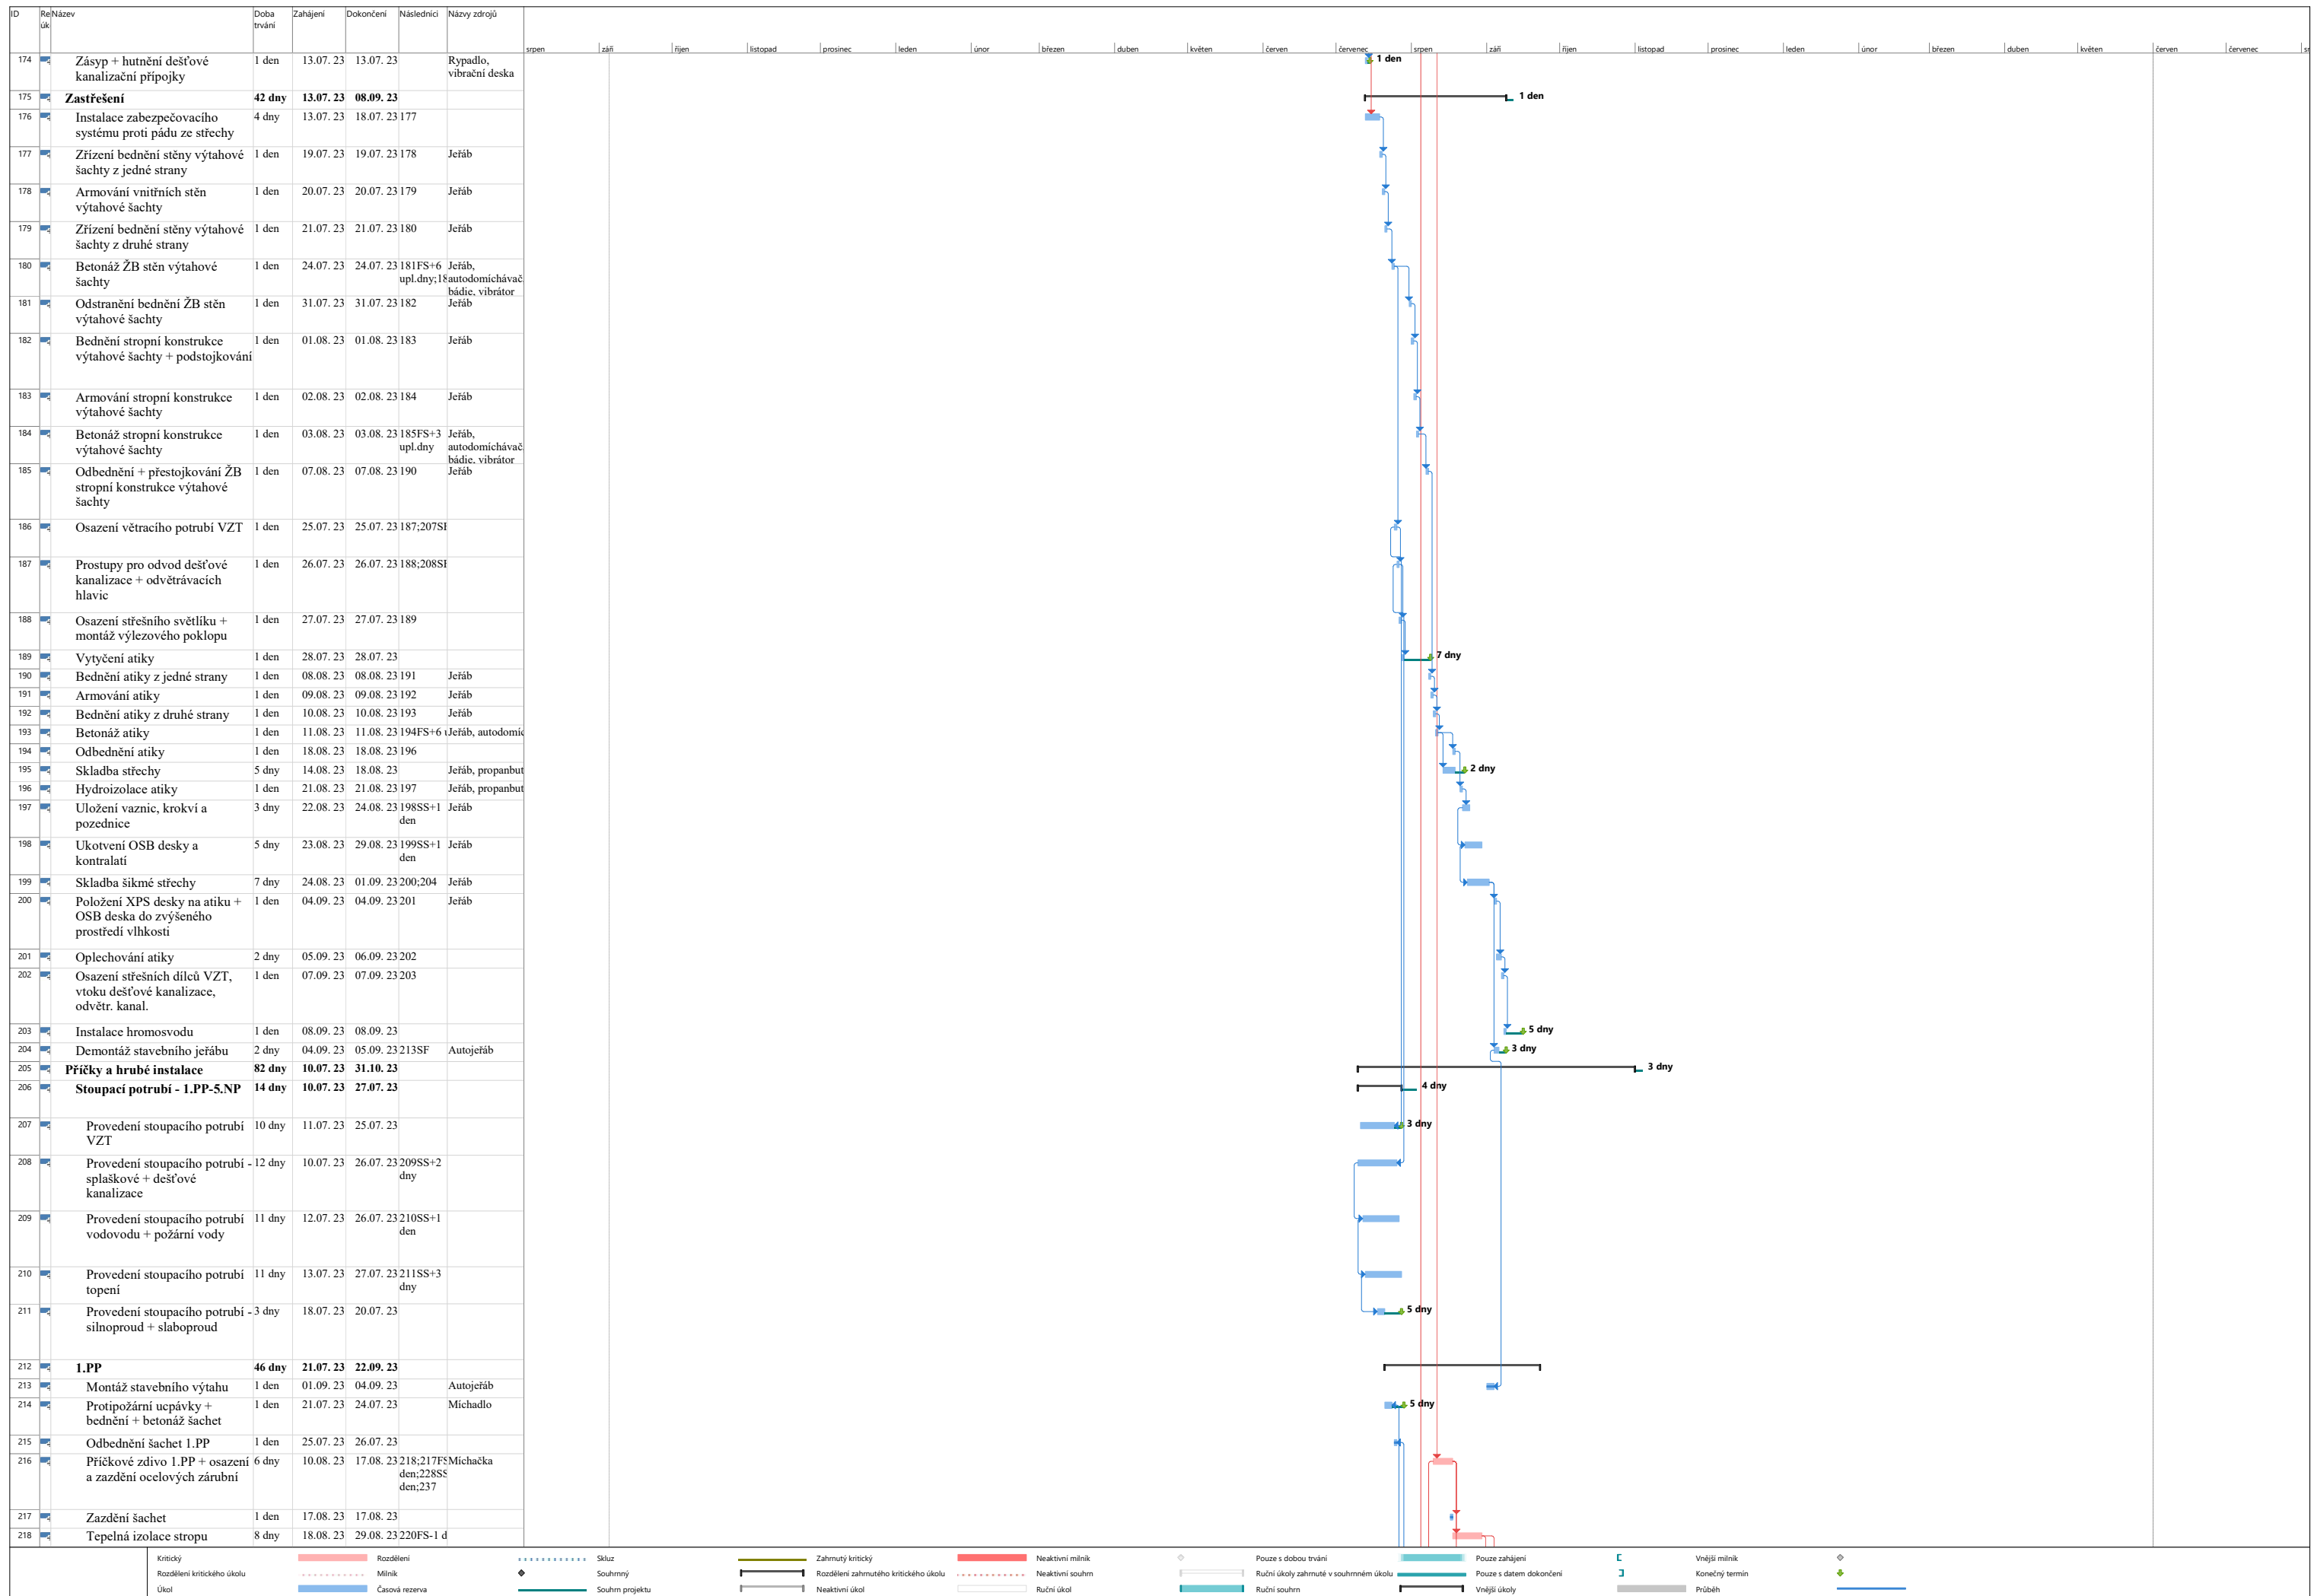

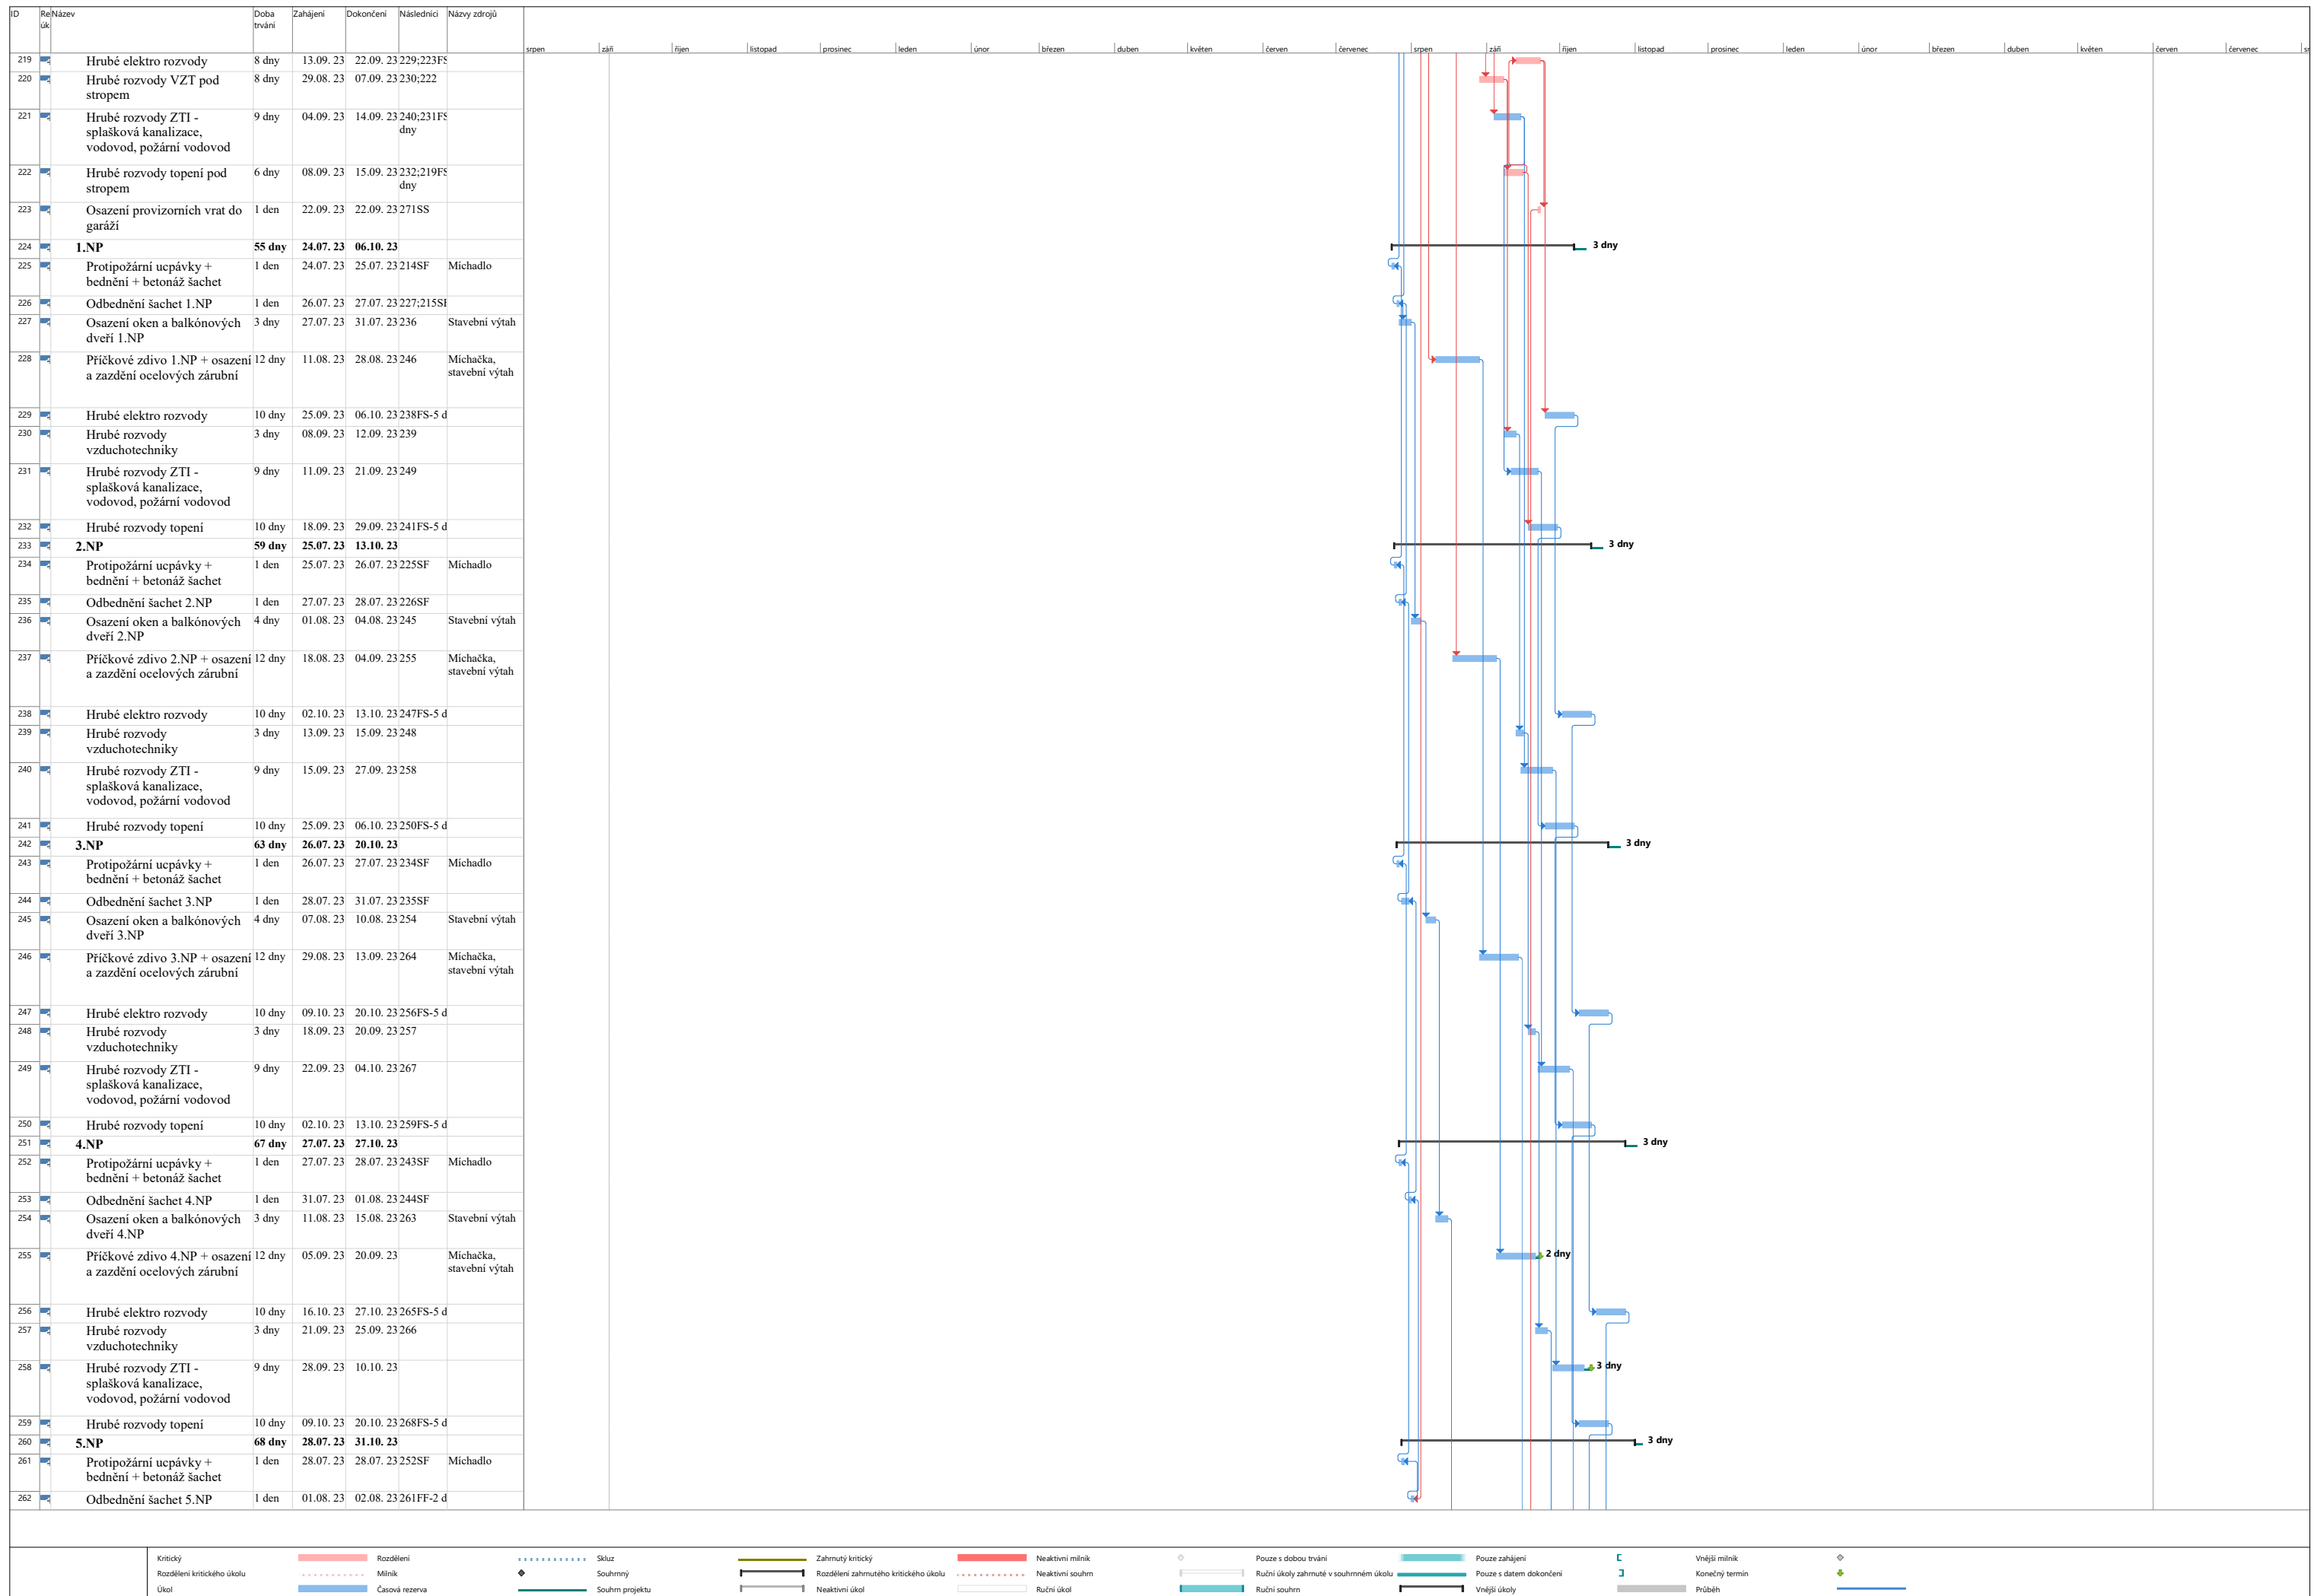


ID	ReNázev úk	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Názvy zdrojů
263	Osazení oken a balkónových dveří 5.NP	2 dny	16.08.23	17.08.23		Stavební výtah
264	Příčkové zdivo 5.NP + osazení a zazdění ocelových zárubní	9 dny	14.09.23	26.09.23		Michačka, stavební výtah
265	Hrubé elektro rozvody	7 dny	23.10.23	31.10.23		
266	Hrubé rozvody vzduchotechniky	2 dny	26.09.23	27.09.23		
267	Hrubé rozvody ZTI - splašková kanalizace, vodovod, požární vodovod	7 dny	05.10.23	13.10.23		
268	Hrubé rozvody topení	8 dny	16.10.23	25.10.23		
269	<b>Vnitřní úpravy povrchů</b>	<b>64 dny</b>	<b>22.09.23</b>	<b>20.12.23</b>		
270	<b>1.PP</b>	<b>14 dny</b>	<b>22.09.23</b>	<b>11.10.23</b>		
271	Omitky 1.PP	6 dny	22.09.23	29.09.23	274SS+2	Michadlo, silo, s
272	Provedení lité syntetické stěrky	3 dny	09.10.23	11.10.23		Čerpadlo
273	<b>1.NP</b>	<b>48 dny</b>	<b>26.09.23</b>	<b>01.12.23</b>		
274	Omitky 1.NP	20 dny	26.09.23	23.10.23	284;275	Michadlo, silo, s
275	Provedení tepelné izolace podlah 1.NP	4 dny	24.10.23	27.10.23	276	
276	Provedení hrubé podlahy 1.NP	3 dny	30.10.23	01.11.23		Čerpadlo, vibrační lat'
277	Provedení SDK 1.NP	4 dny	27.11.23	01.12.23	321SS	
278	<b>2.NP</b>	<b>42 dny</b>	<b>10.10.23</b>	<b>07.12.23</b>		
279	Omitky 2.NP	20 dny	10.10.23	06.11.23	289;280	Michadlo, silo, s
280	Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 2.NP	1 den	07.11.23	07.11.23	281	
281	Provedení hrubé podlahy 2.NP	3 dny	08.11.23	10.11.23		Čerpadlo, vibrační lat'
282	Provedení SDK 2.NP	4 dny	01.12.23	07.12.23	277SF	
283	<b>3.NP</b>	<b>36 dny</b>	<b>24.10.23</b>	<b>13.12.23</b>		
284	Omitky 3.NP	19 dny	24.10.23	17.11.23	294;285	Michadlo, silo, s
285	Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 3.NP	4 dny	20.11.23	23.11.23	286	
286	Provedení hrubé podlahy 3.NP	2 dny	24.11.23	27.11.23		Čerpadlo, vibrační lat'
287	Provedení SDK 3.NP	4 dny	07.12.23	13.12.23	282SF	
288	<b>4.NP</b>	<b>29 dny</b>	<b>07.11.23</b>	<b>18.12.23</b>		
289	Omitky 4.NP	18 dny	07.11.23	30.11.23	290	Michadlo, silo, s
290	Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 4.NP	4 dny	01.12.23	06.12.23	291	
291	Provedení hrubé podlahy 4.NP	2 dny	07.12.23	08.12.23		Čerpadlo, vibrační lat'
292	Provedení SDK 4.NP	3 dny	13.12.23	18.12.23	287SF	
293	<b>5.NP</b>	<b>23 dny</b>	<b>20.11.23</b>	<b>20.12.23</b>		
294	Omitky 5.NP	15 dny	20.11.23	08.12.23	295;393	Michadlo, silo, s
295	Provedení kročejové + tepelné izolace podlah 5.NP	4 dny	11.12.23	14.12.23	296	
296	Provedení hrubé podlahy 5.NP	2 dny	15.12.23	18.12.23	297FS-1 den	Čerpadlo, vibrační lat'
297	Provedení SDK 5.NP	3 dny	18.12.23	20.12.23	292SF	
298	<b>Vodovodní přípojka + přípojka požární vody</b>	<b>6 dny</b>	<b>10.11.23</b>	<b>17.11.23</b>		
299	Vytyčení + výkop rýh vodovodní přípojky + přípojky požární vody	1 den	10.11.23	10.11.23	300	Totální stanice, nákladní auto, rypadlo,
300	Podsyp + vodovodní přípojka + přípojka požární vody	2 dny	13.11.23	14.11.23	301	Rypadlo
301	Napojení vodovodní přípojky na BD + přípojky požární vody	2 dny	15.11.23	16.11.23	302	
302	Zásyp + hutnění vodovodních přípojek + osazení požárního hydrantu	1 den	17.11.23	17.11.23	304	Rypadlo, vibrační deska
303	<b>Horkovodní přípojka</b>	<b>4 dny</b>	<b>20.11.23</b>	<b>23.11.23</b>		
304	Vytyčení + výkop rýh horkovodní přípojky	1 den	20.11.23	20.11.23	305	Totální stanice, nákladní auto, rypadlo,
305	Podsyp + horkovodní přípojka	1 den	21.11.23	21.11.23	306	Rypadlo,
306	Napojení horkovodní přípojky na BD	1 den	22.11.23	22.11.23	307	
307	Zásyp + hutnění horkovodní přípojky	1 den	23.11.23	23.11.23	309	Rypadlo, vibrační deska
308	<b>Elektro přípojka</b>	<b>4 dny</b>	<b>24.11.23</b>	<b>29.11.23</b>		
309	Vytyčení + výkop rýh elektro přípojky	1 den	24.11.23	24.11.23	310	Totální stanice, nákladní auto, rypadlo,
310	Podsyp + elektro přípojka	1 den	27.11.23	27.11.23	311	Rypadlo,
311	Elektro napojení na BD	1 den	28.11.23	28.11.23	312	

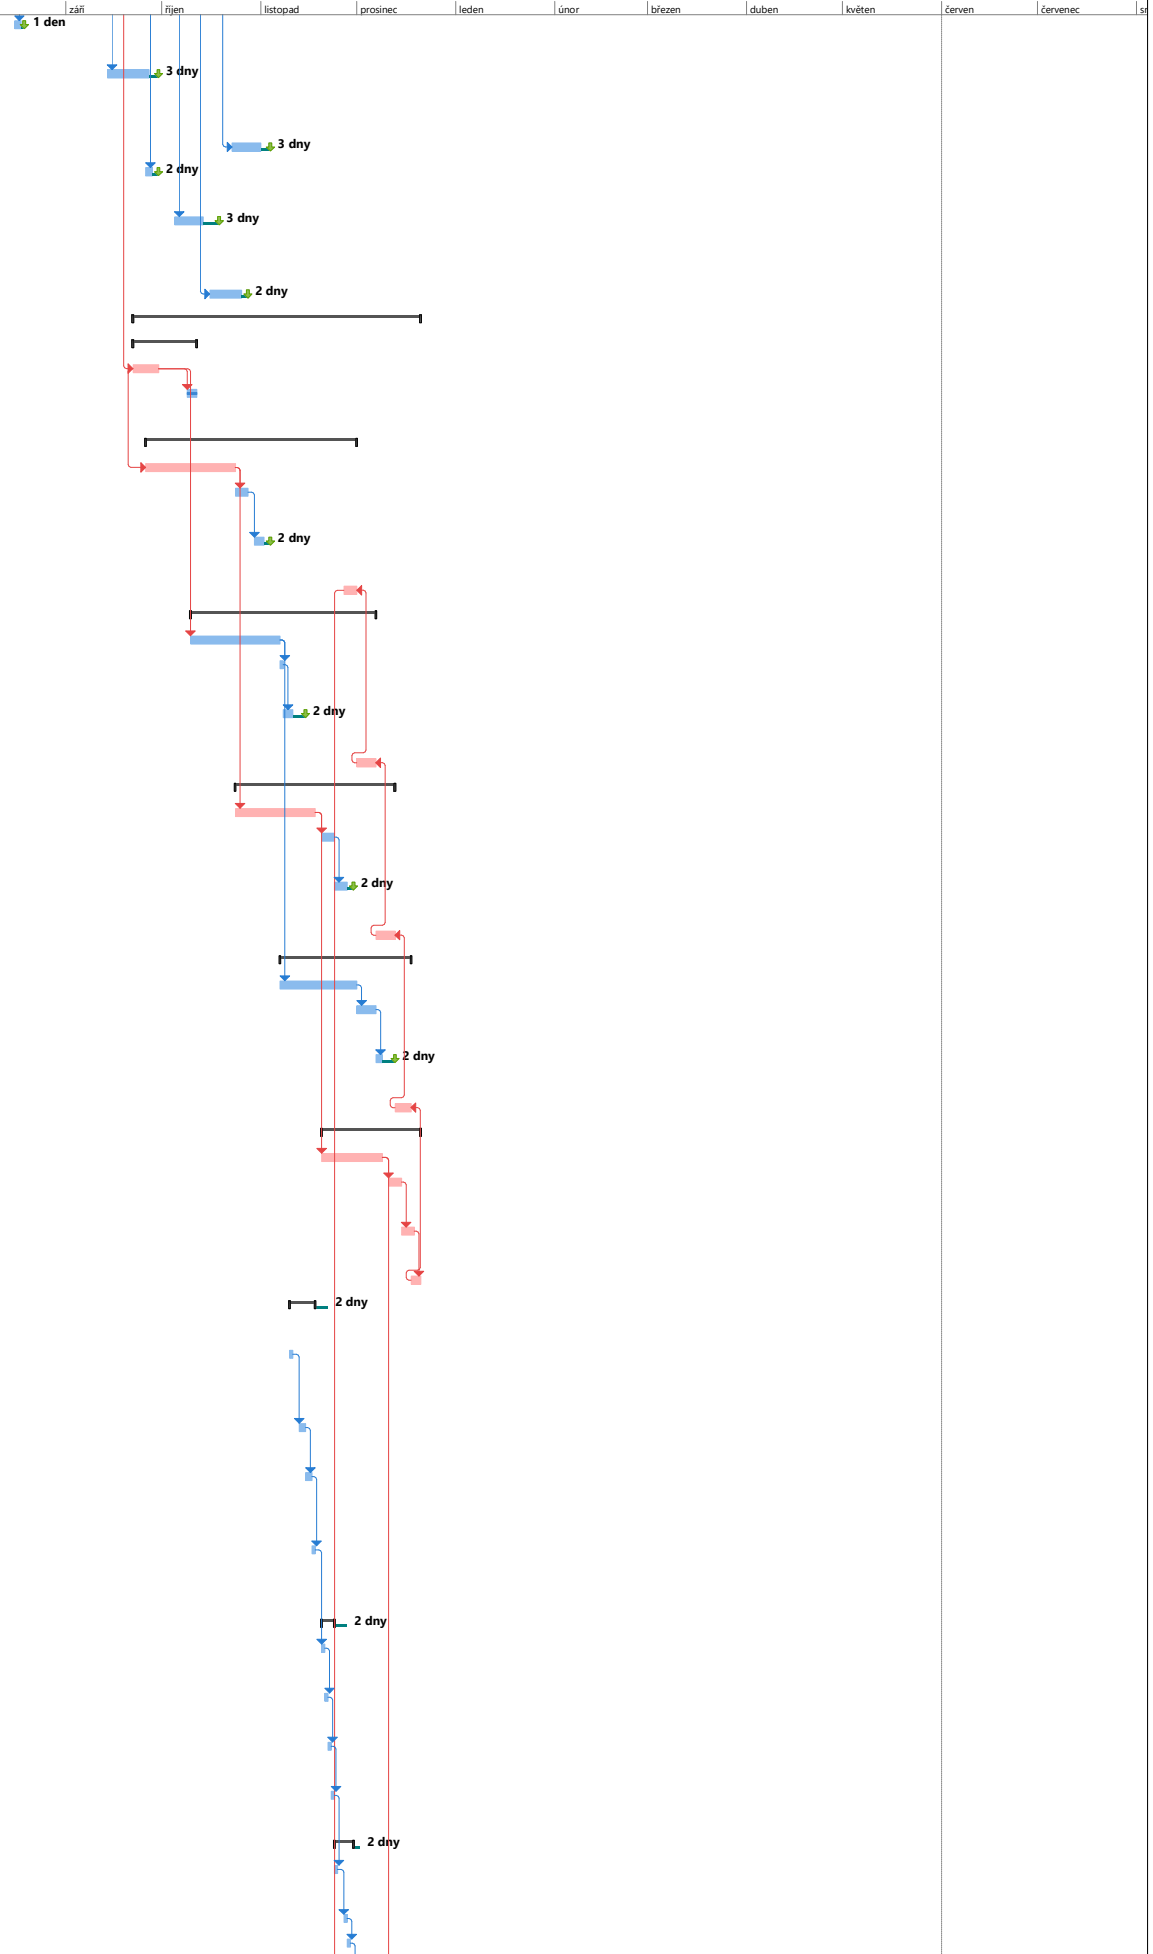


Kritický	Rozdělení	Skuz	Zahrnutý kritický	Neaktivní mílník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Vnější mílník
Rozdělení kritického úkolu	Mílník	Souhrnný	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	Konečný termín
Úkol	Časová rezerva	Souhrn projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Vnější úkoly	Průběh

ID	ReNázev úk	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Následníci	Názvy zdrojů
312	Zásyp + hutnění elektro přípojky	1 den	29.11. 23	29.11. 23		Rypadlo, vibrační deska
313	<b>Dokončovací práce a kompletace</b>	<b>117 dny</b>	<b>20.11. 23</b>	<b>30.04. 24</b>		
314	<b>Technologická zařízení</b>	<b>85 dny</b>	<b>20.11. 23</b>	<b>15.03. 24</b>		
315	Montáž chladících jednotek VZT	1 den	14.02. 24	14.02. 24		
316	Montáž výměňkové stanice	1 den	20.11. 23	20.11. 23 317		
317	Osazení expanzní nádoby	1 den	21.11. 23	21.11. 23 318		
318	Osazení akumulární nádoby	1 den	22.11. 23	22.11. 23		
319	Montáž osobního výtahů	15 dny	26.02. 24	15.03. 24		
320	<b>1.PP</b>	<b>112 dny</b>	<b>27.11. 23</b>	<b>30.04. 24</b>		
321	Osazení garážových vrat	1 den	27.11. 23	27.11. 23 322		
322	Tryskání podkladu + provedení epoxidový nátěr	2 dny	28.11. 23	29.11. 23 326		Tryskací stroj
323	Provedení penetračního nátěru + maleb 1.PP	7 dny	26.12. 23	03.01. 24 324FS+2 dny:333SS dny:345		
324	Prívodní/odvodní jednotky VZT + kompletace vzduchotechniky 1.PP	10 dny	08.01. 24	19.01. 24 334FS-4 dny:346;3		
325	Provedení zábradlí schodiště	1 den	15.01. 24	16.01. 24		
326	Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 1.PP	2 dny	30.11. 23	01.12. 23 323FS+16 dny:332;3	Rezačka	
327	Nátěr zárubní + osazení obl. + osazení prahů, lišt a dveřních křidel 1.PP	3 dny	06.03. 24	11.03. 24		
328	Montáž požárních hydrantů	1 den	22.01. 24	22.01. 24 329;339FS		
329	Kompletace elektro + svítidla	10 dny	23.01. 24	05.02. 24 341FS-5 dny:353		
330	Vyčištění podlaží	4 dny	25.04. 24	30.04. 24 442FS-9 d		
331	<b>1.NP</b>	<b>103 dny</b>	<b>04.12. 23</b>	<b>24.04. 24</b>		
332	Osazení vnitřních parapetů	3 dny	04.12. 23	06.12. 23 344		
333	Provedení penetračního nátěru + maleb 1.NP	10 dny	28.12. 23	10.01. 24 357		
334	Kompletace vzduchotechniky 1.NP	7 dny	16.01. 24	24.01. 24 358		
335	Provedení zábradlí schodiště 1.NP	1 den	16.01. 24	17.01. 24 325SF		
336	Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 1.NP	13 dny	04.12. 23	20.12. 23 348FS-6 dny:360	Rezačka	
337	Provedení laminátové podlahy + soklů 1.NP	13 dny	13.02. 24	29.02. 24 349FS-7 dny:361		
338	Nátěr zárubní + osazení obl. a vst.dveří, osazení prahů, lišt a dveřních křidel	3 dny	11.03. 24	14.03. 24 327SF		
339	Osazení zařízení ZTI + montáž výtokových armatur 1.NP	2 dny	26.01. 24	29.01. 24 351;340FS den		
340	Osazení otopných těles 1.NP	4 dny	29.01. 24	01.02. 24 352		
341	Kompletace elektro + svítidla	10 dny	30.01. 24	12.02. 24 365;337		
342	Vyčištění podlaží	4 dny	19.04. 24	24.04. 24 330		
343	<b>2.NP</b>	<b>96 dny</b>	<b>07.12. 23</b>	<b>18.04. 24</b>		
344	Osazení vnitřních parapetů	3 dny	07.12. 23	11.12. 23 356		
345	Provedení penetračního nátěru + maleb 2.NP	10 dny	04.01. 24	17.01. 24 369		
346	Kompletace vzduchotechniky 2.NP	7 dny	22.01. 24	30.01. 24 370		
347	Provedení zábradlí schodiště 2.NP	1 den	17.01. 24	18.01. 24 335SF		
348	Provedení keramických obkladů a dlažeb + spárování 2.NP	13 dny	13.12. 23	29.12. 23 372	Rezačka	
349	Provedení laminátové podlahy + soklů 2.NP	12 dny	21.02. 24	07.03. 24 373		
350	Nátěr zárubní + osazení obl. + osazení prahů, lišt a dveřních křidel 2.NP	3 dny	14.03. 24	19.03. 24 338SF		
351	Osazení zařízení ZTI + montáž výtokových armatur 2.NP	2 dny	30.01. 24	31.01. 24 363		
352	Osazení otopných těles 2.NP	4 dny	02.02. 24	07.02. 24 364		
353	Kompletace elektro + svítidla	10 dny	06.02. 24	19.02. 24 377		
354	Vyčištění podlaží	4 dny	15.04. 24	18.04. 24 342		
355	<b>3.NP</b>	<b>89 dny</b>	<b>12.12. 23</b>	<b>12.04. 24</b>		
356	Osazení vnitřních parapetů	3 dny	12.12. 23	14.12. 23 368		

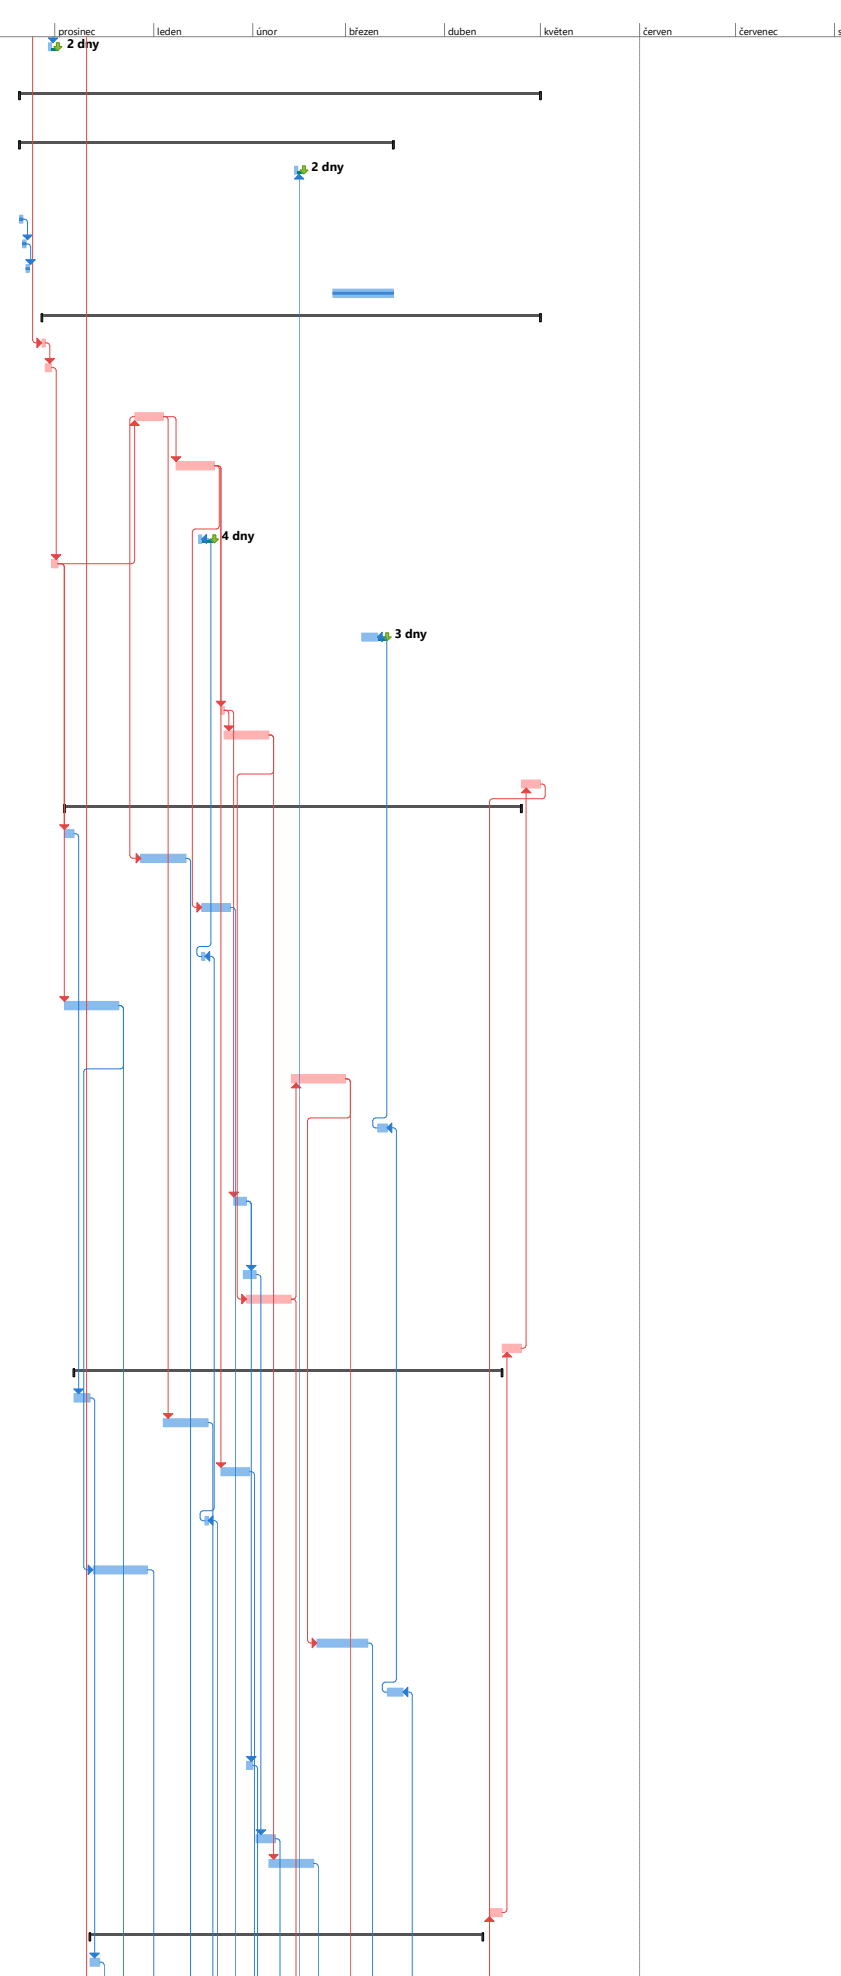

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kritický úkol</li> <li>Rozdělení úkolů</li> <li>Mínik</li> <li>Úkol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdělení</li> <li>Souhrnný</li> <li>Souhrn projektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skuz</li> <li>Souhrn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahrnutý kritický</li> <li>Rozdělení zahrnutého kritického úkolu</li> <li>Neaktivní úkol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neaktivní mínik</li> <li>Neaktivní souhrn</li> <li>Ruční úkol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pouze s dobou trvání</li> <li>Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu</li> <li>Ruční souhrn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pouze zahájení</li> <li>Pouze s datem dokončení</li> <li>Vnější úkoly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vnější mínik</li> <li>Konečný termín</li> <li>Průběh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Průběh</li> </ul>
---	--	--	--	---	--	---	--	--

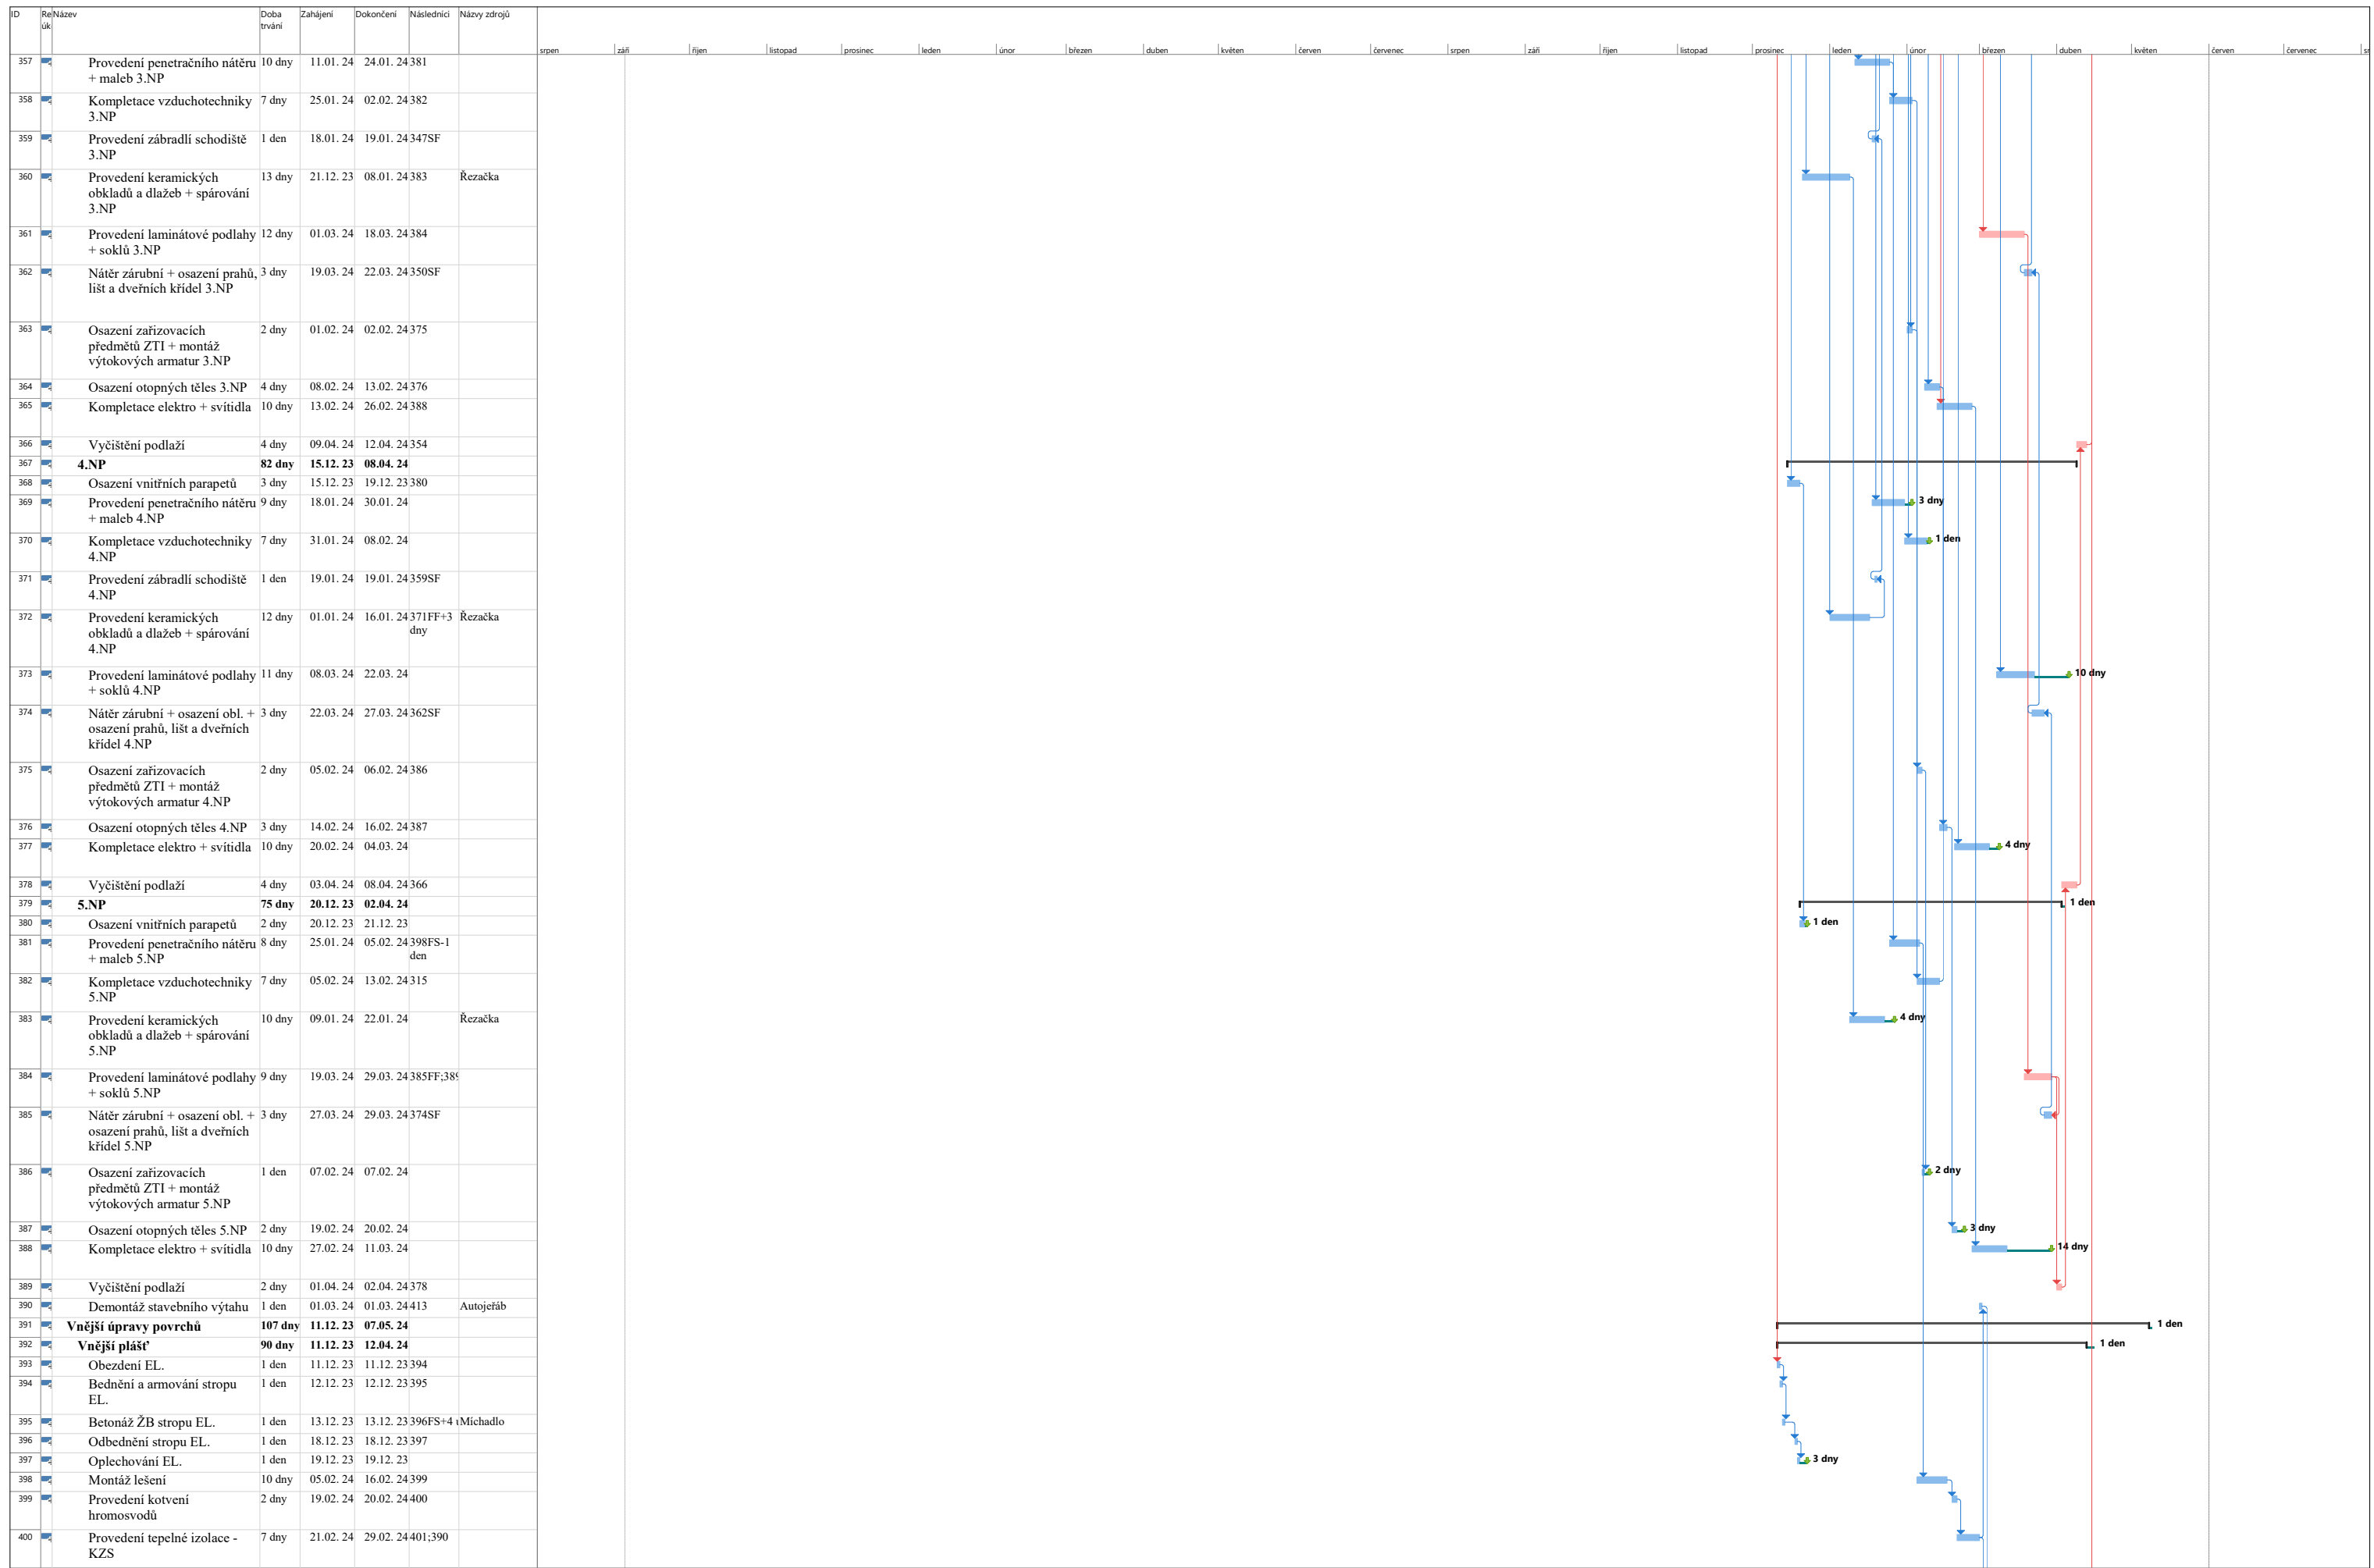

Kritický úkol	Rozdělení úkolu	Milník	Časová rezervace	Skuz	Souhrmný	Souhrm projektu	Zahrnutý kritický úkol	Rozdělení zahrnutého kritického úkolu	Neaktivní úkol	Neaktivní milník	Neaktivní souhrm	Ruční úkol	Pouze s dobou trvání	Ruční úkoly zahrnuté v souhrmném úkolu	Ruční souhrm	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Vnější milník	Konečný termín	Průběh	Vnější úkoly
---------------	-----------------	--------	------------------	------	----------	-----------------	------------------------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------	----------------------	--	--------------	----------------	-------------------------	---------------	----------------	--------	--------------

