

Zobrazení hlavních vazeb								2016												2017												2018					
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
prip_kanal_splas																																					
101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 prip_kanal_splas	1	1	0	15.8.16	19.8.16	15.8.16	19.8.16																													
301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 prip_kanal_splas	2	1	0	15.8.16	19.8.16	15.8.16	19.8.16																													
601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 prip_kanal_splas	1	1	0	15.8.16	19.8.16	15.8.16	19.8.16																													
701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 prip_kanal_splas	1	2	0	15.8.16	26.8.16	15.8.16	26.8.16																													
3104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 prip_kanal_splas	1	1	0	22.8.16	26.8.16	22.8.16	26.8.16																													
3859	PŘESUN HMOT TE 3 1 prip_kanal_splas	2	1	3	22.8.16	26.8.16	12.9.16	16.9.16																													
6238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ 1 prip_kanal_splas	2	1	0	29.8.16	2.9.16	29.8.16	2.9.16																													
6278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 prip_kanal_splas	2	1	0	29.8.16	2.9.16	29.8.16	2.9.16																													
6409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 prip_kanal_splas	1	1	2	29.8.16	2.9.16	12.9.16	16.9.16																													
6456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 prip_kanal_splas	1	1	2	29.8.16	2.9.16	12.9.16	16.9.16																													
6508	ARMATURY, DOPLŇKY ŠACHET 1 prip_kanal_splas	1	1	2	29.8.16	2.9.16	12.9.16	16.9.16																													
6805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 prip_kanal_splas	2	1	3	5.9.16	9.9.16	26.9.16	30.9.16																													
6859	PŘESUN HMOT TE 6 1 prip_kanal_splas	1	1	3	22.8.16	26.8.16	12.9.16	16.9.16																													
9108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 prip_kanal_splas	1	1	0	5.9.16	9.9.16	5.9.16	9.9.16																													
9401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 prip_kanal_splas	1	1	0	12.9.16	16.9.16	12.9.16	16.9.16																													
9705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 prip_kanal_splas	2	1	2	19.9.16	23.9.16	3.10.16	7.10.16																													
9859	PŘESUN HMOT TE 9 1 prip_kanal_splas	1	2	0	12.9.16	23.9.16	12.9.16	23.9.16																													
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 prip_kanal_splas	1	1	0	19.9.16	23.9.16	19.9.16	23.9.16																													
10101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Prip_kanal_dest	1	1	1	22.8.16	26.8.16	29.8.16	2.9.16																													
10301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Prip_kanal_dest	2	1	1	22.8.16	26.8.16	29.8.16	2.9.16																													
10601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Prip_kanal_dest	1	1	1	22.8.16	26.8.16	29.8.16	2.9.16																													
10701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Prip_kanal_dest	1	2	0	29.8.16	9.9.16	29.8.16	9.9.16																													
13104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Prip_kanal_dest	1	1	0	5.9.16	9.9.16	5.9.16	9.9.16																													
13408	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 Prip_kanal_dest	2	1	0	12.9.16	16.9.16	12.9.16	16.9.16																													
13859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Prip_kanal_dest	2	1	4	5.9.16	9.9.16	3.10.16	7.10.16																													
16238	POTRUBÍ KAMENINOVÉ 1 Prip_kanal_dest	2	1	0	19.9.16	23.9.16	19.9.16	23.9.16																													
16278	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Prip_kanal_dest	2	1	0	19.9.16	23.9.16	19.9.16	23.9.16																													
16409	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 Prip_kanal_dest	1	1	1	19.9.16	23.9.16	26.9.16	30.9.16																													

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - -+ -+, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Zobrazení hlavních vazeb								2016												2017												2018
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek připust.	Konec připust.	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1							
Dodav.	Směnnost		[týd.]					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1							
16456	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 Prip_kanal_dest	1	1	1	19.9.16	23.9.16	26.9.16																									
16508	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Prip_kanal_dest	1	1	2	19.9.16	23.9.16	3.10.16																									
16805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 Prip_kanal_dest	2	1	1	26.9.16	30.9.16	3.10.16																									
16859	PŘESUN HMOT TE 6 1 Prip_kanal_dest	1	1	3	12.9.16	16.9.16	3.10.16																									
19108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 Prip_kanal_dest	1	1	0	26.9.16	30.9.16	26.9.16																									
19401	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Prip_kanal_dest	2	1	0	3.10.16	7.10.16	3.10.16																									
19705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 Prip_kanal_dest	2	1	0	10.10.16	14.10.16	10.10.16																									
19859	PŘESUN HMOT TE 9 1 Prip_kanal_dest	1	2	0	3.10.16	14.10.16	3.10.16																									
19980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Prip_kanal_dest	2	1	0	10.10.16	14.10.16	10.10.16																									
Prip_vodovod																																
20101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Prip_vodovod	1	1	2	29.8.16	2.9.16	12.9.16																									
20301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Prip_vodovod	2	1	2	29.8.16	2.9.16	12.9.16																									
20601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Prip_vodovod	1	2	2	29.8.16	9.9.16	12.9.16																									
20701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Prip_vodovod	1	2	0	12.9.16	23.9.16	12.9.16																									
23104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Prip_vodovod	1	1	0	19.9.16	23.9.16	19.9.16																									
23808	ŠACHTY NA POTRUBÍ 1 Prip_vodovod	1	1	0	19.9.16	23.9.16	19.9.16																									
23859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Prip_vodovod	2	1	2	19.9.16	23.9.16	3.10.16																									
26178	POTRUBÍ Z PLASTU 1 Prip_vodovod	2	1	0	26.9.16	30.9.16	26.9.16																									
26259	DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS 1 Prip_vodovod	1	1	1	26.9.16	30.9.16	3.10.16																									
26506	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS 1 Prip_vodovod	1	1	1	26.9.16	30.9.16	3.10.16																									
26608	ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET 1 Prip_vodovod	1	1	2	26.9.16	30.9.16	10.10.16																									
26805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 Prip_vodovod	2	1	1	3.10.16	7.10.16	10.10.16																									
26859	PŘESUN HMOT TE 6 1 Prip_vodovod	1	1	2	26.9.16	30.9.16	10.10.16																									
29108	TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ 1 Prip_vodovod	1	1	0	3.10.16	7.10.16	3.10.16																									
29501	OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ 1 Prip_vodovod	2	1	0	10.10.16	14.10.16	10.10.16																									
29705	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 Prip_vodovod	2	1	0	17.10.16	21.10.16	17.10.16																									
29859	PŘESUN HMOT TE 9 1 Prip_vodovod	1	2	0	10.10.16	21.10.16	10.10.16																									
29980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Prip_vodovod	2	1	0	17.10.16	21.10.16	17.10.16																									


Zobrazení hlavních vazeb								2016												2017												2018							
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		
DCOV																																							
30301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 DCOV	2	2	0	24.10.16	4.11.16	24.10.16	4.11.16																															
30551	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 DCOV	2	2	1	24.10.16	4.11.16	31.10.16	11.11.16																															
30601	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 DCOV	1	2	1	24.10.16	4.11.16	31.10.16	11.11.16																															
30802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 DCOV	1	2	0	7.11.16	18.11.16	7.11.16	18.11.16																															
33122	ZÁKLADY IS 1 DCOV	2	2	0	7.11.16	18.11.16	7.11.16	18.11.16																															
33859	PŘESUN HMOT TE 3 1 DCOV	2	2	4	24.10.16	4.11.16	21.11.16	2.12.16																															
36201	ZÁSYPY 1 DCOV	1	2	6	24.10.16	4.11.16	5.12.16	16.12.16																															
36557	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 DCOV	1	2	0	21.11.16	2.12.16	21.11.16	2.12.16																															
36778	POTRUBÍ Z PLASTU 1 DCOV	2	1	0	28.11.16	2.12.16	28.11.16	2.12.16																															
36859	PŘESUN HMOT TE 6 1 DCOV	1	2	4	24.10.16	4.11.16	21.11.16	2.12.16																															
39659	ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ 1 DCOV	2	2	0	21.11.16	2.12.16	21.11.16	2.12.16																															
39859	PŘESUN HMOT TE 9 1 DCOV	1	2	0	21.11.16	2.12.16	21.11.16	2.12.16																															
39980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 DCOV	2	1	0	5.12.16	9.12.16	5.12.16	9.12.16																															
Prip_elekto																																							
40101	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE 1 Prip_elekto	1	1	0	7.11.16	11.11.16	7.11.16	11.11.16																															
40301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 Prip_elekto	2	2	0	7.11.16	18.11.16	7.11.16	18.11.16																															
40601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 Prip_elekto	1	2	1	7.11.16	18.11.16	14.11.16	25.11.16																															
40701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 Prip_elekto	1	2	1	7.11.16	18.11.16	14.11.16	25.11.16																															
43104	PODKLAD A VEDL KONSTR IS 1 Prip_elekto	1	1	0	21.11.16	25.11.16	21.11.16	25.11.16																															
43403	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 1 Prip_elekto	2	1	0	28.11.16	2.12.16	28.11.16	2.12.16																															
43859	PŘESUN HMOT TE 3 1 Prip_elekto	2	2	6	21.11.16	2.12.16	2.1.17	13.1.17																															
46207	SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU 1 Prip_elekto	1	1	0	12.12.16	16.12.16	12.12.16	16.12.16																															
46601	ZÁSYPY 1 Prip_elekto	1	1	0	19.12.16	23.12.16	19.12.16	23.12.16																															
46805	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 Prip_elekto	2	2	0	27.12.16	6.1.17	27.12.16	6.1.17																															
46859	PŘESUN HMOT TE 6 1 Prip_elekto	1	2	3	12.12.16	23.12.16	2.1.17	13.1.17																															
49605	VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE 1 Prip_elekto	2	2	0	2.1.17	13.1.17	2.1.17	13.1.17																															
49859	PŘESUN HMOT TE 9 1 Prip_elekto	1	2	3	12.12.16	23.12.16	2.1.17	13.1.17																															

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - -+ -+ , milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Zobrazení hlavních vazeb								2016												2017												2018
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1							
Dodav.	Směnnost		[týd.]					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1							
49980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Prip_elekto	2	1	0	9.1.17	13.1.17	9.1.17																									
oploceni																																
50201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 oploceni	2	2	0	16.1.17	27.1.17	16.1.17																									
50301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 oploceni	2	1	0	16.1.17	20.1.17	16.1.17																									
50601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 oploceni	1	1	1	16.1.17	20.1.17	23.1.17																									
50802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 oploceni	1	1	0	23.1.17	27.1.17	23.1.17																									
53102	ZÁKLADY IS 1 oploceni	2	1	0	30.1.17	3.2.17	30.1.17																									
53859	PŘESUN HMOT TE 3 1 oploceni	2	1	4	30.1.17	3.2.17	27.2.17																									
56203	ZÍDKY PLOTY A ZÁBRADLÍ 1 oploceni	3	3	0	6.2.17	24.2.17	6.2.17																									
56801	ZÁSYPY 1 oploceni	1	1	0	27.2.17	3.3.17	27.2.17																									
56859	PŘESUN HMOT TE 6 1 oploceni	1	1	5	30.1.17	3.2.17	6.3.17																									
59357	ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY 1 oploceni	1	1	5	30.1.17	3.2.17	6.3.17																									
59407	SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 oploceni	1	1	5	30.1.17	3.2.17	6.3.17																									
59457	NÁTĚRY VENKOVNÍ 1 oploceni	1	1	0	6.3.17	10.3.17	6.3.17																									
59859	PŘESUN HMOT TE 9 1 oploceni	1	1	2	20.2.17	24.2.17	6.3.17																									
59980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 oploceni	2	1	0	6.3.17	10.3.17	6.3.17																									
RD_s_garazi																																
60201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 RD_s_garazi	2	2	0	13.3.17	24.3.17	13.3.17																									
60301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 RD_s_garazi	2	2	0	27.3.17	7.4.17	27.3.17																									
60601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 RD_s_garazi	1	2	2	27.3.17	7.4.17	10.4.17																									
60802	POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ 1 RD_s_garazi	2	2	0	10.4.17	21.4.17	10.4.17																									
61202	ZÁKLADY 1 RD_s_garazi	3	2	0	24.4.17	5.5.17	24.4.17																									
61507	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD 1 RD_s_garazi	1	2	0	15.5.17	26.5.17	15.5.17																									
61604	PODKLAD LEŽ KANALIZACE 1 RD_s_garazi	1	2	0	10.4.17	21.4.17	10.4.17																									
61707	KANALIZACE LEŽATÁ 1 RD_s_garazi	1	2	0	24.4.17	5.5.17	24.4.17																									
61859	PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ 1 RD_s_garazi	3	2	0	9.5.17	19.5.17	9.5.17																									
62607	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 RD_s_garazi	1	2	7	29.5.17	9.6.17	17.7.17																									
62801	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 RD_s_garazi	1	2	7	12.6.17	23.6.17	31.7.17																									

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - -, milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

9.12.17

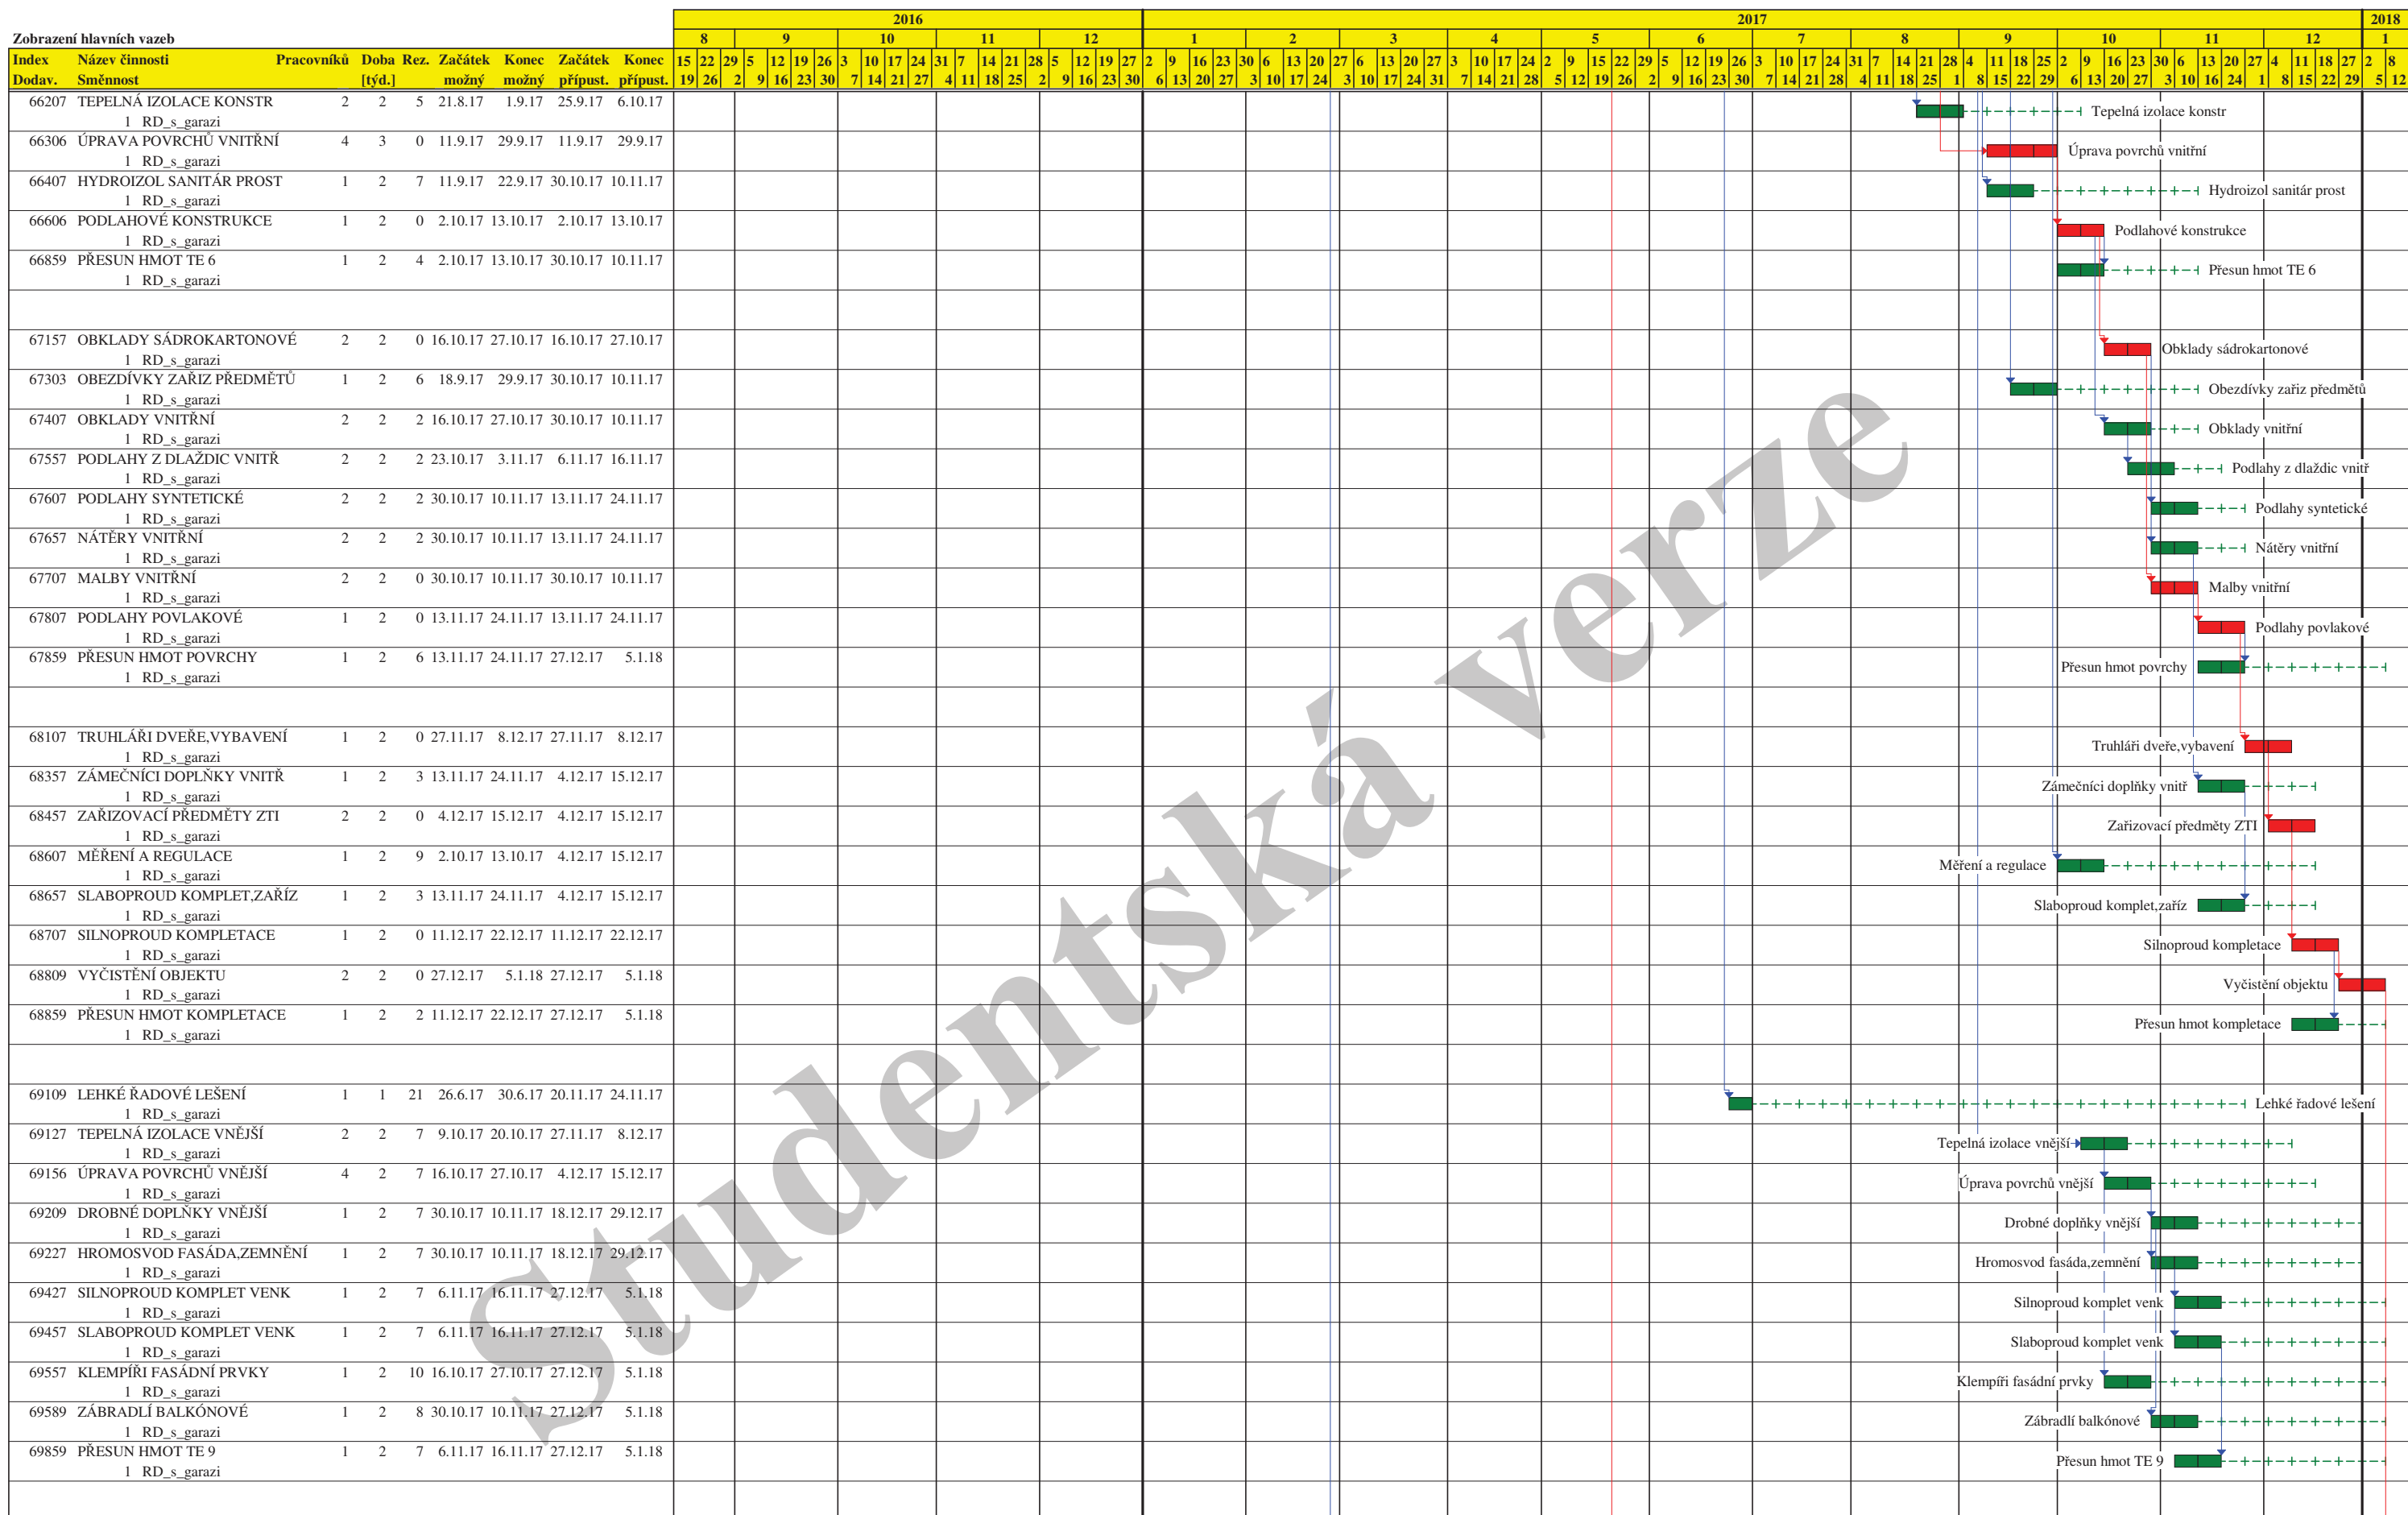

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - - - - - , milník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

Zobrazení hlavních vazeb								2016												2017												2018
Index	Název činnosti	Pracovníků	Doba Rez.	Začátek možný	Konec možný	Začátek přípust.	Konec přípust.	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1							
Dodav.	Směnnost		[týd.]					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1							
69980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 RD_s_garazi	2	1	0	8.1.18	12.1.18	8.1.18	12.1.18																								
70101	PŘÍPRAVNÉ A PŘÍDR PRÁCE 1 zpevnen_plochy	2	1	3	27.2.17	3.3.17	20.3.17	24.3.17																								
70201	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY 1 zpevnen_plochy	2	1	4	27.2.17	3.3.17	27.3.17	31.3.17																								
70301	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 zpevnen_plochy	2	2	4	27.2.17	10.3.17	27.3.17	7.4.17																								
70601	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU 1 zpevnen_plochy	1	1	6	27.2.17	3.3.17	10.4.17	14.4.17																								
70701	NÁSYPY A SKLÁDKY 1 zpevnen_plochy	1	2	3	6.3.17	17.3.17	27.3.17	7.4.17																								
73101	NÁSYPY ZHUTNĚNÉ 1 zpevnen_plochy	2	1	5	6.3.17	10.3.17	10.4.17	14.4.17																								
73155	PODKLAD KOM SPOD VRSTVY 1 zpevnen_plochy	2	1	3	20.3.17	24.3.17	10.4.17	14.4.17																								
73459	CHODNÍKOVÉ OBRUBY 1 zpevnen_plochy	2	1	3	20.3.17	24.3.17	10.4.17	14.4.17																								
73509	OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY 1 zpevnen_plochy	1	1	3	27.3.17	31.3.17	17.4.17	21.4.17																								
73859	PŘESUN HMOT TE 3 1 zpevnen_plochy	2	1	8	20.3.17	24.3.17	15.5.17	19.5.17																								
76105	PODKLAD KOM VRCH VRSTVA 1 zpevnen_plochy	2	1	3	27.3.17	31.3.17	17.4.17	21.4.17																								
76305	DLAŽBA KOMUNIKACE 1 zpevnen_plochy	2	3	3	27.3.17	14.4.17	17.4.17	5.5.17																								
76809	DOPLŇKY POZEM KOMUNIKACÍ 1 zpevnen_plochy	2	1	6	27.3.17	31.3.17	9.5.17	12.5.17																								
76859	PŘESUN HMOT TE 6 1 zpevnen_plochy	1	1	6	3.4.17	7.4.17	15.5.17	19.5.17																								
79405	DLAŽBA PĚŠÍ KOMUNIKACE 1 zpevnen_plochy	2	1	3	17.4.17	21.4.17	9.5.17	12.5.17																								
79859	PŘESUN HMOT TE 9 1 zpevnen_plochy	1	1	6	3.4.17	7.4.17	15.5.17	19.5.17																								
79980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 zpevnen_plochy	2	1	0	15.5.17	19.5.17	15.5.17	19.5.17																								

Činnost: kritická - ■, zpožděná - ■, s rezervou - ■, rezerva - +---+, mílník - ⊕, vynucený termín - ▶, hlavní vazba - ↓

