

APQP - činnost

č. PRJ20003


Definování programu						
Zákazník	[Redacted]			Název projektu 730B		
	Dodací číslo 4311016010			Číslo nabídky N009-20		
	Číslo výkresu 0000022054 ind. AAE			Číslo produktu 05628		
Termín fází projektu určuje:						
Datum SOP zákazníka		01.12.2021	Koeficient obtížnosti produktu		3	Priorita
Datum zahájení programu		05.06.2020	Časový fond projektu (dnů)		544	5
Časový plán						
Návrh termínů milníků		Schválení zákazníka	N/A	Datum	N/A	
2.0 Návrh a vývoj produktu	3.0 Návrh a vývoj procesu	4.0 Validace produktu a procesu	SOP	Vyhodnocení programu	Dnů do SOP	
11.2.21	9.9.21	1.12.21	1.12.21	30.5.22	0	

Dodržení časového plánu programu	Plnění termínů aktivit (dnů)	Fond	Plnění termínu fází (dnů)	%
2.0 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU	-613	236	-207	-87,7
3.0 NÁVRH A VÝVOJ PROCESU	-1648	231	-204	-88,3
4.0 VALIDACE PRODUKTU A PROCESU	-1377	80	-65	-81,3
CELKEM	-3638	547		POHLED ZÁKAZNÍKA ✓

Stav zajištění vybavení, nástrojů a zařízení				
Plánovaný termín	14.7.21	Ověřený podíl zajištěnosti	Aktualizováno dne	15.12.20
Smluvní termín	15.12.20		Aktualizoval	[Redacted]

Stav zajištění materiálu				
Plánovaný termín	14.7.21	Ověřený podíl zajištěnosti	Aktualizováno dne	15.12.2020
Smluvní termín	10.12.20		Aktualizoval	[Redacted]

Fáze	Činnost	SP	Odpovědnost	Počátek	Termín	Splněno	Zaplánováno
2.0 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU							
2.01	DFMEA						
2.02	Posouzení technologičnosti návrhu						
2.03	Ověřování návrhu						
2.04	Přezkoumání návrhu						
2.05	Výroba prototypu, prototypový kontrolní plán						
2.06	Technické výkresy, 3D data						
2.07	Technické specifikace						
2.08	Materiálové specifikace						
2.09	Požadavky na nové vybavení, nástroje a zař.	C1	[Redacted]	18.9.20	17.12.20	✓ 20.5.20	✓
2.10	Zvláštní znaky produktu a procesu	S3	[Redacted]	18.9.20	27.12.20	✓ 15.6.20	✓
2.11	Požadavky na měřidla a zkušební zařízení						
Přezkoumání fáze vedením		C1	[Redacted]	27.12.20	11.2.21	✓ 19.7.20	✓
3.0 NÁVRH A VÝVOJ PROCESU							
3.01	Normy a specifikace pro balení	C1	[Redacted]	14.2.21	10.3.21	✓ 20.8.20	✓
3.02	Vývojový diagram procesu	S3	[Redacted]	14.2.21	14.4.21	✓ 20.7.20	✓
3.03	Plán uspořádání výrobních prostorů						
3.04	Maticе znaků						
3.05	PFMEA	S3	[Redacted]	14.4.21	16.5.21	✓ 20.7.20	✓
3.06	Plán kontroly a řízení pro ověřovací série	S3	[Redacted]	16.5.21	1.6.21	✓ 20.7.20	✓
3.07	Instrukce pro proces	S3	[Redacted]	1.6.21	14.7.21	✓ 21.7.20	✓
Přezkoumání fáze vedením		C1	[Redacted]	14.7.21	9.9.21	✓ 17.2.21	✓
4.0 VALIDACE PRODUKTU A PROCESU							
4.01	Významná výrobní dávka	C4	[Redacted]	12.9.21	24.10.21	✓ 23.3.21	✓
4.02	MSA	S3	[Redacted]	24.10.21	25.11.21	✓ 22.7.20	✓
4.03	Studie předběžné způsobilosti procesu						
4.04	Schvalování dílů do sériové výroby	S3	[Redacted]	25.11.21	28.11.21	✓ 27.9.21	✓
4.05	Hodnocení balení	C3	[Redacted]	28.11.21	29.11.21	✓ 1.12.20	✓
4.06	Plán kontroly a řízení pro výrobu	S3	[Redacted]	29.11.21	30.11.21	✓ 2.6.21	✓
Přezkoumání fáze vedením		C1	[Redacted]	30.11.21	1.12.21	✓ 27.9.21	✓
5.0 ZPĚTNÁ VAZBA, HODNOCENÍ A NÁPRÁVNÁ OPATŘENÍ							
5.01	Snížená variabilita/Předpis prod. auditu	S3	[Redacted]	1.12.21	9.2.22	✓ 4.12.21	✓
5.02	Spokojenost zákazníka	S3	[Redacted]	1.12.21	30.5.22		✓
5.03	Dodávání a servis						
	Záznam historie dílu	S3	[Redacted]			11.10.21	✓

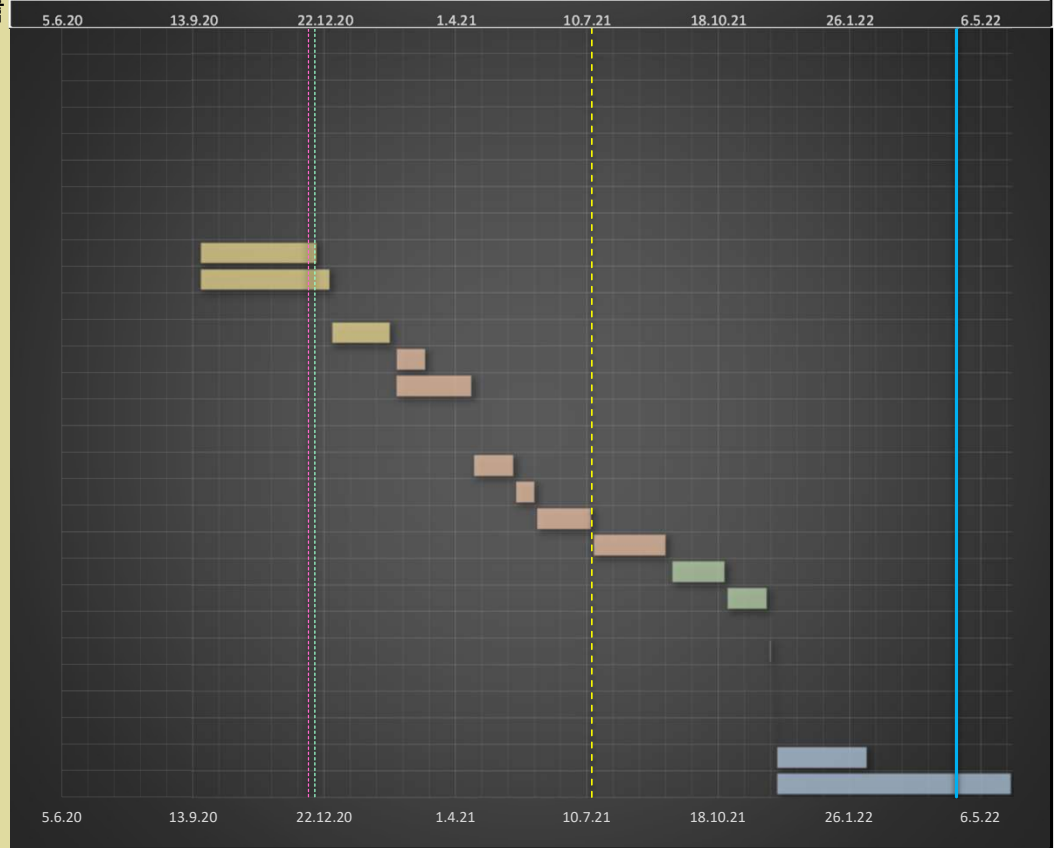

#	Popis problému/Hodnocení	Zachytil	Dne	Opatření	Číslo	Odpovědnost	Termín	Splněno
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
