


Projektový plán bowlingového turnaje

Autor: Zuzana Uhlířová
 Vedoucí práce: Ing. Petr Fanta Ph.D.
 Akademický rok: 2023 - 2024
 Škola: ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií
 Studijní program: Ekonomika a Management



**MASARYKŮV ÚSTAV
 VYŠŠÍCH STUDIÍ
 ČVUT V PRAZE**

Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem. Cílem práce je vypracovat projektový plán bowlingového turnaje, podle kterého bude zrealizován turnaj v září 2024. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody projektového řízení jako WBS, časové plánování, rozpočet projektu a analýza zainteresovaných stran a rizik. V praktické části jsou tyto metody využity pro vytvoření projektového plánu bowlingového turnaje.

Abstract

This bachelor thesis deals with project management. The aim of the thesis is to develop a project plan for a bowling tournament, according to which the tournament will be implemented in September 2024. The theoretical part describes the basic concepts and methods of project management such as WBS, time planning, project budget and stakeholder and risk analysis. In the practical part, these methods are used to develop a project plan for the bowling tournament.

Cíl projektu

Realizace třetího ročníku turnaje "Špagát cup" pojatého jako neoficiálního mistrovství ČR na provázkových stavěcích pro hráče všech úrovní.


Struktura práce

- Zakládací listina
- WBS
- Tabulka aktivit a závislostí
- Síťový graf a CPM
- Ganttův diagram
- Zdroje projektu
- Projektový tým
- Matice odpovědnosti
- Analýza zainteresovaných stran
- Rozpočet
- Analýza rizik

Tabulka aktivit a závislostí

Balík práce	Název aktivit	Index	Doba trvání	Předcházející	Následující
1. CENY	Výběr a objednání pohárů	1.	5	15	24
	Nakoupení věcných cen	2.	2	24	16
	Příprava pohárů a cen na vyhlášení vítězů	3.	3	24	16
	Předání pohárů, věcných a finančních cen vítězům	4.	0,5	19	21
2.1. FOTOGRAFIE	Vytvoření fotek	5.	6	19	21
	Nahrání fotek na webové stránky	6.	3	28	-----
2.2. PROPAGACE	Vytvoření pozvámek na turnaj	7.	5	11	8,9
	Sdílení pozvámek na sociálních sítích	8.	10	7	14
3. UBYTOVÁNÍ	Rozeslání osobních pozvámek špičkovým hráčům	9.	10	7	14
	Obvolání hotelů	10.	15	14	1
	Zarezerování pokojů	11.	3	10	7
4.1. REGISTRACE HRÁČŮ	Potvrzení přesného počtu pokojů	12.	1	24	16
	Předání informací hráčům o hotelích	13.	2	16	17
	Vytvoření registračního formuláře na webových stránkách	14.	10	8,9	15
	Spuštění rezervací	15.	1	14	1
4.2. PROGRAM TURNAJE	Ukončení rezervací	16.	1	26, 12, 2, 3	13
	Stažení seznamu hráčů	17.	1	13	19
	Vytvoření programu turnaje	18.	15	30, 31	10
4.3. VÝSLEDKY	Zahájení programu	19.	1	17	20, 5, 4, 22, 25, 27
	Kontrola průběhu programu	20.	6	19	21
5. OBČERSTVENÍ	Ukončení programu	21.	1	20, 5, 4, 22, 25, 27	28
	Zapisování výsledků	22.	6	19	21
6. PROSTOR	Nahrání výsledků na webové stránky	23.	3	28	-----
	Výběr a objednání občerstvení	24.	5	1	26, 12, 2, 3
	Servírování občerstvení	25.	1	19	21
	Revize bowlingového centra před turnajem	26.	10	24	16
	Mazání drah před každou rundou	27.	6	19	21
	Úklid centra po turnaji	28.	1	21	6, 23
	Zarezerování bowlingových hrah	29.	5	-----	30, 31
	Domluvení uzavřené společnosti na den vyhlášení	30.	3	29	18
	Domluvení otevření bowlingového centra před otevřací dobou	31.	5	29	18

WBS

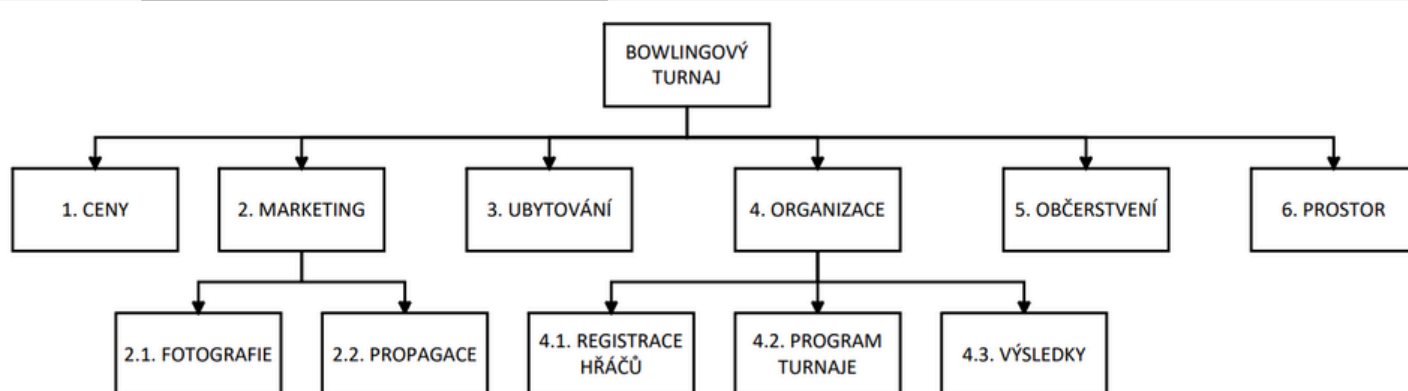

Závěr

Cíl bakalářské práce byl splněn. Byli využity nástroje projektového řízení pomocí nichž byl vytvořen projektový plán bowlingového turnaje, který se bude konat v září 2024.

Síťový graf

