ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

Obsah

4.1 Podklady pro časoprostorový graf

4.2 Porovnání časoprostorových grafů

4.3 Graf nasazení pracovníků, strojů, spotřeba materiálu – varianta č.1

4.4 Graf nasazení pracovníků, strojů, spotřeba materiálu – varianta č.2

4.5 Ganttův diagram – varianta č.1

4.6 Ganttův diagram – varianta č.2

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4.1 PODKLADY PRO ČASOPROSTOROVÝ GRAF

POMOCNÝ ČASOPROSTOROVÝ GRAF
OBJEKT A12

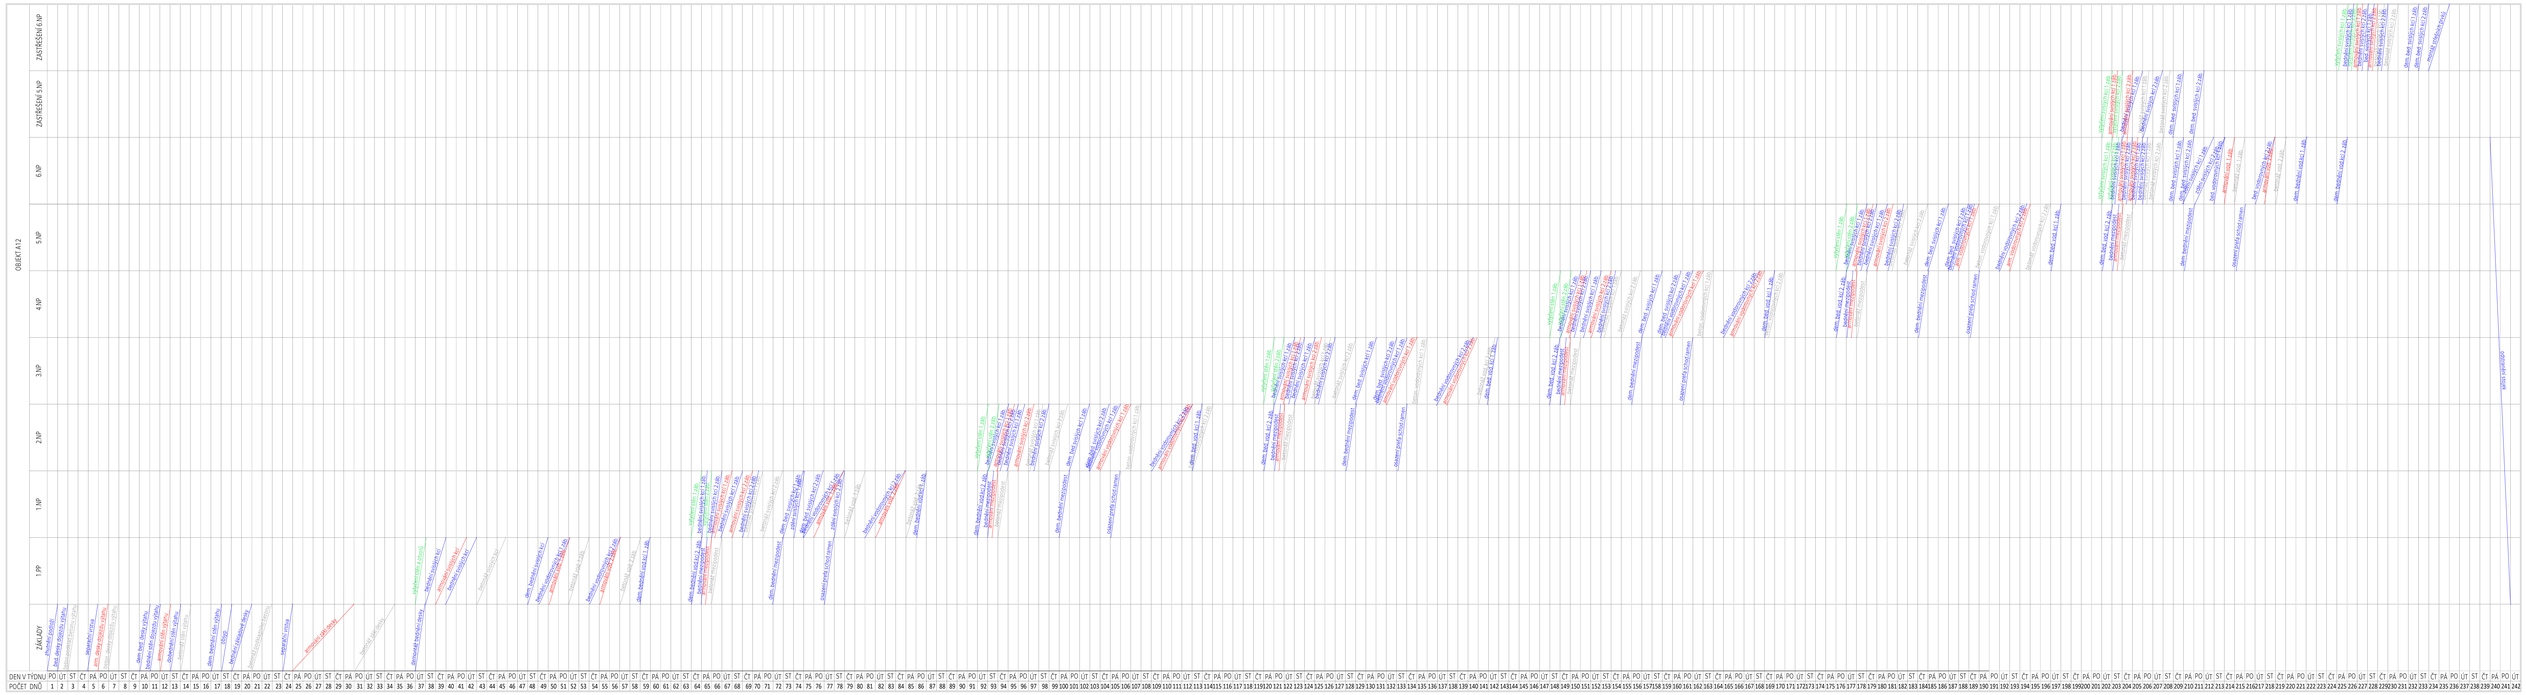

POMOCNÝ ČASOPROSTOROVÝ GRAF
OBJEKT A34

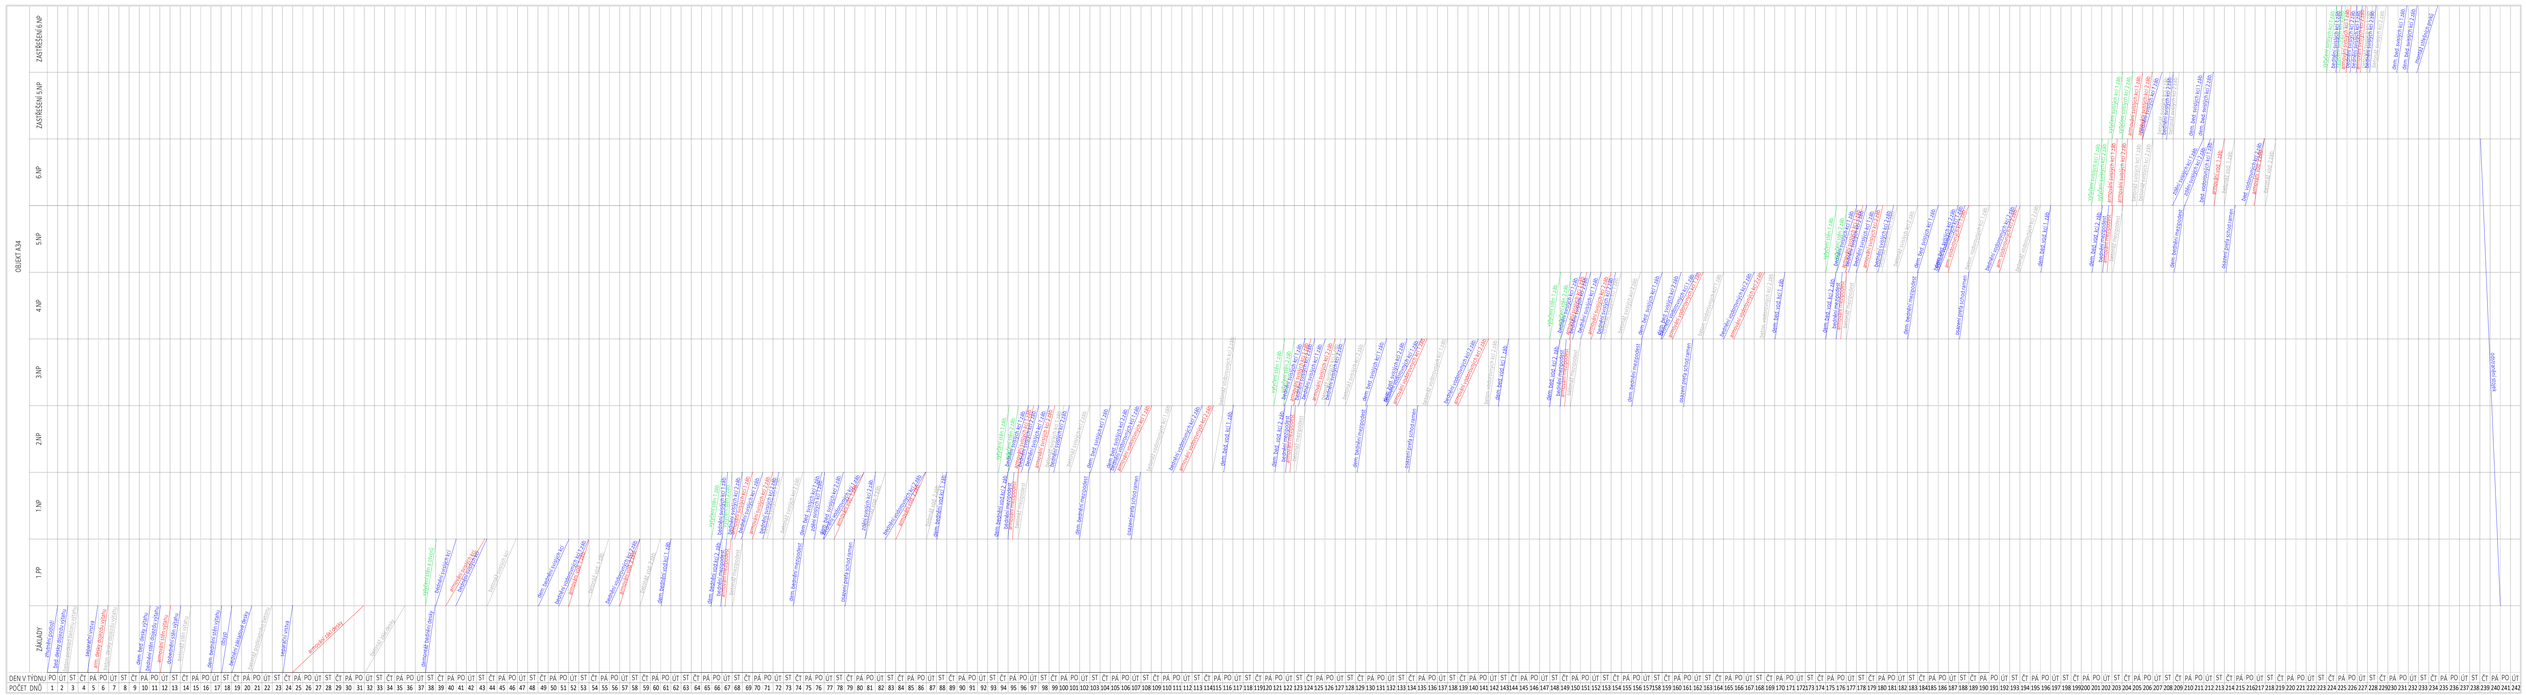

LEGENDA

- BETONÁŘI
- ELEKTRIKÁŘI
- GEODETI
- OBSLUHA STROJE
- STAVEBNÍ DĚLNÍCI
- VAZAČI VÝZTUŽE
- STAVBYVEDOUCÍ

ZKRATKY

arm.	ARMOVÁNÍ
bed.	BEDNĚNÍ
dem. bed.	DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ
beton.	BETONÁŽ
vod.	VODOROVNÝ
zab.	ZABĚR

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA
L	K122 TECHNOLOGIE STAVEB	ALENA KRÁLOVÁ
ROČNÍK	VEDOUCÍ PRÁCE	AKADEMICKÝ ROK
4.	Ing. VÁCLAV POSPÍCHAL, Ph.D.	2021/2022 (LS)

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

PROJEKT:
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

STAVBA:
KOTI HYACINT ABC

OBSAH: **PODKLADY PRO ČASOPROSTOROVÝ GRAF OBJEKT A12, A34**

FORMÁT	18x A4
MĚŘÍTKO	-
DATUM	10.5.2022
Č. VÝKRESU	4.1.01

POMOCNÝ ČASOPROSTOROVÝ GRAF
OBJEKT B

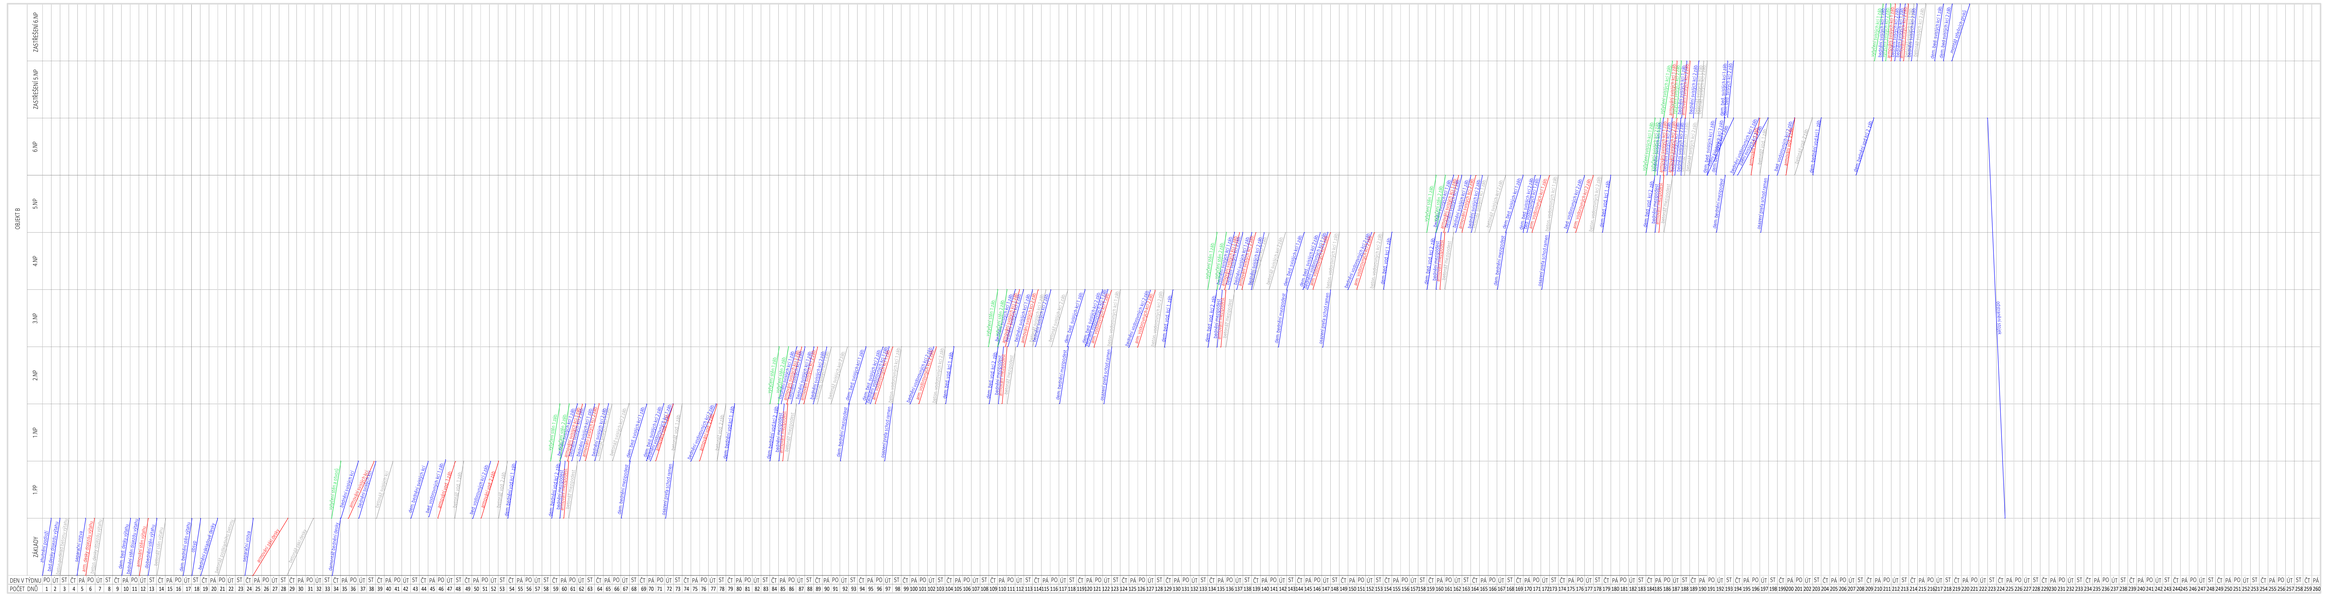

POMOCNÝ ČASOPROSTOROVÝ GRAF
OBJEKT C

LEGENDA

- BETONÁŘI
- ELEKTRIKÁŘI
- GEODETI
- OBSLUHA STROJE
- STAVEBNÍ DĚLNÍCI
- VAZAČI VÝZTUŽI
- STAVBYVEDOUCÍ

ZKRATKY

arm.	ARMOVÁNÍ
bed.	BEDNĚNÍ
dem. bed.	DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ
beton.	BETONÁŽ
vod.	VODOROVNÝ
záb.	ZÁBĚR

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
1	K122 TECHNOLOGIE STAVEB	ALENA KRÁLOVÁ	
ROČNÍK	VEDOUCÍ PRÁCE	AKADEMICKÝ ROK	
4.	Ing. VÁCLAV POSPÍCHAL, Ph.D.	2021/2022 (LS)	

PROJEKT:
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

STAVBA:	KOTI HYACINT ABC	FORMÁT	21x A4
		MĚŘÍTKO	-
OBSAH:	PODKLADY PRO ČASOPROSTOROVÝ GRAF OBJEKT B, C	DATUM	10.5.2022
		Č. VÝKRESU	4.1.02

POMOCNÉ ČASOPROSTOROVÉ GRAFY

PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE

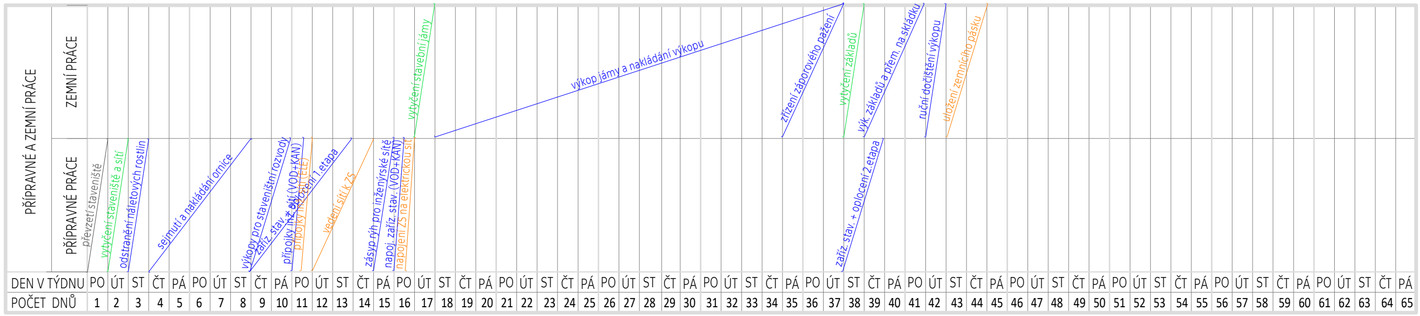

GARÁŽE

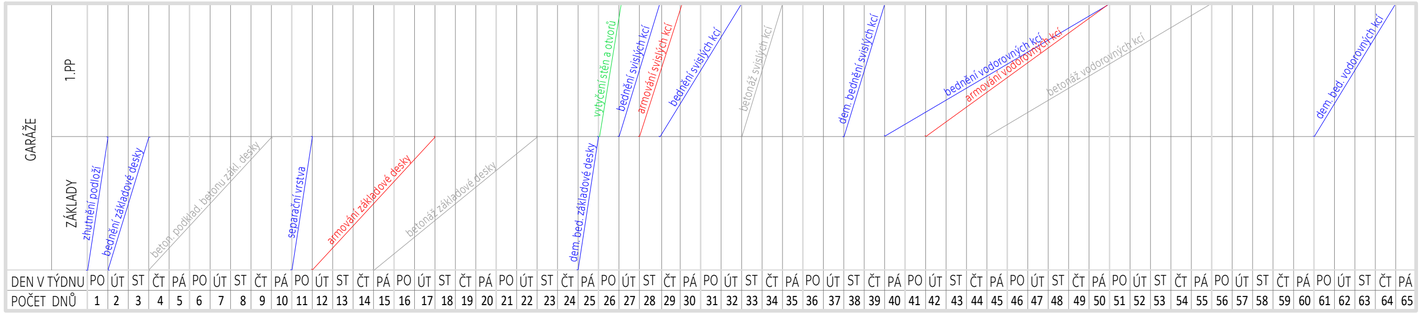

RAMPA

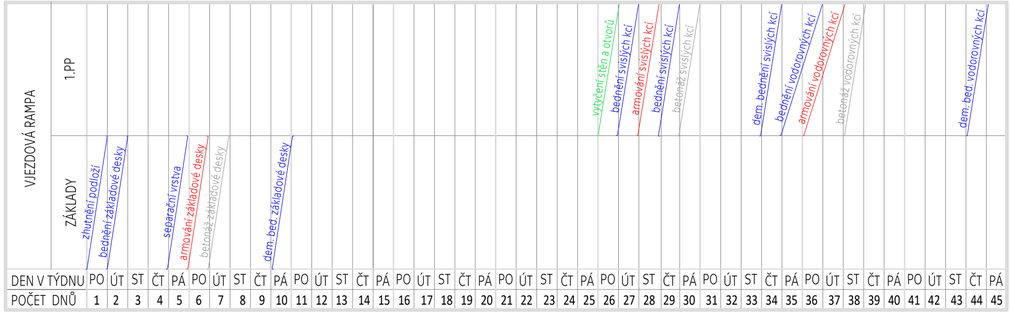

LEGENDA

- BETONÁŘI
- ELEKTRIKÁŘI
- GEODETI
- OBSLUHA STROJE
- STAVEBNÍ DĚLNÍCI
- VAZAČI VÝZTUŽE
- STAVBYVEDOUCÍ

ZKRATKY

arm.	ARMOVÁNÍ
bed.	BEDNĚNÍ
dem. bed.	DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ
beton.	BETONÁŽ
vod.	VODOROVNÝ
záb.	ZÁBĚR

OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA
L	K122 TECHNOLOGIE STAVEB	ALENA KRÁLOVÁ
ROČNÍK	VEDOUCÍ PRÁCE	AKADEMICKÝ ROK
4.	Ing. VÁCLAV POSPÍCHAL, Ph.D.	2021/2022 (LS)

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

PROJEKT:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

STAVBA:
KOTI HYACINT ABC

OBSAH : **PODKLADY PRO ČASOPROSTOROVÝ GRAF**
PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE, OBJEKT GARÁŽÍ, VJEZD. RAMPA

FORMÁT	3x A4
MĚŘÍTKO	-
DATUM	10.5.2022
Č. VÝKRESU	4.1.03

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4.2 POROVNÁNÍ ČASOPROSTOROVÝCH GRAFŮ

VARIANTA VÝSTAVBY Č.2

ZEMNÍ PRÁCE
ZÁKLADY
OBJEKT A
OBJEKT C
OBJEKT F
OBJEKT G
OBJEKT H
OBJEKT AC
OBJEKT AD
OBJEKT AE
DEN
MĚSÍC
DATUM
ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ LMP
ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ LMP
ZAHÁJENÍ/DOKONČENÍ LMP

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4.3 GRAF NASAZENÍ ZDROJŮ - VARIANTA Č.1

NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ
VARIANTA 1

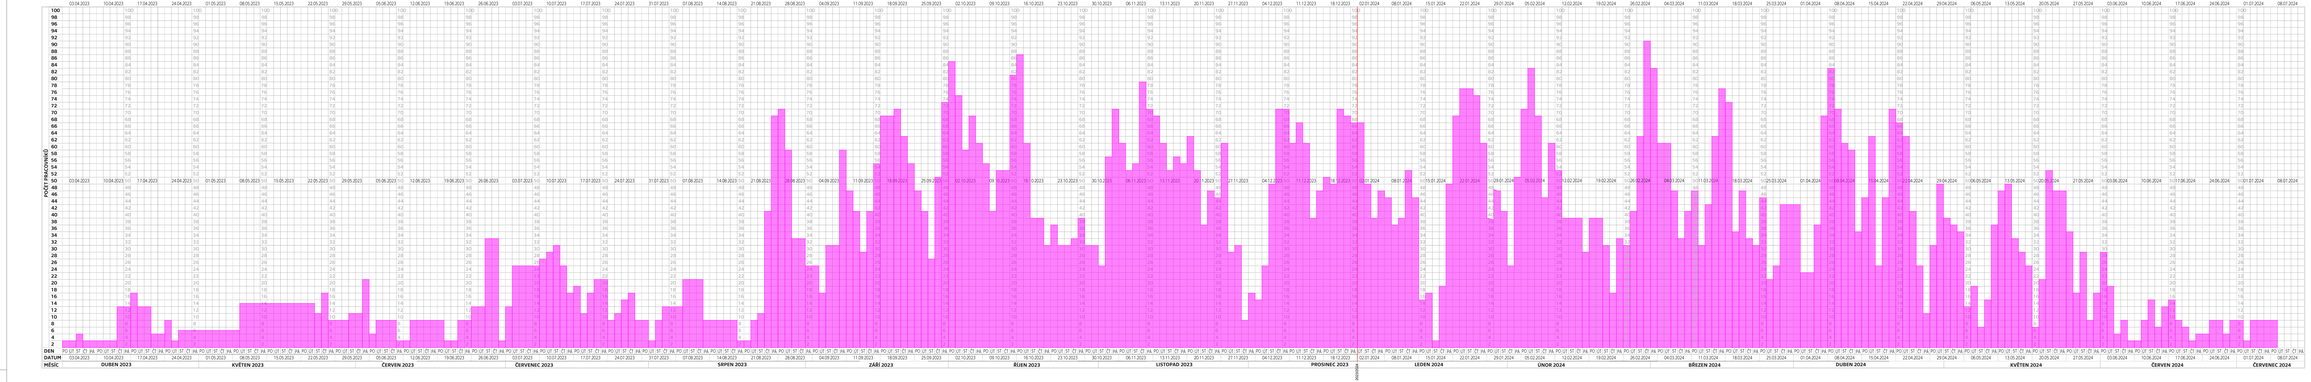

VYUŽITÍ MECHANIZACE
VARIANTA 1



SPOTŘEBA MATERIÁLU - BETON
VARIANTA 1



SPOTŘEBA MATERIÁLU - VÝZTUŽ
VARIANTA 1



SPOTŘEBA MATERIÁLU - ZDIVO
VARIANTA 1



OBOR	KATEDRA	JMÉNO STUDENTA	FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE
L	K122 TECHNOLOGIE STAVEB	ALENA KRÁLOVÁ	
ROČNÍK	VEDOUCÍ PRÁCE	AKADEMICKÝ ROK	
4.	Ing. VÁCLAV POSPÍŠIL, Ph.D.	2021/2022 LS	

MATI

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

STAVBA		FORMÁT	27x 84
KOTI HYACINT ABC		MĚŘÍTKO	1:200
OBSAH		DATUM	10.5.2022
VARIANTA 1 - NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ, NASAZENÍ STROJŮ, SPOTŘEBA MATERIÁLU		Č. VÝKR.	4.3

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4.4 GRAF NASAZENÍ ZDROJŮ - VARIANTA Č.2

NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ
VARIANTA 2



VYUŽITÍ MECHANIZACE
VARIANTA 2



SPOTŘEBA MATERIÁLU - BETON
VARIANTA 2



SPOTŘEBA MATERIÁLU - VÝZTUŽ
VARIANTA 2



SPOTŘEBA MATERIÁLU - ZDIVO
VARIANTA 2



ŠKOLA	VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA	VEDOUCÍ VÝZKUMNÉHO ÚKOLU	FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV PROJEKTOVÁNÍ
AUTOR	DAVID KOBLÍŽEK	OPONENT PRÁCE	
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. VÁCLAV PAŘÍZEK, Ph.D.	DATUM ZADÁNÍ	2021-2022 LS
NÁZEV	**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE** **STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT**		
STUPEŇ			
PŘEDMĚT	PROJEKT PRÁCE		
VARIANTA	VARIANTA 2 - NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ, NASAZENÍ STROJŮ, SPOTŘEBA MATERIÁLU		

FORMÁT	A3
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	12.4.2022
PODPIS	
STRANA	A3

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4.5 GANTTŮV DIAGRAM
- VARIANTA Č.1

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
1		**HRUBÁ STAVBA KOTI HYACINT**	**325 dny**	**03.04. 23**	**08.07. 24**		
2		**Přípravné práce ABC**	**39 dny**	**03.04. 23**	**25.05. 23**		
3		převzetí staveniště	1 den	03.04. 23	03.04. 23		4
4		vytyčení staveniště a sítí	1 den	04.04. 23	04.04. 23	3	5
5		odstranění náletových rostlin	1 den	05.04. 23	05.04. 23	4	6
6		sejmutí ornice a uložení na mezideponii	5 dny	06.04. 23	12.04. 23	5	7;9
7		zařízení staveniště včetně oplocení 1.etapa	5 dny	13.04. 23	19.04. 23	6	
8		zařízení staveniště 2.etapa (po výkopu jámy)	2 dny	24.05. 23	25.05. 23	18	
9		výkopy pro staveništní rozvody	2 dny	13.04. 23	14.04. 23	6	10;11
10		přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)	1 den	17.04. 23	17.04. 23	9	12;13
11		přípojky inženýrských sítí (elektro)	1 den	17.04. 23	17.04. 23	9	12;13
12		vedení sítí v zemi k staveništnímu zařízení (VOD, ELE)	3 dny	18.04. 23	20.04. 23	10;11	13
13		zásyp rýh pro inženýrské sítě	1 den	21.04. 23	21.04. 23	10;11;12	14;15
14		napojení zařízení staveniště (vodovod, kanalizace)	1 den	24.04. 23	24.04. 23	13	17
15		napojení zařízení staveniště (elektro)	1 den	24.04. 23	24.04. 23	13	17
16		**Zemní práce ABC**	**28 dny**	**25.04. 23**	**01.06. 23**		
17		vytyčení stavební jámy	1 den	25.04. 23	25.04. 23	15;14	18
18		výkop jámy a nakládání výkopu	20 dny	26.04. 23	23.05. 23	17	19FF;8
19		zřízení záporového pažení	11 dny	09.05. 23	23.05. 23	18FF	20
20		vytyčení základů	1 den	24.05. 23	24.05. 23	19	21
21		výkop základů a přesmítění výkopku na skládku	3 dny	25.05. 23	29.05. 23	20	22
22		ruční dočištění výkopu na základovou spáru/ruční začištění jámy/r	1 den	30.05. 23	30.05. 23	21	23;747;495;274;51
23		uložení zemnícího pásku	2 dny	31.05. 23	01.06. 23	22	25
24		**Zřízení věžového jeřábu**	**35 dny**	**02.06. 23**	**20.07. 23**		
25		armování základů pod jeřáby	1 den	02.06. 23	02.06. 23	23	26
26		betonáž základů pod jeřáby	1 den	05.06. 23	05.06. 23	25	
27		zřízení věžového jeřábu 1	1 den	19.07. 23	19.07. 23	68;764;291;512	28
28		zřízení věžového jeřábu 2	1 den	20.07. 23	20.07. 23	27	72;295;516;972
29		**RAMPA DO GARÁŽÍ**	**44 dny**	**19.07. 23**	**18.09. 23**		
30		**Základy**	**10 dny**	**19.07. 23**	**01.08. 23**		
31		zhutnění podloží	1 den	19.07. 23	19.07. 23	970SS	32
32		bednění základové desky	1 den	20.07. 23	20.07. 23	31	33
33		betonáž podkladního betonu	1 den	21.07. 23	21.07. 23	32	34FS+1 den
34		separační vrstva	1 den	25.07. 23	25.07. 23	33FS+1 den	35
35		armování základové desky	1 den	26.07. 23	26.07. 23	34	36
36		betonáž základové desky	1 den	27.07. 23	27.07. 23	35	37FS+2 dny
37		demontáž bednění základové desky	1 den	01.08. 23	01.08. 23	36FS+2 dny	71;294;515;767;39;978
38		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**19 dny**	**23.08. 23**	**18.09. 23**		
39		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	976;37	40
40		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	1 den	24.08. 23	24.08. 23	39	41SS+1 den
41		armování svislých nosných konstrukcí	1 den	25.08. 23	25.08. 23	40SS+1 den	42SS+1 den
42		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	1 den	28.08. 23	28.08. 23	41SS+1 den	43
43		betonáž svislých nosných konstrukcí	1 den	29.08. 23	29.08. 23	42	44FS+3 dny
44		demontáž bednění svislých konstrukcí	1 den	04.09. 23	04.09. 23	43FS+3 dny	45
45		bednění vodorovných konstrukcí, stojky	2 dny	05.09. 23	06.09. 23	44	46SS+1 den
46		armování vodorovných konstrukcí	2 dny	06.09. 23	07.09. 23	45SS+1 den	47
47		betonáž vodorovných konstrukcí	1 den	08.09. 23	08.09. 23	46	48FS+5 dny
48		demontáž bednění vodorovných konstrukcí, přestojkování	1 den	18.09. 23	18.09. 23	47FS+5 dny	990
49		**OBJEKT A12**	**265 dny**	**31.05. 23**	**12.06. 24**		
50		**Základy**	**37 dny**	**31.05. 23**	**20.07. 23**		
51		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	52
52		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	51	53
53		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	52	54FS+1 den
54		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	53FS+1 den	55
55		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	54	56
56		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	55	57FS+2 dny
57		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	56FS+2 dny	58
58		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	57	59
59		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	58	60
60		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	59	61
61		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	60	62FS+2 dny
62		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	61FS+2 dny	63
63		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	62	64
64		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	63	65
65		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	64	66FS+1 den
66		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	65FS+1 den	67
67		armování základové desky	6 dny	04.07. 23	11.07. 23	66	68
68		betonáž základové desky	4 dny	12.07. 23	17.07. 23	67	69FS+2 dny;970;27
69		demontáž bednění základové desky	1 den	20.07. 23	20.07. 23	68FS+2 dny	71SS
70		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**41 dny**	**23.08. 23**	**18.10. 23**		
71		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	69SS;976;37	72
72		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	71;28	73SS+1 den
73		armování svislých nosných konstrukcí	3 dny	25.08. 23	29.08. 23	72SS+1 den	74SS+1 den
74		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	3 dny	28.08. 23	30.08. 23	73SS+1 den	75
75		betonáž svislých nosných konstrukcí	3 dny	31.08. 23	04.09. 23	74	76FS+2 dny
76		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	07.09. 23	08.09. 23	75FS+2 dny	77SS+1 den;767FS+5 dny
77		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	08.09. 23	12.09. 23	76SS+1 den	78SS+1 den;79
78		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.09. 23	12.09. 23	77SS+1 den	79
79		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.09. 23	14.09. 23	77;78	80FS+5 dny;81SS+2 dny
80		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	22.09. 23	22.09. 23	79FS+5 dny	
81		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	15.09. 23	19.09. 23	79SS+2 dny	82SS+1 den;83
82		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	18.09. 23	19.09. 23	81SS+1 den	83
83		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	20.09. 23	21.09. 23	81;82	84FS+5 dny
84		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	29.09. 23	29.09. 23	83FS+5 dny	85;91SS;98SS
85		bednění mezipodesty, stojky	1 den	02.10. 23	02.10. 23	84	86SS;87
86		armování mezipodesty	1 den	02.10. 23	02.10. 23	85SS	87
87		betonáž mezipodesty	1 den	03.10. 23	03.10. 23	85;86	88FS+5 dny;89FS+10 dny
88		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	11.10. 23	11.10. 23	87FS+5 dny	
89		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	18.10. 23	18.10. 23	87FS+10 dny	
90		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**42 dny**	**29.09. 23**	**27.11. 23**		

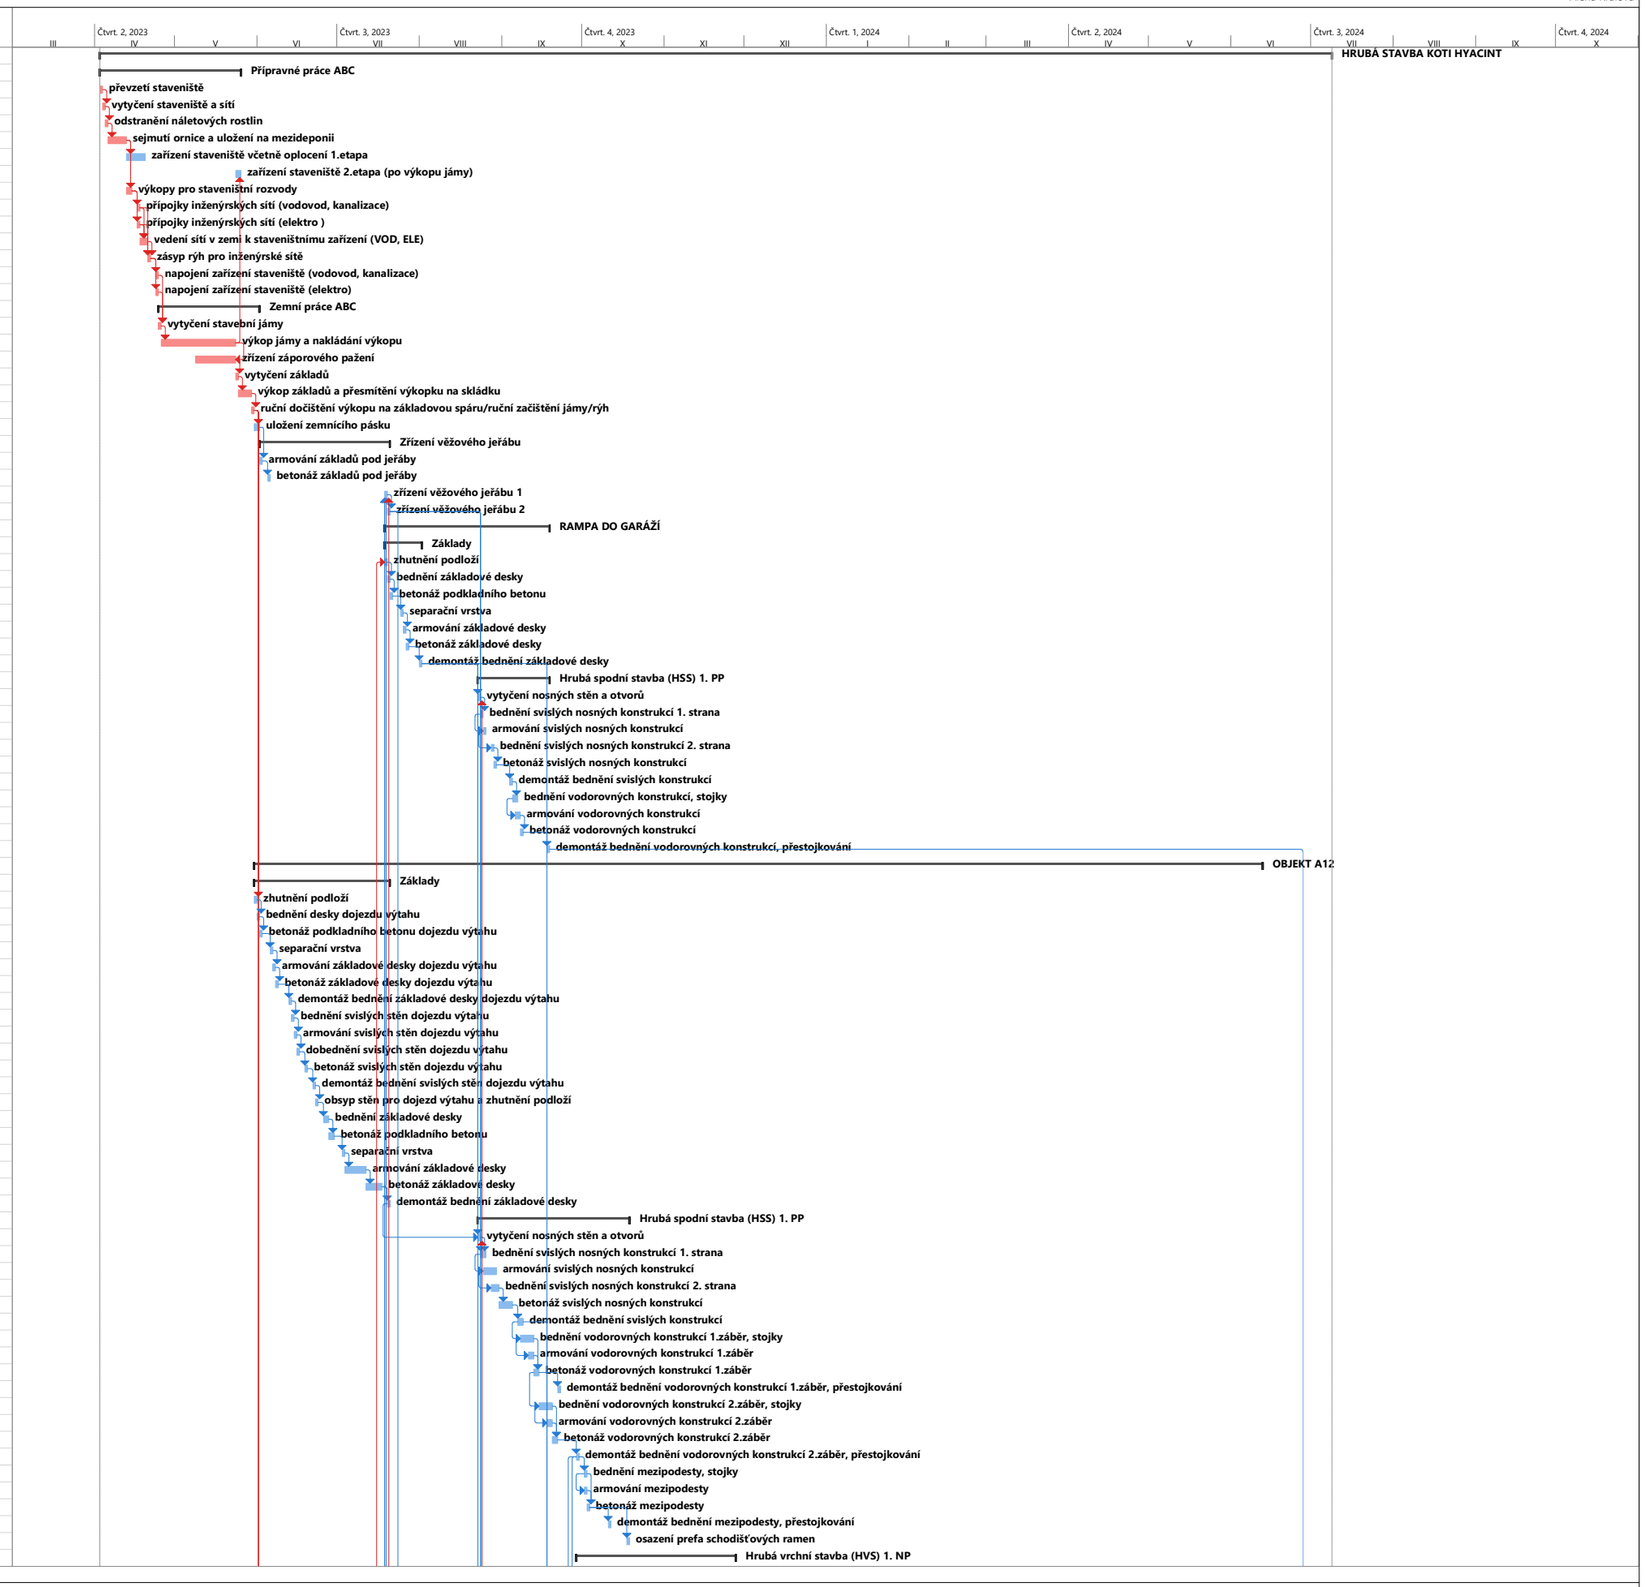

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
91		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	29.09. 23	29.09. 23	84SS	92;98
92		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	02.10. 23	02.10. 23	91	93SS+1 den
93		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	03.10. 23	04.10. 23	92SS+1 den	94SS+1 den;100
94		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	93SS+1 den	95
95		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	94	96FS+2 dny
96		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.10. 23	13.10. 23	95FS+2 dny	97SS+1 den
97		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	13.10. 23	13.10. 23	96SS+1 den	105
98		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	02.10. 23	02.10. 23	84SS;91	99
99		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	03.10. 23	03.10. 23	98	100SS+1 den
100		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.10. 23	06.10. 23	93;99SS+1 den	101SS+1 den
101		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	100SS+1 den	102
102		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.10. 23	11.10. 23	101	103FS+2 dny
103		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	16.10. 23	17.10. 23	102FS+2 dny	104FS+1 den;109
104		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.10. 23	19.10. 23	103FS+1 den	
105		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	16.10. 23	19.10. 23	97	106SS+1 den;107
106		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	17.10. 23	19.10. 23	105SS+1 den	107
107		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.10. 23	23.10. 23	105;106	108FS+5 dny;109SS+2 dny
108		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	31.10. 23	31.10. 23	107FS+5 dny	
109		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	24.10. 23	27.10. 23	103;107SS+2 dny	110SS+1 den;111
110		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	25.10. 23	27.10. 23	109SS+1 den	111
111		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.10. 23	31.10. 23	109;110	112FS+5 dny
112		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	08.11. 23	08.11. 23	111FS+5 dny	113;125SS;119SS
113		bednění mezipodesty, stojky	1 den	09.11. 23	09.11. 23	112	114SS;115
114		armování mezipodesty	1 den	09.11. 23	09.11. 23	113SS	115
115		betonáž mezipodesty	1 den	10.11. 23	10.11. 23	113;114	116FS+5 dny;117FS+10 dny
116		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	20.11. 23	20.11. 23	115FS+5 dny	
117		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	27.11. 23	27.11. 23	115FS+10 dny	
118		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**42 dny**	**08.11. 23**	**12.01. 24**		
119		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	08.11. 23	08.11. 23	112SS	120;125
120		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	09.11. 23	10.11. 23	119	121SS+1 den
121		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	120SS+1 den	122SS+1 den;127
122		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	13.11. 23	14.11. 23	121SS+1 den	123
123		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.11. 23	16.11. 23	122	124FS+2 dny;129
124		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	21.11. 23	22.11. 23	123FS+2 dny	131
125		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	09.11. 23	09.11. 23	112SS;119	126
126		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	125	127SS+1 den
127		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.11. 23	15.11. 23	121;126SS+1 den	128SS+1 den
128		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	15.11. 23	16.11. 23	127SS+1 den	129
129		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	17.11. 23	20.11. 23	123;128	130FS+2 dny
130		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	23.11. 23	24.11. 23	129FS+2 dny	135
131		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	23.11. 23	27.11. 23	124	132SS+1 den;133
132		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	24.11. 23	28.11. 23	131SS+1 den	133
133		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	29.11. 23	29.11. 23	131;132	134FS+5 dny;135SS+2 dny
134		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	07.12. 23	07.12. 23	133FS+5 dny	
135		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	01.12. 23	06.12. 23	130;133SS+2 dny	136SS+1 den;137
136		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	04.12. 23	06.12. 23	135SS+1 den	137
137		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.12. 23	08.12. 23	135;136	138FS+5 dny
138		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	18.12. 23	18.12. 23	137FS+5 dny	139;151SS;145SS
139		bednění mezipodesty, stojky	1 den	19.12. 23	19.12. 23	138	140SS;141
140		armování mezipodesty	1 den	19.12. 23	19.12. 23	139SS	141
141		betonáž mezipodesty	1 den	20.12. 23	20.12. 23	139;140	142FS+5 dny;143FS+10 dny
142		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	05.01. 24	05.01. 24	141FS+5 dny	
143		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	12.01. 24	12.01. 24	141FS+10 dny	
144		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**42 dny**	**18.12. 23**	**21.02. 24**		
145		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	18.12. 23	18.12. 23	138SS	146;151
146		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	19.12. 23	20.12. 23	145	147SS+1 den
147		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.12. 23	21.12. 23	146SS+1 den	148SS+1 den;153
148		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	21.12. 23	22.12. 23	147SS+1 den	149
149		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.01. 24	03.01. 24	148	150FS+2 dny
150		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.01. 24	09.01. 24	149FS+2 dny	157
151		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	19.12. 23	19.12. 23	138SS;145	152
152		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	20.12. 23	21.12. 23	151	153SS+1 den
153		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.12. 23	02.01. 24	147;152SS+1 den	154SS+1 den
154		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	02.01. 24	03.01. 24	153SS+1 den	155
155		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.01. 24	05.01. 24	154	156FS+2 dny
156		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.01. 24	11.01. 24	155FS+2 dny	161
157		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	10.01. 24	12.01. 24	150	158SS+1 den;159
158		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	11.01. 24	15.01. 24	157SS+1 den	159
159		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	16.01. 24	16.01. 24	157;158	160FS+5 dny;161SS+2 dny
160		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	24.01. 24	24.01. 24	159FS+5 dny	
161		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	18.01. 24	23.01. 24	156;159SS+2 dny	162SS+1 den;163
162		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	19.01. 24	23.01. 24	161SS+1 den	163
163		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.01. 24	25.01. 24	161;162	164FS+5 dny
164		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	02.02. 24	02.02. 24	163FS+5 dny	165;177SS;171SS
165		bednění mezipodesty, stojky	1 den	05.02. 24	05.02. 24	164	166SS;167
166		armování mezipodesty	1 den	05.02. 24	05.02. 24	165SS	167
167		betonáž mezipodesty	1 den	06.02. 24	06.02. 24	165;166	168FS+5 dny;169FS+10 dny
168		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	14.02. 24	14.02. 24	167FS+5 dny	
169		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	21.02. 24	21.02. 24	167FS+10 dny	
170		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**42 dny**	**02.02. 24**	**01.04. 24**		
171		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	02.02. 24	02.02. 24	164SS	172;177
172		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	05.02. 24	06.02. 24	171	173SS+1 den
173		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.02. 24	07.02. 24	172SS+1 den	174SS+1 den;179
174		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	07.02. 24	08.02. 24	173SS+1 den	175
175		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	174	176FS+2 dny
176		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.02. 24	16.02. 24	175FS+2 dny	183
177		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	05.02. 24	05.02. 24	164SS;171	178
178		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	06.02. 24	07.02. 24	177	179SS+1 den
179		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.02. 24	09.02. 24	173;178SS+1 den	180SS+1 den
180		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	179SS+1 den	181

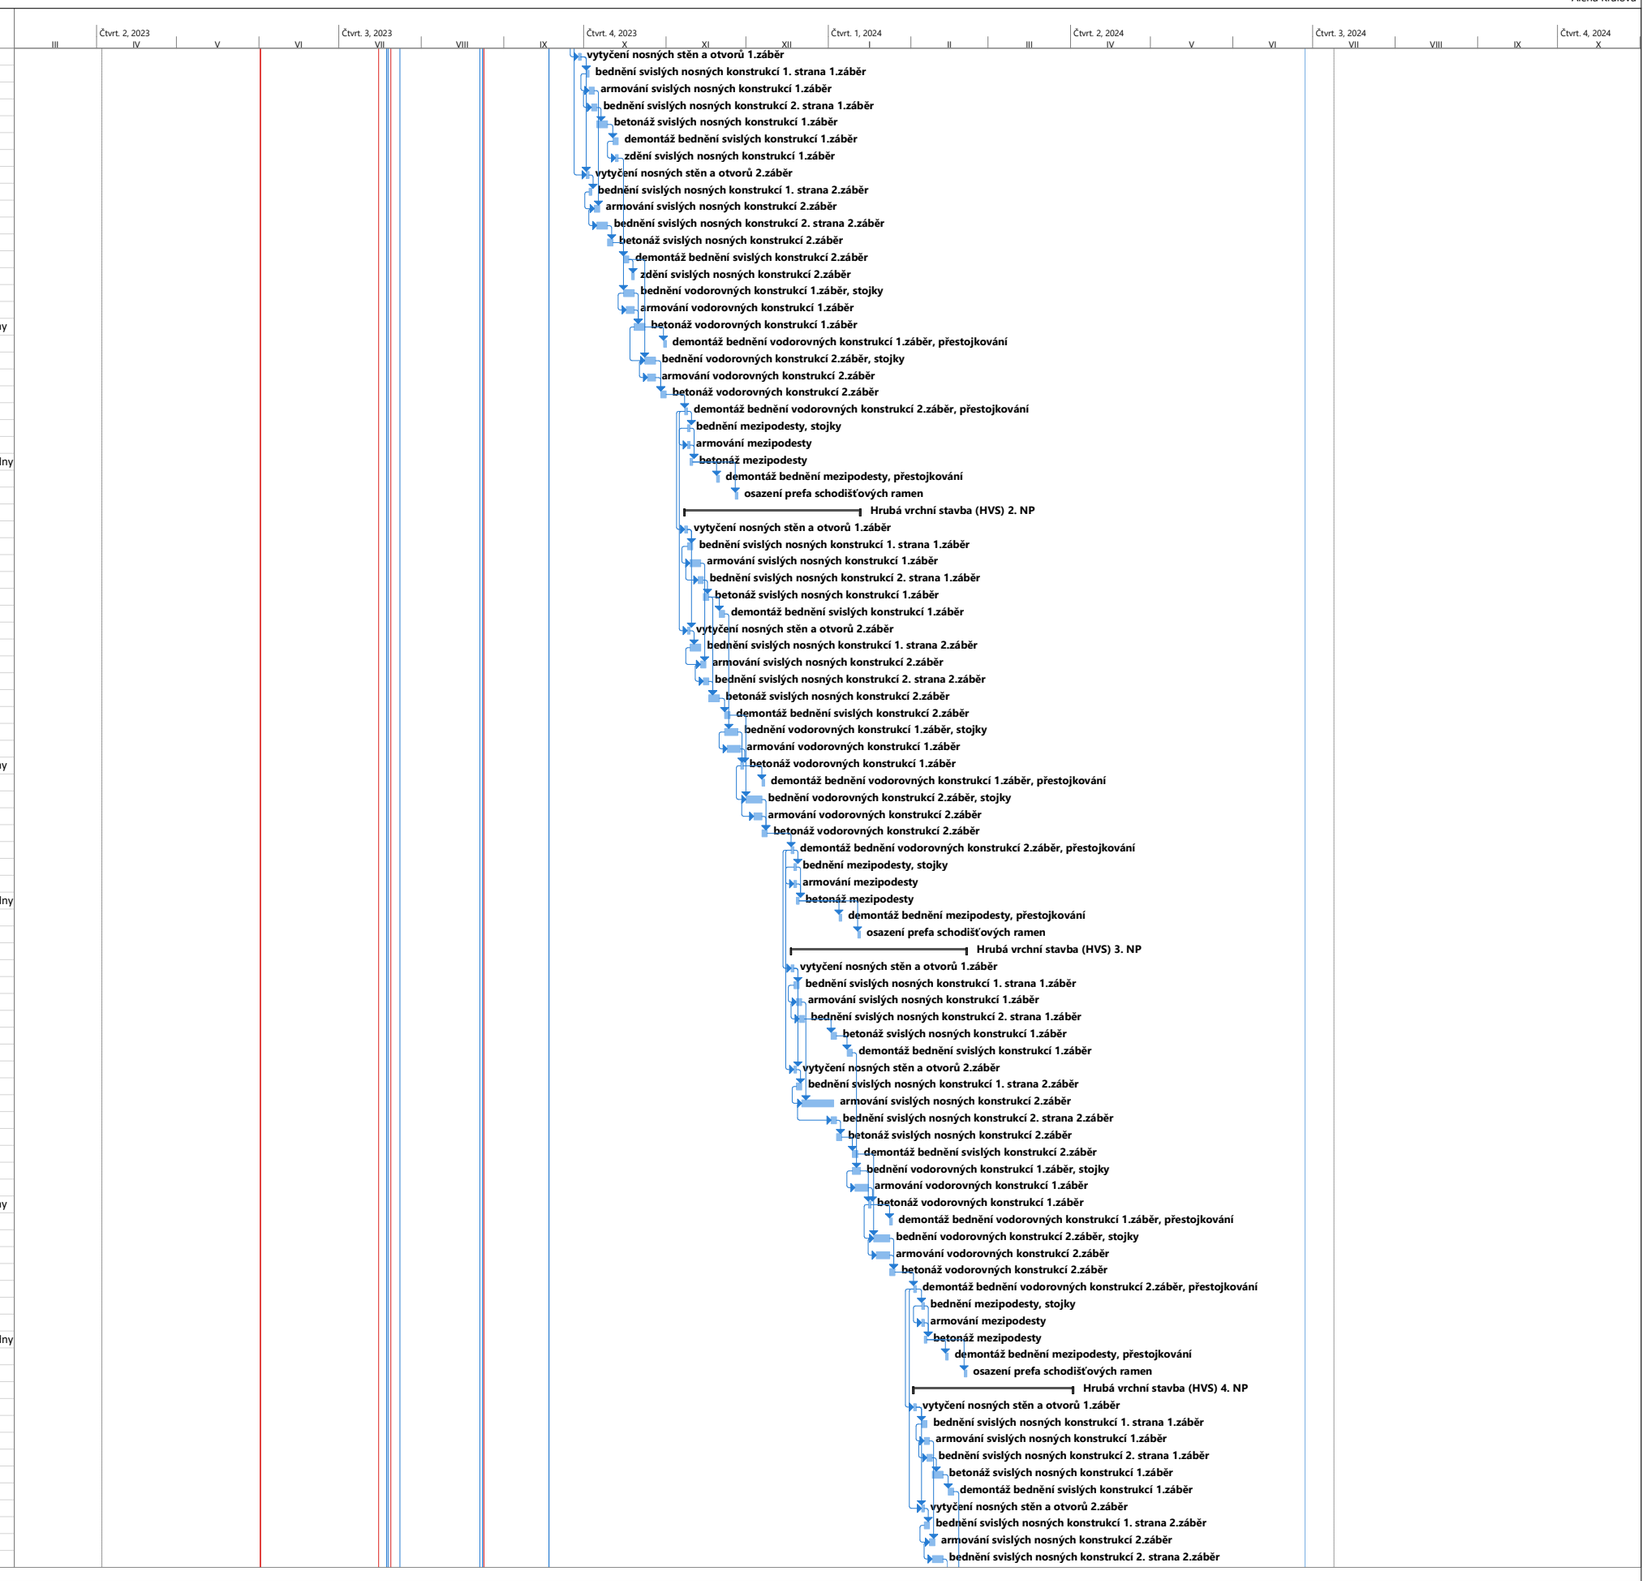

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
181		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.02. 24	14.02. 24	180	182FS+2 dny
182		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.02. 24	20.02. 24	181FS+2 dny	187
183		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	19.02. 24	21.02. 24	176	184SS+1 den;185
184		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	20.02. 24	22.02. 24	183SS+1 den	185
185		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	23.02. 24	23.02. 24	183;184	186FS+5 dny;187SS+2 dny
186		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	04.03. 24	04.03. 24	185FS+5 dny	
187		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	27.02. 24	01.03. 24	182;185SS+2 dny	188SS+1 den;189
188		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	28.02. 24	01.03. 24	187SS+1 den	189
189		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.03. 24	05.03. 24	187;188	190FS+5 dny
190		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	13.03. 24	13.03. 24	189FS+5 dny	191;203SS;197SS
191		bednění mezipodesty, stojky	1 den	14.03. 24	14.03. 24	190	192SS;193
192		armování mezipodesty	1 den	14.03. 24	14.03. 24	191SS	193
193		betonáž mezipodesty	1 den	15.03. 24	15.03. 24	191;192	194FS+5 dny;195FS+10 dny
194		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	25.03. 24	25.03. 24	193FS+5 dny	
195		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	01.04. 24	01.04. 24	193FS+10 dny	
196		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**40 dny**	**13.03. 24**	**07.05. 24**		
197		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	13.03. 24	13.03. 24	190SS	198;203
198		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	14.03. 24	15.03. 24	197	199SS+1 den
199		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	198SS+1 den	200SS+1 den;205
200		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	18.03. 24	19.03. 24	199SS+1 den	201
201		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.03. 24	21.03. 24	200	202FS+2 dny
202		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.03. 24	27.03. 24	201FS+2 dny	209
203		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	14.03. 24	14.03. 24	190SS;197	204
204		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	203	205SS+1 den
205		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.03. 24	20.03. 24	199;204SS+1 den	206SS+1 den
206		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	20.03. 24	21.03. 24	205SS+1 den	207
207		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.03. 24	25.03. 24	206	208FS+2 dny
208		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	28.03. 24	29.03. 24	207FS+2 dny	213
209		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	28.03. 24	01.04. 24	202	210SS+1 den;211
210		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.03. 24	01.04. 24	209SS+1 den	211
211		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.04. 24	03.04. 24	209;210	212FS+5 dny;213SS+2 dny
212		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	11.04. 24	11.04. 24	211FS+5 dny	
213		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	04.04. 24	08.04. 24	208;211SS+2 dny	214SS+1 den;215
214		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.04. 24	08.04. 24	213SS+1 den	215
215		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	09.04. 24	10.04. 24	213;214	216FS+5 dny
216		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	18.04. 24	18.04. 24	215FS+5 dny	217;230SS;223SS
217		bednění mezipodesty, stojky	1 den	19.04. 24	19.04. 24	216	218SS;219
218		armování mezipodesty	1 den	19.04. 24	19.04. 24	217SS	219
219		betonáž mezipodesty	1 den	22.04. 24	22.04. 24	217;218	220FS+5 dny;221FS+10 dny
220		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	30.04. 24	30.04. 24	219FS+5 dny	
221		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	07.05. 24	07.05. 24	219FS+10 dny	
222		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**24 dny**	**18.04. 24**	**21.05. 24**		
223		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	18.04. 24	18.04. 24	216SS	224;230;246SS
224		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	223	225SS+1 den
225		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	22.04. 24	22.04. 24	224SS+1 den	226SS+1 den
226		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	23.04. 24	23.04. 24	225SS+1 den	227
227		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	24.04. 24	24.04. 24	226	228FS+2 dny
228		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	29.04. 24	29.04. 24	227FS+2 dny	229SS+1 den
229		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	3 dny	30.04. 24	02.05. 24	228SS+1 den	237
230		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	216SS;223	231;251SS
231		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	22.04. 24	22.04. 24	230	232SS+1 den
232		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	23.04. 24	23.04. 24	231SS+1 den	233SS+1 den
233		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	24.04. 24	24.04. 24	232SS+1 den	234
234		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	25.04. 24	25.04. 24	233	235FS+2 dny
235		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	30.04. 24	30.04. 24	234FS+2 dny	236SS+1 den;241
236		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	3 dny	01.05. 24	03.05. 24	235SS+1 den	
237		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	1 den	03.05. 24	03.05. 24	229	238SS+1 den;239
238		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	06.05. 24	06.05. 24	237SS+1 den	239
239		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	07.05. 24	07.05. 24	237;238	240FS+5 dny;241SS+2 dny
240		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	15.05. 24	15.05. 24	239FS+5 dny	
241		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	09.05. 24	10.05. 24	235;239SS+2 dny	242SS+1 den;243
242		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	10.05. 24	10.05. 24	241SS+1 den	243
243		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	241;242	244FS+5 dny;271FS+20 dny
244		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	21.05. 24	21.05. 24	243FS+5 dny	263;257SS
245		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**10 dny**	**18.04. 24**	**01.05. 24**		
246		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	18.04. 24	18.04. 24	223SS	247
247		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	246	248
248		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.04. 24	23.04. 24	247	249;253
249		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	24.04. 24	24.04. 24	248	250FS+2 dny
250		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	29.04. 24	29.04. 24	249FS+2 dny	
251		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	230SS	252
252		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	22.04. 24	22.04. 24	251	253
253		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.04. 24	25.04. 24	248;252	254
254		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	26.04. 24	26.04. 24	253	255FS+2 dny
255		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	01.05. 24	01.05. 24	254FS+2 dny	
256		**Zastřešení nad 6.NP**	**11 dny**	**21.05. 24**	**04.06. 24**		
257		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	21.05. 24	21.05. 24	244SS	258
258		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	257	259
259		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	23.05. 24	23.05. 24	258	260
260		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	24.05. 24	24.05. 24	259	261
261		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	27.05. 24	27.05. 24	260	262FS+2 dny
262		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	30.05. 24	30.05. 24	261FS+2 dny	
263		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	244	264
264		bednění svislých konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	23.05. 24	23.05. 24	263	265
265		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	24.05. 24	24.05. 24	264	266
266		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	27.05. 24	27.05. 24	265	267
267		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	28.05. 24	28.05. 24	266	268FS+2 dny
268		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	31.05. 24	31.05. 24	267FS+2 dny	269
269		montáž střešních prvků	2 dny	03.06. 24	04.06. 24	268	990
270		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**11.06. 24**	**12.06. 24**		

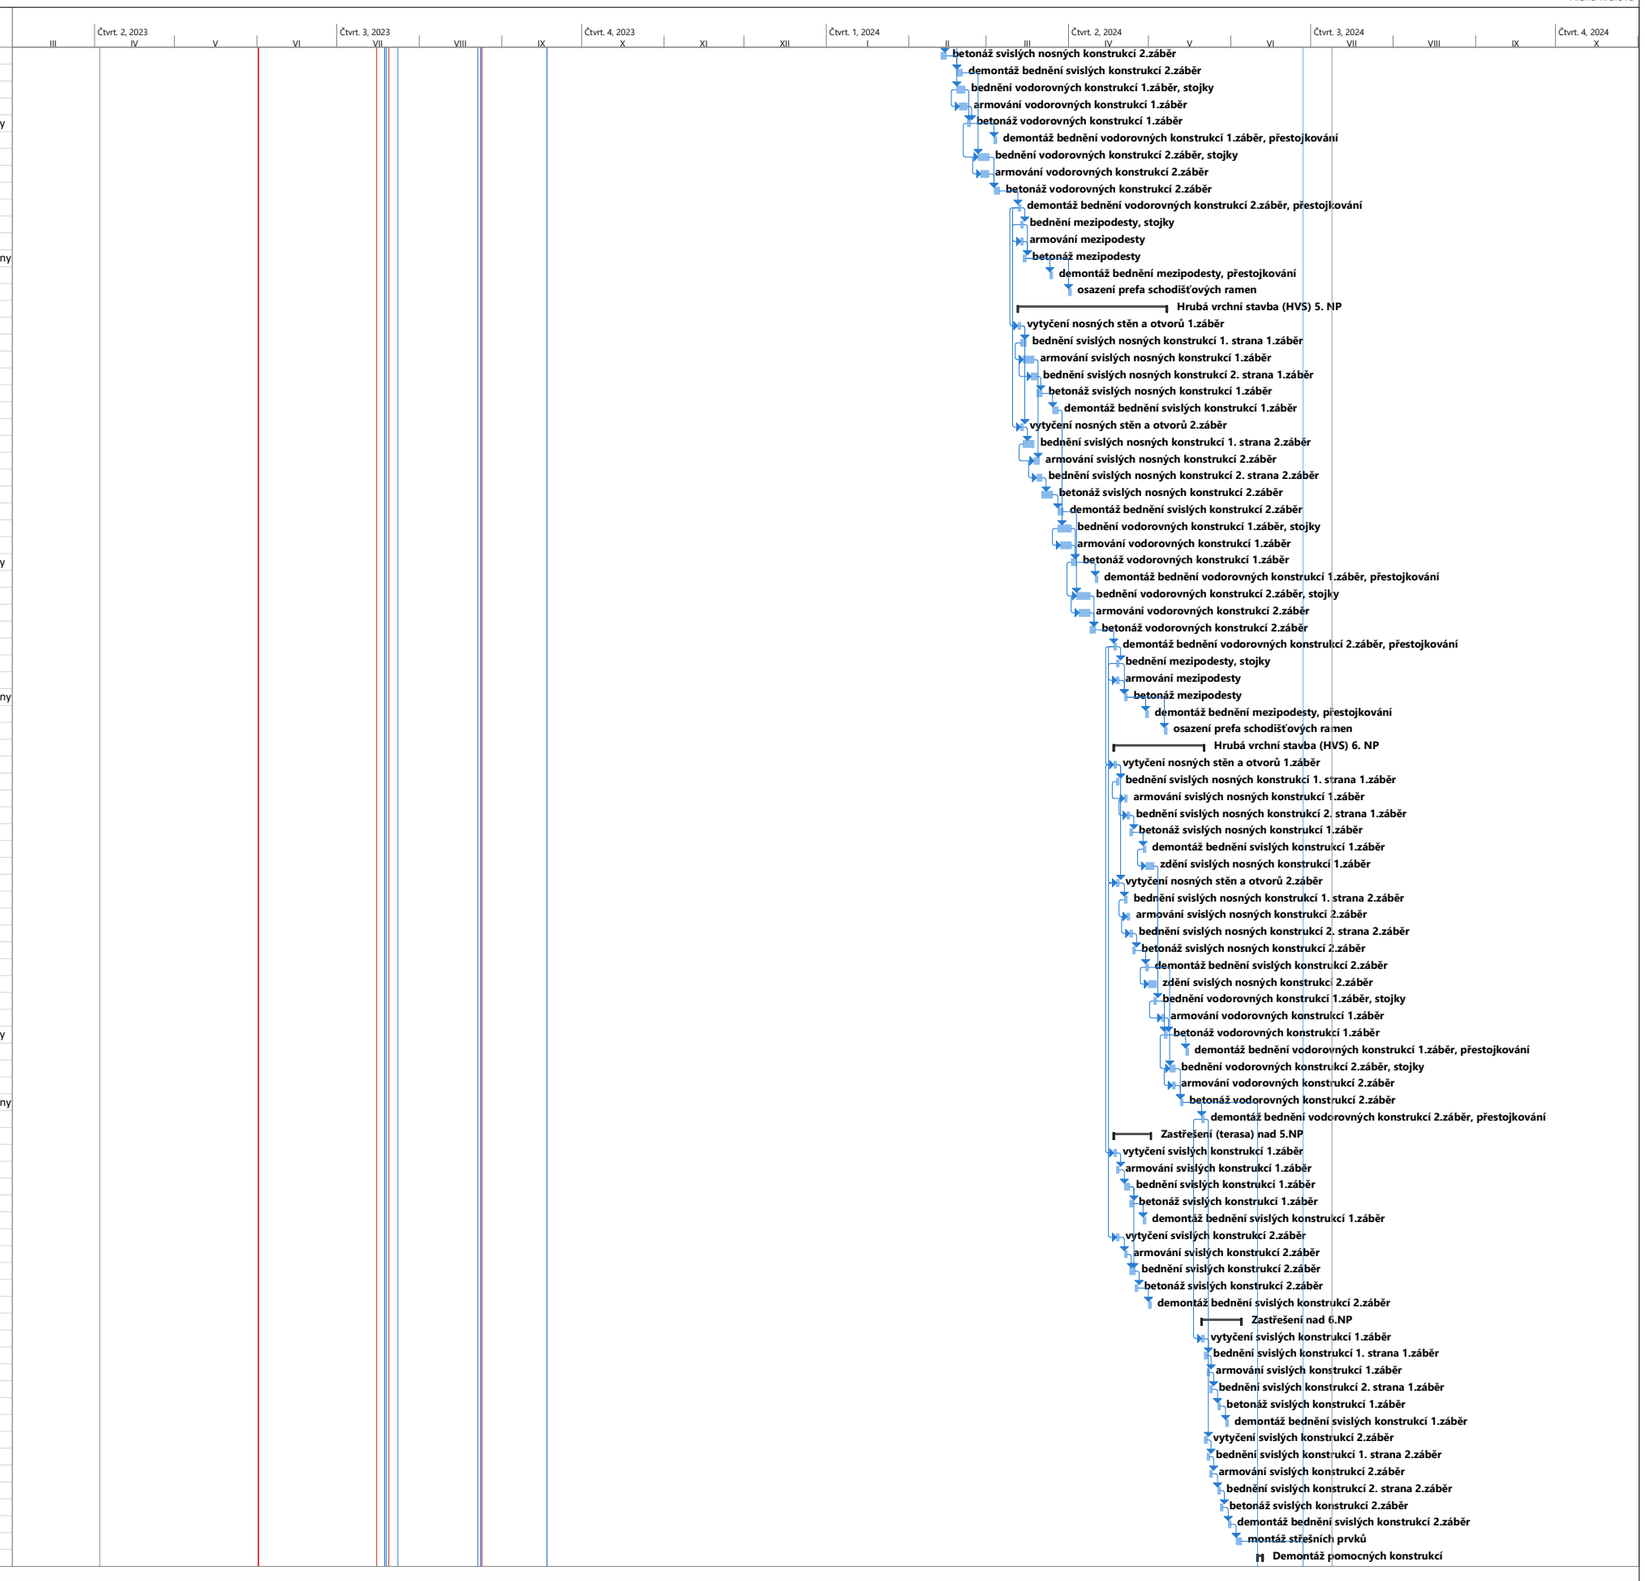

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
271		odstranění stojek	2 dny	11.06. 24	12.06. 24	243FS+20 dny	
272		**OBJEKT B**	**251 dny**	**31.05. 23**	**23.05. 24**		
273		**Základy**	**34 dny**	**31.05. 23**	**17.07. 23**		
274		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	275
275		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	274	276
276		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	275	277FS+1 den
277		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	276FS+1 den	278
278		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	277	279
279		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	278	280FS+2 dny
280		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	279FS+2 dny	281
281		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	280	282
282		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	281	283
283		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	282	284
284		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	283	285FS+2 dny
285		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	284FS+2 dny	286
286		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	285	287
287		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	286	288
288		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	287	289FS+1 den
289		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	288FS+1 den	290
290		armování základové desky	4 dny	04.07. 23	07.07. 23	289	291
291		betonáž základové desky	3 dny	10.07. 23	12.07. 23	290	292FS+2 dny;970;27
292		demontáž bednění základové desky	1 den	17.07. 23	17.07. 23	291FS+2 dny	294SS
293		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**39 dny**	**23.08. 23**	**16.10. 23**		
294		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	292SS;976;37	295
295		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	294;28	296SS+1 den
296		armování svislých nosných konstrukcí	3 dny	25.08. 23	29.08. 23	295SS+1 den	297SS+1 den
297		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	2 dny	28.08. 23	29.08. 23	296SS+1 den	298
298		betonáž svislých nosných konstrukcí	2 dny	30.08. 23	31.08. 23	297	299FS+2 dny
299		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	05.09. 23	06.09. 23	298FS+2 dny	300
300		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	07.09. 23	08.09. 23	299	301SS+1 den;302
301		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.09. 23	11.09. 23	300SS+1 den	302
302		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	12.09. 23	12.09. 23	300;301	303FS+5 dny;304SS+2 dny
303		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	20.09. 23	20.09. 23	302FS+5 dny	
304		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	14.09. 23	15.09. 23	302SS+2 dny	305SS+1 den;306
305		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.09. 23	18.09. 23	304SS+1 den	306
306		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.09. 23	19.09. 23	304;305	307FS+5 dny
307		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	27.09. 23	27.09. 23	306FS+5 dny	308;314SS;320SS
308		bednění mezipodesty, stojky	1 den	28.09. 23	28.09. 23	307	309SS;310
309		armování mezipodesty	1 den	28.09. 23	28.09. 23	308SS	310
310		betonáž mezipodesty	1 den	29.09. 23	29.09. 23	308;309	311FS+5 dny;312FS+10 dny
311		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	09.10. 23	09.10. 23	310FS+5 dny	
312		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	16.10. 23	16.10. 23	310FS+10 dny	
313		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**39 dny**	**27.09. 23**	**20.11. 23**		
314		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	27.09. 23	27.09. 23	307SS	315;320
315		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	28.09. 23	29.09. 23	314	316SS+1 den
316		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.09. 23	02.10. 23	315SS+1 den	317SS+1 den;322
317		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	02.10. 23	03.10. 23	316SS+1 den	318
318		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	317	319FS+2 dny
319		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	10.10. 23	11.10. 23	318FS+2 dny	326
320		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	28.09. 23	28.09. 23	307SS;314	321
321		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	29.09. 23	02.10. 23	320	322SS+1 den
322		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	03.10. 23	04.10. 23	316;321SS+1 den	323SS+1 den
323		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	322SS+1 den	324
324		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	323	325FS+2 dny
325		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.10. 23	13.10. 23	324FS+2 dny	330
326		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	12.10. 23	16.10. 23	319	327SS+1 den;328
327		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.10. 23	16.10. 23	326SS+1 den	328SS+1 den
328		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	17.10. 23	17.10. 23	326;327SS+1 den	329FS+5 dny;330SS+2 dny
329		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	25.10. 23	25.10. 23	328FS+5 dny	
330		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	19.10. 23	23.10. 23	325;328SS+2 dny	331SS+1 den;332
331		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	20.10. 23	23.10. 23	330SS+1 den	332
332		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	24.10. 23	24.10. 23	330;331	333FS+5 dny
333		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	01.11. 23	01.11. 23	332FS+5 dny	334;346SS;340SS
334		bednění mezipodesty, stojky	1 den	02.11. 23	02.11. 23	333	335SS;336
335		armování mezipodesty	1 den	02.11. 23	02.11. 23	334SS	336
336		betonáž mezipodesty	1 den	03.11. 23	03.11. 23	334;335	337FS+5 dny;338FS+10 dny
337		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	13.11. 23	13.11. 23	336FS+5 dny	
338		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	20.11. 23	20.11. 23	336FS+10 dny	
339		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**39 dny**	**01.11. 23**	**02.01. 24**		
340		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	01.11. 23	01.11. 23	333SS	341;346
341		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	02.11. 23	03.11. 23	340	342SS+1 den
342		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	03.11. 23	06.11. 23	341SS+1 den	343SS+1 den;348
343		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	06.11. 23	07.11. 23	342SS+1 den	344
344		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.11. 23	09.11. 23	343	345FS+2 dny
345		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	14.11. 23	15.11. 23	344FS+2 dny	352
346		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	02.11. 23	02.11. 23	333SS;340	347
347		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	03.11. 23	06.11. 23	346	348SS+1 den
348		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.11. 23	08.11. 23	342;347SS+1 den	349SS+1 den
349		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	08.11. 23	09.11. 23	348SS+1 den	350
350		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	349	351FS+2 dny
351		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	16.11. 23	17.11. 23	350FS+2 dny	356
352		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	16.11. 23	20.11. 23	345	353SS+1 den;354
353		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	17.11. 23	20.11. 23	352SS+1 den	354
354		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	21.11. 23	21.11. 23	352;353	355FS+5 dny;356SS+2 dny
355		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	29.11. 23	29.11. 23	354FS+5 dny	
356		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	23.11. 23	27.11. 23	351;354SS+2 dny	357SS+1 den;358
357		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.11. 23	27.11. 23	356SS+1 den	358
358		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	28.11. 23	28.11. 23	356;357	359FS+5 dny
359		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	06.12. 23	06.12. 23	358FS+5 dny	360;372SS;366SS
360		bednění mezipodesty, stojky	1 den	07.12. 23	07.12. 23	359	361SS;362

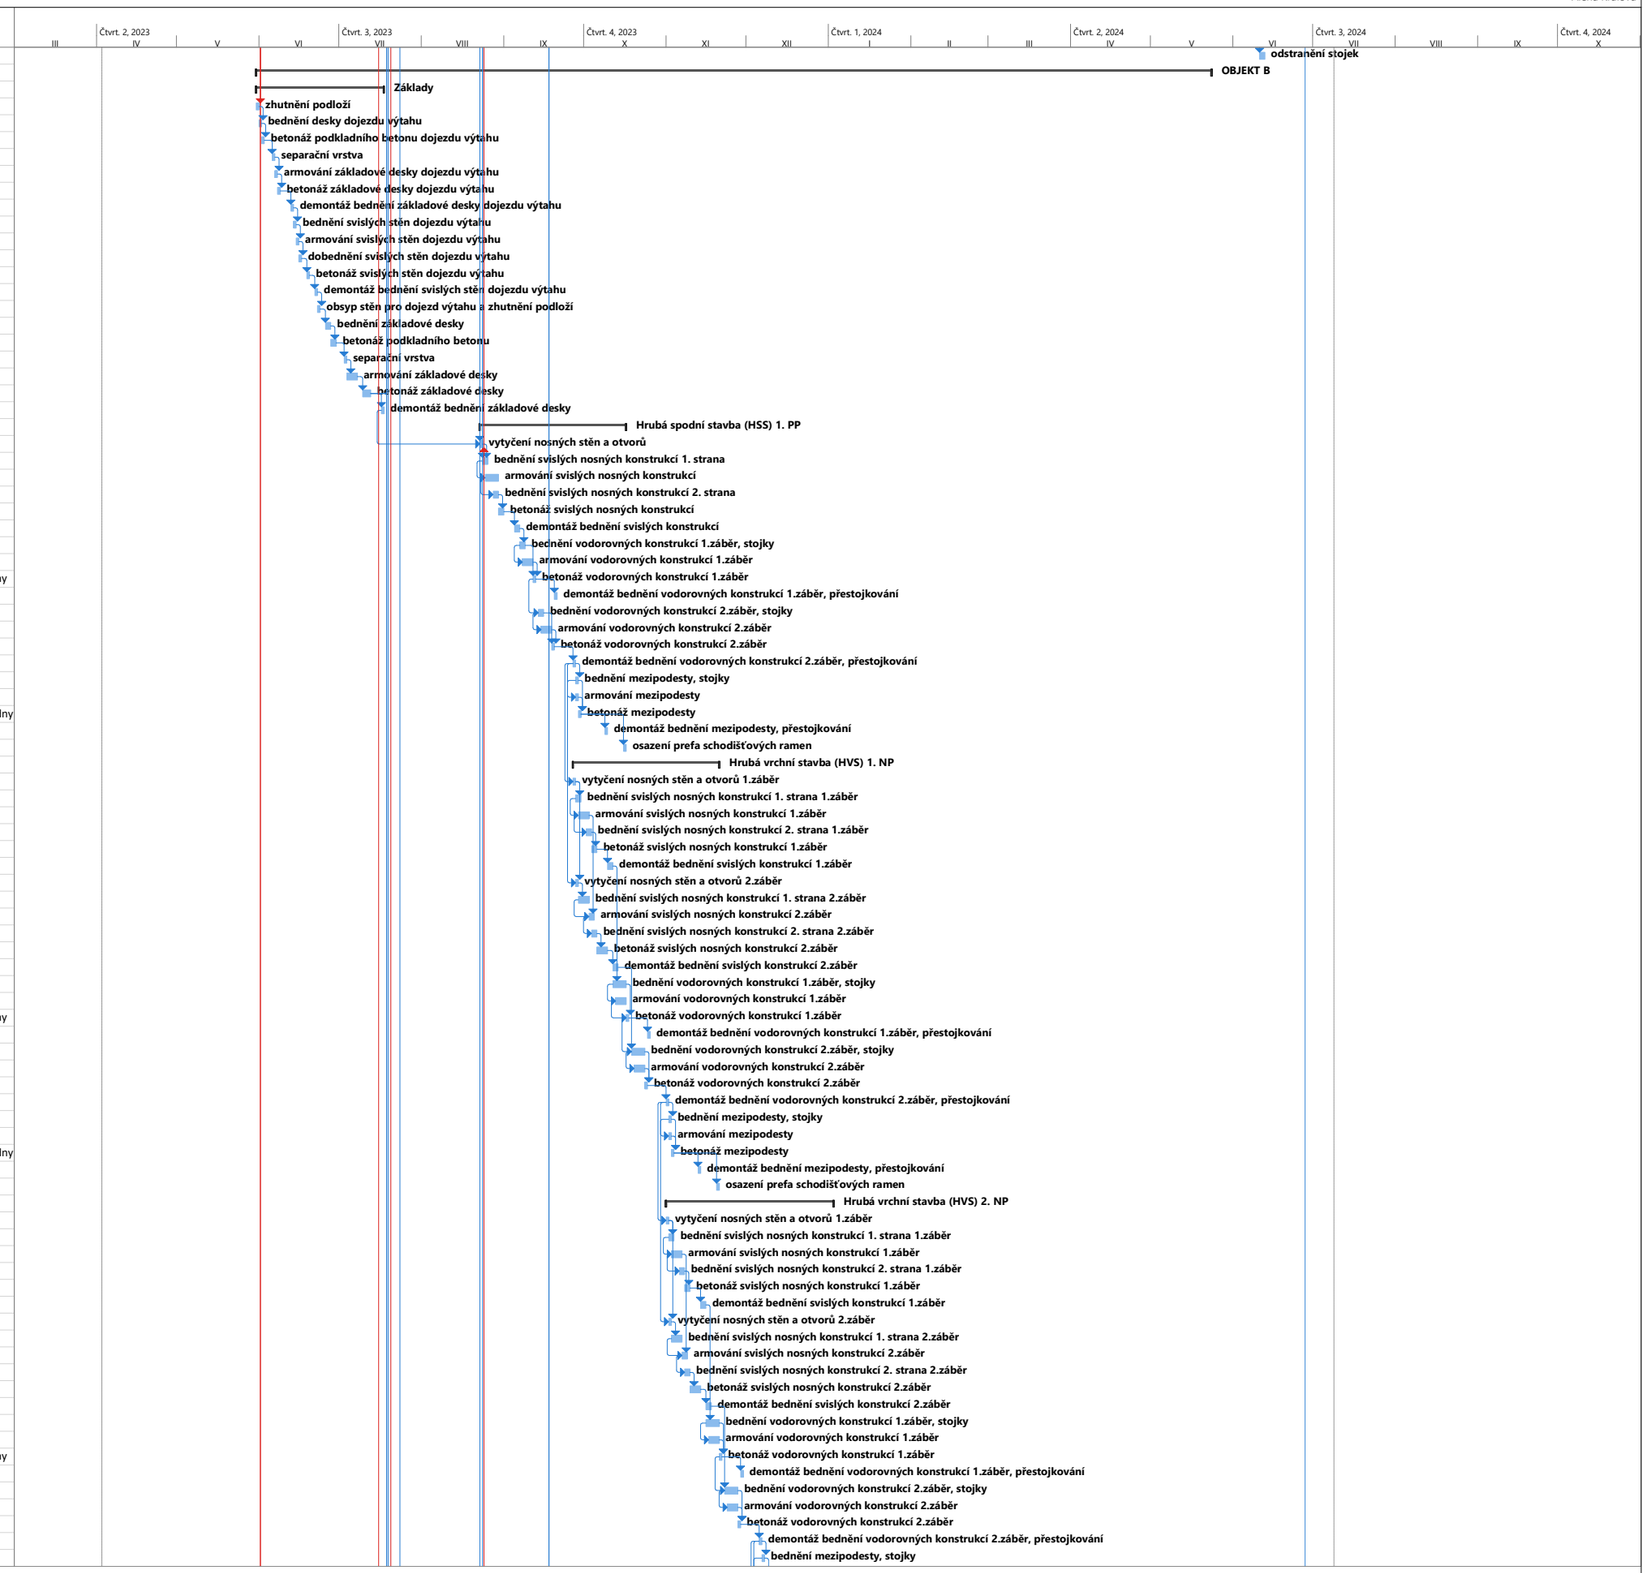

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
361		armování mezipodesty	1 den	07.12. 23	07.12. 23	360SS	362
362		betonáž mezipodesty	1 den	08.12. 23	08.12. 23	360;361	363FS+5 dny;364FS+10 dny
363		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	18.12. 23	18.12. 23	362FS+5 dny	
364		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	02.01. 24	02.01. 24	362FS+10 dny	
365		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**39 dny**	**06.12. 23**	**06.02. 24**		
366		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	06.12. 23	06.12. 23	359SS	367;372
367		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	07.12. 23	08.12. 23	366	368SS+1 den
368		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.12. 23	11.12. 23	367SS+1 den	369SS+1 den;374
369		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	11.12. 23	12.12. 23	368SS+1 den	370
370		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.12. 23	14.12. 23	369	371FS+2 dny
371		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	19.12. 23	20.12. 23	370FS+2 dny	378
372		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	07.12. 23	07.12. 23	359SS;366	373
373		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	08.12. 23	11.12. 23	372	374SS+1 den
374		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.12. 23	13.12. 23	368;373SS+1 den	375SS+1 den
375		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	13.12. 23	14.12. 23	374SS+1 den	376
376		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.12. 23	18.12. 23	375	377FS+2 dny
377		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	21.12. 23	22.12. 23	376FS+2 dny	382
378		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	21.12. 23	02.01. 24	371	379SS+1 den;380
379		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.12. 23	02.01. 24	378SS+1 den	380
380		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	03.01. 24	03.01. 24	378;379	381FS+5 dny;382SS+2 dny
381		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	11.01. 24	11.01. 24	380FS+5 dny	
382		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	05.01. 24	09.01. 24	377;380SS+2 dny	383SS+1 den;384
383		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.01. 24	09.01. 24	382SS+1 den	384
384		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	10.01. 24	10.01. 24	382;383	385FS+5 dny
385		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	18.01. 24	18.01. 24	384FS+5 dny	386;398SS;392SS
386		bednění mezipodesty, stojky	1 den	19.01. 24	19.01. 24	385	387SS
387		armování mezipodesty	1 den	19.01. 24	19.01. 24	386SS	388
388		betonáž mezipodesty	1 den	22.01. 24	22.01. 24	387	389FS+5 dny;390FS+10 dny
389		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	30.01. 24	30.01. 24	388FS+5 dny	
390		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	06.02. 24	06.02. 24	388FS+10 dny	
391		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**39 dny**	**18.01. 24**	**12.03. 24**		
392		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	18.01. 24	18.01. 24	385SS	393;398
393		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	19.01. 24	22.01. 24	392	394SS+1 den
394		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.01. 24	23.01. 24	393SS+1 den	395SS+1 den;400
395		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	23.01. 24	24.01. 24	394SS+1 den	396
396		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	395	397FS+2 dny
397		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	31.01. 24	01.02. 24	396FS+2 dny	404
398		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	19.01. 24	19.01. 24	385SS;392	399
399		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	22.01. 24	23.01. 24	398	400SS+1 den
400		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.01. 24	25.01. 24	394;399SS+1 den	401SS+1 den
401		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	400SS+1 den	402
402		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	29.01. 24	30.01. 24	401	403FS+2 dny
403		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	02.02. 24	05.02. 24	402FS+2 dny	
404		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	02.02. 24	06.02. 24	397	405SS+1 den;406
405		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	05.02. 24	06.02. 24	404SS+1 den	406
406		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	07.02. 24	07.02. 24	404;405	407FS+5 dny;408SS+2 dny
407		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	15.02. 24	15.02. 24	406FS+5 dny	
408		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	09.02. 24	13.02. 24	406SS+2 dny	409SS+1 den;410
409		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.02. 24	13.02. 24	408SS+1 den	410
410		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	14.02. 24	14.02. 24	408;409	411FS+5 dny
411		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	22.02. 24	22.02. 24	410FS+5 dny	412;424SS;418SS
412		bednění mezipodesty, stojky	1 den	23.02. 24	23.02. 24	411	413SS
413		armování mezipodesty	1 den	23.02. 24	23.02. 24	412SS	414
414		betonáž mezipodesty	1 den	26.02. 24	26.02. 24	413	415FS+5 dny;416FS+10 dny
415		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	05.03. 24	05.03. 24	414FS+5 dny	
416		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	12.03. 24	12.03. 24	414FS+10 dny	
417		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**39 dny**	**22.02. 24**	**16.04. 24**		
418		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	22.02. 24	22.02. 24	411SS	419;424
419		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	23.02. 24	26.02. 24	418	420SS+1 den
420		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.02. 24	27.02. 24	419SS+1 den	421SS+1 den;426
421		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	27.02. 24	28.02. 24	420SS+1 den	422
422		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	421	423FS+2 dny
423		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.03. 24	07.03. 24	422FS+2 dny	430
424		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	23.02. 24	23.02. 24	411SS;418	425
425		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	26.02. 24	27.02. 24	424	426SS+1 den
426		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	28.02. 24	29.02. 24	420;425SS+1 den	427SS+1 den
427		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	426SS+1 den	428
428		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.03. 24	05.03. 24	427	429FS+2 dny
429		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.03. 24	11.03. 24	428FS+2 dny	434
430		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	08.03. 24	11.03. 24	423	431SS+1 den;432
431		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.03. 24	12.03. 24	430SS+1 den	432
432		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	13.03. 24	13.03. 24	430;431	433FS+5 dny;434SS+2 dny
433		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	21.03. 24	21.03. 24	432FS+5 dny	
434		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	429;432SS+2 dny	435SS+1 den;436
435		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	18.03. 24	19.03. 24	434SS+1 den	436
436		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	20.03. 24	20.03. 24	434;435	437FS+5 dny
437		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	28.03. 24	28.03. 24	436FS+5 dny	438;451SS;444SS
438		bednění mezipodesty, stojky	1 den	29.03. 24	29.03. 24	437	439SS
439		armování mezipodesty	1 den	29.03. 24	29.03. 24	438SS	440
440		betonáž mezipodesty	1 den	01.04. 24	01.04. 24	439	441FS+5 dny;442FS+10 dny
441		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	09.04. 24	09.04. 24	440FS+5 dny	
442		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	16.04. 24	16.04. 24	440FS+10 dny	
443		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**26 dny**	**28.03. 24**	**02.05. 24**		
444		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	28.03. 24	28.03. 24	437SS	445;451
445		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	29.03. 24	29.03. 24	444	446SS+1 den
446		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	01.04. 24	01.04. 24	445SS+1 den	447SS+1 den
447		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	446SS+1 den	448
448		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	447	449FS+2 dny
449		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	08.04. 24	08.04. 24	448FS+2 dny	450SS
450		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	3 dny	08.04. 24	10.04. 24	449SS	458;457

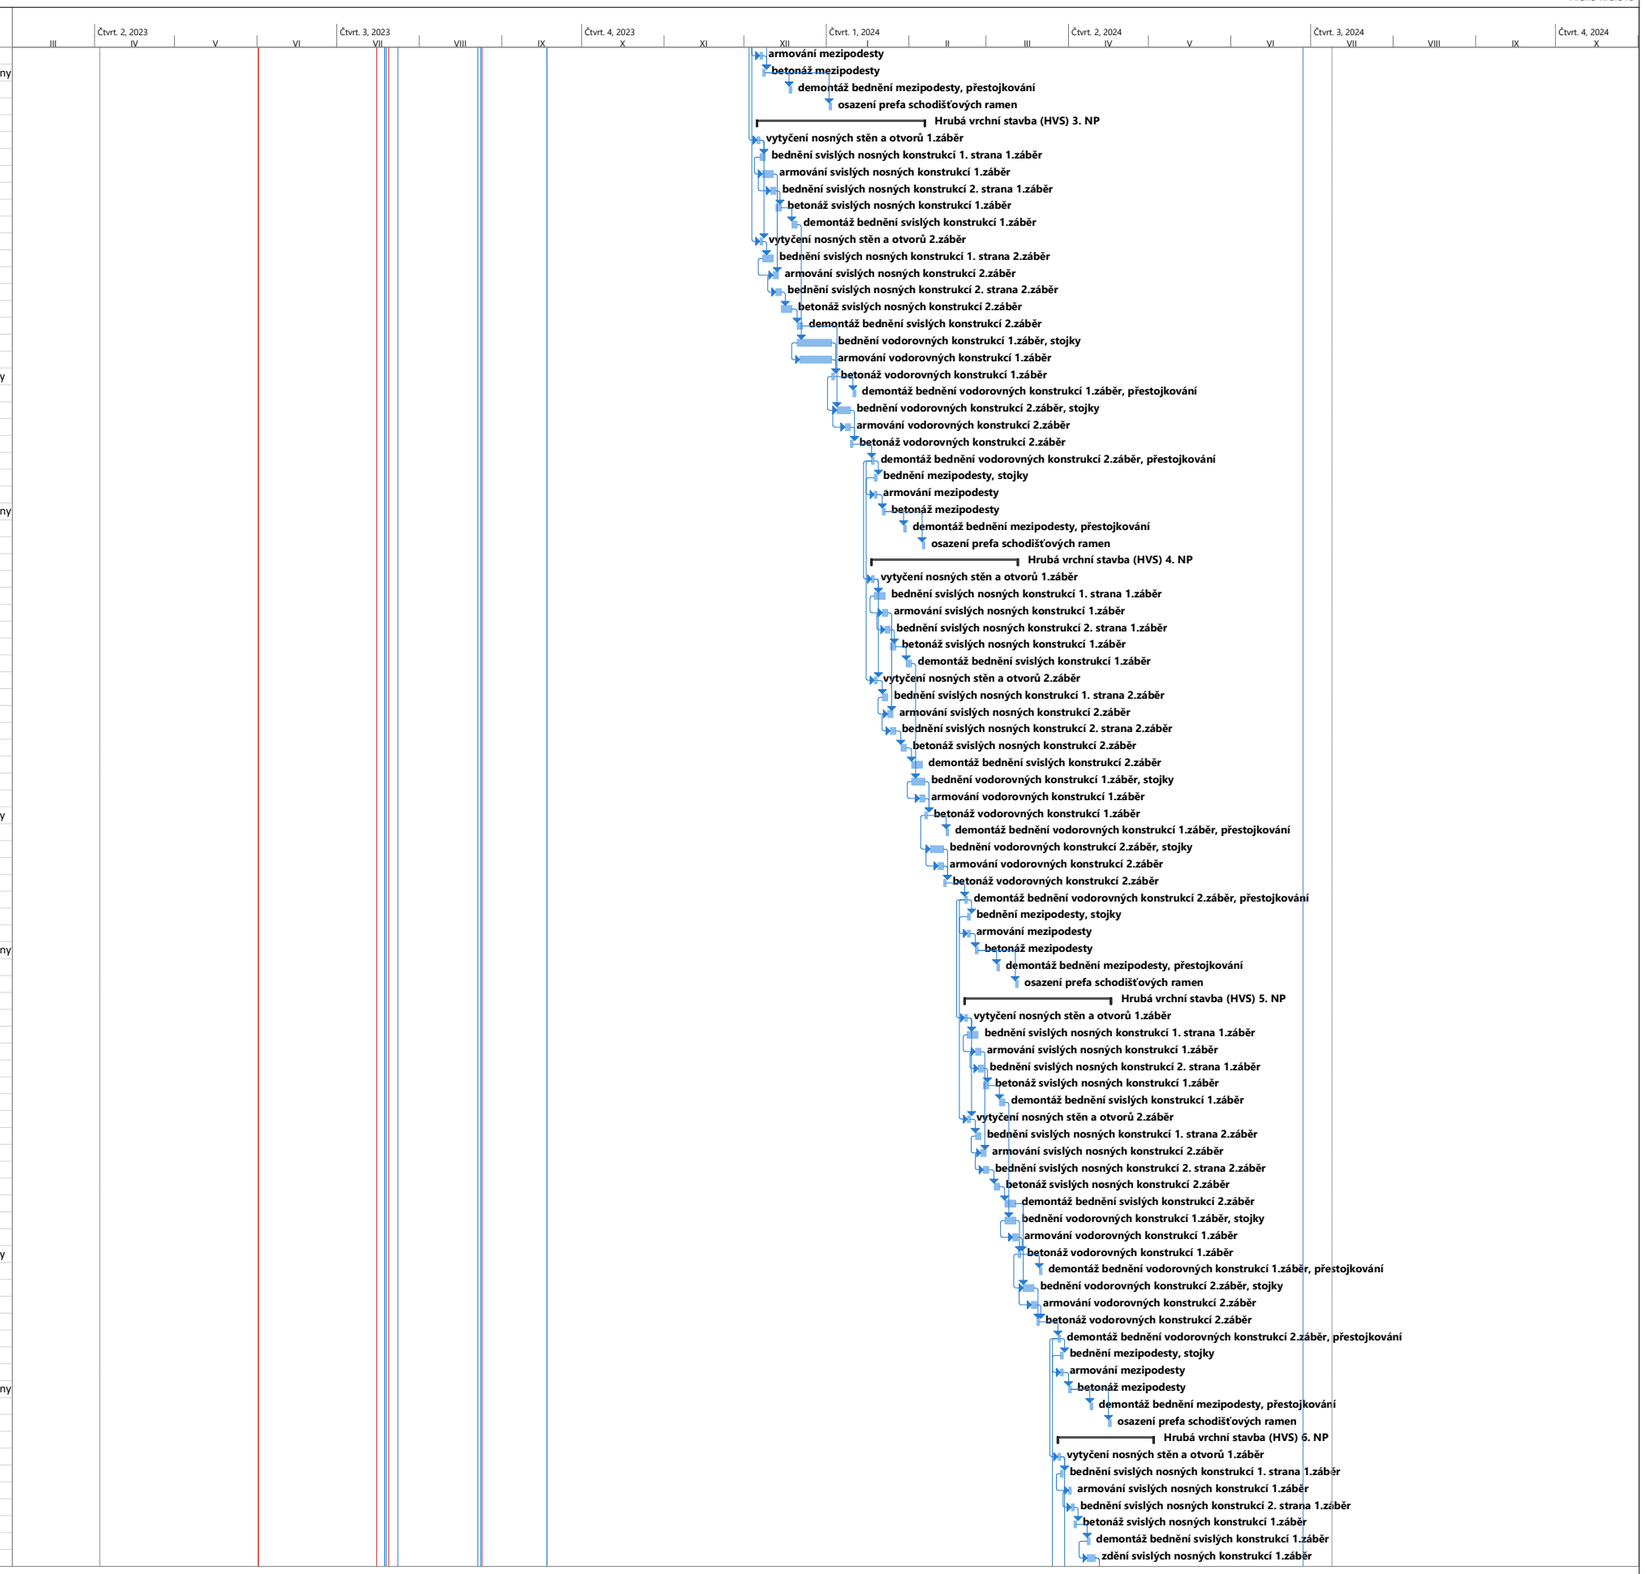

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
451		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	29.03. 24	29.03. 24	437SS;444	452;467
452		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	01.04. 24	01.04. 24	451	453SS+1 den
453		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	452SS+1 den	454SS+1 den
454		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	453SS+1 den	455
455		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	04.04. 24	04.04. 24	454	456FS+2 dny;470
456		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	09.04. 24	09.04. 24	455FS+2 dny	457SS
457		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	4 dny	11.04. 24	16.04. 24	450;456SS	462
458		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	11.04. 24	15.04. 24	450	459FF;460
459		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	15.04. 24	15.04. 24	458FF	460
460		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	16.04. 24	16.04. 24	458;459	461FS+5 dny;462SS+2 dny
461		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	24.04. 24	24.04. 24	460FS+5 dny	
462		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	18.04. 24	19.04. 24	457;460SS+2 dny	463FF;464
463		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	462FF	464
464		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.04. 24	23.04. 24	462;463	465FS+5 dny;492FS+20 dny
465		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	2 dny	01.05. 24	02.05. 24	464FS+5 dny	478
466		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**8 dny**	**01.04. 24**	**10.04. 24**		
467		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	01.04. 24	01.04. 24	451	468;472
468		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	467	469
469		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	468	
470		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	455	471FS+2 dny;475SS
471		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	470FS+2 dny	
472		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	467	473
473		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	472	474
474		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	04.04. 24	04.04. 24	473	475
475		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	470SS;474	476FS+2 dny
476		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	475FS+2 dny	
477		**Zastřešení nad 6. NP**	**11 dny**	**03.05. 24**	**17.05. 24**		
478		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	03.05. 24	03.05. 24	465	479;484
479		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	06.05. 24	06.05. 24	478	480
480		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	07.05. 24	07.05. 24	479	481
481		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	08.05. 24	08.05. 24	480	482
482		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	09.05. 24	09.05. 24	481	483FS+2 dny
483		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	482FS+2 dny	490
484		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	06.05. 24	06.05. 24	478	485
485		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	07.05. 24	07.05. 24	484	486
486		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	08.05. 24	08.05. 24	485	487
487		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	09.05. 24	09.05. 24	486	488
488		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	10.05. 24	10.05. 24	487	489FS+2 dny
489		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	488FS+2 dny	490
490		montáž střešních prvků	2 dny	16.05. 24	17.05. 24	483;489	990
491		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**22.05. 24**	**23.05. 24**		
492		odstranění stojek	2 dny	22.05. 24	23.05. 24	464FS+20 dny	
493		**OBJEKT C**	**283 dny**	**31.05. 23**	**08.07. 24**		
494		**Základy**	**35 dny**	**31.05. 23**	**18.07. 23**		
495		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	496
496		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	495	497
497		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	496	498FS+1 den
498		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	497FS+1 den	499
499		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	498	500
500		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	499	501FS+2 dny
501		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	500FS+2 dny	502
502		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	501	503
503		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	502	504
504		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	503	505
505		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	504	506FS+2 dny
506		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	505FS+2 dny	507
507		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	506	508
508		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	507	509
509		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	508	510FS+1 den
510		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	509FS+1 den	511
511		armování základové desky	5 dny	04.07. 23	10.07. 23	510	512
512		betonáž základové desky	3 dny	11.07. 23	13.07. 23	511	513FS+2 dny;970;27
513		demontáž bednění základové desky	1 den	18.07. 23	18.07. 23	512FS+2 dny	515SS
514		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**40 dny**	**23.08. 23**	**17.10. 23**		
515		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	513SS;976;37	516
516		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	515;28	517SS+1 den
517		armování svislých nosných konstrukcí	3 dny	25.08. 23	29.08. 23	516SS+1 den	518SS+1 den
518		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	2 dny	28.08. 23	29.08. 23	517SS+1 den	519
519		betonáž svislých nosných konstrukcí	3 dny	30.08. 23	01.09. 23	518	520FS+2 dny
520		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	06.09. 23	07.09. 23	519FS+2 dny	521
521		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	08.09. 23	11.09. 23	520	522SS+1 den;523
522		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.09. 23	12.09. 23	521SS+1 den	523
523		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	13.09. 23	13.09. 23	521;522	524FS+5 dny;525SS+2 dny
524		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	21.09. 23	21.09. 23	523FS+5 dny	
525		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	15.09. 23	18.09. 23	523SS+2 dny	526SS+1 den;527
526		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	18.09. 23	19.09. 23	525SS+1 den	527
527		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	20.09. 23	20.09. 23	525;526	528FS+5 dny
528		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	28.09. 23	28.09. 23	527FS+5 dny	529;535SS;541SS
529		bednění mezipodesty, stojky	1 den	29.09. 23	29.09. 23	528	530SS;531
530		armování mezipodesty	1 den	29.09. 23	29.09. 23	529SS	531
531		betonáž mezipodesty	1 den	02.10. 23	02.10. 23	529;530	532FS+5 dny;533FS+10 dny
532		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	10.10. 23	10.10. 23	531FS+5 dny	
533		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	17.10. 23	17.10. 23	531FS+10 dny	
534		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**39 dny**	**28.09. 23**	**21.11. 23**		
535		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	28.09. 23	28.09. 23	528SS	536;541
536		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	29.09. 23	02.10. 23	535	537SS+1 den
537		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.10. 23	03.10. 23	536SS+1 den	538SS+1 den;543
538		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	03.10. 23	04.10. 23	537SS+1 den	539
539		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	05.10. 23	06.10. 23	538	540FS+2 dny
540		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.10. 23	12.10. 23	539FS+2 dny	547

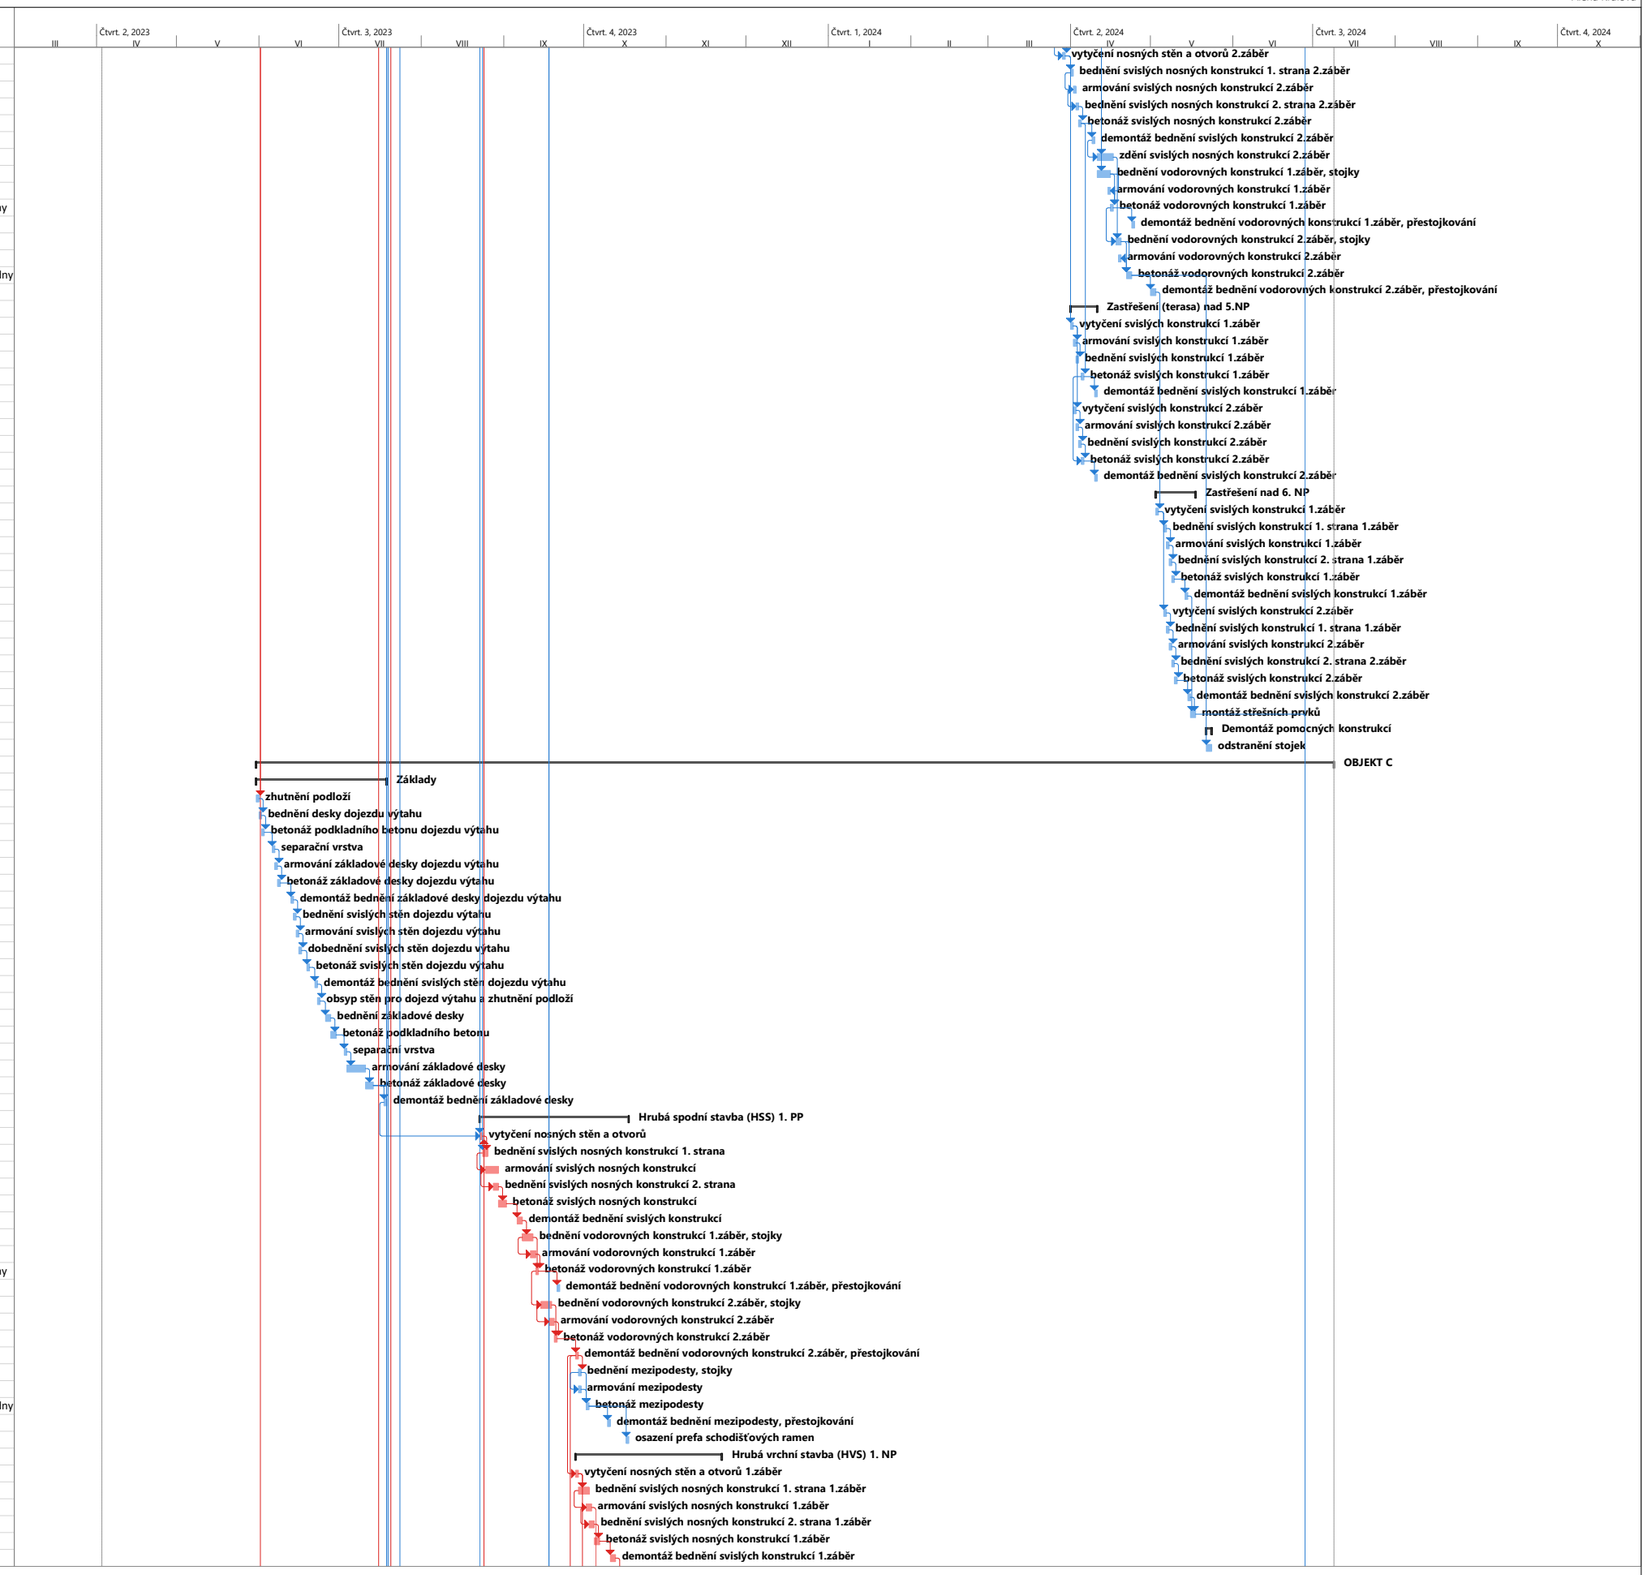

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
541		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	29.09. 23	29.09. 23	528SS;535	542
542		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	02.10. 23	03.10. 23	541	543SS+1 den
543		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	537;542SS+1 den	544SS+1 den
544		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	05.10. 23	06.10. 23	543SS+1 den	545
545		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	09.10. 23	10.10. 23	544	546FS+2 dny
546		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.10. 23	16.10. 23	545FS+2 dny	551
547		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	13.10. 23	17.10. 23	540	548SS+1 den;549
548		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	16.10. 23	17.10. 23	547SS+1 den	549
549		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	18.10. 23	18.10. 23	547;548	550FS+5 dny;551SS+2 dny
550		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	26.10. 23	26.10. 23	549FS+5 dny	
551		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	20.10. 23	24.10. 23	546;549SS+2 dny	552SS+1 den;553
552		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	23.10. 23	24.10. 23	551SS+1 den	553
553		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	25.10. 23	25.10. 23	551;552	554FS+5 dny
554		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	02.11. 23	02.11. 23	553FS+5 dny	555;567SS;561SS
555		bednění mezipodesty, stojky	1 den	03.11. 23	03.11. 23	554	556SS;557
556		armování mezipodesty	1 den	03.11. 23	03.11. 23	555SS	557
557		betonáž mezipodesty	1 den	06.11. 23	06.11. 23	555;556	558FS+5 dny;559FS+10 dny
558		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	14.11. 23	14.11. 23	557FS+5 dny	
559		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	21.11. 23	21.11. 23	557FS+10 dny	
560		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**40 dny**	**02.11. 23**	**04.01. 24**		
561		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	02.11. 23	02.11. 23	554SS	562;567
562		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	03.11. 23	06.11. 23	561	563SS+1 den
563		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.11. 23	07.11. 23	562SS+1 den	564SS+1 den;569
564		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	07.11. 23	08.11. 23	563SS+1 den	565
565		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.11. 23	10.11. 23	564	566FS+2 dny
566		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	15.11. 23	17.11. 23	565FS+2 dny	573
567		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	03.11. 23	03.11. 23	554SS;561	568
568		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	06.11. 23	07.11. 23	567	569SS+1 den
569		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.11. 23	09.11. 23	563;568SS+1 den	570SS+1 den
570		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	09.11. 23	10.11. 23	569SS+1 den	571
571		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.11. 23	14.11. 23	570	572FS+2 dny
572		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	17.11. 23	20.11. 23	571FS+2 dny	577
573		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	20.11. 23	22.11. 23	566	574SS+1 den;575
574		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	21.11. 23	22.11. 23	573SS+1 den	575
575		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	23.11. 23	23.11. 23	573;574	576FS+5 dny;577SS+2 dny
576		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	01.12. 23	01.12. 23	575FS+5 dny	
577		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	27.11. 23	29.11. 23	572;575SS+2 dny	578SS+1 den;579
578		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	28.11. 23	29.11. 23	577SS+1 den	579
579		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	30.11. 23	30.11. 23	577;578	580FS+5 dny
580		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	08.12. 23	08.12. 23	579FS+5 dny	581;593SS;587SS
581		bednění mezipodesty, stojky	1 den	11.12. 23	11.12. 23	580	582SS;583
582		armování mezipodesty	1 den	11.12. 23	11.12. 23	581SS	583
583		betonáž mezipodesty	1 den	12.12. 23	12.12. 23	581;582	584FS+5 dny;585FS+10 dny
584		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	20.12. 23	20.12. 23	583FS+5 dny	
585		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	04.01. 24	04.01. 24	583FS+10 dny	
586		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**40 dny**	**08.12. 23**	**09.02. 24**		
587		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	08.12. 23	08.12. 23	580SS	588;593
588		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	11.12. 23	12.12. 23	587	589SS+1 den
589		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.12. 23	13.12. 23	588SS+1 den	590SS+1 den;595
590		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	13.12. 23	14.12. 23	589SS+1 den	591
591		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.12. 23	18.12. 23	590	592FS+2 dny
592		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	21.12. 23	02.01. 24	591FS+2 dny	599
593		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	11.12. 23	11.12. 23	580SS;587	594
594		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	12.12. 23	13.12. 23	593	595SS+1 den
595		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.12. 23	15.12. 23	589;594SS+1 den	596SS+1 den
596		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	15.12. 23	18.12. 23	595SS+1 den	597
597		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.12. 23	20.12. 23	596	598FS+2 dny
598		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	02.01. 24	03.01. 24	597FS+2 dny	603
599		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	03.01. 24	05.01. 24	592	600SS+1 den;601
600		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	04.01. 24	05.01. 24	599SS+1 den	601
601		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	08.01. 24	08.01. 24	599;600	602FS+5 dny;603SS+2 dny
602		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	16.01. 24	16.01. 24	601FS+5 dny	
603		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	10.01. 24	12.01. 24	598;601SS+2 dny	604SS+1 den;605
604		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	11.01. 24	12.01. 24	603SS+1 den	605
605		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	15.01. 24	15.01. 24	603;604	606FS+5 dny
606		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	23.01. 24	23.01. 24	605FS+5 dny	607;619SS;613SS
607		bednění mezipodesty, stojky	1 den	24.01. 24	24.01. 24	606	608SS
608		armování mezipodesty	1 den	24.01. 24	24.01. 24	607SS	609
609		betonáž mezipodesty	1 den	25.01. 24	25.01. 24	608	610FS+5 dny;611FS+10 dny
610		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	02.02. 24	02.02. 24	609FS+5 dny	
611		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	09.02. 24	09.02. 24	609FS+10 dny	
612		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**40 dny**	**23.01. 24**	**18.03. 24**		
613		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	23.01. 24	23.01. 24	606SS	614;619
614		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	24.01. 24	25.01. 24	613	615SS+1 den
615		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	614SS+1 den	616SS+1 den;621
616		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	26.01. 24	29.01. 24	615SS+1 den	617
617		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	30.01. 24	31.01. 24	616	618FS+2 dny
618		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	05.02. 24	07.02. 24	617FS+2 dny	625
619		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	24.01. 24	24.01. 24	606SS;613	620
620		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	619	621SS+1 den
621		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	29.01. 24	30.01. 24	615;620SS+1 den	622SS+1 den
622		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	30.01. 24	31.01. 24	621SS+1 den	623
623		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	01.02. 24	02.02. 24	622	624FS+2 dny
624		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.02. 24	08.02. 24	623FS+2 dny	
625		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	08.02. 24	12.02. 24	618	626SS+1 den;627
626		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	625SS+1 den	627
627		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	13.02. 24	13.02. 24	625;626	628FS+5 dny;629SS+2 dny
628		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	21.02. 24	21.02. 24	627FS+5 dny	
629		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	15.02. 24	19.02. 24	627SS+2 dny	630SS+1 den;631
630		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	16.02. 24	19.02. 24	629SS+1 den	631

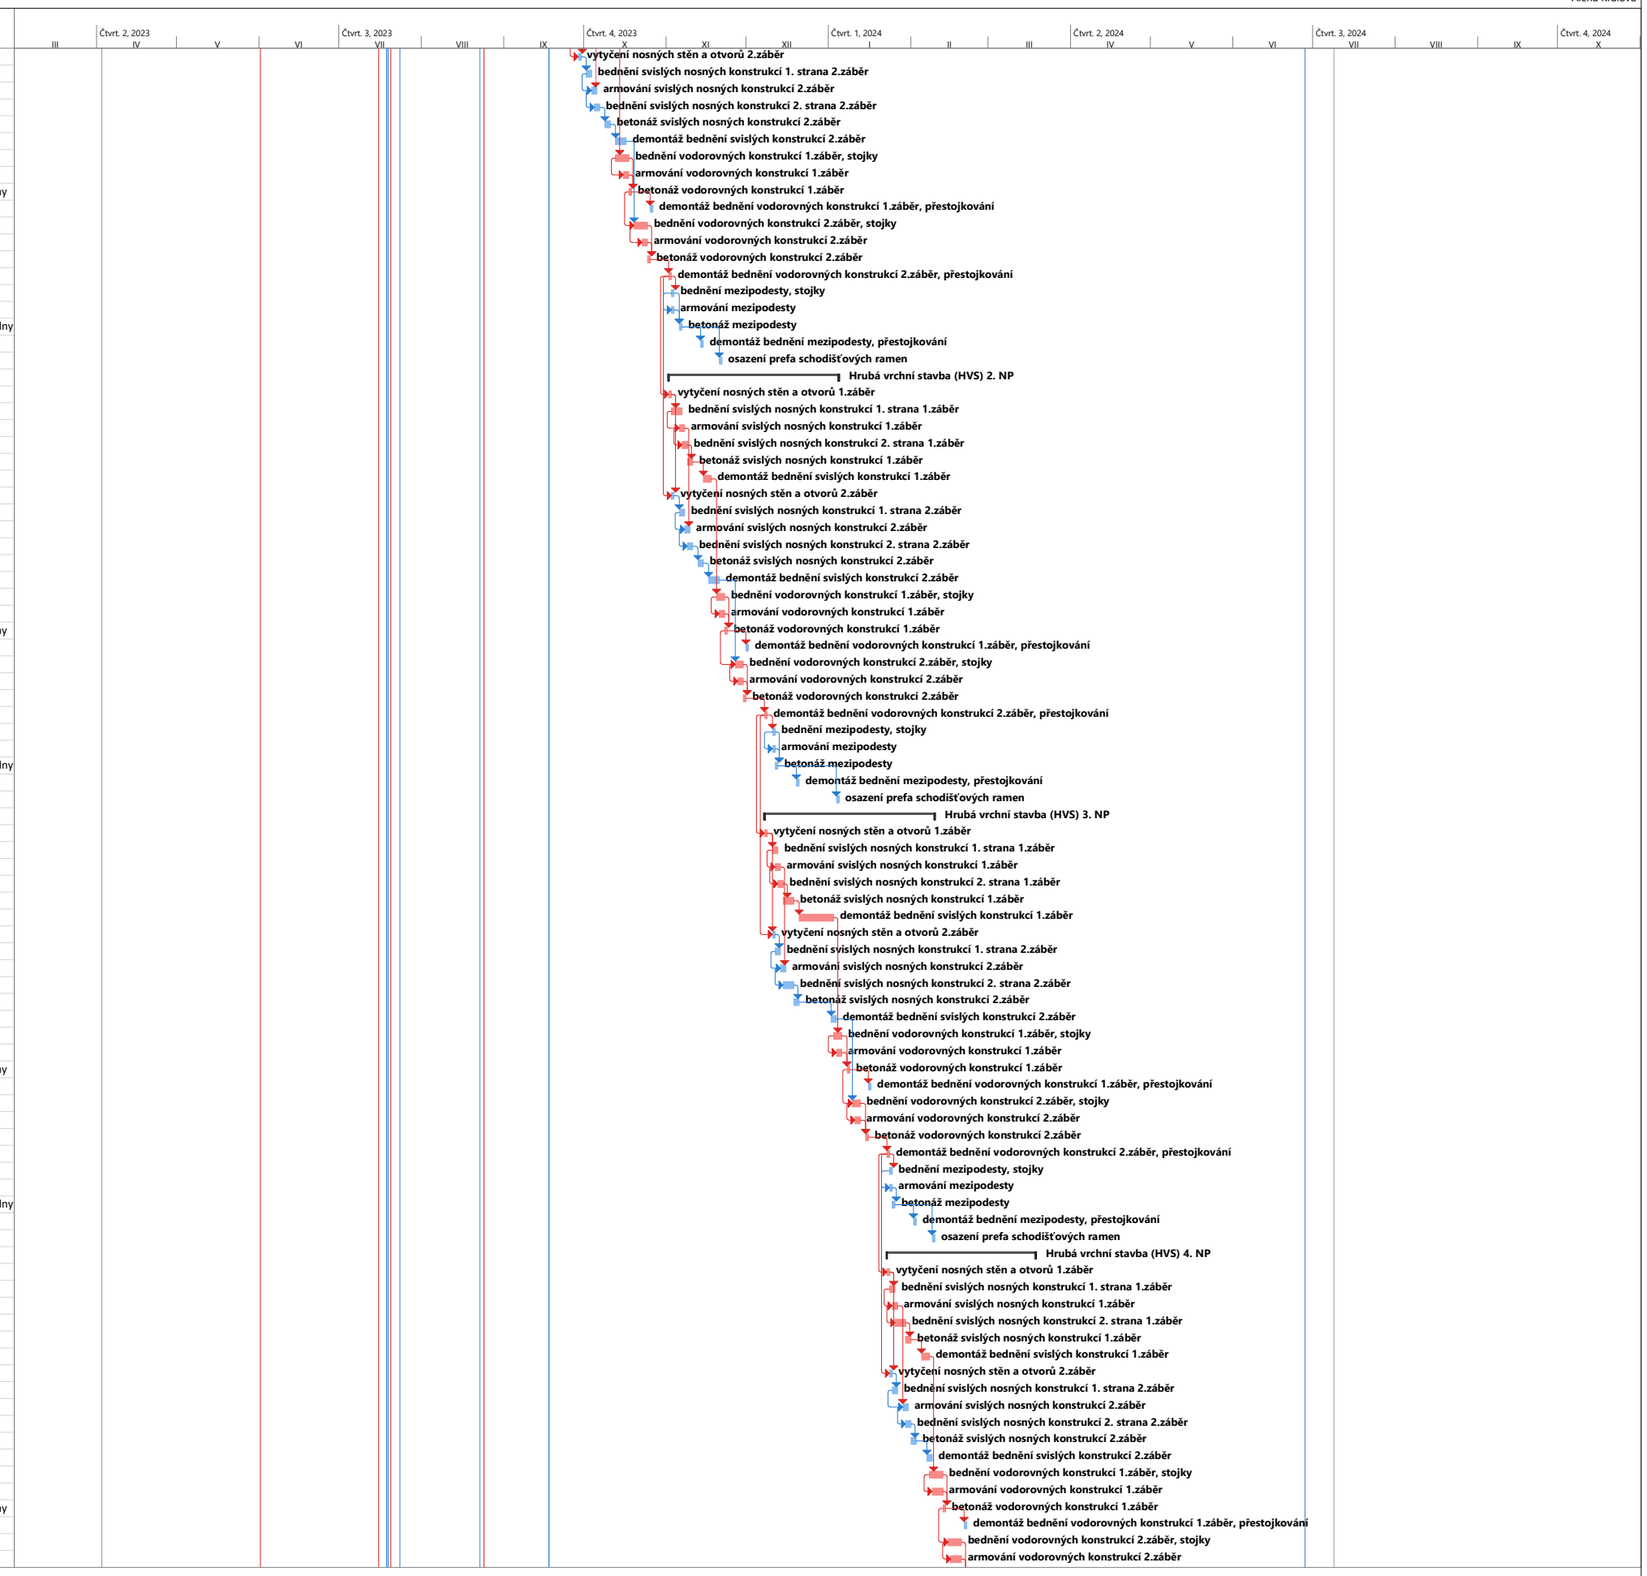

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
631		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	20.02. 24	20.02. 24	629;630	632FS+5 dny
632		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	28.02. 24	28.02. 24	631FS+5 dny	633;645SS;639SS
633		bednění mezipodesty, stojky	1 den	29.02. 24	29.02. 24	632	634SS
634		armování mezipodesty	1 den	29.02. 24	29.02. 24	633SS	635
635		betonáž mezipodesty	1 den	01.03. 24	01.03. 24	634	636FS+5 dny;637FS+10 dny
636		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	11.03. 24	11.03. 24	635FS+5 dny	
637		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	18.03. 24	18.03. 24	635FS+10 dny	
638		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**41 dny**	**28.02. 24**	**24.04. 24**		
639		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	28.02. 24	28.02. 24	632SS	640;645
640		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	639	641SS+1 den
641		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	01.03. 24	04.03. 24	640SS+1 den	642SS+1 den;647
642		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	04.03. 24	05.03. 24	641SS+1 den	643
643		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.03. 24	07.03. 24	642	644FS+2 dny
644		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	12.03. 24	14.03. 24	643FS+2 dny	651
645		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	29.02. 24	29.02. 24	632SS;639	646
646		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	01.03. 24	04.03. 24	645	647SS+1 den
647		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.03. 24	06.03. 24	641;646SS+1 den	648SS+1 den
648		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	06.03. 24	07.03. 24	647SS+1 den	649
649		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.03. 24	11.03. 24	648	650FS+2 dny
650		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.03. 24	15.03. 24	649FS+2 dny	655
651		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	644	652SS+1 den;653
652		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	18.03. 24	19.03. 24	651SS+1 den	653
653		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	20.03. 24	20.03. 24	651;652	654FS+5 dny;655SS+2 dny
654		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	28.03. 24	28.03. 24	653FS+5 dny	
655		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	22.03. 24	25.03. 24	650;653SS+2 dny	656SS+1 den;657
656		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	25.03. 24	26.03. 24	655SS+1 den	657
657		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	27.03. 24	27.03. 24	655;656	658FS+5 dny
658		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	04.04. 24	04.04. 24	657FS+5 dny	659;672SS;665SS
659		bednění mezipodesty, stojky	1 den	05.04. 24	05.04. 24	658	660SS
660		armování mezipodesty	1 den	05.04. 24	05.04. 24	659SS	661
661		betonáž mezipodesty	1 den	08.04. 24	08.04. 24	660	662FS+5 dny;663FS+10 dny
662		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	23.04. 24	23.04. 24	661FS+5 dny;678	663
663		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	24.04. 24	24.04. 24	661FS+10 dny;662	
664		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**40 dny**	**04.04. 24**	**29.05. 24**		
665		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	04.04. 24	04.04. 24	658SS	666;672;712
666		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	665	667SS+1 den
667		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	08.04. 24	08.04. 24	666SS+1 den	668SS+1 den
668		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	09.04. 24	09.04. 24	667SS+1 den	669
669		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	668	670FS+2 dny
670		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	15.04. 24	15.04. 24	669FS+2 dny	671
671		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	4 dny	16.04. 24	19.04. 24	670	679
672		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	658SS;665	673;717
673		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	08.04. 24	08.04. 24	672	674SS+1 den
674		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	09.04. 24	09.04. 24	673SS+1 den	675SS+1 den
675		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	674SS+1 den	676
676		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	11.04. 24	11.04. 24	675	677FS+2 dny
677		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	16.04. 24	16.04. 24	676FS+2 dny	678
678		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	4 dny	17.04. 24	22.04. 24	677	662;683
679		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	22.04. 24	23.04. 24	671	680SS+1 den;681
680		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	23.04. 24	24.04. 24	679SS+1 den	681
681		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	25.04. 24	25.04. 24	679;680	682FS+5 dny;683SS+2 dny
682		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	03.05. 24	03.05. 24	681FS+5 dny	
683		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	29.04. 24	30.04. 24	678;681SS+2 dny	684SS+1 den;685
684		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.04. 24	01.05. 24	683SS+1 den	685
685		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	02.05. 24	02.05. 24	683;684	686FS+5 dny
686		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	10.05. 24	10.05. 24	685FS+5 dny	687;700SS;693SS
687		bednění mezipodesty, stojky	1 den	13.05. 24	13.05. 24	686	688SS
688		armování mezipodesty	1 den	13.05. 24	13.05. 24	687SS	689
689		betonáž mezipodesty	1 den	14.05. 24	14.05. 24	688	690FS+5 dny;691FS+10 dny
690		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	24.05. 24	24.05. 24	689FS+5 dny;705	
691		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	29.05. 24	29.05. 24	689FS+10 dny	
692		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 7. NP**	**27 dny**	**10.05. 24**	**17.06. 24**		
693		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	10.05. 24	10.05. 24	686SS	694;700;723
694		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	693	695SS+1 den
695		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	694SS+1 den	696SS+1 den
696		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	695SS+1 den	697
697		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	696	698FS+2 dny
698		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	21.05. 24	21.05. 24	697FS+2 dny	699
699		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.05. 24	23.05. 24	698	707
700		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	686SS;693	701;729
701		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	700	702SS+1 den
702		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	701SS+1 den	703SS+1 den
703		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	702SS+1 den	704
704		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	17.05. 24	17.05. 24	703	705FS+2 dny
705		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.05. 24	23.05. 24	704FS+2 dny	690;706
706		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	4 dny	24.05. 24	29.05. 24	705	707
707		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	30.05. 24	04.06. 24	699;706	708SS+2 dny;709
708		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	03.06. 24	04.06. 24	707SS+2 dny	709
709		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	05.06. 24	06.06. 24	707;708	710FS+5 dny;744FS+20 dny
710		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	2 dny	14.06. 24	17.06. 24	709FS+5 dny	736SS
711		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**8 dny**	**05.04. 24**	**16.04. 24**		
712		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	665	713
713		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	08.04. 24	08.04. 24	712	714
714		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	09.04. 24	09.04. 24	713	715
715		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	714	716FS+2 dny
716		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	15.04. 24	15.04. 24	715FS+2 dny	
717		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	08.04. 24	08.04. 24	672	718
718		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	09.04. 24	09.04. 24	717	719
719		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	718	720
720		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	11.04. 24	11.04. 24	719	721FS+2 dny

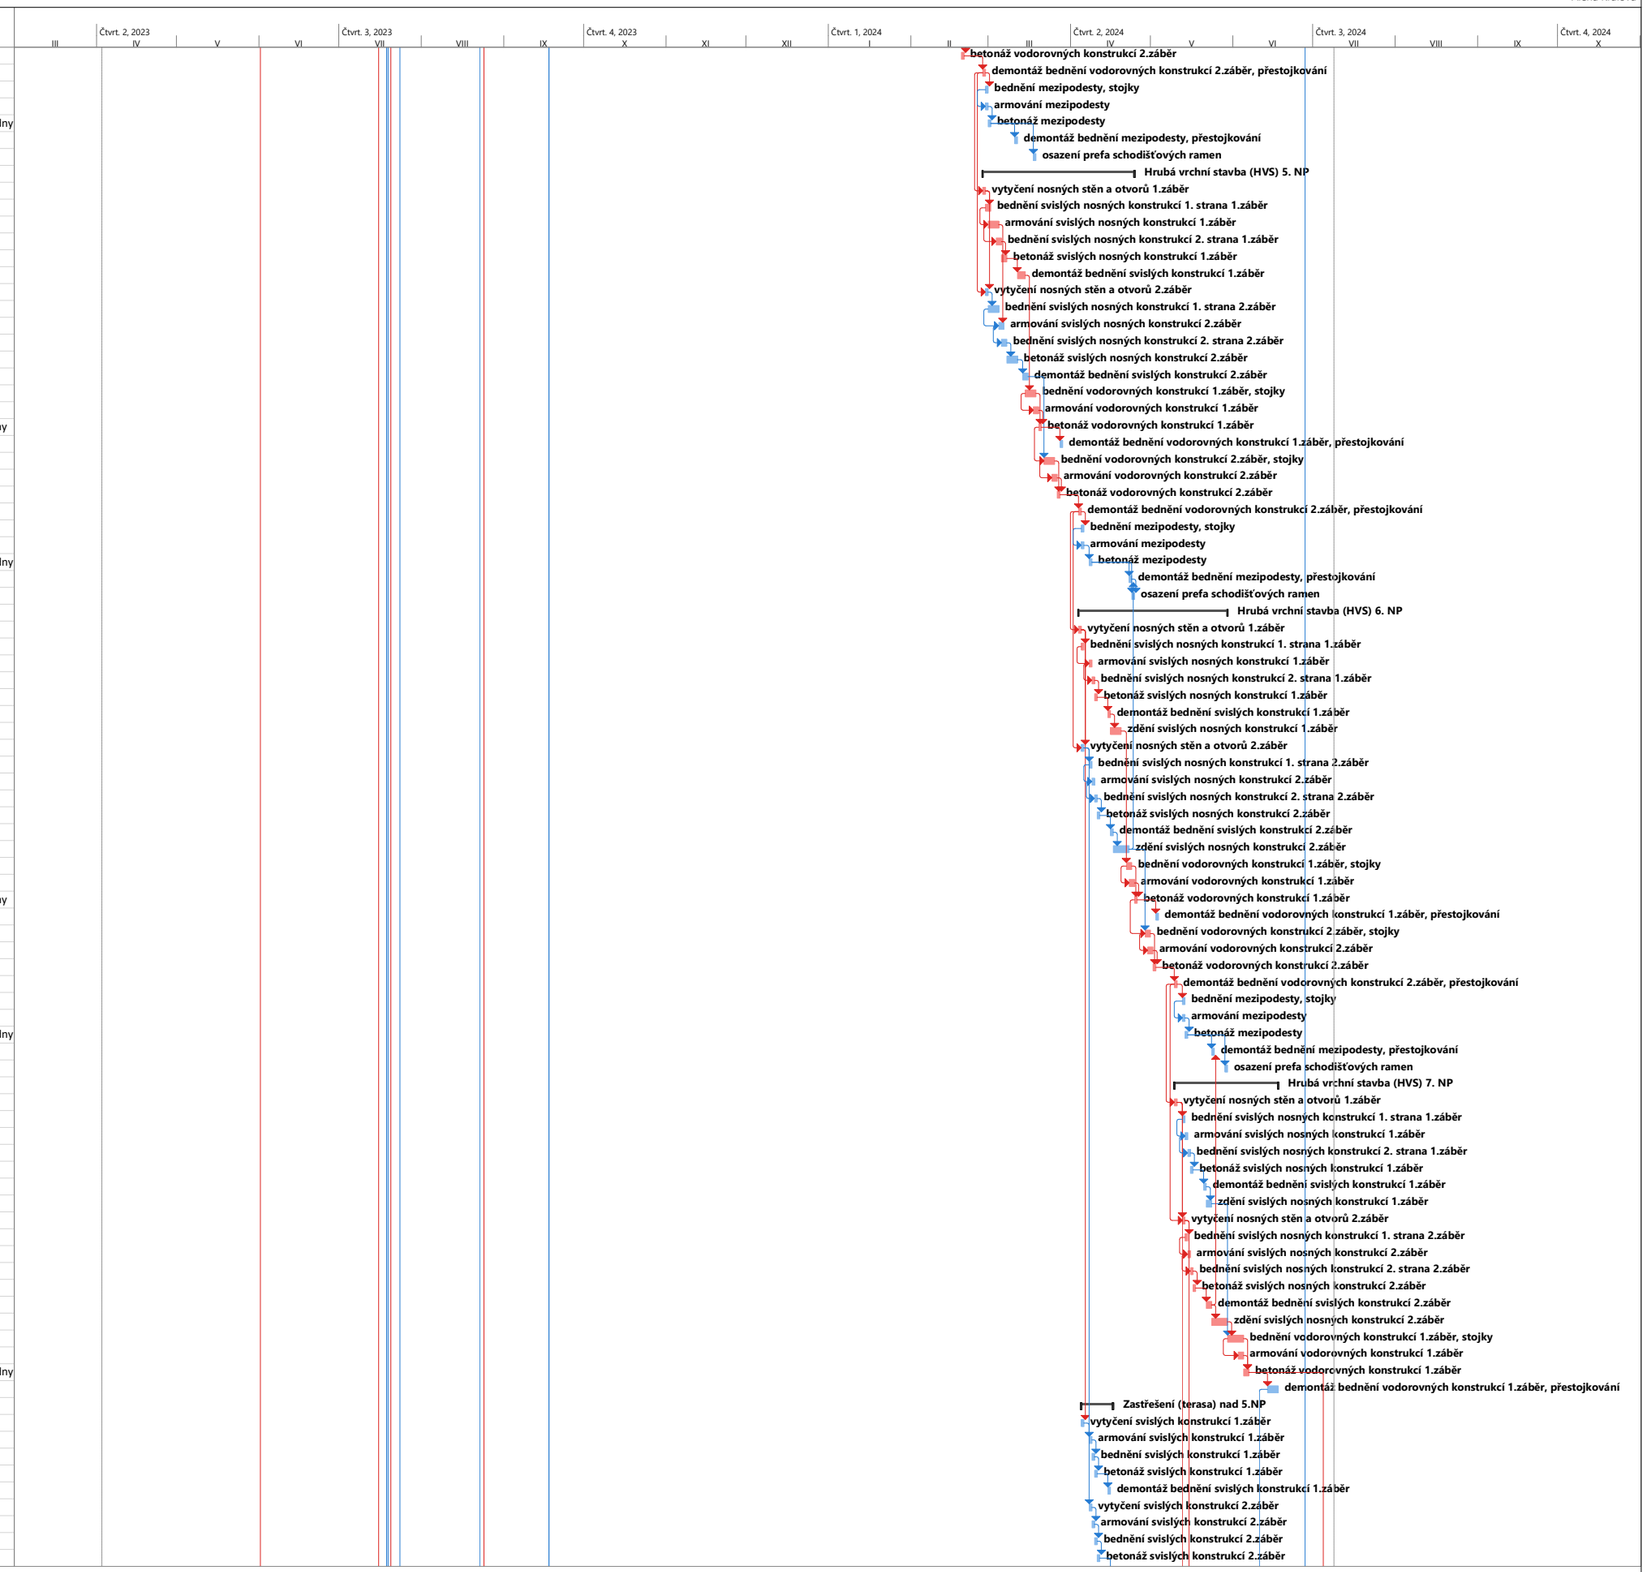

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
721		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	16.04. 24	16.04. 24	720FS+2 dny	
722		**Zastřešení nad 6.NP**	**10 dny**	**13.05. 24**	**24.05. 24**		
723		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	693	724
724		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	723	725
725		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	724	726;730
726		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	725	727
727		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	17.05. 24	17.05. 24	726	728FS+2 dny
728		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	727FS+2 dny	
729		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	700	730
730		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	725;729	731
731		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	17.05. 24	17.05. 24	730	732
732		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	20.05. 24	20.05. 24	731	733FS+2 dny
733		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	23.05. 24	23.05. 24	732FS+2 dny	734
734		montáž střešních prvků	1 den	24.05. 24	24.05. 24	733	
735		**Zastřešení nad 7.NP**	**10 dny**	**14.06. 24**	**27.06. 24**		
736		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.06. 24	14.06. 24	710SS	737
737		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	17.06. 24	17.06. 24	736	738
738		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	18.06. 24	18.06. 24	737	739
739		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	19.06. 24	19.06. 24	738	740
740		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	20.06. 24	20.06. 24	739	741FS+2 dny
741		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	25.06. 24	25.06. 24	740FS+2 dny	742
742		montáž střešních prvků	2 dny	26.06. 24	27.06. 24	741	990
743		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**05.07. 24**	**08.07. 24**		
744		odstranění stojek	2 dny	05.07. 24	08.07. 24	709FS+20 dny	
745		**OBJEKT A34**	**281 dny**	**31.05. 23**	**04.07. 24**		
746		**Základy**	**38 dny**	**31.05. 23**	**21.07. 23**		
747		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	748
748		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	747	749
749		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	748	750FS+1 den
750		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	749FS+1 den	751
751		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	750	752
752		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	751	753FS+2 dny
753		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	752FS+2 dny	754
754		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	753	755
755		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	754	756
756		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	755	757
757		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	756	758FS+2 dny
758		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	757FS+2 dny	759
759		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	758	760
760		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	759	761
761		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	760	762FS+1 den
762		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	761FS+1 den	763
763		armování základové desky	7 dny	04.07. 23	12.07. 23	762	764
764		betonáž základové desky	4 dny	13.07. 23	18.07. 23	763	765FS+2 dny;970;27
765		demontáž bednění základové desky	1 den	21.07. 23	21.07. 23	764FS+2 dny	767SS
766		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**42 dny**	**18.09. 23**	**14.11. 23**		
767		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	18.09. 23	18.09. 23	765SS;76FS+5 dny;976;37	768
768		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	19.09. 23	20.09. 23	767	769SS+1 den
769		armování svislých nosných konstrukcí	4 dny	20.09. 23	25.09. 23	768SS+1 den	770SS+1 den
770		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	3 dny	21.09. 23	25.09. 23	769SS+1 den	771
771		betonáž svislých nosných konstrukcí	3 dny	26.09. 23	28.09. 23	770	772FS+2 dny
772		demontáž bednění svislých konstrukcí	3 dny	03.10. 23	05.10. 23	771FS+2 dny	773SS+2 dny
773		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	05.10. 23	09.10. 23	772SS+2 dny	774SS+1 den;775
774		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	773SS+1 den	775
775		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	10.10. 23	11.10. 23	773;774	776FS+5 dny;777SS+2 dny
776		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	19.10. 23	19.10. 23	775FS+5 dny	
777		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	12.10. 23	16.10. 23	775SS+2 dny	778SS+1 den;779
778		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.10. 23	16.10. 23	777SS+1 den	779
779		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	17.10. 23	18.10. 23	777;778	780FS+5 dny
780		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	26.10. 23	26.10. 23	779FS+5 dny	781;787SS;794SS
781		bednění mezipodesty, stojky	1 den	27.10. 23	27.10. 23	780	782SS;783
782		armování mezipodesty	1 den	27.10. 23	27.10. 23	781SS	783
783		betonáž mezipodesty	1 den	30.10. 23	30.10. 23	781;782	784FS+5 dny;785FS+10 dny
784		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	07.11. 23	07.11. 23	783FS+5 dny	
785		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	14.11. 23	14.11. 23	783FS+10 dny	
786		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**42 dny**	**26.10. 23**	**22.12. 23**		
787		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	26.10. 23	26.10. 23	780SS	788;794
788		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	27.10. 23	27.10. 23	787	789SS+1 den
789		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	30.10. 23	31.10. 23	788SS+1 den	790SS+1 den;796
790		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	31.10. 23	01.11. 23	789SS+1 den	791
791		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.11. 23	03.11. 23	790	792FS+2 dny
792		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.11. 23	09.11. 23	791FS+2 dny	793SS+1 den
793		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	09.11. 23	09.11. 23	792SS+1 den	801
794		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	27.10. 23	27.10. 23	780SS;787	795
795		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	30.10. 23	30.10. 23	794	796SS+1 den
796		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	01.11. 23	02.11. 23	789;795SS+1 den	797SS+1 den
797		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	02.11. 23	03.11. 23	796SS+1 den	798
798		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	06.11. 23	07.11. 23	797	799FS+2 dny
799		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	798FS+2 dny	800SS+1 den;805
800		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	16.11. 23	16.11. 23	799SS+1 den;801	
801		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	10.11. 23	15.11. 23	793	800;802SS+1 den;803
802		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	13.11. 23	15.11. 23	801SS+1 den	803
803		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	16.11. 23	17.11. 23	801;802	804FS+5 dny;805SS+2 dny
804		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	27.11. 23	27.11. 23	803FS+5 dny	
805		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	20.11. 23	23.11. 23	799;803SS+2 dny	806SS+1 den;807
806		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	21.11. 23	23.11. 23	805SS+1 den	807
807		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.11. 23	27.11. 23	805;806	808FS+5 dny
808		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	05.12. 23	05.12. 23	807FS+5 dny	809;815SS;821SS
809		bednění mezipodesty, stojky	1 den	06.12. 23	06.12. 23	808	810SS;811
810		armování mezipodesty	1 den	06.12. 23	06.12. 23	809SS	811

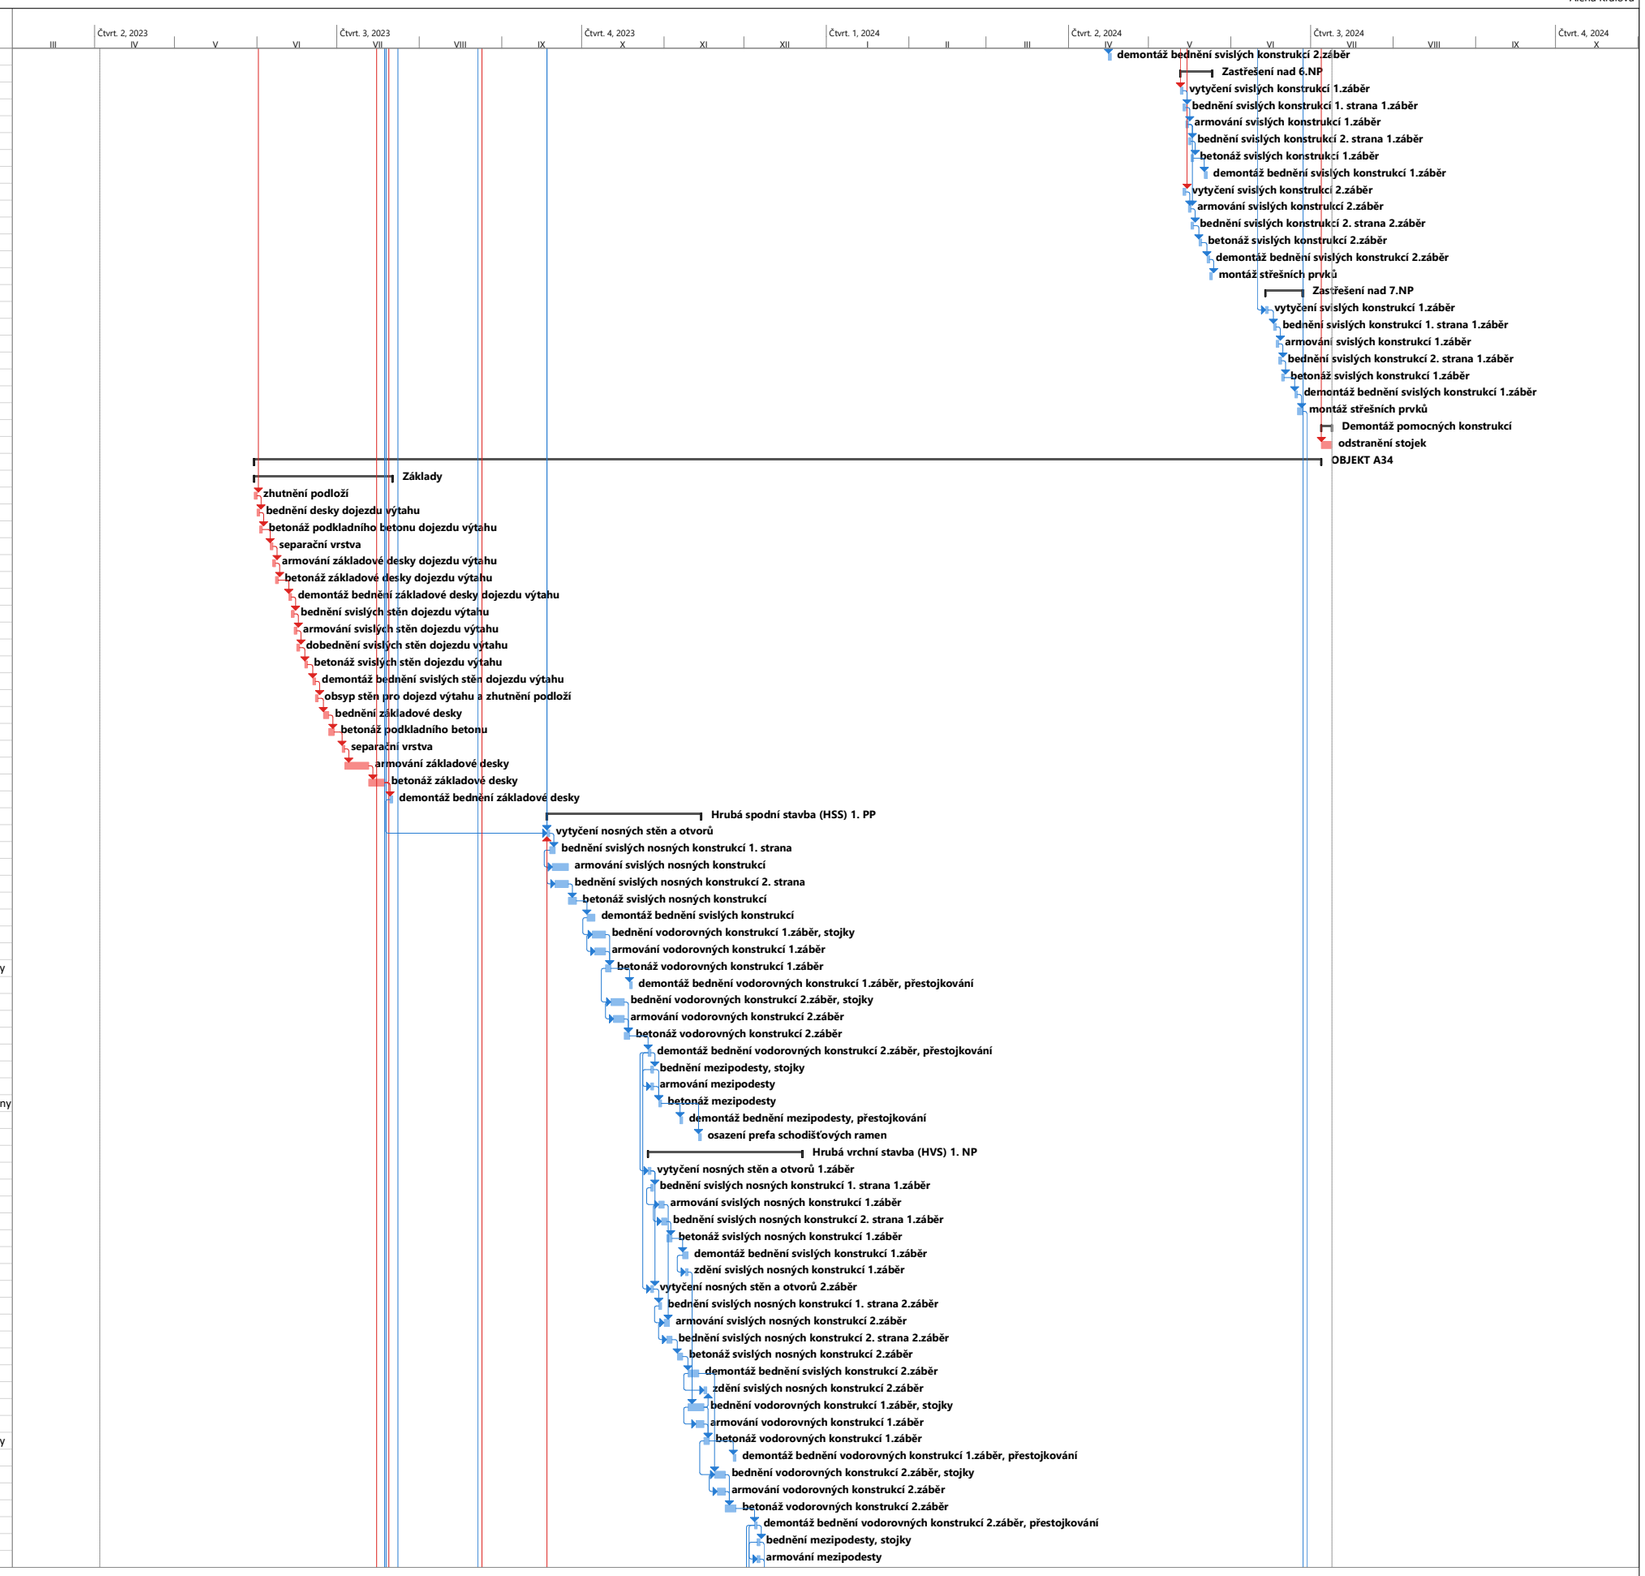

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
811		betonáž mezipodesty	1 den	07.12. 23	07.12. 23	809;810	812FS+5 dny;813FS+10 dny
812		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	15.12. 23	15.12. 23	811FS+5 dny	
813		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	22.12. 23	22.12. 23	811FS+10 dny	
814		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**41 dny**	**05.12. 23**	**07.02. 24**		
815		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	05.12. 23	05.12. 23	808SS	816;821
816		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	06.12. 23	07.12. 23	815	817SS+1 den
817		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	07.12. 23	08.12. 23	816SS+1 den	818SS+1 den;823
818		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	08.12. 23	11.12. 23	817SS+1 den	819
819		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.12. 23	13.12. 23	818	820FS+2 dny
820		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	18.12. 23	19.12. 23	819FS+2 dny	827
821		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	06.12. 23	06.12. 23	808SS;815	822
822		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	07.12. 23	08.12. 23	821	823SS+1 den
823		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	11.12. 23	12.12. 23	817;822SS+1 den	824SS+1 den
824		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	12.12. 23	13.12. 23	823SS+1 den	825
825		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.12. 23	15.12. 23	824	826FS+2 dny
826		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	20.12. 23	21.12. 23	825FS+2 dny	831
827		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	20.12. 23	22.12. 23	820	828SS+1 den;829
828		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	21.12. 23	02.01. 24	827SS+1 den	829
829		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	03.01. 24	04.01. 24	827;828	830FS+5 dny;831SS+2 dny
830		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	12.01. 24	12.01. 24	829FS+5 dny	
831		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	05.01. 24	09.01. 24	826;829SS+2 dny	832SS+1 den;833
832		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	08.01. 24	10.01. 24	831SS+1 den	833
833		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	11.01. 24	11.01. 24	831;832	834FS+5 dny
834		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	19.01. 24	19.01. 24	833FS+5 dny	835;841SS;847SS
835		bednění mezipodesty, stojky	1 den	22.01. 24	22.01. 24	834	836SS;837
836		armování mezipodesty	1 den	22.01. 24	22.01. 24	835SS	837
837		betonáž mezipodesty	1 den	23.01. 24	23.01. 24	835;836	838FS+5 dny;839FS+10 dny
838		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	31.01. 24	31.01. 24	837FS+5 dny	
839		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	07.02. 24	07.02. 24	837FS+10 dny	
840		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**41 dny**	**19.01. 24**	**15.03. 24**		
841		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	19.01. 24	19.01. 24	834SS	842;847
842		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	22.01. 24	23.01. 24	841	843SS+1 den
843		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	23.01. 24	24.01. 24	842SS+1 den	844SS+1 den;849
844		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	24.01. 24	25.01. 24	843SS+1 den	845
845		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.01. 24	29.01. 24	844	846FS+2 dny
846		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	01.02. 24	02.02. 24	845FS+2 dny	853
847		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	22.01. 24	22.01. 24	834SS;841	848
848		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	23.01. 24	24.01. 24	847	849SS+1 den
849		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	843;848SS+1 den	850SS+1 den
850		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	26.01. 24	29.01. 24	849SS+1 den	851
851		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.01. 24	31.01. 24	850	852FS+2 dny
852		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.02. 24	06.02. 24	851FS+2 dny	857
853		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	05.02. 24	08.02. 24	846	854SS+1 den;855
854		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	06.02. 24	08.02. 24	853SS+1 den	855
855		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	853;854	856FS+5 dny;857SS+2 dny
856		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	20.02. 24	20.02. 24	855FS+5 dny	
857		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	13.02. 24	15.02. 24	852;855SS+2 dny	858SS+1 den;859
858		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	14.02. 24	16.02. 24	857SS+1 den	859
859		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.02. 24	19.02. 24	857;858	860FS+5 dny
860		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	27.02. 24	27.02. 24	859FS+5 dny	861;867SS;873SS
861		bednění mezipodesty, stojky	1 den	28.02. 24	28.02. 24	860	862SS;863
862		armování mezipodesty	1 den	28.02. 24	28.02. 24	861SS	863
863		betonáž mezipodesty	1 den	29.02. 24	29.02. 24	861;862	864FS+5 dny;865FS+10 dny
864		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	08.03. 24	08.03. 24	863FS+5 dny	
865		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	15.03. 24	15.03. 24	863FS+10 dny	
866		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**41 dny**	**27.02. 24**	**23.04. 24**		
867		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	27.02. 24	27.02. 24	860SS	868;873
868		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	28.02. 24	29.02. 24	867	869SS+1 den
869		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	868SS+1 den	870SS+1 den;875
870		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	01.03. 24	04.03. 24	869SS+1 den	871
871		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	05.03. 24	06.03. 24	870	872FS+2 dny
872		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.03. 24	12.03. 24	871FS+2 dny	879
873		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	28.02. 24	28.02. 24	860SS;867	874
874		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	873	875SS+1 den
875		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.03. 24	05.03. 24	869;874SS+1 den	876SS+1 den
876		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	05.03. 24	06.03. 24	875SS+1 den	877
877		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.03. 24	08.03. 24	876	878FS+2 dny
878		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.03. 24	14.03. 24	877FS+2 dny	883
879		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	13.03. 24	18.03. 24	872	880SS+1 den;881
880		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	14.03. 24	18.03. 24	879SS+1 den	881
881		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	19.03. 24	20.03. 24	879;880	882FS+5 dny;883SS+2 dny
882		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	28.03. 24	28.03. 24	881FS+5 dny	
883		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	21.03. 24	25.03. 24	878;881SS+2 dny	884SS+1 den;885
884		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	22.03. 24	26.03. 24	883SS+1 den	885
885		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	27.03. 24	27.03. 24	883;884	886FS+5 dny
886		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	04.04. 24	04.04. 24	885FS+5 dny	887;893SS;899SS
887		bednění mezipodesty, stojky	1 den	05.04. 24	05.04. 24	886	888SS;889
888		armování mezipodesty	1 den	05.04. 24	05.04. 24	887SS	889
889		betonáž mezipodesty	1 den	08.04. 24	08.04. 24	887;888	890FS+5 dny;891FS+10 dny
890		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	16.04. 24	16.04. 24	889FS+5 dny	
891		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	23.04. 24	23.04. 24	889FS+10 dny	
892		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**40 dny**	**04.04. 24**	**29.05. 24**		
893		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	04.04. 24	04.04. 24	886SS	894;899
894		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	05.04. 24	08.04. 24	893	895SS+1 den
895		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.04. 24	09.04. 24	894SS+1 den	896SS+1 den;901
896		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	09.04. 24	10.04. 24	895SS+1 den	897
897		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.04. 24	12.04. 24	896	898FS+2 dny
898		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	17.04. 24	18.04. 24	897FS+2 dny	905
899		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	886SS;893	900
900		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	08.04. 24	09.04. 24	899	901SS+1 den

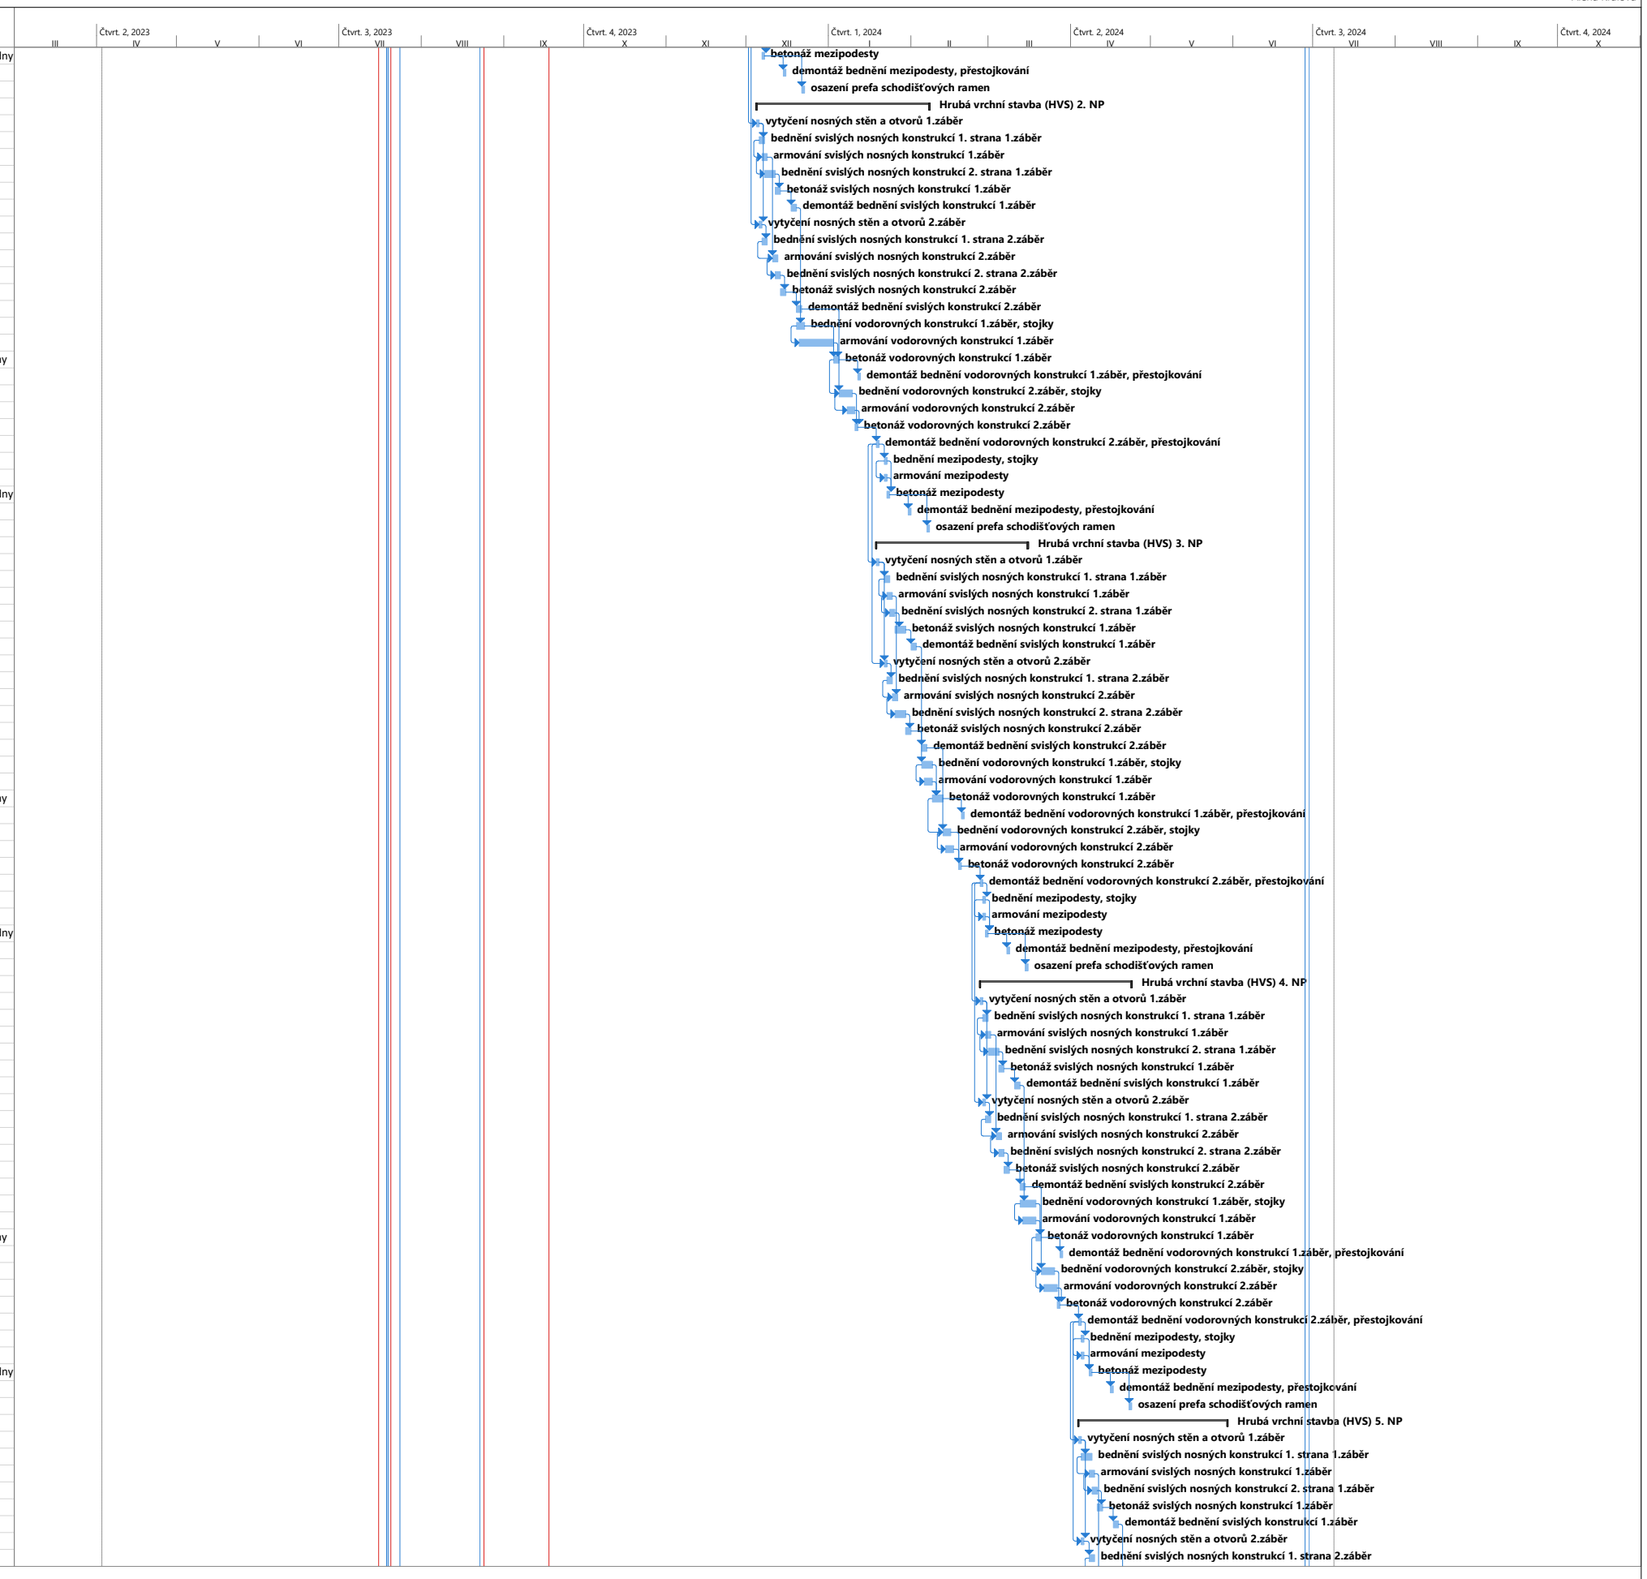

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
901		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.04. 24	11.04. 24	895;900SS+1 den	902SS+1 den
902		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	11.04. 24	12.04. 24	901SS+1 den	903
903		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.04. 24	16.04. 24	902	904FS+2 dny
904		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.04. 24	22.04. 24	903FS+2 dny	909
905		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	19.04. 24	23.04. 24	898	906SS+1 den;907
906		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.04. 24	23.04. 24	905SS+1 den	907
907		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	24.04. 24	25.04. 24	905;906	908FS+5 dny;909SS+2 dny
908		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	03.05. 24	03.05. 24	907FS+5 dny	
909		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	26.04. 24	30.04. 24	904;907SS+2 dny	910SS+1 den;911
910		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	29.04. 24	30.04. 24	909SS+1 den	911
911		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	01.05. 24	02.05. 24	909;910	912FS+5 dny
912		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	10.05. 24	10.05. 24	911FS+5 dny	913;919SS;926SS
913		bednění mezipodesty, stojky	1 den	13.05. 24	13.05. 24	912	914SS;915
914		armování mezipodesty	1 den	13.05. 24	13.05. 24	913SS	915
915		betonáž mezipodesty	1 den	14.05. 24	14.05. 24	913;914	916FS+5 dny;917FS+10 dny
916		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	22.05. 24	22.05. 24	915FS+5 dny	
917		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	29.05. 24	29.05. 24	915FS+10 dny	
918		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**24 dny**	**10.05. 24**	**12.06. 24**		
919		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	10.05. 24	10.05. 24	912SS	920;926
920		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	919	921SS+1 den
921		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	920SS+1 den	922SS+1 den
922		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	921SS+1 den	923
923		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	922	924FS+2 dny
924		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	21.05. 24	21.05. 24	923FS+2 dny	925SS+1 den
925		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	3 dny	22.05. 24	24.05. 24	924SS+1 den	933
926		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	912SS;919	927;947SS;942
927		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	926	928SS+1 den
928		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	927SS+1 den	929SS+1 den;943
929		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	928SS+1 den	930
930		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	17.05. 24	17.05. 24	929	931FS+2 dny
931		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	930FS+2 dny	932SS+1 den;937
932		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	3 dny	23.05. 24	27.05. 24	931SS+1 den	
933		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	1 den	27.05. 24	27.05. 24	925	934SS+1 den;935
934		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	28.05. 24	28.05. 24	933SS+1 den	935
935		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	29.05. 24	29.05. 24	933;934	936FS+5 dny;937SS+2 dny
936		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	06.06. 24	06.06. 24	935FS+5 dny	
937		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	31.05. 24	03.06. 24	931;935SS+2 dny	938SS+1 den;939
938		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	03.06. 24	03.06. 24	937SS+1 den	939
939		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	04.06. 24	04.06. 24	937;938	940FS+5 dny;967FS+20 dny
940		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	12.06. 24	12.06. 24	939FS+5 dny	953SS
941		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**10 dny**	**14.05. 24**	**27.05. 24**		
942		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	926	943;947
943		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	16.05. 24	16.05. 24	928;942	944;948
944		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	17.05. 24	20.05. 24	943	945;949
945		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	21.05. 24	21.05. 24	944	946FS+2 dny
946		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	24.05. 24	24.05. 24	945FS+2 dny	
947		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	926SS;942	948
948		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	17.05. 24	17.05. 24	943;947	949
949		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	21.05. 24	21.05. 24	944;948	950
950		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	949	951FS+2 dny
951		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	27.05. 24	27.05. 24	950FS+2 dny	
952		**Zastřešení nad 6.NP**	**11 dny**	**12.06. 24**	**26.06. 24**		
953		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	12.06. 24	12.06. 24	940SS	954;959
954		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	13.06. 24	13.06. 24	953	955
955		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.06. 24	14.06. 24	954	956
956		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	17.06. 24	17.06. 24	955	957
957		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	18.06. 24	18.06. 24	956	958FS+2 dny
958		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	21.06. 24	21.06. 24	957FS+2 dny	
959		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	13.06. 24	13.06. 24	953	960
960		bednění svislých konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	14.06. 24	14.06. 24	959	961
961		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	17.06. 24	17.06. 24	960	962
962		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	18.06. 24	18.06. 24	961	963
963		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	19.06. 24	19.06. 24	962	964FS+2 dny
964		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	24.06. 24	24.06. 24	963FS+2 dny	965
965		montáž střešních prvků	2 dny	25.06. 24	26.06. 24	964	990
966		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**03.07. 24**	**04.07. 24**		
967		odstranění stojek	2 dny	03.07. 24	04.07. 24	939FS+20 dny	
968		**GARÁŽE ABC**	**64 dny**	**19.07. 23**	**16.10. 23**		
969		**Základy**	**25 dny**	**19.07. 23**	**22.08. 23**		
970		zhutnění podloží	1 den	19.07. 23	19.07. 23	68;764;291;512	971;31SS
971		bednění základové desky	2 dny	20.07. 23	21.07. 23	970	972
972		betonáž podkladního betonu	6 dny	24.07. 23	31.07. 23	971;28	973FS+1 den
973		separační vrstva	1 den	02.08. 23	02.08. 23	972FS+1 den	974
974		armování základové desky	6 dny	03.08. 23	10.08. 23	973	975SS+3 dny
975		betonáž základové desky	8 dny	08.08. 23	17.08. 23	974SS+3 dny	976FS+2 dny
976		demontáž bednění základové desky	1 den	22.08. 23	22.08. 23	975FS+2 dny	71;294;515;767;39;978
977		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**39 dny**	**23.08. 23**	**16.10. 23**		
978		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	976;37	979
979		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	978	980SS+1 den
980		armování svislých nosných konstrukcí	2 dny	25.08. 23	28.08. 23	979SS+1 den	981SS+1 den
981		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	4 dny	28.08. 23	31.08. 23	980SS+1 den	982
982		betonáž svislých nosných konstrukcí	2 dny	01.09. 23	04.09. 23	981	983FS+3 dny
983		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	08.09. 23	11.09. 23	982FS+3 dny	984
984		bednění vodorovných konstrukcí, stojky	11 dny	12.09. 23	26.09. 23	983	985FF;986SS+5 dny
985		armování vodorovných konstrukcí	9 dny	14.09. 23	26.09. 23	984FF	
986		betonáž vodorovných konstrukcí	11 dny	19.09. 23	03.10. 23	984SS+5 dny	987FS+5 dny
987		demontáž bednění vodorovných konstrukcí, přestojkování	4 dny	11.10. 23	16.10. 23	986FS+5 dny	990
988		**Demontáž věžového jeřábu**	**2 dny**	**28.06. 24**	**01.07. 24**		
989		demontáž věžového jeřábu 1	1 den	01.07. 24	01.07. 24	990	
990		demontáž věžového jeřábu 2	1 den	28.06. 24	28.06. 24	987;48;269;490;742;965	989

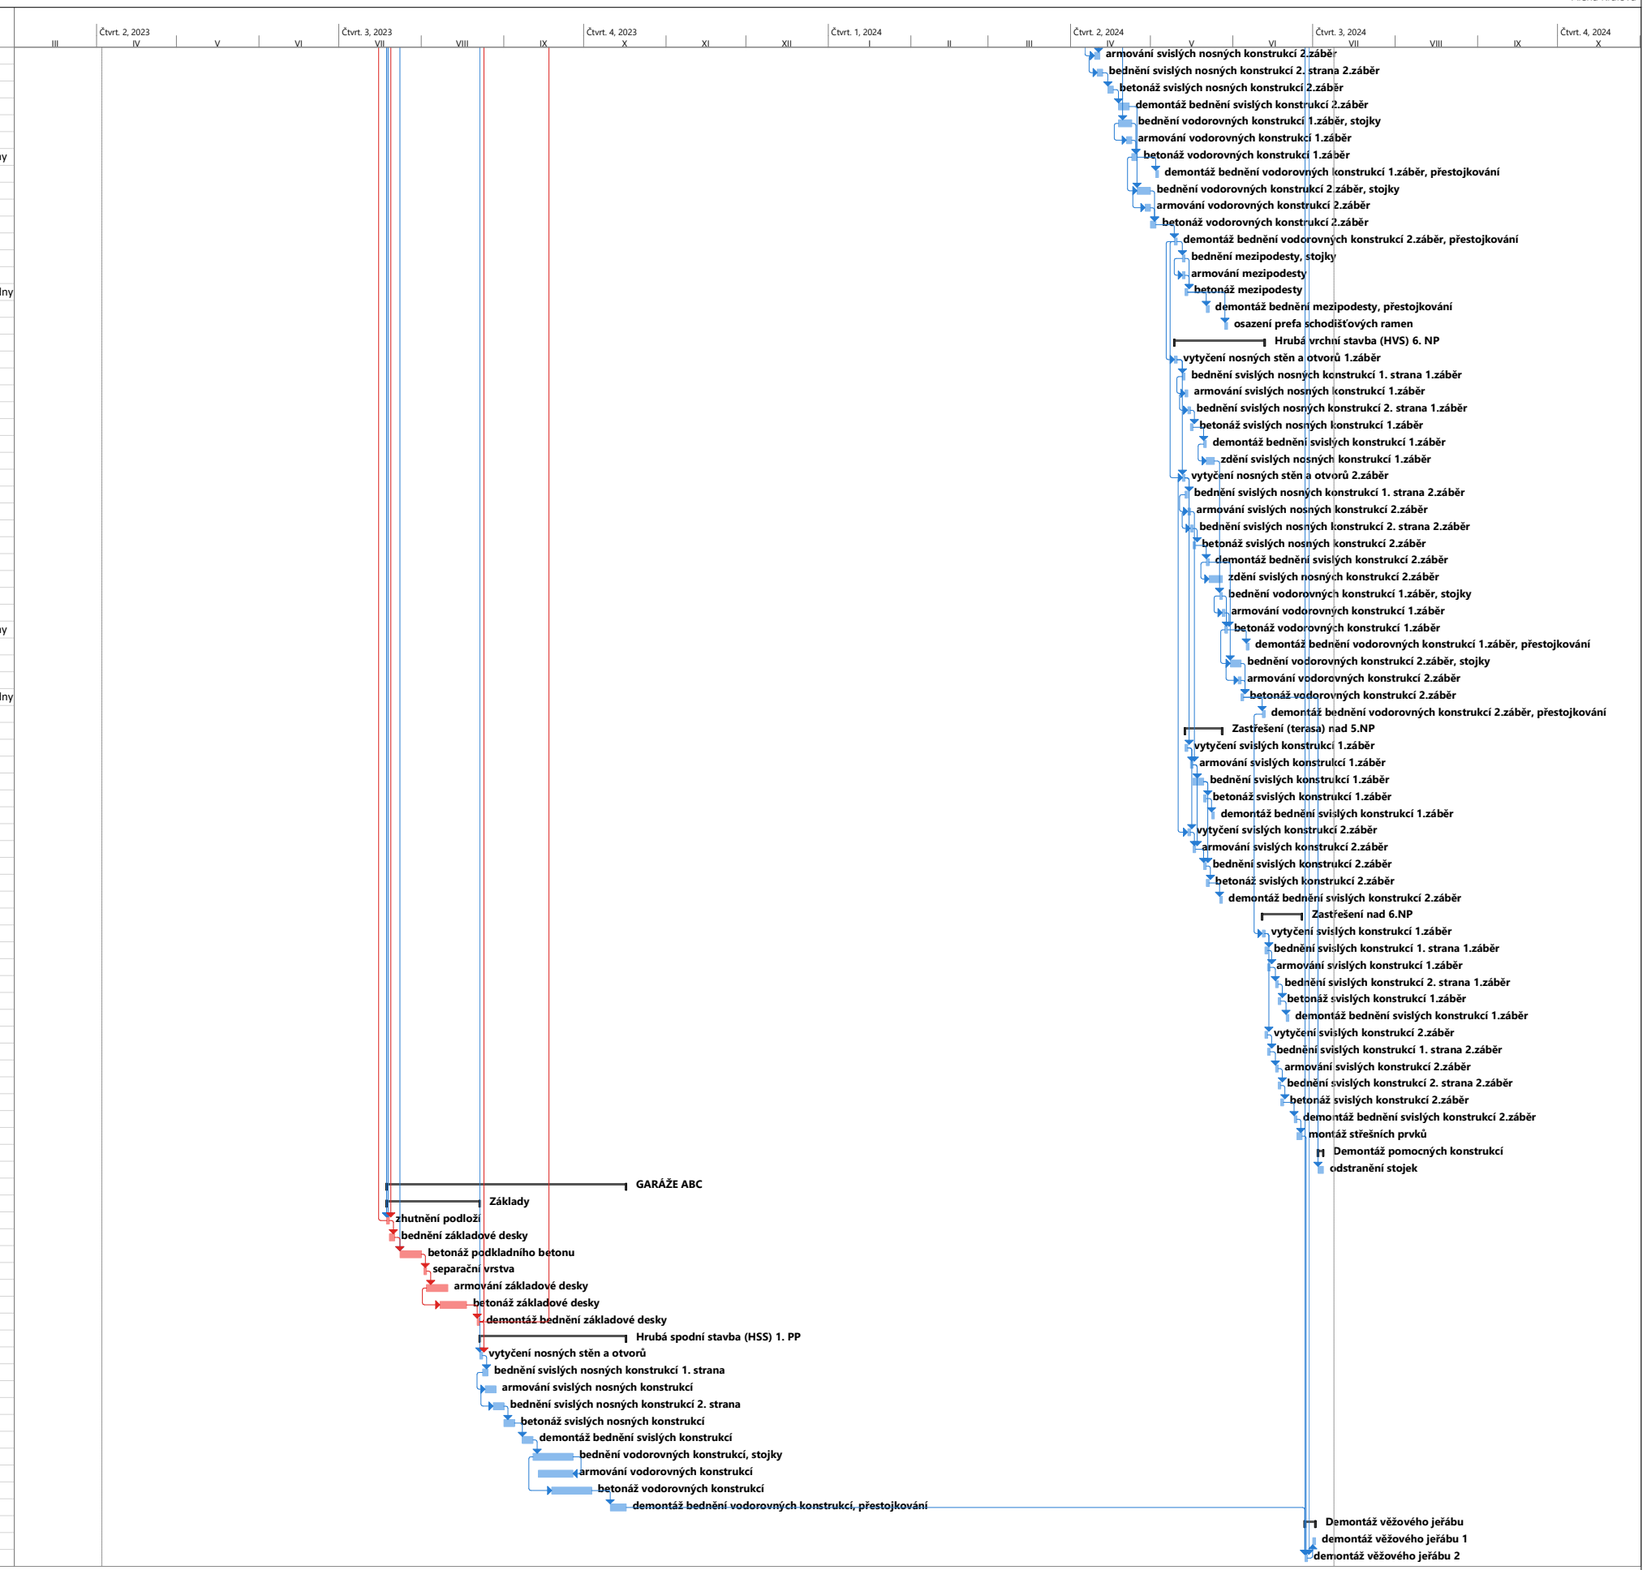

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA
TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT

BYTOVÝ DŮM KOTI HYACINT V PRAZE

2022

ALENA KRÁLOVÁ

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
ING. VÁCLAV POSPÍCHAL, PH.D.

4.6 GANTTŮV DIAGRAM
- VARIANTA Č.2

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
1		**HRUBÁ STAVBA KOTI HYACINT**	**526 dny**	**03.04. 23**	**29.04. 25**		
2		**Přípravné práce ABC**	**39 dny**	**03.04. 23**	**25.05. 23**		
3		převzetí staveniště	1 den	03.04. 23	03.04. 23		4
4		vytyčení staveniště a sítí	1 den	04.04. 23	04.04. 23	3	5
5		odstranění náletových rostlin	1 den	05.04. 23	05.04. 23	4	6
6		sejmutí ornice a uložení na mezideponii	5 dny	06.04. 23	12.04. 23	5	7;9
7		zařízení staveniště včetně oplocení 1.etapa	5 dny	13.04. 23	19.04. 23	6	
8		zařízení staveniště 2.etapa (po výkopu jámy)	2 dny	24.05. 23	25.05. 23	18	
9		výkopy pro staveništní rozvody	2 dny	13.04. 23	14.04. 23	6	10;11
10		přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)	1 den	17.04. 23	17.04. 23	9	12;13
11		přípojky inženýrských sítí (elektro)	1 den	17.04. 23	17.04. 23	9	12;13
12		vedení sítí v zemi k staveništnímu zařízení (VOD, ELE)	3 dny	18.04. 23	20.04. 23	10;11	13
13		zásyp rýh pro inženýrské sítě	1 den	21.04. 23	21.04. 23	10;11;12	14;15
14		napojení zařízení staveniště (vodovod, kanalizace)	1 den	24.04. 23	24.04. 23	13	17
15		napojení zařízení staveniště (elektro)	1 den	24.04. 23	24.04. 23	13	17
16		**Zemní práce ABC**	**28 dny**	**25.04. 23**	**01.06. 23**		
17		vytyčení stavební jámy	1 den	25.04. 23	25.04. 23	15;14	18
18		výkop jámy a nakládání výkopu	20 dny	26.04. 23	23.05. 23	17	19FF;8
19		zřízení záporového pažení	11 dny	09.05. 23	23.05. 23	18FF	20
20		vytyčení základů	1 den	24.05. 23	24.05. 23	19	21
21		výkop základů a přesmítění výkopku na skládku	3 dny	25.05. 23	29.05. 23	20	22
22		ruční dočištění výkopu na základovou spáru/ruční začištění jámy/r	1 den	30.05. 23	30.05. 23	21	23;495;747;274;51
23		uložení zemnícího pásku	2 dny	31.05. 23	01.06. 23	22	25
24		**Zřízení věžového jeřábu**	**259 dny**	**02.06. 23**	**06.06. 24**		
25		armování základu pod jeřáb	1 den	02.06. 23	02.06. 23	23	26
26		betonáž základu pod jeřáb	1 den	05.06. 23	05.06. 23	25	
27		zřízení věžového jeřábu 1	1 den	06.06. 24	06.06. 24	990	39;515;767
28		zřízení věžového jeřábu 2	1 den	19.07. 23	19.07. 23	970SS	
29		**RAMPA DO GARÁŽÍ**	**245 dny**	**19.07. 23**	**03.07. 24**		
30		**Základy**	**10 dny**	**19.07. 23**	**01.08. 23**		
31		zhutnění podloží	1 den	19.07. 23	19.07. 23	970SS	32
32		bednění základové desky	1 den	20.07. 23	20.07. 23	31	33
33		betonáž podkladního betonu	1 den	21.07. 23	21.07. 23	32	34FS+1 den
34		separační vrstva	1 den	25.07. 23	25.07. 23	33FS+1 den	35
35		armování základové desky	1 den	26.07. 23	26.07. 23	34	36
36		betonáž základové desky	1 den	27.07. 23	27.07. 23	35	37FS+2 dny
37		demontáž bednění základové desky	1 den	01.08. 23	01.08. 23	36FS+2 dny	71;294;978
38		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**19 dny**	**07.06. 24**	**03.07. 24**		**989**
39		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	07.06. 24	07.06. 24	27	40
40		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	1 den	10.06. 24	10.06. 24	39	41SS+1 den
41		armování svislých nosných konstrukcí	1 den	11.06. 24	11.06. 24	40SS+1 den	42SS+1 den
42		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	1 den	12.06. 24	12.06. 24	41SS+1 den	43
43		betonáž svislých nosných konstrukcí	1 den	13.06. 24	13.06. 24	42	44FS+3 dny
44		demontáž bednění svislých konstrukcí	1 den	19.06. 24	19.06. 24	43FS+3 dny	45
45		bednění vodorovných konstrukcí, stojky	2 dny	20.06. 24	21.06. 24	44	46SS+1 den
46		armování vodorovných konstrukcí	2 dny	21.06. 24	24.06. 24	45SS+1 den	47
47		betonáž vodorovných konstrukcí	1 den	25.06. 24	25.06. 24	46	48FS+5 dny
48		demontáž bednění vodorovných konstrukcí, přestojkování	1 den	03.07. 24	03.07. 24	47FS+5 dny	
49		**OBJEKT A12**	**265 dny**	**31.05. 23**	**12.06. 24**		
50		**Základy**	**37 dny**	**31.05. 23**	**20.07. 23**		
51		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	52
52		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	51	53
53		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	52	54FS+1 den
54		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	53FS+1 den	55
55		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	54	56
56		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	55	57FS+2 dny
57		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	56FS+2 dny	58
58		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	57	59
59		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	58	60
60		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	59	61
61		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	60	62FS+2 dny
62		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	61FS+2 dny	63
63		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	62	64
64		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	63	65
65		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	64	66FS+1 den
66		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	65FS+1 den	67
67		armování základové desky	6 dny	04.07. 23	11.07. 23	66	68
68		betonáž základové desky	4 dny	12.07. 23	17.07. 23	67	69FS+2 dny;970
69		demontáž bednění základové desky	1 den	20.07. 23	20.07. 23	68FS+2 dny	
70		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**41 dny**	**23.08. 23**	**18.10. 23**		
71		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	37;976	72
72		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	71	73SS+1 den
73		armování svislých nosných konstrukcí	3 dny	25.08. 23	29.08. 23	72SS+1 den	74SS+1 den
74		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	3 dny	28.08. 23	30.08. 23	73SS+1 den	75
75		betonáž svislých nosných konstrukcí	3 dny	31.08. 23	04.09. 23	74	76FS+2 dny
76		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	07.09. 23	08.09. 23	75FS+2 dny	77SS+1 den
77		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	08.09. 23	12.09. 23	76SS+1 den	78SS+1 den;79
78		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.09. 23	12.09. 23	77SS+1 den	79
79		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.09. 23	14.09. 23	77;78	80FS+5 dny;81SS+2 dny
80		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	22.09. 23	22.09. 23	79FS+5 dny	
81		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	15.09. 23	19.09. 23	79SS+2 dny	82SS+1 den;83
82		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	18.09. 23	19.09. 23	81SS+1 den	83
83		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	20.09. 23	21.09. 23	81;82	84FS+5 dny
84		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	29.09. 23	29.09. 23	83FS+5 dny	85;91SS;98SS
85		bednění mezipodesty, stojky	1 den	02.10. 23	02.10. 23	84	86SS;87
86		armování mezipodesty	1 den	02.10. 23	02.10. 23	85SS	87
87		betonáž mezipodesty	1 den	03.10. 23	03.10. 23	85;86	88FS+5 dny;89FS+10 dny
88		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	11.10. 23	11.10. 23	87FS+5 dny	
89		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	18.10. 23	18.10. 23	87FS+10 dny	
90		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**42 dny**	**29.09. 23**	**27.11. 23**		

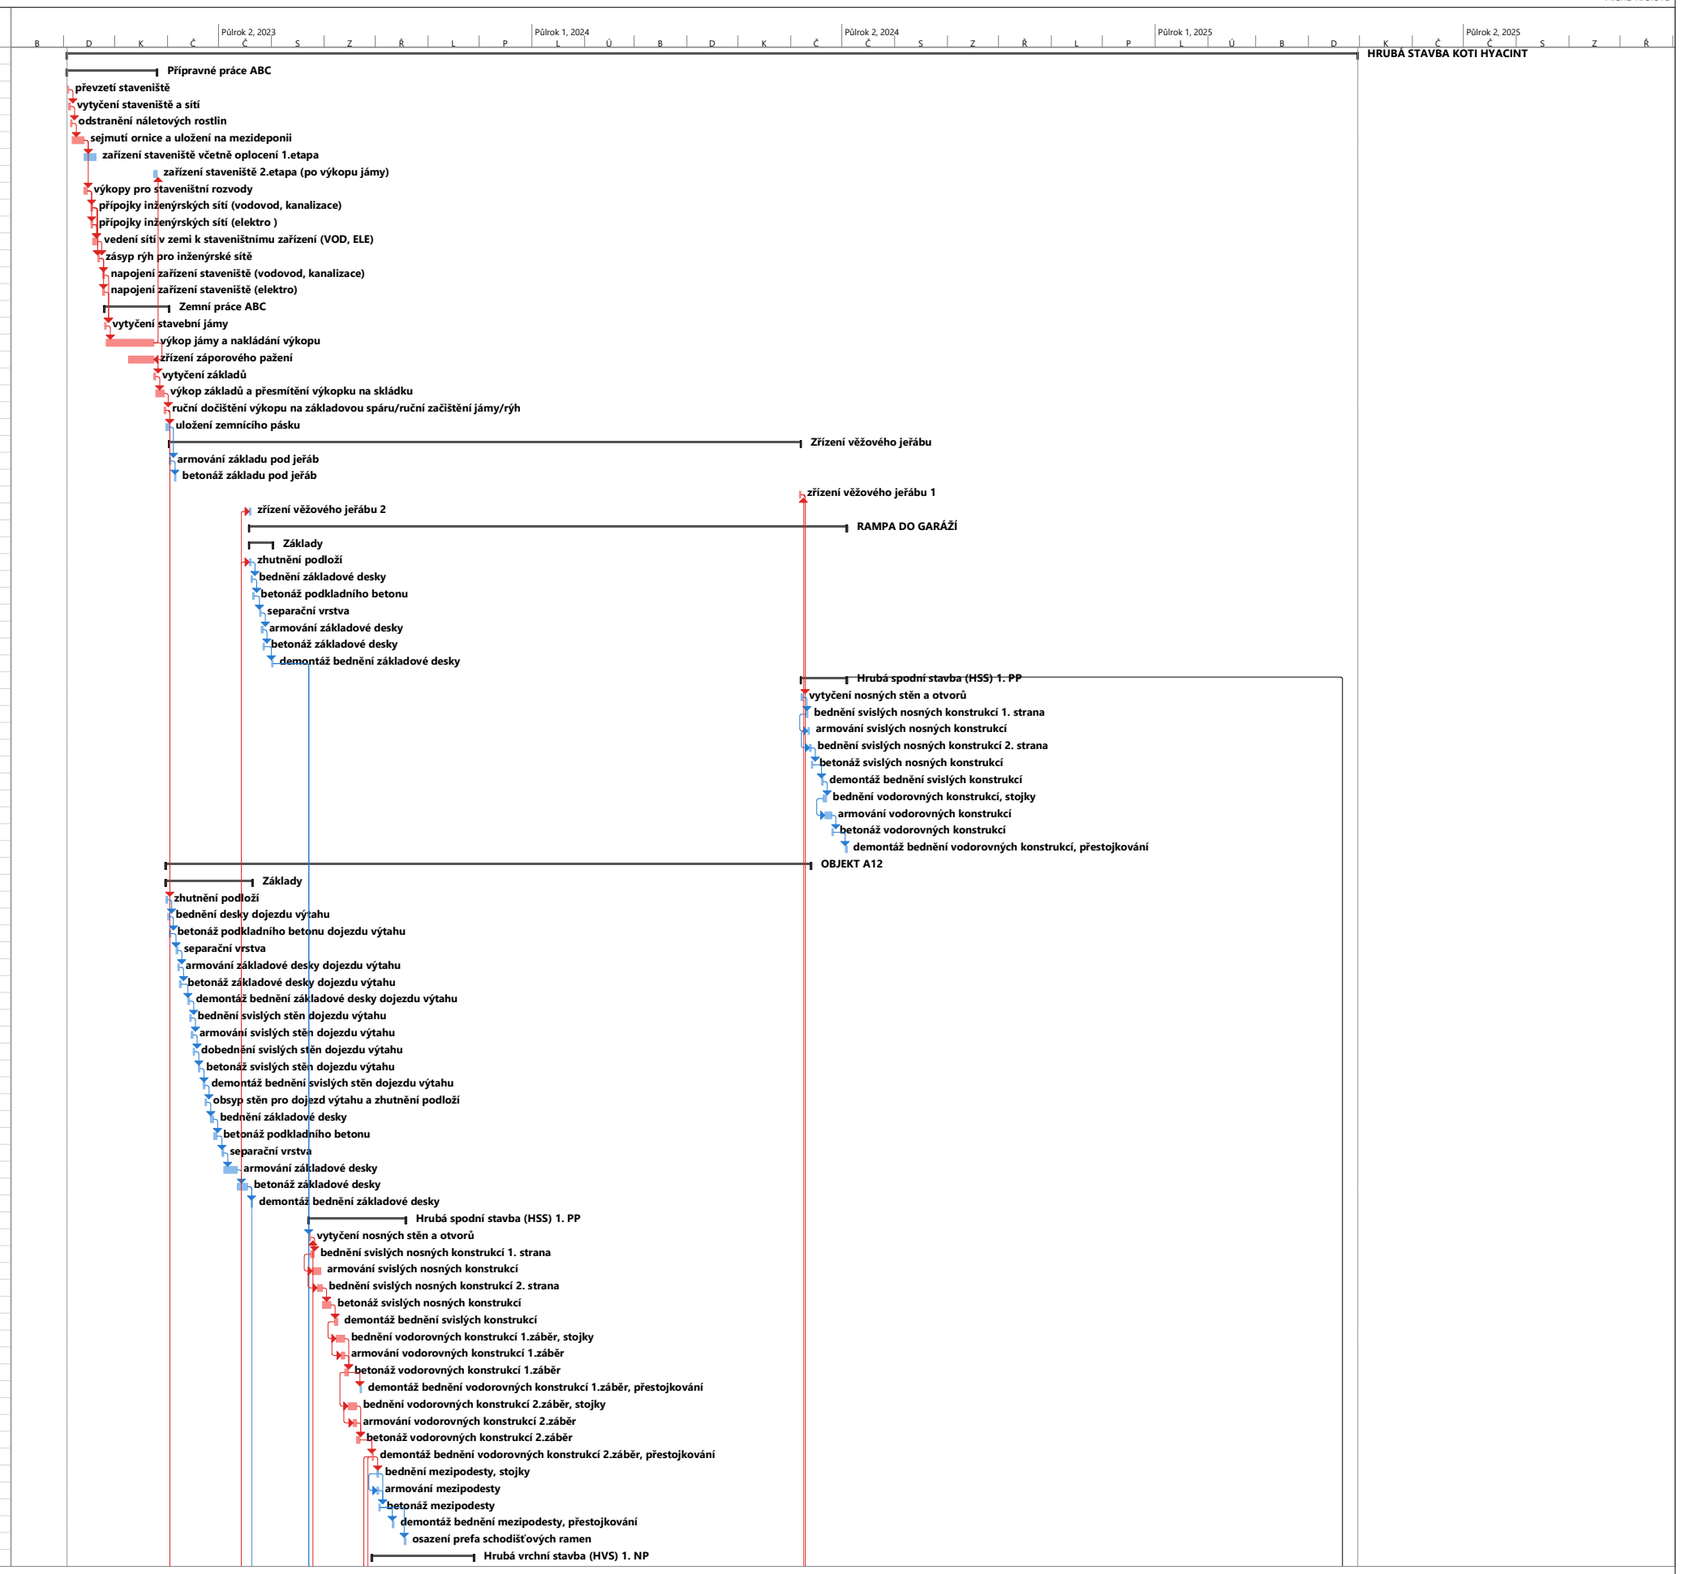

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
91		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	29.09. 23	29.09. 23	84SS	92;98
92		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	02.10. 23	02.10. 23	91	93SS+1 den
93		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	03.10. 23	04.10. 23	92SS+1 den	94SS+1 den;100
94		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	93SS+1 den	95
95		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	94	96FS+2 dny
96		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.10. 23	13.10. 23	95FS+2 dny	97SS+1 den
97		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	13.10. 23	13.10. 23	96SS+1 den	105
98		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	02.10. 23	02.10. 23	84SS;91	99
99		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	03.10. 23	03.10. 23	98	100SS+1 den
100		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.10. 23	06.10. 23	93;99SS+1 den	101SS+1 den
101		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	100SS+1 den	102
102		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.10. 23	11.10. 23	101	103FS+2 dny
103		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	16.10. 23	17.10. 23	102FS+2 dny	104FS+1 den;109
104		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.10. 23	19.10. 23	103FS+1 den	
105		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	16.10. 23	19.10. 23	97	106SS+1 den;107
106		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	17.10. 23	19.10. 23	105SS+1 den	107
107		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.10. 23	23.10. 23	105;106	108FS+5 dny;109SS+2 dny
108		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	31.10. 23	31.10. 23	107FS+5 dny	
109		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	24.10. 23	27.10. 23	103;107SS+2 dny	110SS+1 den;111
110		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	25.10. 23	27.10. 23	109SS+1 den	111
111		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.10. 23	31.10. 23	109;110	112FS+5 dny
112		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	08.11. 23	08.11. 23	111FS+5 dny	113;125SS;119SS
113		bednění mezipodesty, stojky	1 den	09.11. 23	09.11. 23	112	114SS;115
114		armování mezipodesty	1 den	09.11. 23	09.11. 23	113SS	115
115		betonáž mezipodesty	1 den	10.11. 23	10.11. 23	113;114	116FS+5 dny;117FS+10 dny
116		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	20.11. 23	20.11. 23	115FS+5 dny	
117		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	27.11. 23	27.11. 23	115FS+10 dny	
118		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**42 dny**	**08.11. 23**	**12.01. 24**		
119		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	08.11. 23	08.11. 23	112SS	120;125
120		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	09.11. 23	10.11. 23	119	121SS+1 den
121		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	120SS+1 den	122SS+1 den;127
122		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	13.11. 23	14.11. 23	121SS+1 den	123
123		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.11. 23	16.11. 23	122	124FS+2 dny;129
124		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	21.11. 23	22.11. 23	123FS+2 dny	131
125		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	09.11. 23	09.11. 23	112SS;119	126
126		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	125	127SS+1 den
127		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.11. 23	15.11. 23	121;126SS+1 den	128SS+1 den
128		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	15.11. 23	16.11. 23	127SS+1 den	129
129		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	17.11. 23	20.11. 23	123;128	130FS+2 dny
130		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	23.11. 23	24.11. 23	129FS+2 dny	135
131		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	23.11. 23	27.11. 23	124	132SS+1 den;133
132		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	24.11. 23	28.11. 23	131SS+1 den	133
133		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	29.11. 23	29.11. 23	131;132	134FS+5 dny;135SS+2 dny
134		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	07.12. 23	07.12. 23	133FS+5 dny	
135		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	01.12. 23	06.12. 23	130;133SS+2 dny	136SS+1 den;137
136		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	04.12. 23	06.12. 23	135SS+1 den	137
137		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.12. 23	08.12. 23	135;136	138FS+5 dny
138		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	18.12. 23	18.12. 23	137FS+5 dny	139;151SS;145SS
139		bednění mezipodesty, stojky	1 den	19.12. 23	19.12. 23	138	140SS;141
140		armování mezipodesty	1 den	19.12. 23	19.12. 23	139SS	141
141		betonáž mezipodesty	1 den	20.12. 23	20.12. 23	139;140	142FS+5 dny;143FS+10 dny
142		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	05.01. 24	05.01. 24	141FS+5 dny	
143		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	12.01. 24	12.01. 24	141FS+10 dny	
144		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**42 dny**	**18.12. 23**	**21.02. 24**		
145		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	18.12. 23	18.12. 23	138SS	146;151
146		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	19.12. 23	20.12. 23	145	147SS+1 den
147		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.12. 23	21.12. 23	146SS+1 den	148SS+1 den;153
148		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	21.12. 23	22.12. 23	147SS+1 den	149
149		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.01. 24	03.01. 24	148	150FS+2 dny
150		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.01. 24	09.01. 24	149FS+2 dny	157
151		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	19.12. 23	19.12. 23	138SS;145	152
152		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	20.12. 23	21.12. 23	151	153SS+1 den
153		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.12. 23	02.01. 24	147;152SS+1 den	154SS+1 den
154		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	02.01. 24	03.01. 24	153SS+1 den	155
155		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.01. 24	05.01. 24	154	156FS+2 dny
156		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.01. 24	11.01. 24	155FS+2 dny	161
157		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	10.01. 24	12.01. 24	150	158SS+1 den;159
158		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	11.01. 24	15.01. 24	157SS+1 den	159
159		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	16.01. 24	16.01. 24	157;158	160FS+5 dny;161SS+2 dny
160		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	24.01. 24	24.01. 24	159FS+5 dny	
161		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	18.01. 24	23.01. 24	156;159SS+2 dny	162SS+1 den;163
162		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	19.01. 24	23.01. 24	161SS+1 den	163
163		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.01. 24	25.01. 24	161;162	164FS+5 dny
164		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	02.02. 24	02.02. 24	163FS+5 dny	165;177SS;171SS
165		bednění mezipodesty, stojky	1 den	05.02. 24	05.02. 24	164	166SS;167
166		armování mezipodesty	1 den	05.02. 24	05.02. 24	165SS	167
167		betonáž mezipodesty	1 den	06.02. 24	06.02. 24	165;166	168FS+5 dny;169FS+10 dny
168		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	14.02. 24	14.02. 24	167FS+5 dny	
169		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	21.02. 24	21.02. 24	167FS+10 dny	
170		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**42 dny**	**02.02. 24**	**01.04. 24**		
171		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	02.02. 24	02.02. 24	164SS	172;177
172		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	05.02. 24	06.02. 24	171	173SS+1 den
173		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.02. 24	07.02. 24	172SS+1 den	174SS+1 den;179
174		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	07.02. 24	08.02. 24	173SS+1 den	175
175		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	174	176FS+2 dny
176		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.02. 24	16.02. 24	175FS+2 dny	183
177		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	05.02. 24	05.02. 24	164SS;171	178
178		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	06.02. 24	07.02. 24	177	179SS+1 den
179		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.02. 24	09.02. 24	173;178SS+1 den	180SS+1 den
180		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	179SS+1 den	181

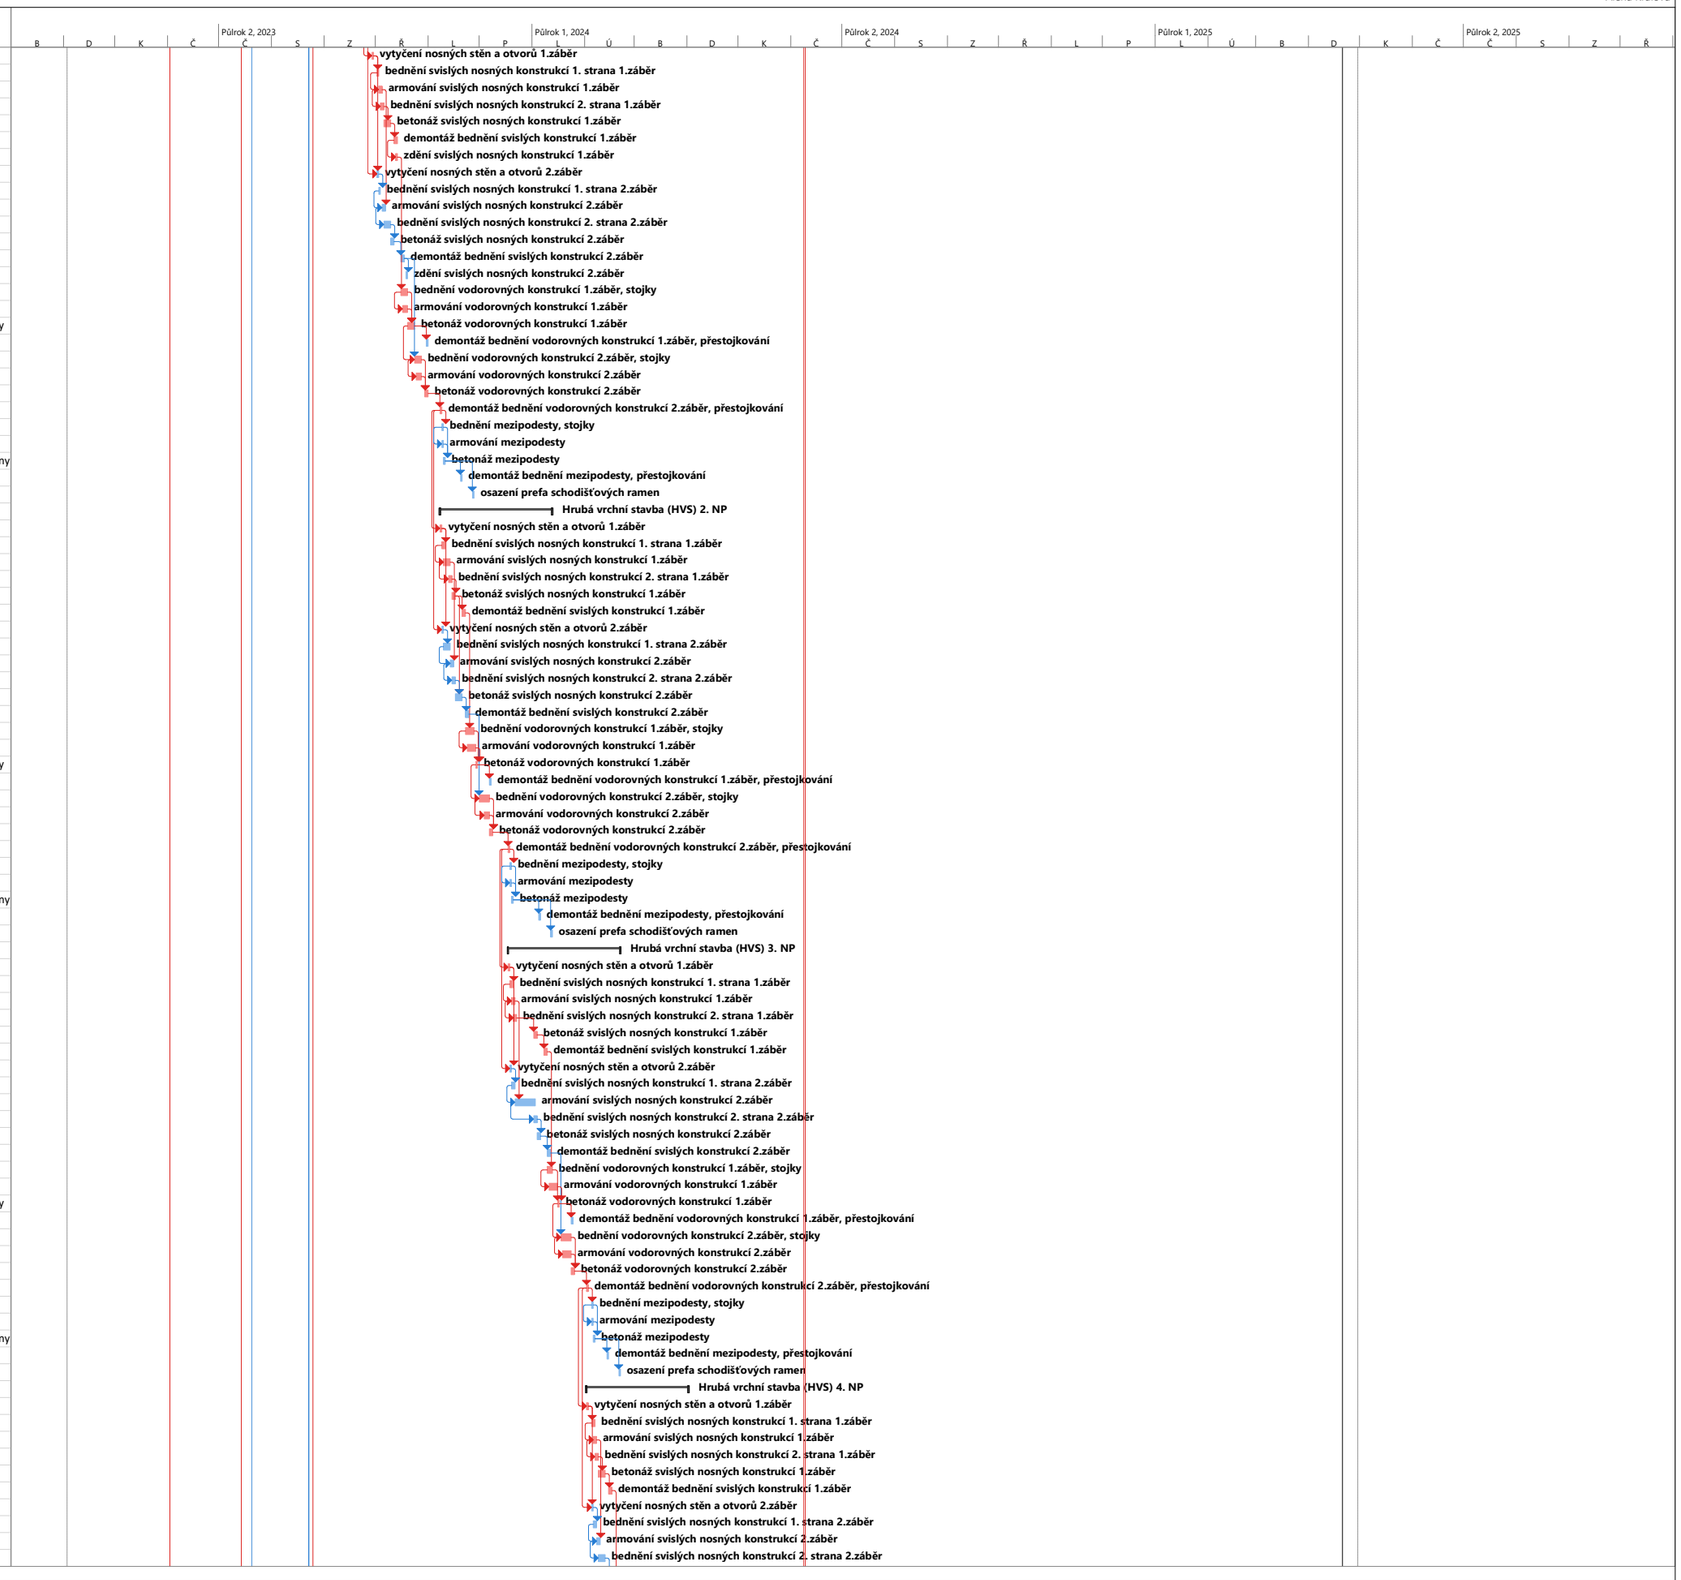

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
181		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.02. 24	14.02. 24	180	182FS+2 dny
182		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.02. 24	20.02. 24	181FS+2 dny	187
183		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	19.02. 24	21.02. 24	176	184SS+1 den;185
184		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	20.02. 24	22.02. 24	183SS+1 den	185
185		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	23.02. 24	23.02. 24	183;184	186FS+5 dny;187SS+2 dny
186		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	04.03. 24	04.03. 24	185FS+5 dny	
187		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	27.02. 24	01.03. 24	182;185SS+2 dny	188SS+1 den;189
188		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	28.02. 24	01.03. 24	187SS+1 den	189
189		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.03. 24	05.03. 24	187;188	190FS+5 dny
190		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	13.03. 24	13.03. 24	189FS+5 dny	191;203SS;197SS
191		bednění mezipodesty, stojky	1 den	14.03. 24	14.03. 24	190	192SS;193
192		armování mezipodesty	1 den	14.03. 24	14.03. 24	191SS	193
193		betonáž mezipodesty	1 den	15.03. 24	15.03. 24	191;192	194FS+5 dny;195FS+10 dny
194		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	25.03. 24	25.03. 24	193FS+5 dny	
195		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	01.04. 24	01.04. 24	193FS+10 dny	
196		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**40 dny**	**13.03. 24**	**07.05. 24**		
197		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	13.03. 24	13.03. 24	190SS	198;203
198		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	14.03. 24	15.03. 24	197	199SS+1 den
199		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	198SS+1 den	200SS+1 den;205
200		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	18.03. 24	19.03. 24	199SS+1 den	201
201		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.03. 24	21.03. 24	200	202FS+2 dny
202		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.03. 24	27.03. 24	201FS+2 dny	209
203		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	14.03. 24	14.03. 24	190SS;197	204
204		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	203	205SS+1 den
205		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.03. 24	20.03. 24	199;204SS+1 den	206SS+1 den
206		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	20.03. 24	21.03. 24	205SS+1 den	207
207		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.03. 24	25.03. 24	206	208FS+2 dny
208		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	28.03. 24	29.03. 24	207FS+2 dny	213
209		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	28.03. 24	01.04. 24	202	210SS+1 den;211
210		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.03. 24	01.04. 24	209SS+1 den	211
211		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.04. 24	03.04. 24	209;210	212FS+5 dny;213SS+2 dny
212		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	11.04. 24	11.04. 24	211FS+5 dny	
213		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	04.04. 24	08.04. 24	208;211SS+2 dny	214SS+1 den;215
214		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.04. 24	08.04. 24	213SS+1 den	215
215		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	09.04. 24	10.04. 24	213;214	216FS+5 dny
216		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	18.04. 24	18.04. 24	215FS+5 dny	217;230SS;223SS
217		bednění mezipodesty, stojky	1 den	19.04. 24	19.04. 24	216	218SS;219
218		armování mezipodesty	1 den	19.04. 24	19.04. 24	217SS	219
219		betonáž mezipodesty	1 den	22.04. 24	22.04. 24	217;218	220FS+5 dny;221FS+10 dny
220		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	30.04. 24	30.04. 24	219FS+5 dny	
221		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	07.05. 24	07.05. 24	219FS+10 dny	
222		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**24 dny**	**18.04. 24**	**21.05. 24**		
223		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	18.04. 24	18.04. 24	216SS	224;230;246SS
224		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	223	225SS+1 den
225		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	22.04. 24	22.04. 24	224SS+1 den	226SS+1 den
226		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	23.04. 24	23.04. 24	225SS+1 den	227
227		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	24.04. 24	24.04. 24	226	228FS+2 dny
228		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	29.04. 24	29.04. 24	227FS+2 dny	229SS+1 den
229		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	3 dny	30.04. 24	02.05. 24	228SS+1 den	237
230		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	216SS;223	231;251SS
231		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	22.04. 24	22.04. 24	230	232SS+1 den
232		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	23.04. 24	23.04. 24	231SS+1 den	233SS+1 den
233		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	24.04. 24	24.04. 24	232SS+1 den	234
234		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	25.04. 24	25.04. 24	233	235FS+2 dny
235		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	30.04. 24	30.04. 24	234FS+2 dny	236SS+1 den;241
236		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	3 dny	01.05. 24	03.05. 24	235SS+1 den	
237		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	1 den	03.05. 24	03.05. 24	229	238SS+1 den;239
238		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	06.05. 24	06.05. 24	237SS+1 den	239
239		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	07.05. 24	07.05. 24	237;238	240FS+5 dny;241SS+2 dny
240		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	15.05. 24	15.05. 24	239FS+5 dny	
241		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	09.05. 24	10.05. 24	235;239SS+2 dny	242SS+1 den;243
242		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	10.05. 24	10.05. 24	241SS+1 den	243
243		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	13.05. 24	13.05. 24	241;242	244FS+5 dny;271FS+20 dny
244		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	21.05. 24	21.05. 24	243FS+5 dny	263;257SS
245		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**10 dny**	**18.04. 24**	**01.05. 24**		
246		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	18.04. 24	18.04. 24	223SS	247
247		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	246	248
248		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.04. 24	23.04. 24	247	249;253
249		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	24.04. 24	24.04. 24	248	250FS+2 dny
250		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	29.04. 24	29.04. 24	249FS+2 dny	
251		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	230SS	252
252		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	22.04. 24	22.04. 24	251	253
253		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.04. 24	25.04. 24	248;252	254
254		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	26.04. 24	26.04. 24	253	255FS+2 dny
255		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	01.05. 24	01.05. 24	254FS+2 dny	
256		**Zastřešení nad 6.NP**	**11 dny**	**21.05. 24**	**04.06. 24**		**990**
257		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	21.05. 24	21.05. 24	244SS	258
258		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	257	259
259		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	23.05. 24	23.05. 24	258	260
260		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	24.05. 24	24.05. 24	259	261
261		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	27.05. 24	27.05. 24	260	262FS+2 dny
262		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	30.05. 24	30.05. 24	261FS+2 dny	
263		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	22.05. 24	22.05. 24	244	264
264		bednění svislých konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	23.05. 24	23.05. 24	263	265
265		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	24.05. 24	24.05. 24	264	266
266		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	27.05. 24	27.05. 24	265	267
267		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	28.05. 24	28.05. 24	266	268FS+2 dny
268		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	31.05. 24	31.05. 24	267FS+2 dny	269
269		montáž střešních prvků	2 dny	03.06. 24	04.06. 24	268	
270		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**11.06. 24**	**12.06. 24**		

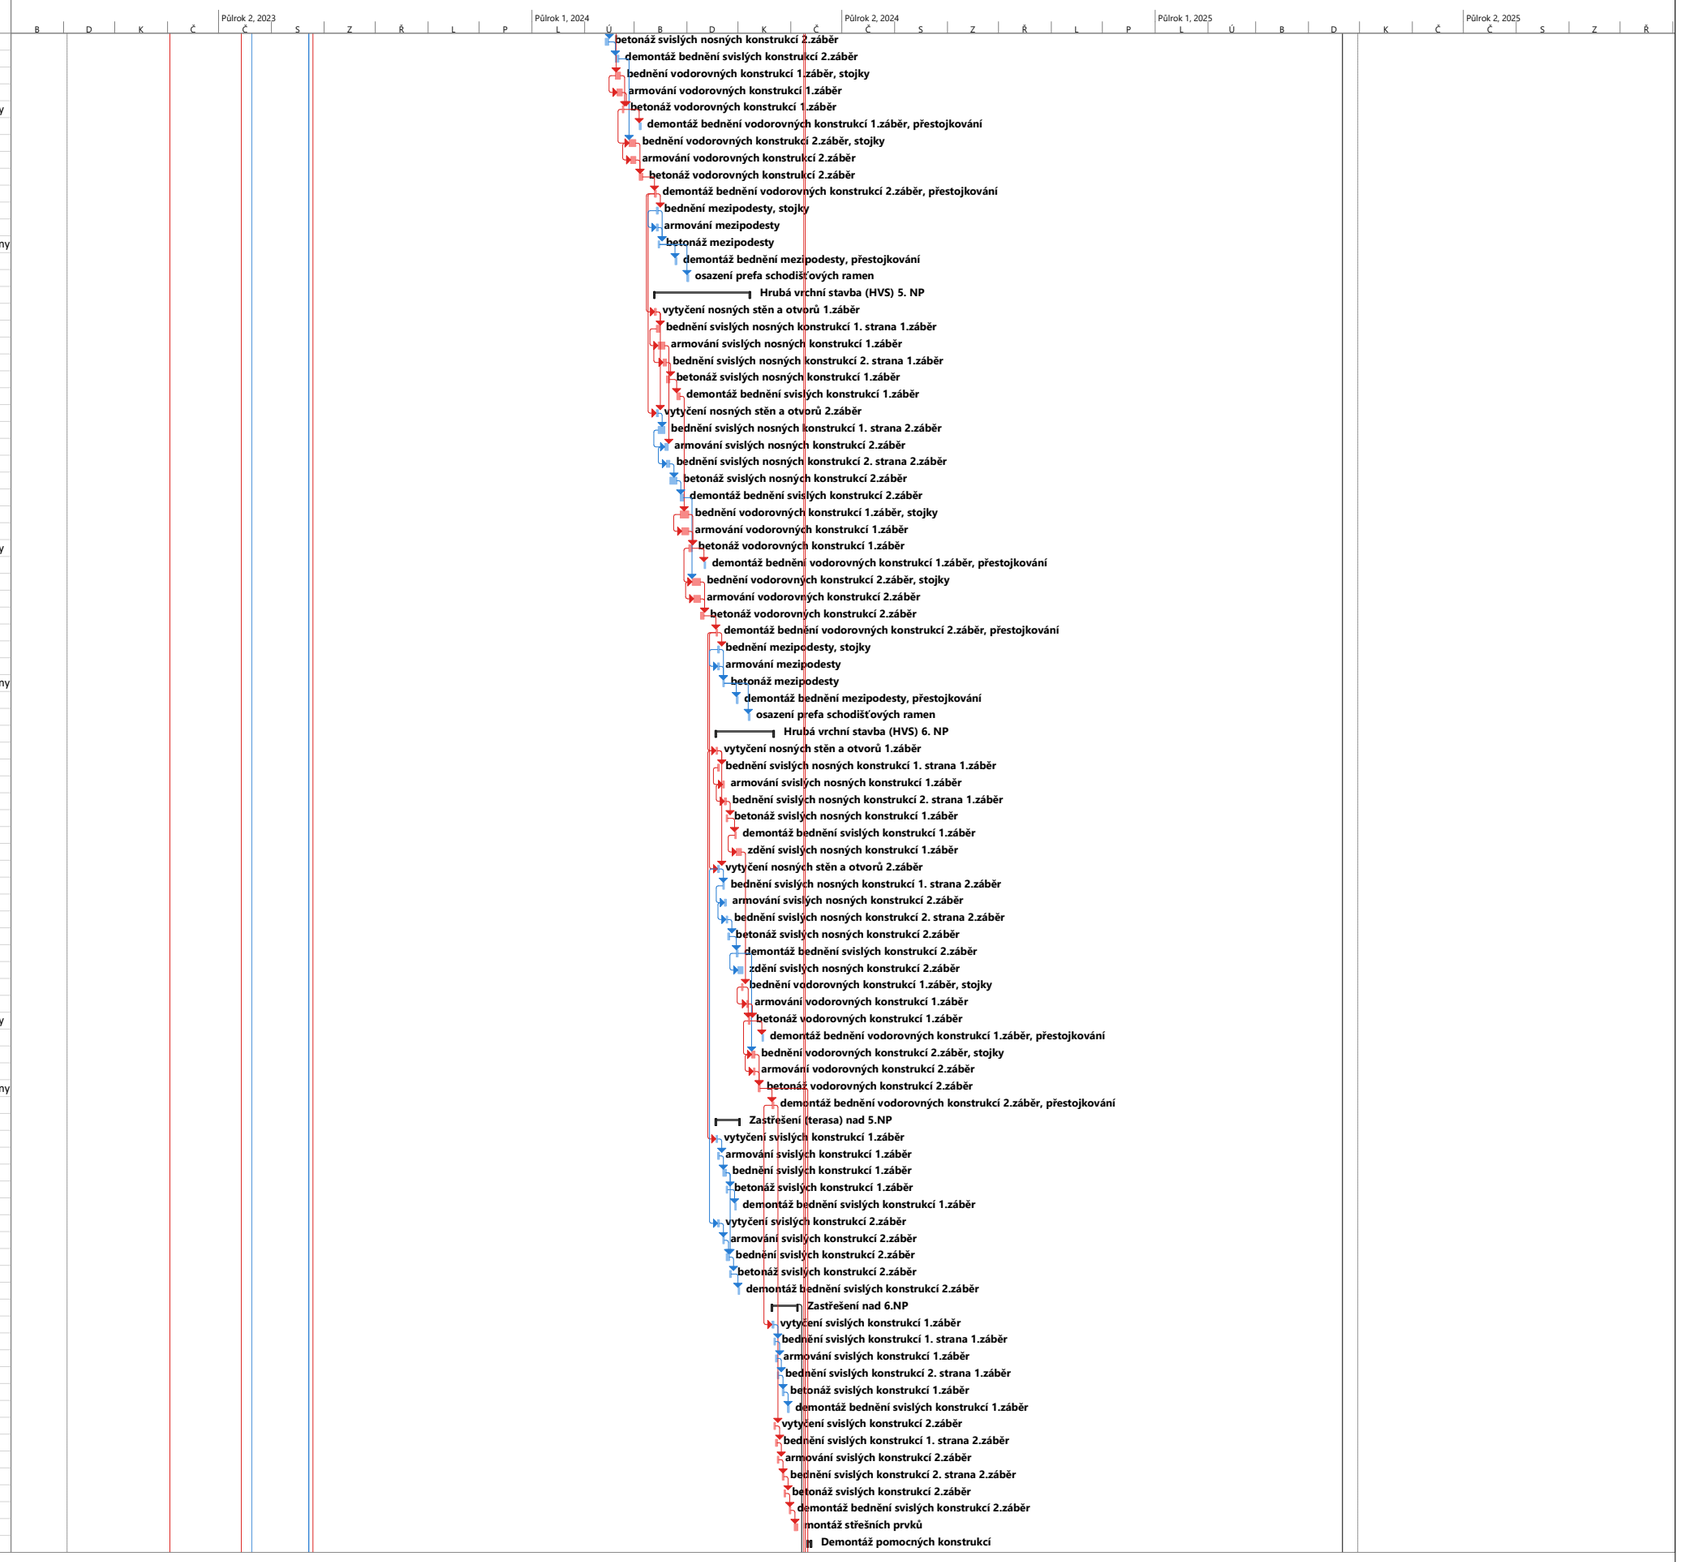

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
271		odstranění stojek	2 dny	11.06. 24	12.06. 24	243FS+20 dny	
272		**OBJEKT B**	**251 dny**	**31.05. 23**	**23.05. 24**		
273		**Základy**	**34 dny**	**31.05. 23**	**17.07. 23**		
274		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	275
275		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	274	276
276		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	275	277FS+1 den
277		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	276FS+1 den	278
278		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	277	279
279		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	278	280FS+2 dny
280		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	279FS+2 dny	281
281		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	280	282
282		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	281	283
283		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	282	284
284		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	283	285FS+2 dny
285		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	284FS+2 dny	286
286		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	285	287
287		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	286	288
288		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	287	289FS+1 den
289		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	288FS+1 den	290
290		armování základové desky	4 dny	04.07. 23	07.07. 23	289	291
291		betonáž základové desky	3 dny	10.07. 23	12.07. 23	290	292FS+2 dny;970
292		demontáž bednění základové desky	1 den	17.07. 23	17.07. 23	291FS+2 dny	
293		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**39 dny**	**23.08. 23**	**16.10. 23**		
294		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	37;976	295
295		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	294	296SS+1 den
296		armování svislých nosných konstrukcí	3 dny	25.08. 23	29.08. 23	295SS+1 den	297SS+1 den
297		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	2 dny	28.08. 23	29.08. 23	296SS+1 den	298
298		betonáž svislých nosných konstrukcí	2 dny	30.08. 23	31.08. 23	297	299FS+2 dny
299		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	05.09. 23	06.09. 23	298FS+2 dny	300
300		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	07.09. 23	08.09. 23	299	301SS+1 den;302
301		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.09. 23	11.09. 23	300SS+1 den	302
302		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	12.09. 23	12.09. 23	300;301	303FS+5 dny;304SS+2 dny
303		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	20.09. 23	20.09. 23	302FS+5 dny	
304		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	14.09. 23	15.09. 23	302SS+2 dny	305SS+1 den;306
305		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.09. 23	18.09. 23	304SS+1 den	306
306		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.09. 23	19.09. 23	304;305	307FS+5 dny
307		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	27.09. 23	27.09. 23	306FS+5 dny	308;314SS;320SS
308		bednění mezipodesty, stojky	1 den	28.09. 23	28.09. 23	307	309SS;310
309		armování mezipodesty	1 den	28.09. 23	28.09. 23	308SS	310
310		betonáž mezipodesty	1 den	29.09. 23	29.09. 23	308;309	311FS+5 dny;312FS+10 dny
311		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	09.10. 23	09.10. 23	310FS+5 dny	
312		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	16.10. 23	16.10. 23	310FS+10 dny	
313		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**39 dny**	**27.09. 23**	**20.11. 23**		
314		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	27.09. 23	27.09. 23	307SS	315;320
315		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	28.09. 23	29.09. 23	314	316SS+1 den
316		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.09. 23	02.10. 23	315SS+1 den	317SS+1 den;322
317		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	02.10. 23	03.10. 23	316SS+1 den	318
318		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	317	319FS+2 dny
319		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	10.10. 23	11.10. 23	318FS+2 dny	326
320		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	28.09. 23	28.09. 23	307SS;314	321
321		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	29.09. 23	02.10. 23	320	322SS+1 den
322		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	03.10. 23	04.10. 23	316;321SS+1 den	323SS+1 den
323		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	04.10. 23	05.10. 23	322SS+1 den	324
324		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	323	325FS+2 dny
325		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.10. 23	13.10. 23	324FS+2 dny	330
326		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	12.10. 23	16.10. 23	319	327SS+1 den;328
327		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.10. 23	16.10. 23	326SS+1 den	328SS+1 den
328		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	17.10. 23	17.10. 23	326;327SS+1 den	329FS+5 dny;330SS+2 dny
329		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	25.10. 23	25.10. 23	328FS+5 dny	
330		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	19.10. 23	23.10. 23	325;328SS+2 dny	331SS+1 den;332
331		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	20.10. 23	23.10. 23	330SS+1 den	332
332		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	24.10. 23	24.10. 23	330;331	333FS+5 dny
333		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	01.11. 23	01.11. 23	332FS+5 dny	334;346SS;340SS
334		bednění mezipodesty, stojky	1 den	02.11. 23	02.11. 23	333	335SS;336
335		armování mezipodesty	1 den	02.11. 23	02.11. 23	334SS	336
336		betonáž mezipodesty	1 den	03.11. 23	03.11. 23	334;335	337FS+5 dny;338FS+10 dny
337		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	13.11. 23	13.11. 23	336FS+5 dny	
338		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	20.11. 23	20.11. 23	336FS+10 dny	
339		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**39 dny**	**01.11. 23**	**02.01. 24**		
340		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	01.11. 23	01.11. 23	333SS	341;346
341		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	02.11. 23	03.11. 23	340	342SS+1 den
342		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	03.11. 23	06.11. 23	341SS+1 den	343SS+1 den;348
343		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	06.11. 23	07.11. 23	342SS+1 den	344
344		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.11. 23	09.11. 23	343	345FS+2 dny
345		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	14.11. 23	15.11. 23	344FS+2 dny	352
346		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	02.11. 23	02.11. 23	333SS;340	347
347		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	03.11. 23	06.11. 23	346	348SS+1 den
348		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.11. 23	08.11. 23	342;347SS+1 den	349SS+1 den
349		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	08.11. 23	09.11. 23	348SS+1 den	350
350		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	349	351FS+2 dny
351		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	16.11. 23	17.11. 23	350FS+2 dny	356
352		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	16.11. 23	20.11. 23	345	353SS+1 den;354
353		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	17.11. 23	20.11. 23	352SS+1 den	354
354		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	21.11. 23	21.11. 23	352;353	355FS+5 dny;356SS+2 dny
355		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	29.11. 23	29.11. 23	354FS+5 dny	
356		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	23.11. 23	27.11. 23	351;354SS+2 dny	357SS+1 den;358
357		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.11. 23	27.11. 23	356SS+1 den	358
358		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	28.11. 23	28.11. 23	356;357	359FS+5 dny
359		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	06.12. 23	06.12. 23	358FS+5 dny	360;372SS;366SS
360		bednění mezipodesty, stojky	1 den	07.12. 23	07.12. 23	359	361SS;362

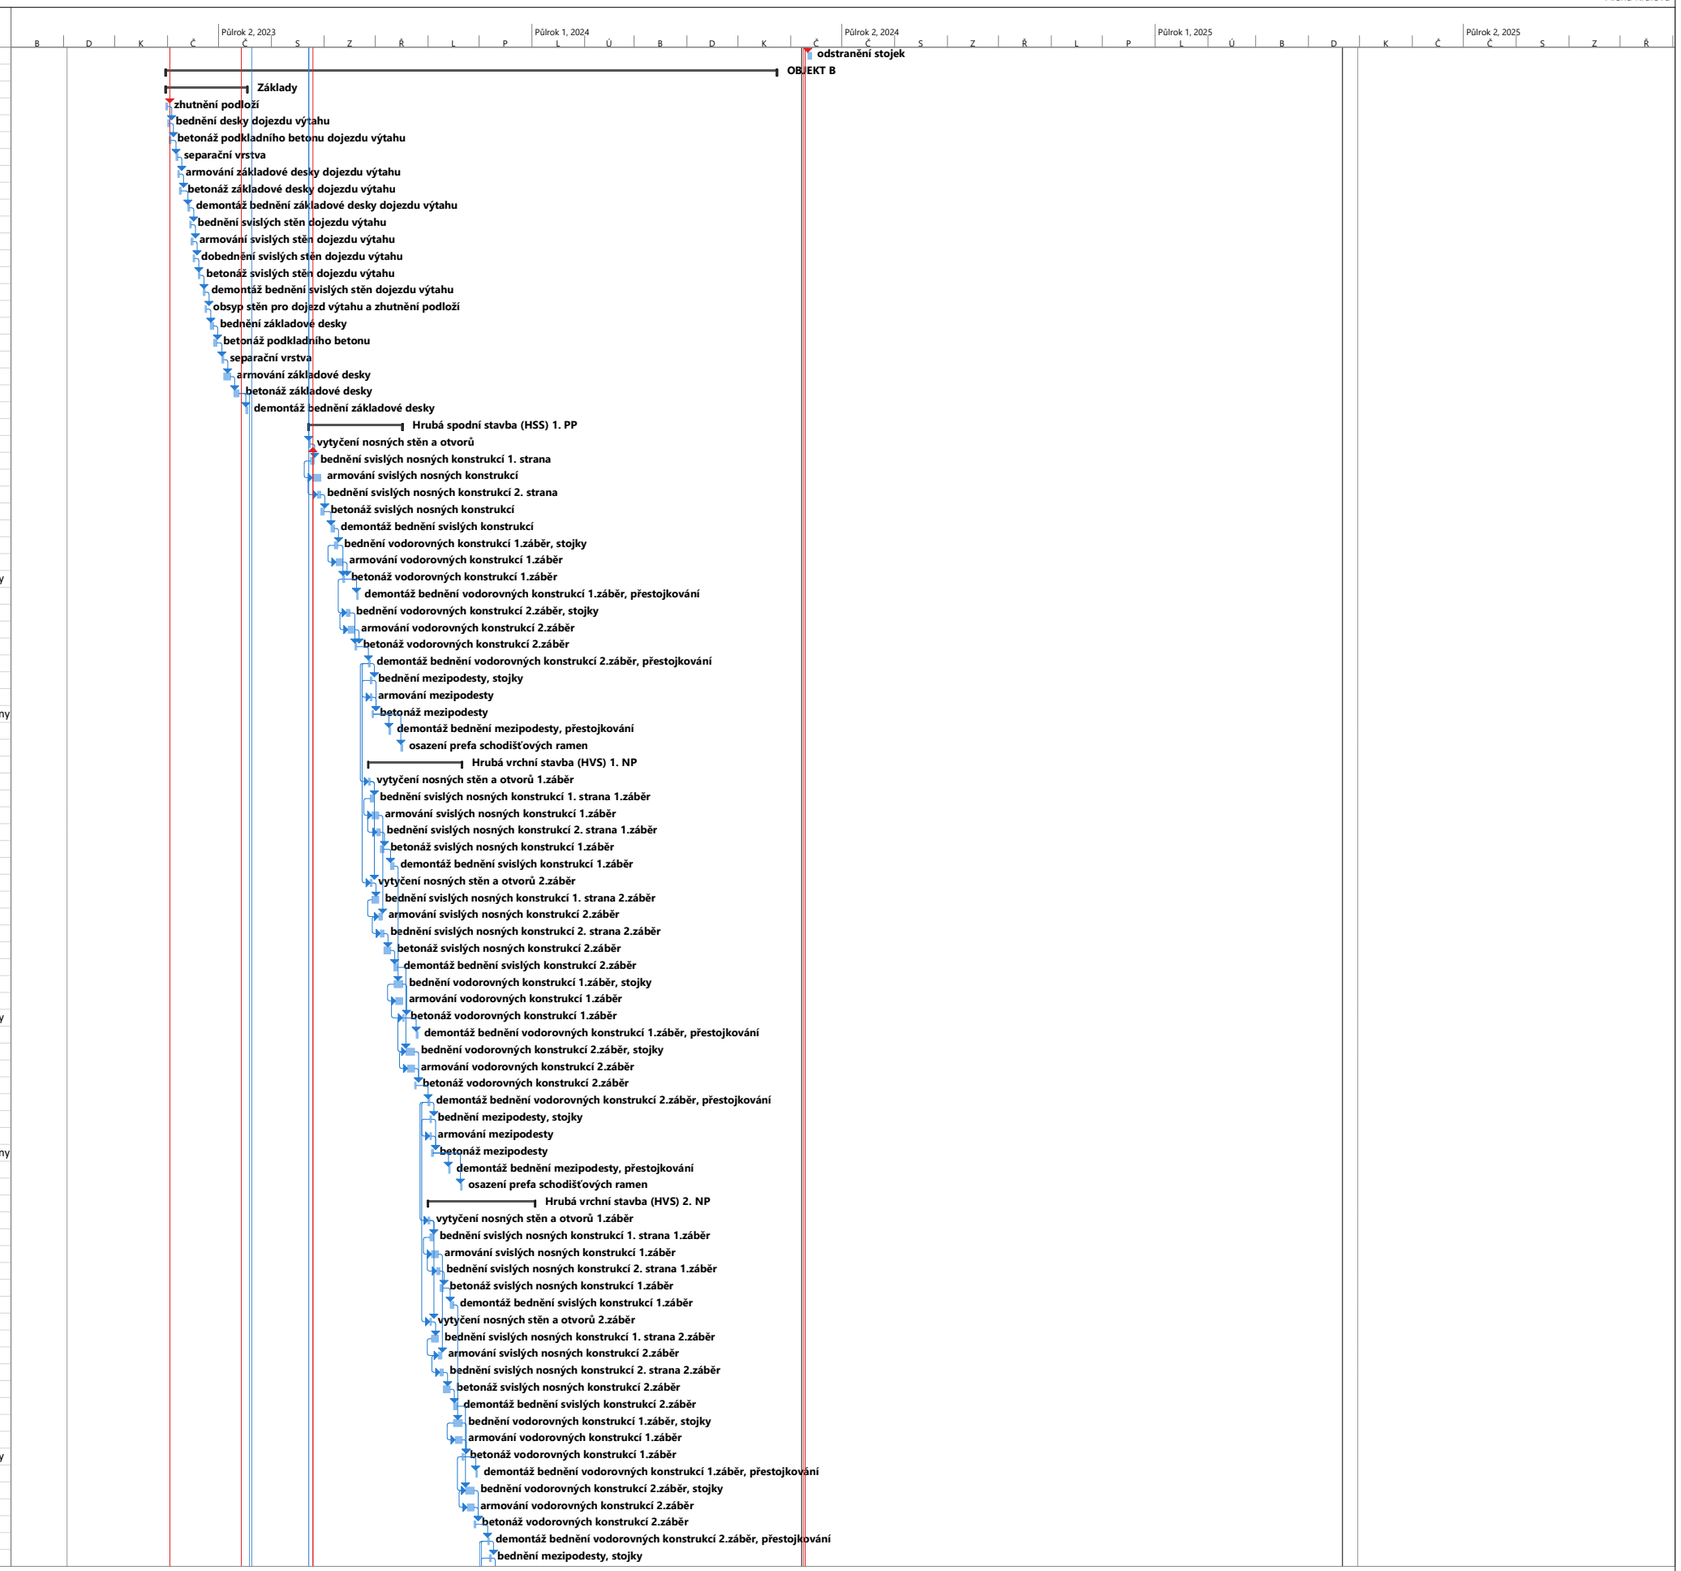

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
361		armování mezipodesty	1 den	07.12. 23	07.12. 23	360SS	362
362		betonáž mezipodesty	1 den	08.12. 23	08.12. 23	360;361	363FS+5 dny;364FS+10 dny
363		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	18.12. 23	18.12. 23	362FS+5 dny	
364		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	02.01. 24	02.01. 24	362FS+10 dny	
365		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**39 dny**	**06.12. 23**	**06.02. 24**		
366		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	06.12. 23	06.12. 23	359SS	367;372
367		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	07.12. 23	08.12. 23	366	368SS+1 den
368		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	08.12. 23	11.12. 23	367SS+1 den	369SS+1 den;374
369		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	11.12. 23	12.12. 23	368SS+1 den	370
370		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.12. 23	14.12. 23	369	371FS+2 dny
371		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	19.12. 23	20.12. 23	370FS+2 dny	378
372		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	07.12. 23	07.12. 23	359SS;366	373
373		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	08.12. 23	11.12. 23	372	374SS+1 den
374		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.12. 23	13.12. 23	368;373SS+1 den	375SS+1 den
375		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	13.12. 23	14.12. 23	374SS+1 den	376
376		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.12. 23	18.12. 23	375	377FS+2 dny
377		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	21.12. 23	22.12. 23	376FS+2 dny	382
378		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	21.12. 23	02.01. 24	371	379SS+1 den;380
379		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.12. 23	02.01. 24	378SS+1 den	380
380		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	03.01. 24	03.01. 24	378;379	381FS+5 dny;382SS+2 dny
381		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	11.01. 24	11.01. 24	380FS+5 dny	
382		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	05.01. 24	09.01. 24	377;380SS+2 dny	383SS+1 den;384
383		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.01. 24	09.01. 24	382SS+1 den	384
384		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	10.01. 24	10.01. 24	382;383	385FS+5 dny
385		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	18.01. 24	18.01. 24	384FS+5 dny	386;398SS;392SS
386		bednění mezipodesty, stojky	1 den	19.01. 24	19.01. 24	385	387SS
387		armování mezipodesty	1 den	19.01. 24	19.01. 24	386SS	388
388		betonáž mezipodesty	1 den	22.01. 24	22.01. 24	387	389FS+5 dny;390FS+10 dny
389		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	30.01. 24	30.01. 24	388FS+5 dny	
390		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	06.02. 24	06.02. 24	388FS+10 dny	
391		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**39 dny**	**18.01. 24**	**12.03. 24**		
392		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	18.01. 24	18.01. 24	385SS	393;398
393		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	19.01. 24	22.01. 24	392	394SS+1 den
394		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.01. 24	23.01. 24	393SS+1 den	395SS+1 den;400
395		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	23.01. 24	24.01. 24	394SS+1 den	396
396		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	395	397FS+2 dny
397		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	31.01. 24	01.02. 24	396FS+2 dny	404
398		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	19.01. 24	19.01. 24	385SS;392	399
399		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	22.01. 24	23.01. 24	398	400SS+1 den
400		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.01. 24	25.01. 24	394;399SS+1 den	401SS+1 den
401		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	25.01. 24	26.01. 24	400SS+1 den	402
402		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	29.01. 24	30.01. 24	401	403FS+2 dny
403		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	02.02. 24	05.02. 24	402FS+2 dny	
404		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	02.02. 24	06.02. 24	397	405SS+1 den;406
405		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	05.02. 24	06.02. 24	404SS+1 den	406
406		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	07.02. 24	07.02. 24	404;405	407FS+5 dny;408SS+2 dny
407		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	15.02. 24	15.02. 24	406FS+5 dny	
408		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	09.02. 24	13.02. 24	406SS+2 dny	409SS+1 den;410
409		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.02. 24	13.02. 24	408SS+1 den	410
410		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	14.02. 24	14.02. 24	408;409	411FS+5 dny
411		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	22.02. 24	22.02. 24	410FS+5 dny	412;424SS;418SS
412		bednění mezipodesty, stojky	1 den	23.02. 24	23.02. 24	411	413SS
413		armování mezipodesty	1 den	23.02. 24	23.02. 24	412SS	414
414		betonáž mezipodesty	1 den	26.02. 24	26.02. 24	413	415FS+5 dny;416FS+10 dny
415		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	05.03. 24	05.03. 24	414FS+5 dny	
416		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	12.03. 24	12.03. 24	414FS+10 dny	
417		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**39 dny**	**22.02. 24**	**16.04. 24**		
418		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	22.02. 24	22.02. 24	411SS	419;424
419		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	23.02. 24	26.02. 24	418	420SS+1 den
420		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.02. 24	27.02. 24	419SS+1 den	421SS+1 den;426
421		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	27.02. 24	28.02. 24	420SS+1 den	422
422		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	421	423FS+2 dny
423		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.03. 24	07.03. 24	422FS+2 dny	430
424		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	23.02. 24	23.02. 24	411SS;418	425
425		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	26.02. 24	27.02. 24	424	426SS+1 den
426		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	28.02. 24	29.02. 24	420;425SS+1 den	427SS+1 den
427		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	29.02. 24	01.03. 24	426SS+1 den	428
428		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.03. 24	05.03. 24	427	429FS+2 dny
429		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.03. 24	11.03. 24	428FS+2 dny	434
430		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	08.03. 24	11.03. 24	423	431SS+1 den;432
431		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.03. 24	12.03. 24	430SS+1 den	432
432		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	13.03. 24	13.03. 24	430;431	433FS+5 dny;434SS+2 dny
433		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	21.03. 24	21.03. 24	432FS+5 dny	
434		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	15.03. 24	18.03. 24	429;432SS+2 dny	435SS+1 den;436
435		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	18.03. 24	19.03. 24	434SS+1 den	436
436		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	20.03. 24	20.03. 24	434;435	437FS+5 dny
437		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	28.03. 24	28.03. 24	436FS+5 dny	438;451SS;444SS
438		bednění mezipodesty, stojky	1 den	29.03. 24	29.03. 24	437	439SS
439		armování mezipodesty	1 den	29.03. 24	29.03. 24	438SS	440
440		betonáž mezipodesty	1 den	01.04. 24	01.04. 24	439	441FS+5 dny;442FS+10 dny
441		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	09.04. 24	09.04. 24	440FS+5 dny	
442		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	16.04. 24	16.04. 24	440FS+10 dny	
443		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**26 dny**	**28.03. 24**	**02.05. 24**		
444		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	28.03. 24	28.03. 24	437SS	445;451
445		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	29.03. 24	29.03. 24	444	446SS+1 den
446		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	01.04. 24	01.04. 24	445SS+1 den	447SS+1 den
447		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	446SS+1 den	448
448		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	447	449FS+2 dny
449		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	08.04. 24	08.04. 24	448FS+2 dny	450SS
450		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	3 dny	08.04. 24	10.04. 24	449SS	458;457

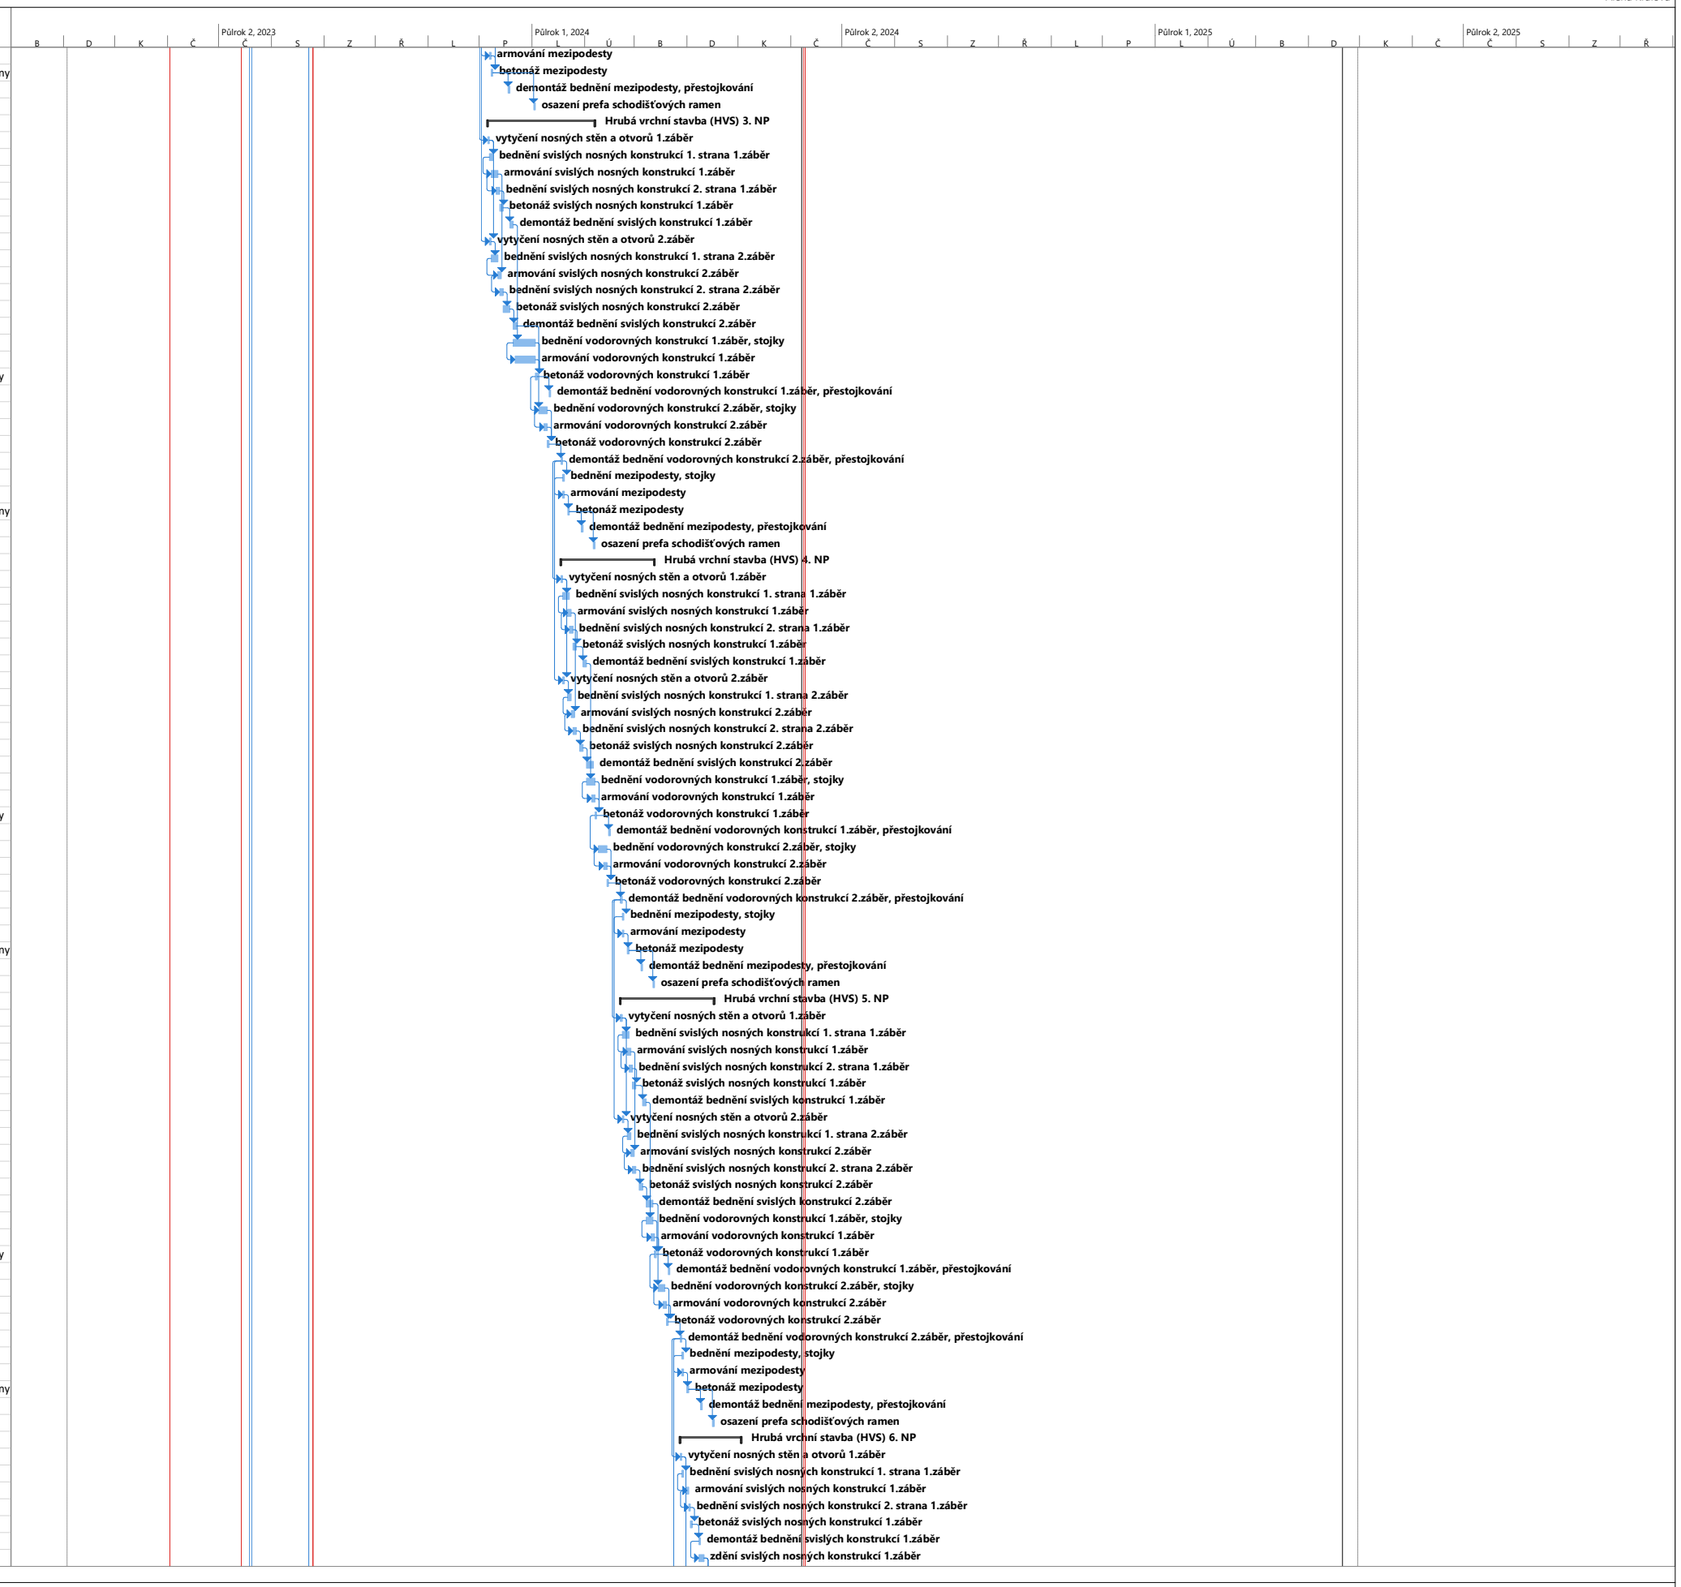

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
451		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	29.03. 24	29.03. 24	437SS;444	452;467
452		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	01.04. 24	01.04. 24	451	453SS+1 den
453		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	452SS+1 den	454SS+1 den
454		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	453SS+1 den	455
455		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	04.04. 24	04.04. 24	454	456FS+2 dny;470
456		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	09.04. 24	09.04. 24	455FS+2 dny	457SS
457		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	4 dny	11.04. 24	16.04. 24	450;456SS	462
458		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	11.04. 24	15.04. 24	450	459FF;460
459		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	15.04. 24	15.04. 24	458FF	460
460		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	16.04. 24	16.04. 24	458;459	461FS+5 dny;462SS+2 dny
461		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	24.04. 24	24.04. 24	460FS+5 dny	
462		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	18.04. 24	19.04. 24	457;460SS+2 dny	463FF;464
463		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	19.04. 24	19.04. 24	462FF	464
464		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	22.04. 24	23.04. 24	462;463	465FS+5 dny;492FS+20 dny
465		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	2 dny	01.05. 24	02.05. 24	464FS+5 dny	478
466		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**8 dny**	**01.04. 24**	**10.04. 24**		
467		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	01.04. 24	01.04. 24	451	468;472
468		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	467	469
469		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	468	
470		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	455	471FS+2 dny;475SS
471		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	470FS+2 dny	
472		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	02.04. 24	02.04. 24	467	473
473		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	03.04. 24	03.04. 24	472	474
474		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	04.04. 24	04.04. 24	473	475
475		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	05.04. 24	05.04. 24	470SS;474	476FS+2 dny
476		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	10.04. 24	10.04. 24	475FS+2 dny	
477		**Zastřešení nad 6. NP**	**11 dny**	**03.05. 24**	**17.05. 24**		**990**
478		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	03.05. 24	03.05. 24	465	479;484
479		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	06.05. 24	06.05. 24	478	480
480		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	07.05. 24	07.05. 24	479	481
481		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	08.05. 24	08.05. 24	480	482
482		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	09.05. 24	09.05. 24	481	483FS+2 dny
483		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.05. 24	14.05. 24	482FS+2 dny	490
484		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	06.05. 24	06.05. 24	478	485
485		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	07.05. 24	07.05. 24	484	486
486		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	08.05. 24	08.05. 24	485	487
487		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	09.05. 24	09.05. 24	486	488
488		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	10.05. 24	10.05. 24	487	489FS+2 dny
489		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	15.05. 24	15.05. 24	488FS+2 dny	490
490		montáž střešních prvků	2 dny	16.05. 24	17.05. 24	483;489	
491		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**22.05. 24**	**23.05. 24**		
492		odstranění stojek	2 dny	22.05. 24	23.05. 24	464FS+20 dny	
493		**OBJEKT C**	**484 dny**	**31.05. 23**	**29.04. 25**		
494		**Základy**	**35 dny**	**31.05. 23**	**18.07. 23**		
495		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	496
496		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	495	497
497		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	496	498FS+1 den
498		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	497FS+1 den	499
499		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	498	500
500		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	499	501FS+2 dny
501		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	500FS+2 dny	502
502		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	501	503
503		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	502	504
504		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	503	505
505		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	504	506FS+2 dny
506		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	505FS+2 dny	507
507		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	506	508
508		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	507	509
509		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	508	510FS+1 den
510		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	509FS+1 den	511
511		armování základové desky	5 dny	04.07. 23	10.07. 23	510	512
512		betonáž základové desky	3 dny	11.07. 23	13.07. 23	511	513FS+2 dny;970
513		demontáž bednění základové desky	1 den	18.07. 23	18.07. 23	512FS+2 dny	
514		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**40 dny**	**07.06. 24**	**01.08. 24**		
515		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	07.06. 24	07.06. 24	27	516
516		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	10.06. 24	11.06. 24	515	517SS+1 den
517		armování svislých nosných konstrukcí	3 dny	11.06. 24	13.06. 24	516SS+1 den	518SS+1 den
518		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	2 dny	12.06. 24	13.06. 24	517SS+1 den	519
519		betonáž svislých nosných konstrukcí	3 dny	14.06. 24	18.06. 24	518	520FS+2 dny
520		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	21.06. 24	24.06. 24	519FS+2 dny	521
521		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	25.06. 24	26.06. 24	520	522SS+1 den;523
522		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.06. 24	27.06. 24	521SS+1 den	523
523		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	28.06. 24	28.06. 24	521;522	524FS+5 dny;525SS+2 dny
524		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	08.07. 24	08.07. 24	523FS+5 dny	
525		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	02.07. 24	03.07. 24	523SS+2 dny	526SS+1 den;527
526		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	03.07. 24	04.07. 24	525SS+1 den	527
527		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	05.07. 24	05.07. 24	525;526	528FS+5 dny
528		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	15.07. 24	15.07. 24	527FS+5 dny	529;535SS;541SS
529		bednění mezipodesty, stojky	1 den	16.07. 24	16.07. 24	528	530SS;531
530		armování mezipodesty	1 den	16.07. 24	16.07. 24	529SS	531
531		betonáž mezipodesty	1 den	17.07. 24	17.07. 24	529;530	532FS+5 dny;533FS+10 dny
532		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	25.07. 24	25.07. 24	531FS+5 dny	
533		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	01.08. 24	01.08. 24	531FS+10 dny	
534		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**39 dny**	**15.07. 24**	**05.09. 24**		
535		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	15.07. 24	15.07. 24	528SS	536;541
536		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	16.07. 24	17.07. 24	535	537SS+1 den
537		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	17.07. 24	18.07. 24	536SS+1 den	538SS+1 den;543
538		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	18.07. 24	19.07. 24	537SS+1 den	539
539		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	538	540FS+2 dny
540		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.07. 24	29.07. 24	539FS+2 dny	547

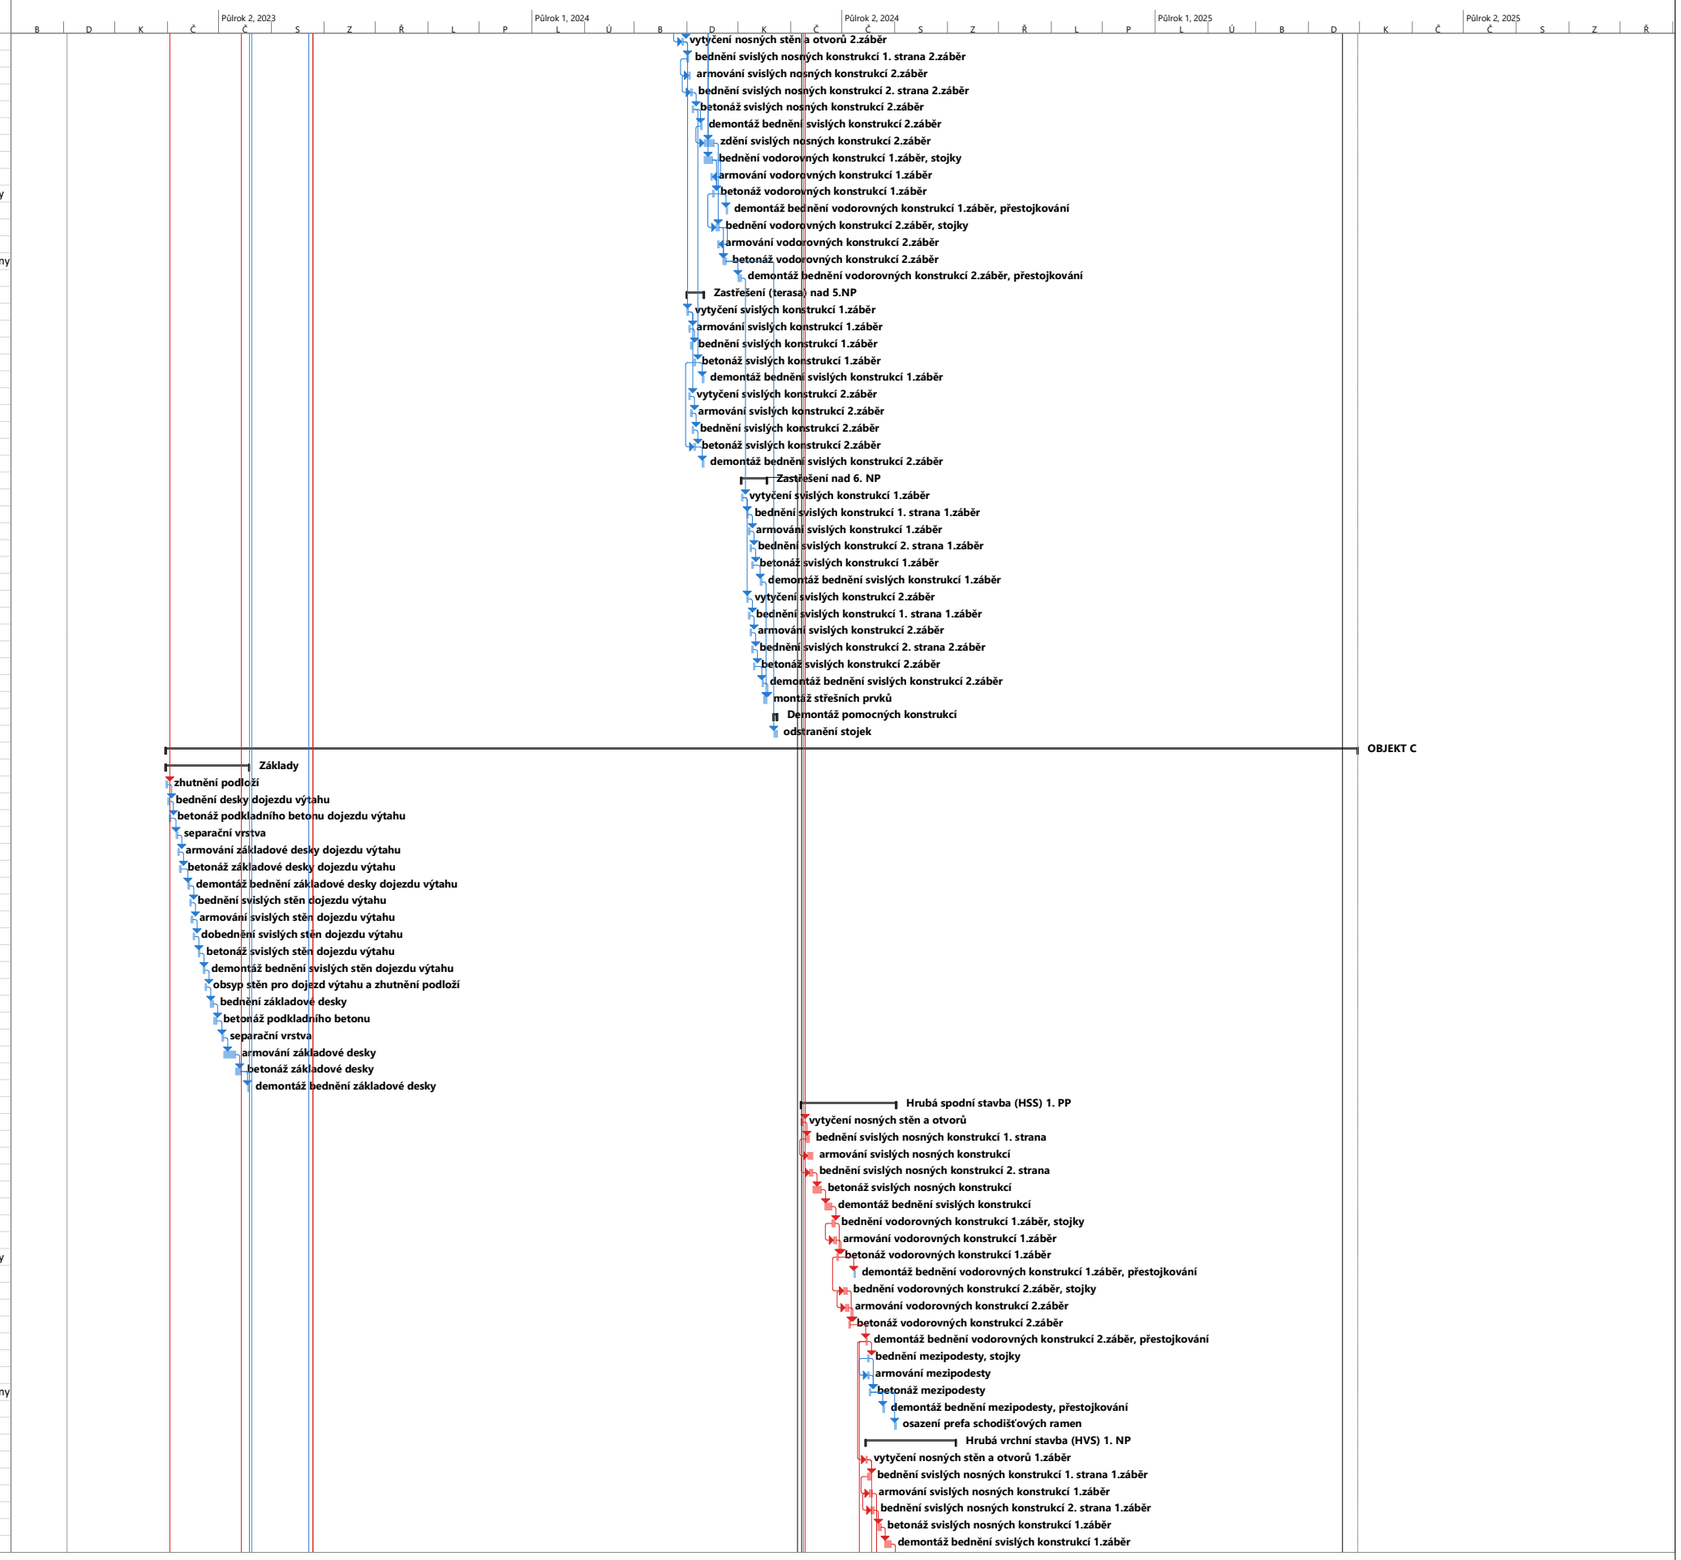

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
541		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	16.07. 24	16.07. 24	528SS;535	542
542		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	17.07. 24	18.07. 24	541	543SS+1 den
543		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.07. 24	22.07. 24	537;542SS+1 den	544SS+1 den
544		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	543SS+1 den	545
545		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	24.07. 24	25.07. 24	544	546FS+2 dny
546		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.07. 24	31.07. 24	545FS+2 dny	551
547		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	30.07. 24	01.08. 24	540	548SS+1 den;549
548		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	31.07. 24	01.08. 24	547SS+1 den	549
549		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	02.08. 24	02.08. 24	547;548	550FS+5 dny;551SS+2 dny
550		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	12.08. 24	12.08. 24	549FS+5 dny	
551		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	06.08. 24	08.08. 24	546;549SS+2 dny	552SS+1 den;553
552		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	07.08. 24	08.08. 24	551SS+1 den	553
553		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	09.08. 24	09.08. 24	551;552	554FS+5 dny
554		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	19.08. 24	19.08. 24	553FS+5 dny	555;567SS;561SS
555		bednění mezipodesty, stojky	1 den	20.08. 24	20.08. 24	554	556SS;557
556		armování mezipodesty	1 den	20.08. 24	20.08. 24	555SS	557
557		betonáž mezipodesty	1 den	21.08. 24	21.08. 24	555;556	558FS+5 dny;559FS+10 dny
558		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	29.08. 24	29.08. 24	557FS+5 dny	
559		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	05.09. 24	05.09. 24	557FS+10 dny	
560		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**40 dny**	**19.08. 24**	**11.10. 24**		
561		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	19.08. 24	19.08. 24	554SS	562;567
562		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	20.08. 24	21.08. 24	561	563SS+1 den
563		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	21.08. 24	22.08. 24	562SS+1 den	564SS+1 den;569
564		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	22.08. 24	23.08. 24	563SS+1 den	565
565		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.08. 24	27.08. 24	564	566FS+2 dny
566		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	30.08. 24	03.09. 24	565FS+2 dny	573
567		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	20.08. 24	20.08. 24	554SS;561	568
568		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	21.08. 24	22.08. 24	567	569SS+1 den
569		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	23.08. 24	26.08. 24	563;568SS+1 den	570SS+1 den
570		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	26.08. 24	27.08. 24	569SS+1 den	571
571		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	28.08. 24	29.08. 24	570	572FS+2 dny
572		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	03.09. 24	04.09. 24	571FS+2 dny	577
573		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	04.09. 24	06.09. 24	566	574SS+1 den;575
574		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	05.09. 24	06.09. 24	573SS+1 den	575
575		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	09.09. 24	09.09. 24	573;574	576FS+5 dny;577SS+2 dny
576		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	17.09. 24	17.09. 24	575FS+5 dny	
577		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	11.09. 24	13.09. 24	572;575SS+2 dny	578SS+1 den;579
578		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	12.09. 24	13.09. 24	577SS+1 den	579
579		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	16.09. 24	16.09. 24	577;578	580FS+5 dny
580		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	24.09. 24	24.09. 24	579FS+5 dny	581;593SS;587SS
581		bednění mezipodesty, stojky	1 den	25.09. 24	25.09. 24	580	582SS;583
582		armování mezipodesty	1 den	25.09. 24	25.09. 24	581SS	583
583		betonáž mezipodesty	1 den	26.09. 24	26.09. 24	581;582	584FS+5 dny;585FS+10 dny
584		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	04.10. 24	04.10. 24	583FS+5 dny	
585		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	11.10. 24	11.10. 24	583FS+10 dny	
586		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**40 dny**	**24.09. 24**	**18.11. 24**		
587		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	24.09. 24	24.09. 24	580SS	588;593
588		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	25.09. 24	26.09. 24	587	589SS+1 den
589		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	26.09. 24	27.09. 24	588SS+1 den	590SS+1 den;595
590		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	27.09. 24	30.09. 24	589SS+1 den	591
591		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	01.10. 24	02.10. 24	590	592FS+2 dny
592		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	07.10. 24	09.10. 24	591FS+2 dny	599
593		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	25.09. 24	25.09. 24	580SS;587	594
594		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	26.09. 24	27.09. 24	593	595SS+1 den
595		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.09. 24	01.10. 24	589;594SS+1 den	596SS+1 den
596		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	01.10. 24	02.10. 24	595SS+1 den	597
597		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	03.10. 24	04.10. 24	596	598FS+2 dny
598		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	09.10. 24	10.10. 24	597FS+2 dny	603
599		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	10.10. 24	14.10. 24	592	600SS+1 den;601
600		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	11.10. 24	14.10. 24	599SS+1 den	601
601		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	15.10. 24	15.10. 24	599;600	602FS+5 dny;603SS+2 dny
602		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	23.10. 24	23.10. 24	601FS+5 dny	
603		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	17.10. 24	21.10. 24	598;601SS+2 dny	604SS+1 den;605
604		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	18.10. 24	21.10. 24	603SS+1 den	605
605		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	22.10. 24	22.10. 24	603;604	606FS+5 dny
606		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	30.10. 24	30.10. 24	605FS+5 dny	607;619SS;613SS
607		bednění mezipodesty, stojky	1 den	31.10. 24	31.10. 24	606	608SS
608		armování mezipodesty	1 den	31.10. 24	31.10. 24	607SS	609
609		betonáž mezipodesty	1 den	01.11. 24	01.11. 24	608	610FS+5 dny;611FS+10 dny
610		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	11.11. 24	11.11. 24	609FS+5 dny	
611		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	18.11. 24	18.11. 24	609FS+10 dny	
612		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**40 dny**	**30.10. 24**	**07.01. 25**		
613		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	30.10. 24	30.10. 24	606SS	614;619
614		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	31.10. 24	01.11. 24	613	615SS+1 den
615		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	01.11. 24	04.11. 24	614SS+1 den	616SS+1 den;621
616		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	04.11. 24	05.11. 24	615SS+1 den	617
617		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.11. 24	07.11. 24	616	618FS+2 dny
618		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	12.11. 24	14.11. 24	617FS+2 dny	625
619		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	31.10. 24	31.10. 24	606SS;613	620
620		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	01.11. 24	04.11. 24	619	621SS+1 den
621		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	05.11. 24	06.11. 24	615;620SS+1 den	622SS+1 den
622		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	06.11. 24	07.11. 24	621SS+1 den	623
623		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.11. 24	11.11. 24	622	624FS+2 dny
624		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.11. 24	15.11. 24	623FS+2 dny	
625		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	15.11. 24	19.11. 24	618	626SS+1 den;627
626		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	18.11. 24	19.11. 24	625SS+1 den	627
627		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	20.11. 24	20.11. 24	625;626	628FS+5 dny;629SS+2 dny
628		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	28.11. 24	28.11. 24	627FS+5 dny	
629		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	22.11. 24	26.11. 24	627SS+2 dny	630SS+1 den;631
630		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	25.11. 24	26.11. 24	629SS+1 den	631

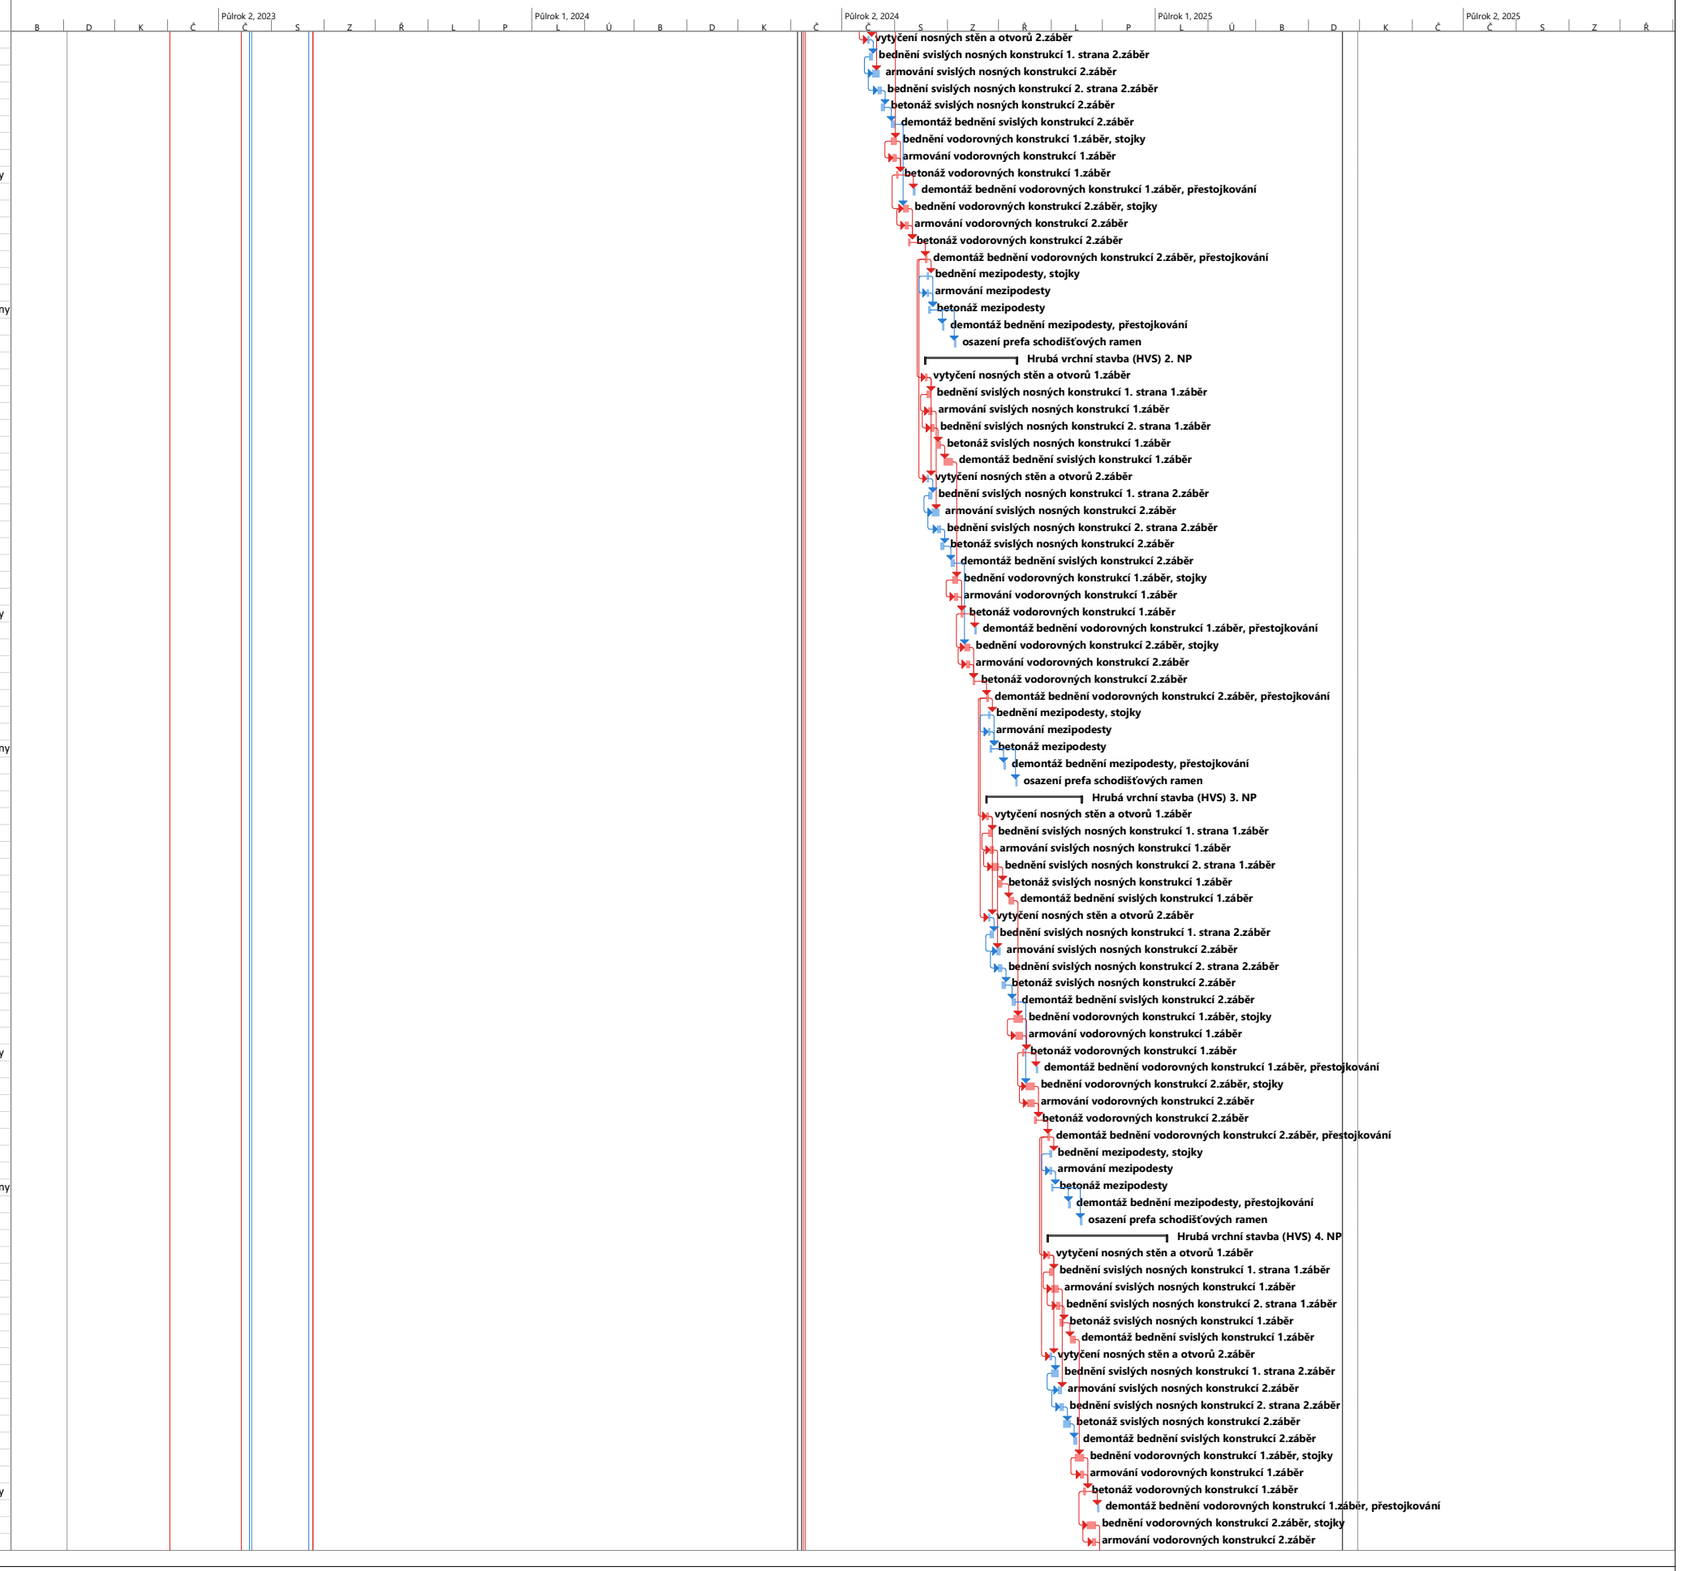

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
631		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	27.11. 24	27.11. 24	629;630	632FS+5 dny
632		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	05.12. 24	05.12. 24	631FS+5 dny	633;645SS;639SS
633		bednění mezipodesty, stojky	1 den	06.12. 24	06.12. 24	632	634SS
634		armování mezipodesty	1 den	06.12. 24	06.12. 24	633SS	635
635		betonáž mezipodesty	1 den	09.12. 24	09.12. 24	634	636FS+5 dny;637FS+10 dny
636		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	17.12. 24	17.12. 24	635FS+5 dny	
637		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	07.01. 25	07.01. 25	635FS+10 dny	
638		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**41 dny**	**05.12. 24**	**13.02. 25**		
639		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	05.12. 24	05.12. 24	632SS	640;645
640		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	06.12. 24	09.12. 24	639	641SS+1 den
641		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.12. 24	10.12. 24	640SS+1 den	642SS+1 den;647
642		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	10.12. 24	11.12. 24	641SS+1 den	643
643		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.12. 24	13.12. 24	642	644FS+2 dny
644		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	3 dny	18.12. 24	20.12. 24	643FS+2 dny	651
645		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	06.12. 24	06.12. 24	632SS;639	646
646		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	09.12. 24	10.12. 24	645	647SS+1 den
647		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	11.12. 24	12.12. 24	641;646SS+1 den	648SS+1 den
648		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	12.12. 24	13.12. 24	647SS+1 den	649
649		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	16.12. 24	17.12. 24	648	650FS+2 dny
650		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	20.12. 24	06.01. 25	649FS+2 dny	655
651		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	06.01. 25	07.01. 25	644	652SS+1 den;653
652		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	07.01. 25	08.01. 25	651SS+1 den	653
653		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	09.01. 25	09.01. 25	651;652	654FS+5 dny;655SS+2 dny
654		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	17.01. 25	17.01. 25	653FS+5 dny	
655		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	13.01. 25	14.01. 25	650;653SS+2 dny	656SS+1 den;657
656		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.01. 25	15.01. 25	655SS+1 den	657
657		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	16.01. 25	16.01. 25	655;656	658FS+5 dny
658		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	24.01. 25	24.01. 25	657FS+5 dny	659;672SS;665SS
659		bednění mezipodesty, stojky	1 den	27.01. 25	27.01. 25	658	660SS
660		armování mezipodesty	1 den	27.01. 25	27.01. 25	659SS	661
661		betonáž mezipodesty	1 den	28.01. 25	28.01. 25	660	662FS+5 dny;663FS+10 dny
662		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	12.02. 25	12.02. 25	661FS+5 dny;678	663
663		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	13.02. 25	13.02. 25	661FS+10 dny;662	
664		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**40 dny**	**24.01. 25**	**20.03. 25**		
665		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	24.01. 25	24.01. 25	658SS	666;672;712
666		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	27.01. 25	27.01. 25	665	667SS+1 den
667		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	28.01. 25	28.01. 25	666SS+1 den	668SS+1 den
668		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	29.01. 25	29.01. 25	667SS+1 den	669
669		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	30.01. 25	30.01. 25	668	670FS+2 dny
670		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	04.02. 25	04.02. 25	669FS+2 dny	671
671		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	4 dny	05.02. 25	10.02. 25	670	679
672		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	27.01. 25	27.01. 25	658SS;665	673;717
673		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	28.01. 25	28.01. 25	672	674SS+1 den
674		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	29.01. 25	29.01. 25	673SS+1 den	675SS+1 den
675		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	30.01. 25	30.01. 25	674SS+1 den	676
676		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	31.01. 25	31.01. 25	675	677FS+2 dny
677		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	05.02. 25	05.02. 25	676FS+2 dny	678
678		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	4 dny	06.02. 25	11.02. 25	677	662;683
679		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	2 dny	11.02. 25	12.02. 25	671	680SS+1 den;681
680		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.02. 25	13.02. 25	679SS+1 den	681
681		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	14.02. 25	14.02. 25	679;680	682FS+5 dny;683SS+2 dny
682		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	24.02. 25	24.02. 25	681FS+5 dny	
683		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	18.02. 25	19.02. 25	678;681SS+2 dny	684SS+1 den;685
684		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.02. 25	20.02. 25	683SS+1 den	685
685		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	21.02. 25	21.02. 25	683;684	686FS+5 dny
686		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	03.03. 25	03.03. 25	685FS+5 dny	687;700SS;693SS
687		bednění mezipodesty, stojky	1 den	04.03. 25	04.03. 25	686	688SS
688		armování mezipodesty	1 den	04.03. 25	04.03. 25	687SS	689
689		betonáž mezipodesty	1 den	05.03. 25	05.03. 25	688	690FS+5 dny;691FS+10 dny
690		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	17.03. 25	17.03. 25	689FS+5 dny;705	
691		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	20.03. 25	20.03. 25	689FS+10 dny	
692		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 7. NP**	**27 dny**	**03.03. 25**	**08.04. 25**		
693		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	03.03. 25	03.03. 25	686SS	694;700;723
694		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	04.03. 25	04.03. 25	693	695SS+1 den
695		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	05.03. 25	05.03. 25	694SS+1 den	696SS+1 den
696		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	06.03. 25	06.03. 25	695SS+1 den	697
697		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	07.03. 25	07.03. 25	696	698FS+2 dny
698		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	12.03. 25	12.03. 25	697FS+2 dny	699
699		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.03. 25	14.03. 25	698	707
700		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	04.03. 25	04.03. 25	686SS;693	701;729
701		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	05.03. 25	05.03. 25	700	702SS+1 den
702		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	06.03. 25	06.03. 25	701SS+1 den	703SS+1 den
703		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	07.03. 25	07.03. 25	702SS+1 den	704
704		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	10.03. 25	10.03. 25	703	705FS+2 dny
705		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	13.03. 25	14.03. 25	704FS+2 dny	690;706
706		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	4 dny	17.03. 25	20.03. 25	705	707
707		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	21.03. 25	26.03. 25	699;706	708SS+2 dny;709
708		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	25.03. 25	26.03. 25	707SS+2 dny	709
709		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	27.03. 25	28.03. 25	707;708	710FS+5 dny;744FS+20 dny
710		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	2 dny	07.04. 25	08.04. 25	709FS+5 dny	736SS
711		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**8 dny**	**27.01. 25**	**05.02. 25**		
712		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	27.01. 25	27.01. 25	665	713
713		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	28.01. 25	28.01. 25	712	714
714		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	29.01. 25	29.01. 25	713	715
715		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	30.01. 25	30.01. 25	714	716FS+2 dny
716		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	04.02. 25	04.02. 25	715FS+2 dny	
717		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	28.01. 25	28.01. 25	672	718
718		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	29.01. 25	29.01. 25	717	719
719		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	30.01. 25	30.01. 25	718	720
720		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	31.01. 25	31.01. 25	719	721FS+2 dny

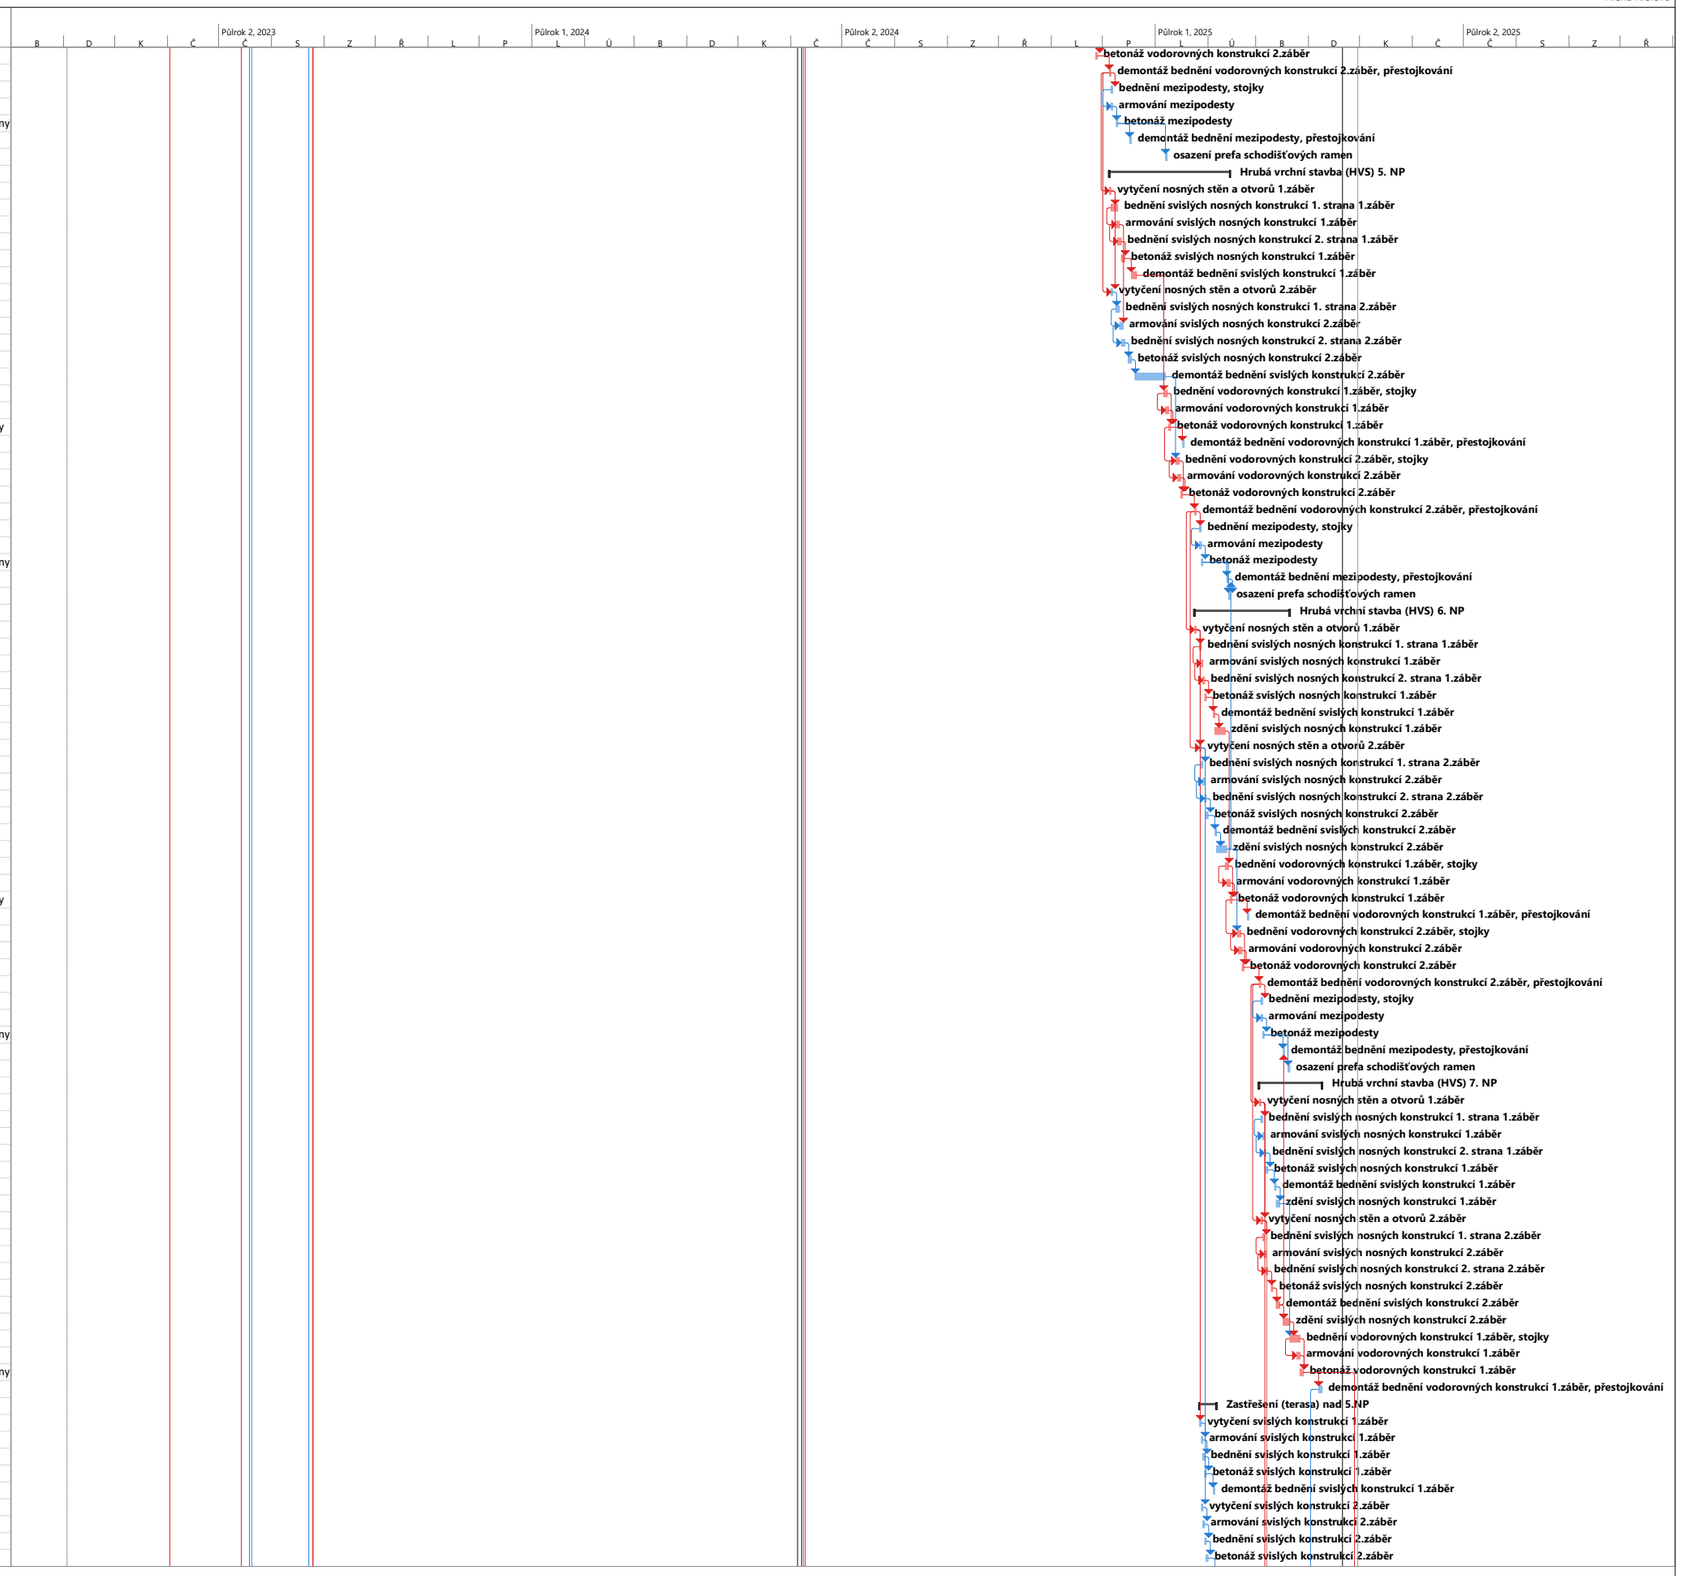

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
721		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	05.02. 25	05.02. 25	720FS+2 dny	
722		**Zastřešení nad 6.NP**	**10 dny**	**04.03. 25**	**17.03. 25**		
723		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	04.03. 25	04.03. 25	693	724
724		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	05.03. 25	05.03. 25	723	725
725		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	06.03. 25	06.03. 25	724	726;730
726		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	07.03. 25	07.03. 25	725	727
727		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	10.03. 25	10.03. 25	726	728FS+2 dny
728		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	13.03. 25	13.03. 25	727FS+2 dny	
729		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	05.03. 25	05.03. 25	700	730
730		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	07.03. 25	07.03. 25	725;729	731
731		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	10.03. 25	10.03. 25	730	732
732		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	11.03. 25	11.03. 25	731	733FS+2 dny
733		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	14.03. 25	14.03. 25	732FS+2 dny	734
734		montáž střešních prvků	1 den	17.03. 25	17.03. 25	733	
735		**Zastřešení nad 7.NP**	**10 dny**	**07.04. 25**	**18.04. 25**		**989**
736		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	07.04. 25	07.04. 25	710SS	737
737		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	08.04. 25	08.04. 25	736	738
738		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	09.04. 25	09.04. 25	737	739
739		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	10.04. 25	10.04. 25	738	740
740		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	11.04. 25	11.04. 25	739	741FS+2 dny
741		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	16.04. 25	16.04. 25	740FS+2 dny	742
742		montáž střešních prvků	2 dny	17.04. 25	18.04. 25	741	
743		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**28.04. 25**	**29.04. 25**		
744		odstranění stojek	2 dny	28.04. 25	29.04. 25	709FS+20 dny	
745		**OBJEKT A34**	**464 dny**	**31.05. 23**	**01.04. 25**		
746		**Základy**	**38 dny**	**31.05. 23**	**21.07. 23**		
747		zhutnění podloží	1 den	31.05. 23	31.05. 23	22	748
748		bednění desky dojezdu výtahu	1 den	01.06. 23	01.06. 23	747	749
749		betonáž podkladního betonu dojezdu výtahu	1 den	02.06. 23	02.06. 23	748	750FS+1 den
750		separační vrstva	1 den	06.06. 23	06.06. 23	749FS+1 den	751
751		armování základové desky dojezdu výtahu	1 den	07.06. 23	07.06. 23	750	752
752		betonáž základové desky dojezdu výtahu	1 den	08.06. 23	08.06. 23	751	753FS+2 dny
753		demontáž bednění základové desky dojezdu výtahu	1 den	13.06. 23	13.06. 23	752FS+2 dny	754
754		bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	14.06. 23	14.06. 23	753	755
755		armování svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	15.06. 23	15.06. 23	754	756
756		dobednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	16.06. 23	16.06. 23	755	757
757		betonáž svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	19.06. 23	19.06. 23	756	758FS+2 dny
758		demontáž bednění svislých stěn dojezdu výtahu	1 den	22.06. 23	22.06. 23	757FS+2 dny	759
759		obsyp stěn pro dojezd výtahu a zhutnění podloží	1 den	23.06. 23	23.06. 23	758	760
760		bednění základové desky	2 dny	26.06. 23	27.06. 23	759	761
761		betonáž podkladního betonu	2 dny	28.06. 23	29.06. 23	760	762FS+1 den
762		separační vrstva	1 den	03.07. 23	03.07. 23	761FS+1 den	763
763		armování základové desky	7 dny	04.07. 23	12.07. 23	762	764
764		betonáž základové desky	4 dny	13.07. 23	18.07. 23	763	765FS+2 dny;970
765		demontáž bednění základové desky	1 den	21.07. 23	21.07. 23	764FS+2 dny	
766		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**42 dny**	**07.06. 24**	**05.08. 24**		
767		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	07.06. 24	07.06. 24	27	768
768		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	10.06. 24	11.06. 24	767	769SS+1 den
769		armování svislých nosných konstrukcí	4 dny	11.06. 24	14.06. 24	768SS+1 den	770SS+1 den
770		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	3 dny	12.06. 24	14.06. 24	769SS+1 den	771
771		betonáž svislých nosných konstrukcí	3 dny	17.06. 24	19.06. 24	770	772FS+2 dny
772		demontáž bednění svislých konstrukcí	3 dny	24.06. 24	26.06. 24	771FS+2 dny	773SS+2 dny
773		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	26.06. 24	28.06. 24	772SS+2 dny	774SS+1 den;775
774		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	27.06. 24	28.06. 24	773SS+1 den	775
775		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	01.07. 24	02.07. 24	773;774	776FS+5 dny;777SS+2 dny
776		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	10.07. 24	10.07. 24	775FS+5 dny	
777		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	03.07. 24	05.07. 24	775SS+2 dny	778SS+1 den;779
778		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.07. 24	05.07. 24	777SS+1 den	779
779		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.07. 24	09.07. 24	777;778	780FS+5 dny
780		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	17.07. 24	17.07. 24	779FS+5 dny	781;787SS;794SS
781		bednění mezipodesty, stojky	1 den	18.07. 24	18.07. 24	780	782SS;783
782		armování mezipodesty	1 den	18.07. 24	18.07. 24	781SS	783
783		betonáž mezipodesty	1 den	19.07. 24	19.07. 24	781;782	784FS+5 dny;785FS+10 dny
784		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	29.07. 24	29.07. 24	783FS+5 dny	
785		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	05.08. 24	05.08. 24	783FS+10 dny	
786		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 1. NP**	**42 dny**	**17.07. 24**	**12.09. 24**		
787		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	17.07. 24	17.07. 24	780SS	788;794
788		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	18.07. 24	18.07. 24	787	789SS+1 den
789		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	19.07. 24	22.07. 24	788SS+1 den	790SS+1 den;796
790		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	789SS+1 den	791
791		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	24.07. 24	25.07. 24	790	792FS+2 dny
792		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	30.07. 24	31.07. 24	791FS+2 dny	793SS+1 den
793		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	31.07. 24	31.07. 24	792SS+1 den	801
794		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	18.07. 24	18.07. 24	780SS;787	795
795		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	19.07. 24	19.07. 24	794	796SS+1 den
796		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	23.07. 24	24.07. 24	789;795SS+1 den	797SS+1 den
797		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	24.07. 24	25.07. 24	796SS+1 den	798
798		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	26.07. 24	29.07. 24	797	799FS+2 dny
799		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	01.08. 24	02.08. 24	798FS+2 dny	800SS+1 den;805
800		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	07.08. 24	07.08. 24	799SS+1 den;801	
801		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	01.08. 24	06.08. 24	793	800;802SS+1 den;803
802		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	02.08. 24	06.08. 24	801SS+1 den	803
803		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	07.08. 24	08.08. 24	801;802	804FS+5 dny;805SS+2 dny
804		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	16.08. 24	16.08. 24	803FS+5 dny	
805		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	4 dny	09.08. 24	14.08. 24	799;803SS+2 dny	806SS+1 den;807
806		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	12.08. 24	14.08. 24	805SS+1 den	807
807		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.08. 24	16.08. 24	805;806	808FS+5 dny
808		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	26.08. 24	26.08. 24	807FS+5 dny	809;815SS;821SS
809		bednění mezipodesty, stojky	1 den	27.08. 24	27.08. 24	808	810SS;811
810		armování mezipodesty	1 den	27.08. 24	27.08. 24	809SS	811

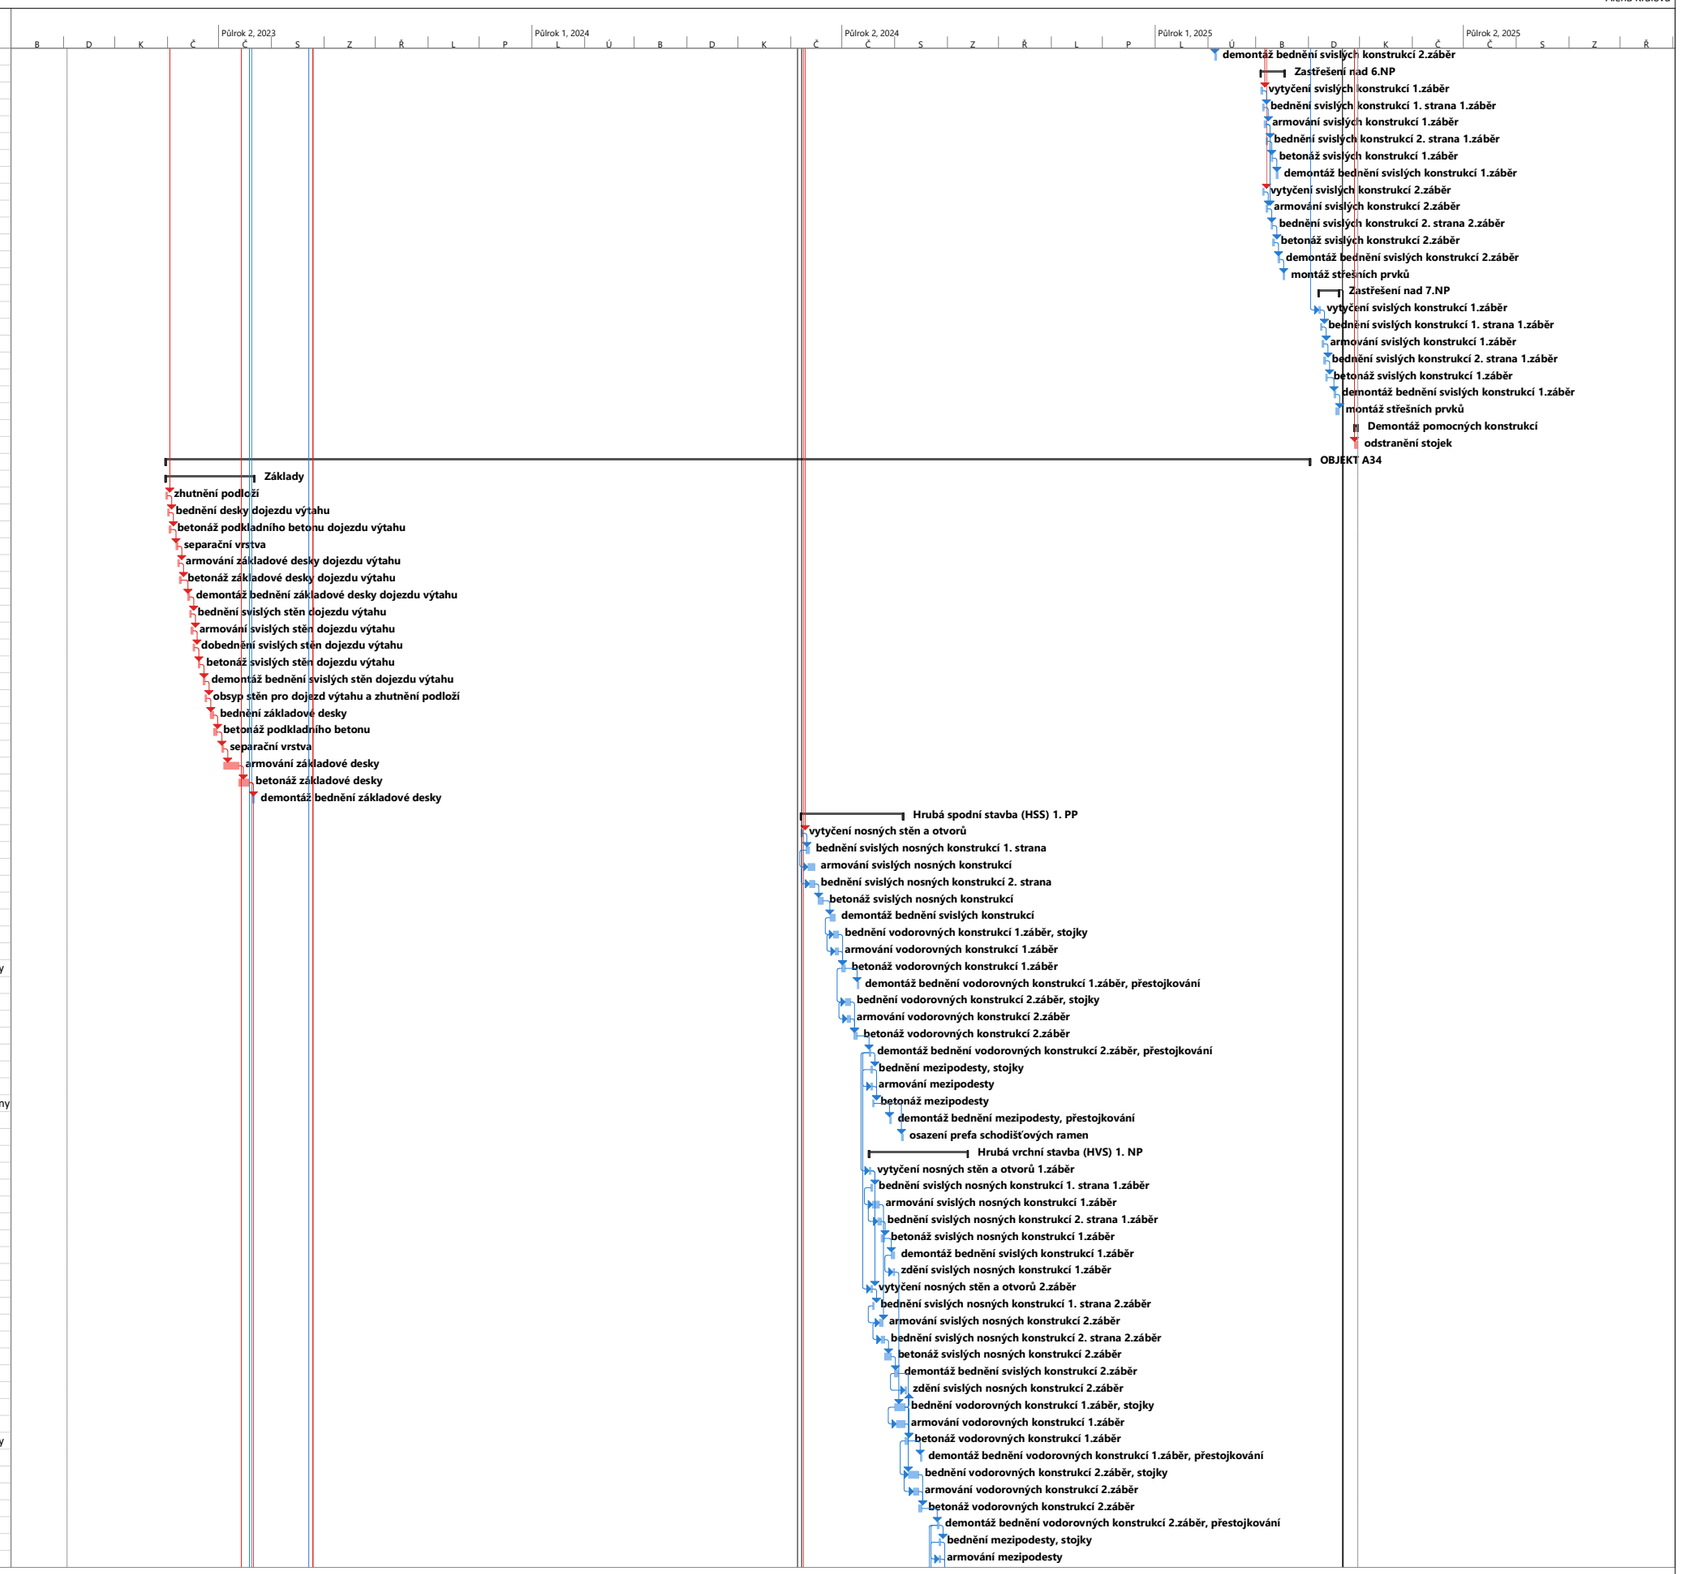

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
811		betonáž mezipodesty	1 den	28.08. 24	28.08. 24	809;810	812FS+5 dny;813FS+10 dny
812		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	05.09. 24	05.09. 24	811FS+5 dny	
813		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	12.09. 24	12.09. 24	811FS+10 dny	
814		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 2. NP**	**41 dny**	**26.08. 24**	**21.10. 24**		
815		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	26.08. 24	26.08. 24	808SS	816;821
816		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	27.08. 24	28.08. 24	815	817SS+1 den
817		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	28.08. 24	29.08. 24	816SS+1 den	818SS+1 den;823
818		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	29.08. 24	30.08. 24	817SS+1 den	819
819		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	02.09. 24	03.09. 24	818	820FS+2 dny
820		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	06.09. 24	09.09. 24	819FS+2 dny	827
821		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	27.08. 24	27.08. 24	808SS;815	822
822		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	28.08. 24	29.08. 24	821	823SS+1 den
823		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	30.08. 24	02.09. 24	817;822SS+1 den	824SS+1 den
824		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	02.09. 24	03.09. 24	823SS+1 den	825
825		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	04.09. 24	05.09. 24	824	826FS+2 dny
826		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	10.09. 24	11.09. 24	825FS+2 dny	831
827		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	10.09. 24	12.09. 24	820	828SS+1 den;829
828		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	11.09. 24	13.09. 24	827SS+1 den	829
829		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	16.09. 24	17.09. 24	827;828	830FS+5 dny;831SS+2 dny
830		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	25.09. 24	25.09. 24	829FS+5 dny	
831		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	18.09. 24	20.09. 24	826;829SS+2 dny	832SS+1 den;833
832		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	19.09. 24	23.09. 24	831SS+1 den	833
833		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	24.09. 24	24.09. 24	831;832	834FS+5 dny
834		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	02.10. 24	02.10. 24	833FS+5 dny	835;841SS;847SS
835		bednění mezipodesty, stojky	1 den	03.10. 24	03.10. 24	834	836SS;837
836		armování mezipodesty	1 den	03.10. 24	03.10. 24	835SS	837
837		betonáž mezipodesty	1 den	04.10. 24	04.10. 24	835;836	838FS+5 dny;839FS+10 dny
838		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	14.10. 24	14.10. 24	837FS+5 dny	
839		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	21.10. 24	21.10. 24	837FS+10 dny	
840		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 3. NP**	**41 dny**	**02.10. 24**	**27.11. 24**		
841		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	02.10. 24	02.10. 24	834SS	842;847
842		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	03.10. 24	04.10. 24	841	843SS+1 den
843		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	04.10. 24	07.10. 24	842SS+1 den	844SS+1 den;849
844		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	07.10. 24	08.10. 24	843SS+1 den	845
845		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	09.10. 24	10.10. 24	844	846FS+2 dny
846		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.10. 24	16.10. 24	845FS+2 dny	853
847		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	03.10. 24	03.10. 24	834SS;841	848
848		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	04.10. 24	07.10. 24	847	849SS+1 den
849		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	08.10. 24	09.10. 24	843;848SS+1 den	850SS+1 den
850		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	09.10. 24	10.10. 24	849SS+1 den	851
851		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	11.10. 24	14.10. 24	850	852FS+2 dny
852		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	17.10. 24	18.10. 24	851FS+2 dny	857
853		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	17.10. 24	22.10. 24	846	854SS+1 den;855
854		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	18.10. 24	22.10. 24	853SS+1 den	855
855		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	23.10. 24	24.10. 24	853;854	856FS+5 dny;857SS+2 dny
856		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	01.11. 24	01.11. 24	855FS+5 dny	
857		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	25.10. 24	29.10. 24	852;855SS+2 dny	858SS+1 den;859
858		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	28.10. 24	30.10. 24	857SS+1 den	859
859		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	31.10. 24	31.10. 24	857;858	860FS+5 dny
860		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	08.11. 24	08.11. 24	859FS+5 dny	861;867SS;873SS
861		bednění mezipodesty, stojky	1 den	11.11. 24	11.11. 24	860	862SS;863
862		armování mezipodesty	1 den	11.11. 24	11.11. 24	861SS	863
863		betonáž mezipodesty	1 den	12.11. 24	12.11. 24	861;862	864FS+5 dny;865FS+10 dny
864		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	20.11. 24	20.11. 24	863FS+5 dny	
865		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	27.11. 24	27.11. 24	863FS+10 dny	
866		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 4. NP**	**41 dny**	**08.11. 24**	**17.01. 25**		
867		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	08.11. 24	08.11. 24	860SS	868;873
868		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	11.11. 24	12.11. 24	867	869SS+1 den
869		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.11. 24	13.11. 24	868SS+1 den	870SS+1 den;875
870		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	13.11. 24	14.11. 24	869SS+1 den	871
871		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	15.11. 24	18.11. 24	870	872FS+2 dny
872		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	21.11. 24	22.11. 24	871FS+2 dny	879
873		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	11.11. 24	11.11. 24	860SS;867	874
874		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	12.11. 24	13.11. 24	873	875SS+1 den
875		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	14.11. 24	15.11. 24	869;874SS+1 den	876SS+1 den
876		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	15.11. 24	18.11. 24	875SS+1 den	877
877		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	19.11. 24	20.11. 24	876	878FS+2 dny
878		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	25.11. 24	26.11. 24	877FS+2 dny	883
879		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	4 dny	25.11. 24	28.11. 24	872	880SS+1 den;881
880		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	3 dny	26.11. 24	28.11. 24	879SS+1 den	881
881		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	29.11. 24	02.12. 24	879;880	882FS+5 dny;883SS+2 dny
882		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	10.12. 24	10.12. 24	881FS+5 dny	
883		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	03.12. 24	05.12. 24	878;881SS+2 dny	884SS+1 den;885
884		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	3 dny	04.12. 24	06.12. 24	883SS+1 den	885
885		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	09.12. 24	09.12. 24	883;884	886FS+5 dny
886		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	17.12. 24	17.12. 24	885FS+5 dny	887;893SS;899SS
887		bednění mezipodesty, stojky	1 den	18.12. 24	18.12. 24	886	888SS;889
888		armování mezipodesty	1 den	18.12. 24	18.12. 24	887SS	889
889		betonáž mezipodesty	1 den	19.12. 24	19.12. 24	887;888	890FS+5 dny;891FS+10 dny
890		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	10.01. 25	10.01. 25	889FS+5 dny	
891		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	17.01. 25	17.01. 25	889FS+10 dny	
892		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 5. NP**	**40 dny**	**17.12. 24**	**24.02. 25**		
893		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	17.12. 24	17.12. 24	886SS	894;899
894		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	2 dny	18.12. 24	19.12. 24	893	895SS+1 den
895		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	19.12. 24	20.12. 24	894SS+1 den	896SS+1 den;901
896		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	2 dny	20.12. 24	06.01. 25	895SS+1 den	897
897		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	2 dny	07.01. 25	08.01. 25	896	898FS+2 dny
898		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	13.01. 25	14.01. 25	897FS+2 dny	905
899		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	18.12. 24	18.12. 24	886SS;893	900
900		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	2 dny	19.12. 24	20.12. 24	899	901SS+1 den

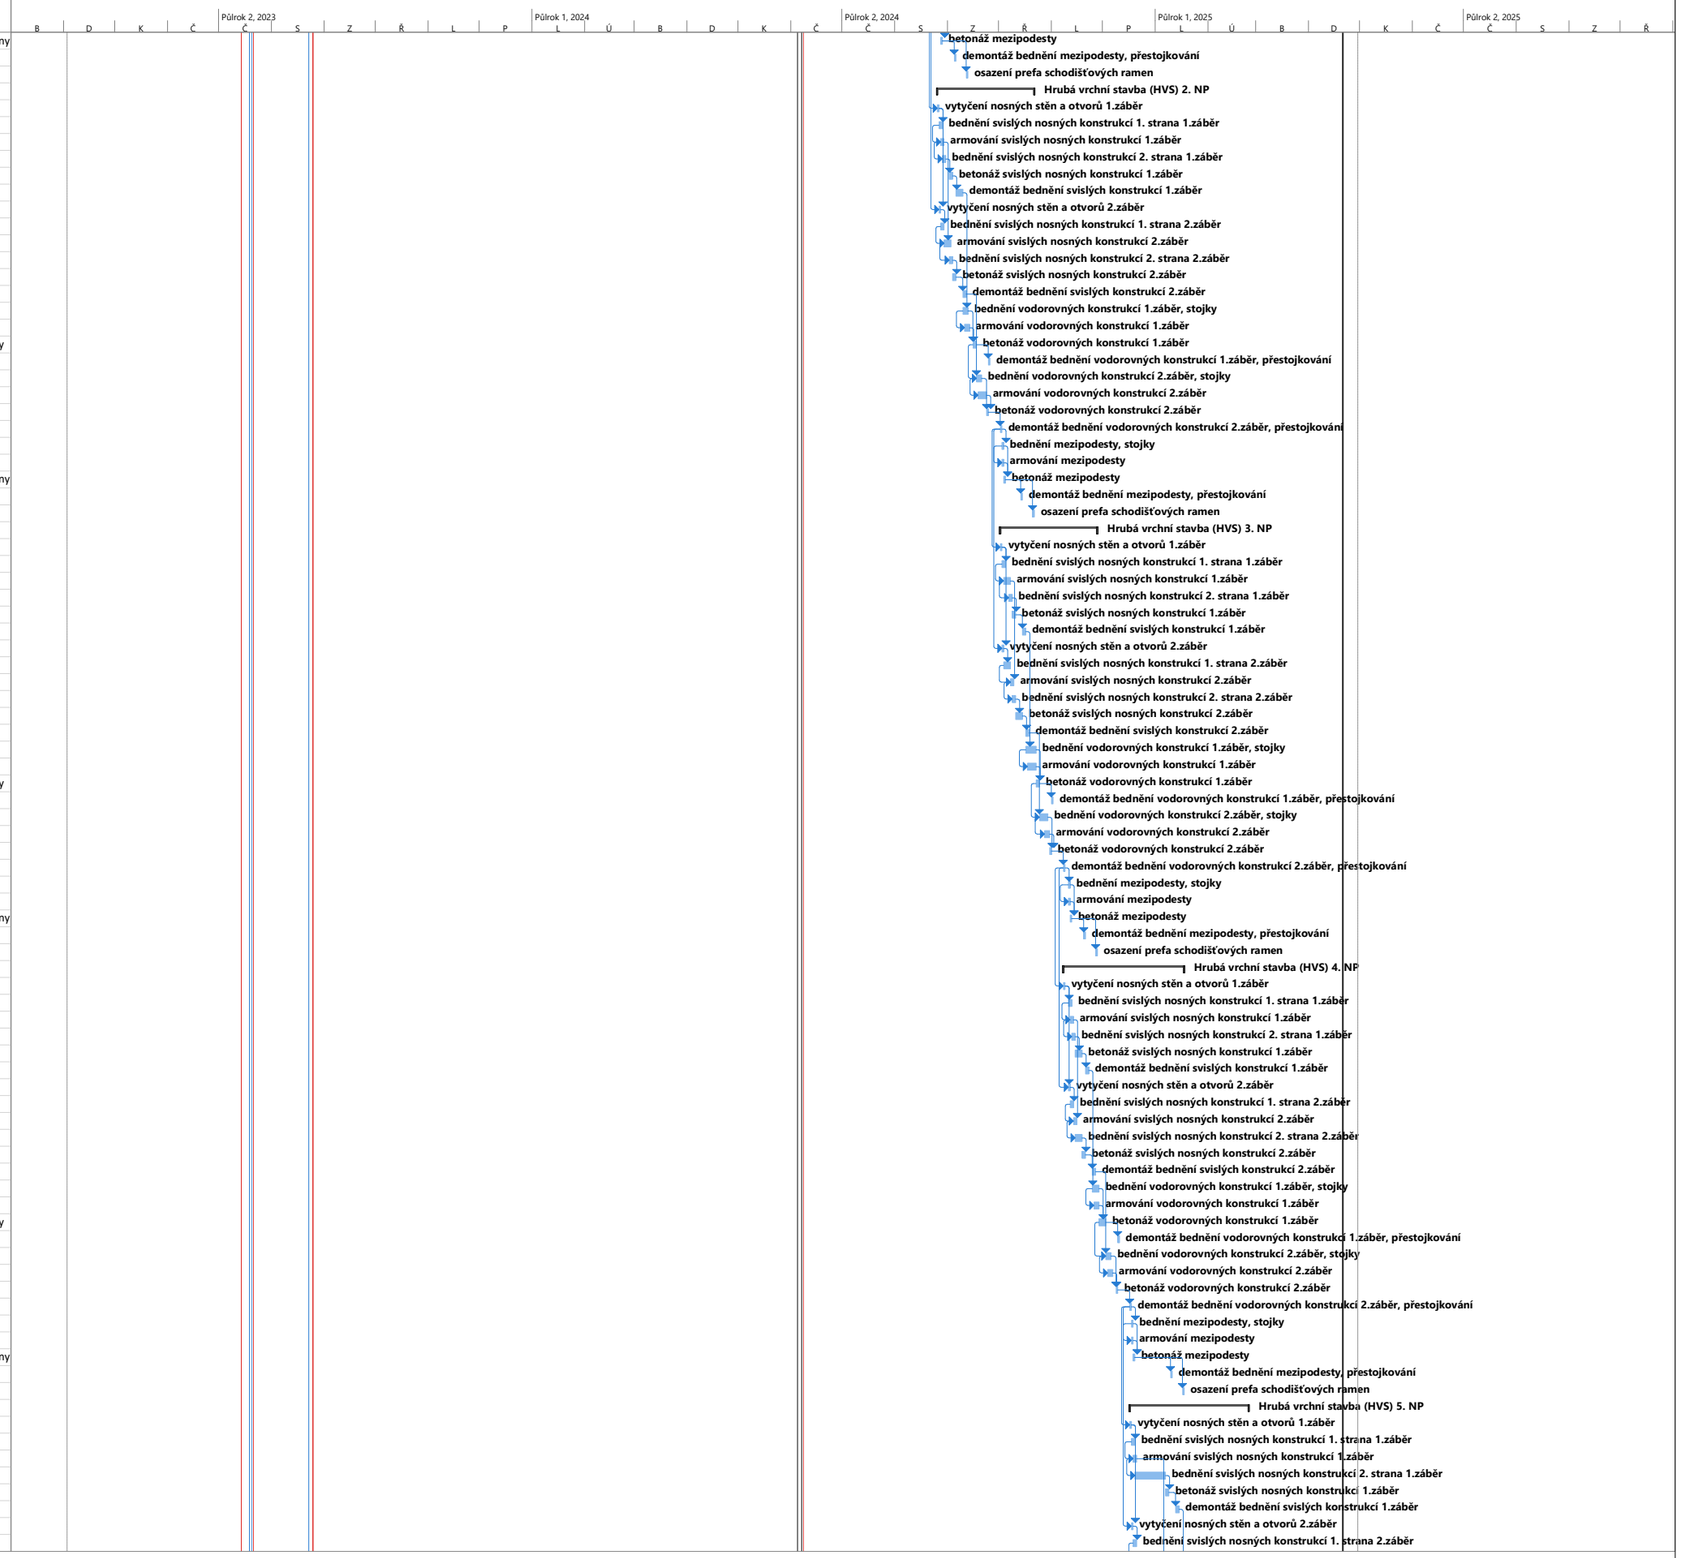
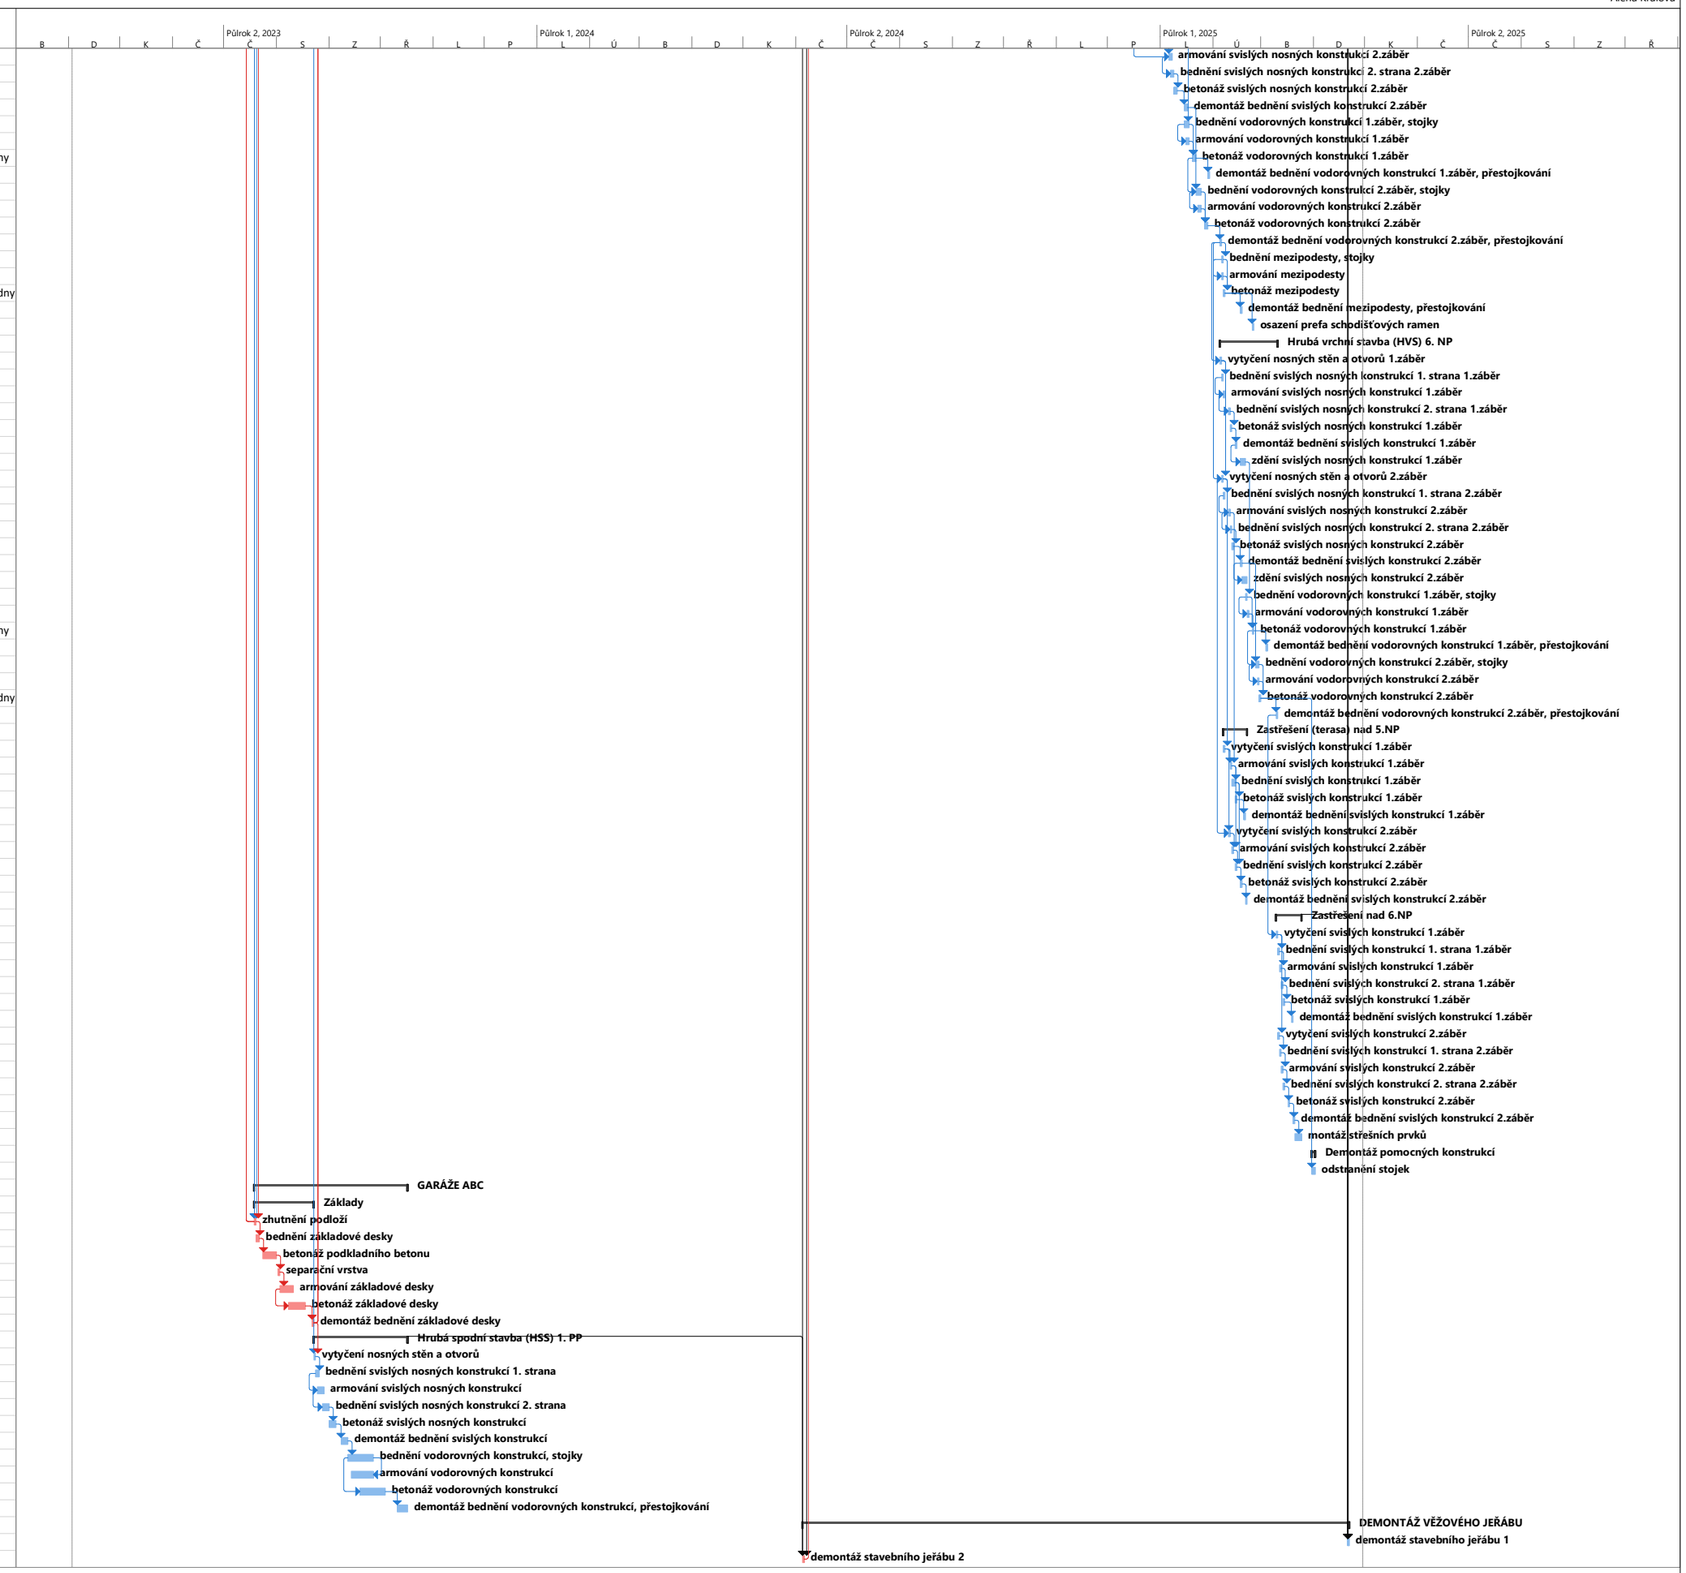
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
901		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	06.01. 25	07.01. 25	895;900SS+1 den	902SS+1 den
902		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	2 dny	07.01. 25	08.01. 25	901SS+1 den	903
903		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	2 dny	09.01. 25	10.01. 25	902	904FS+2 dny
904		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	2 dny	15.01. 25	16.01. 25	903FS+2 dny	909
905		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	3 dny	15.01. 25	17.01. 25	898	906SS+1 den;907
906		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	16.01. 25	17.01. 25	905SS+1 den	907
907		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	2 dny	20.01. 25	21.01. 25	905;906	908FS+5 dny;909SS+2 dny
908		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	29.01. 25	29.01. 25	907FS+5 dny	
909		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	3 dny	22.01. 25	24.01. 25	904;907SS+2 dny	910SS+1 den;911
910		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	23.01. 25	24.01. 25	909SS+1 den	911
911		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	2 dny	27.01. 25	28.01. 25	909;910	912FS+5 dny
912		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	05.02. 25	05.02. 25	911FS+5 dny	913;919SS;926SS
913		bednění mezipodesty, stojky	1 den	06.02. 25	06.02. 25	912	914SS;915
914		armování mezipodesty	1 den	06.02. 25	06.02. 25	913SS	915
915		betonáž mezipodesty	1 den	07.02. 25	07.02. 25	913;914	916FS+5 dny;917FS+10 dny
916		demontáž bednění mezipodesty, přestojkování	1 den	17.02. 25	17.02. 25	915FS+5 dny	
917		osazení prefa schodišťových ramen	1 den	24.02. 25	24.02. 25	915FS+10 dny	
918		**Hrubá vrchní stavba (HVS) 6. NP**	**24 dny**	**05.02. 25**	**10.03. 25**		
919		vytyčení nosných stěn a otvorů 1.záběr	1 den	05.02. 25	05.02. 25	912SS	920;926
920		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	06.02. 25	06.02. 25	919	921SS+1 den
921		armování svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	07.02. 25	07.02. 25	920SS+1 den	922SS+1 den
922		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	10.02. 25	10.02. 25	921SS+1 den	923
923		betonáž svislých nosných konstrukcí 1.záběr	1 den	11.02. 25	11.02. 25	922	924FS+2 dny
924		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.02. 25	14.02. 25	923FS+2 dny	925SS+1 den
925		zdění svislých nosných konstrukcí 1.záběr	3 dny	17.02. 25	19.02. 25	924SS+1 den	933
926		vytyčení nosných stěn a otvorů 2.záběr	1 den	06.02. 25	06.02. 25	912SS;919	927;947SS;942
927		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	07.02. 25	07.02. 25	926	928SS+1 den
928		armování svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	10.02. 25	10.02. 25	927SS+1 den	929SS+1 den;943
929		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	11.02. 25	11.02. 25	928SS+1 den	930
930		betonáž svislých nosných konstrukcí 2.záběr	1 den	12.02. 25	12.02. 25	929	931FS+2 dny
931		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	17.02. 25	17.02. 25	930FS+2 dny	932SS+1 den;937
932		zdění svislých nosných konstrukcí 2.záběr	3 dny	18.02. 25	20.02. 25	931SS+1 den	
933		bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, stojky	1 den	20.02. 25	20.02. 25	925	934SS+1 den;935
934		armování vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	21.02. 25	21.02. 25	933SS+1 den	935
935		betonáž vodorovných konstrukcí 1.záběr	1 den	24.02. 25	24.02. 25	933;934	936FS+5 dny;937SS+2 dny
936		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 1.záběr, přestojkov	1 den	04.03. 25	04.03. 25	935FS+5 dny	
937		bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, stojky	2 dny	26.02. 25	27.02. 25	931;935SS+2 dny	938SS+1 den;939
938		armování vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	27.02. 25	27.02. 25	937SS+1 den	939
939		betonáž vodorovných konstrukcí 2.záběr	1 den	28.02. 25	28.02. 25	937;938	940FS+5 dny;967FS+20 dny
940		demontáž bednění vodorovných konstrukcí 2.záběr, přestojkov	1 den	10.03. 25	10.03. 25	939FS+5 dny	953SS
941		**Zastřešení (terasa) nad 5.NP**	**10 dny**	**07.02. 25**	**20.02. 25**		
942		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	07.02. 25	07.02. 25	926	943;947
943		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	11.02. 25	11.02. 25	928;942	944;948
944		bednění svislých konstrukcí 1.záběr	2 dny	12.02. 25	13.02. 25	943	945;949
945		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.02. 25	14.02. 25	944	946FS+2 dny
946		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	19.02. 25	19.02. 25	945FS+2 dny	
947		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	10.02. 25	10.02. 25	926SS;942	948
948		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	12.02. 25	12.02. 25	943;947	949
949		bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	14.02. 25	14.02. 25	944;948	950
950		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	17.02. 25	17.02. 25	949	951FS+2 dny
951		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	20.02. 25	20.02. 25	950FS+2 dny	
952		**Zastřešení nad 6.NP**	**11 dny**	**10.03. 25**	**24.03. 25**		**989**
953		vytyčení svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	10.03. 25	10.03. 25	940SS	954;959
954		bednění svislých konstrukcí 1. strana 1.záběr	1 den	11.03. 25	11.03. 25	953	955
955		armování svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	12.03. 25	12.03. 25	954	956
956		bednění svislých konstrukcí 2. strana 1.záběr	1 den	13.03. 25	13.03. 25	955	957
957		betonáž svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	14.03. 25	14.03. 25	956	958FS+2 dny
958		demontáž bednění svislých konstrukcí 1.záběr	1 den	19.03. 25	19.03. 25	957FS+2 dny	
959		vytyčení svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	11.03. 25	11.03. 25	953	960
960		bednění svislých konstrukcí 1. strana 2.záběr	1 den	12.03. 25	12.03. 25	959	961
961		armování svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	13.03. 25	13.03. 25	960	962
962		bednění svislých konstrukcí 2. strana 2.záběr	1 den	14.03. 25	14.03. 25	961	963
963		betonáž svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	17.03. 25	17.03. 25	962	964FS+2 dny
964		demontáž bednění svislých konstrukcí 2.záběr	1 den	20.03. 25	20.03. 25	963FS+2 dny	965
965		montáž střešních prvků	2 dny	21.03. 25	24.03. 25	964	
966		**Demontáž pomocných konstrukcí**	**2 dny**	**31.03. 25**	**01.04. 25**		
967		odstranění stojek	2 dny	31.03. 25	01.04. 25	939FS+20 dny	
968		**GARÁŽE ABC**	**64 dny**	**19.07. 23**	**16.10. 23**		
969		**Základy**	**25 dny**	**19.07. 23**	**22.08. 23**		
970		zhutnění podloží	1 den	19.07. 23	19.07. 23	764;512;291;68	971;31SS;28SS
971		bednění základové desky	2 dny	20.07. 23	21.07. 23	970	972
972		betonáž podkladního betonu	6 dny	24.07. 23	31.07. 23	971	973FS+1 den
973		separační vrstva	1 den	02.08. 23	02.08. 23	972FS+1 den	974
974		armování základové desky	6 dny	03.08. 23	10.08. 23	973	975SS+3 dny
975		betonáž základové desky	8 dny	08.08. 23	17.08. 23	974SS+3 dny	976FS+2 dny
976		demontáž bednění základové desky	1 den	22.08. 23	22.08. 23	975FS+2 dny	71;294;978
977		**Hrubá spodní stavba (HSS) 1. PP**	**39 dny**	**23.08. 23**	**16.10. 23**		**990**
978		vytyčení nosných stěn a otvorů	1 den	23.08. 23	23.08. 23	37;976	979
979		bednění svislých nosných konstrukcí 1. strana	2 dny	24.08. 23	25.08. 23	978	980SS+1 den
980		armování svislých nosných konstrukcí	2 dny	25.08. 23	28.08. 23	979SS+1 den	981SS+1 den
981		bednění svislých nosných konstrukcí 2. strana	4 dny	28.08. 23	31.08. 23	980SS+1 den	982
982		betonáž svislých nosných konstrukcí	2 dny	01.09. 23	04.09. 23	981	983FS+3 dny
983		demontáž bednění svislých konstrukcí	2 dny	08.09. 23	11.09. 23	982FS+3 dny	984
984		bednění vodorovných konstrukcí, stojky	11 dny	12.09. 23	26.09. 23	983	985FF;986SS+5 dny
985		armování vodorovných konstrukcí	9 dny	14.09. 23	26.09. 23	984FF	
986		betonáž vodorovných konstrukcí	11 dny	19.09. 23	03.10. 23	984SS+5 dny	987FS+5 dny
987		demontáž bednění vodorovných konstrukcí, přestojkování	4 dny	11.10. 23	16.10. 23	986FS+5 dny	
988		**DEMONTÁŽ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU**	**219 dny**	**05.06. 24**	**21.04. 25**		
989		demontáž stavebního jeřábu 1	1 den	21.04. 25	21.04. 25	38;952;735	
990		demontáž stavebního jeřábu 2	1 den	05.06. 24	05.06. 24	977;477;256	27
