ČVUT
Fakulta stavební

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	**Územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí (malá EIA)**	**203 dny**
2	**Posouzení vlivu na životní prostředí (malá EIA)**	**118 dny**
3	Zpracování oznámení EIA	35 dny
4	Odevzdání na krajský úřad	1 den
5	Zveřejnění oznámení na úřední desce	7 dny
6	Závěr zjišťovacího řízení	45 dny
7	Zveřejnění rozhodnutí na úřední desce s možností odvolání	15 dny
8	Nabytí právní moci	15 dny
9	**Vydání územního rozhodnutí**	**85 dny**
10	Osobní doručování dokumentace	1 den
11	Závazná stanoviska DOSS a správců sítí	30 dny
12	Žádost o vydání územního rozhodnutí	1 den
13	Spracování žádosti	7 dny
14	Oznámení o vypsání zahajovacího řízení a vypsání termínů pro ústní jednání	1 den
15	Doručování oznámení	11 dny
16	Konání ústního jednání	1 den
17	Oznámení o vypsání rozhodnutí	7 dny
18	Doručování oznámení	11 dny
19	Nabytí právní moci	15 dny
20	**Stavební řízení**	**128 dny**
21	**Vydání stavebního povolení**	**128 dny**
22	Osobní doručování dokumentace	1 den
23	Závazná stanoviska DOSS a správců sítí	30 dny
24	Žádost o vydání stavebního povolení	1 den
25	Spracování žádosti	7 dny
26	Oznámení o zahájení stavebního řízení	1 den
27	Doručování oznámení	11 dny
28	Ústní jednání nebo lhůta pro námitky	1 den
29	Rozhodnutí o námitkách soulad s územním rozhodnutím a požadovaných DOSS, dodržování OTP	60 dny
30	Vydání stavebního povolení	1 den
31	Nabytí právní moci	15 dny
32	**Možný začátek realizace**	0 dny

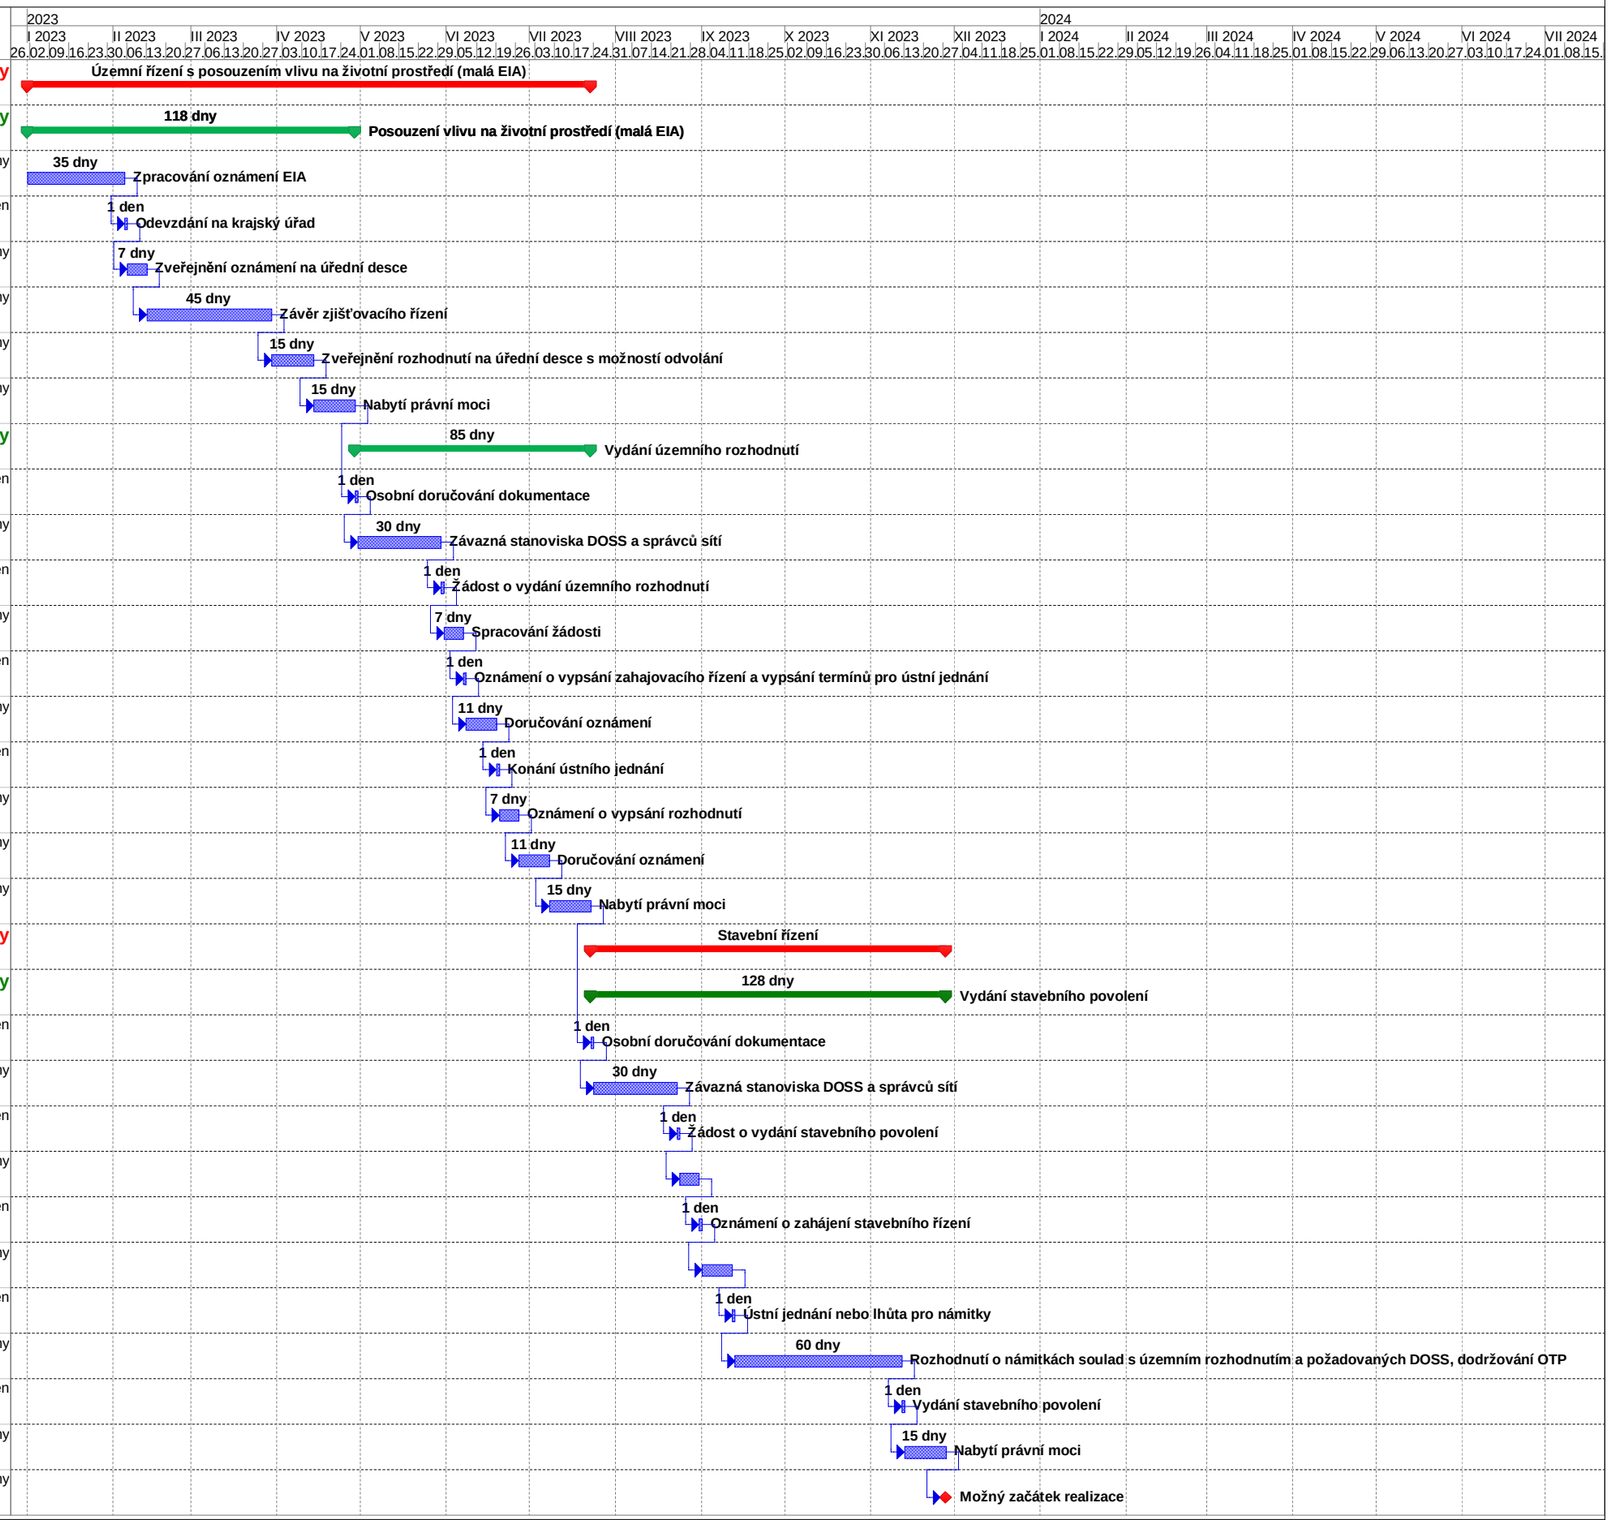

Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 2077/7
166 29 Praha 6
