ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TÉMA – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT – BYTOVÝ DŮM SOKOLOVSKÁ 48

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

ONDŘEJ ŠIMEK

2023

Vedoucí práce: **Ing. Martin Hlava, Ph.D**

Obsah

1. ČASOPROSTOROVÝ GRAF .....
2. HARMONOGRAM .....
3. GRAF NASAZENÍ PRACOVNÍKŮ, STROJŮ A MATERIÁLU .....

Časoprostorový graf

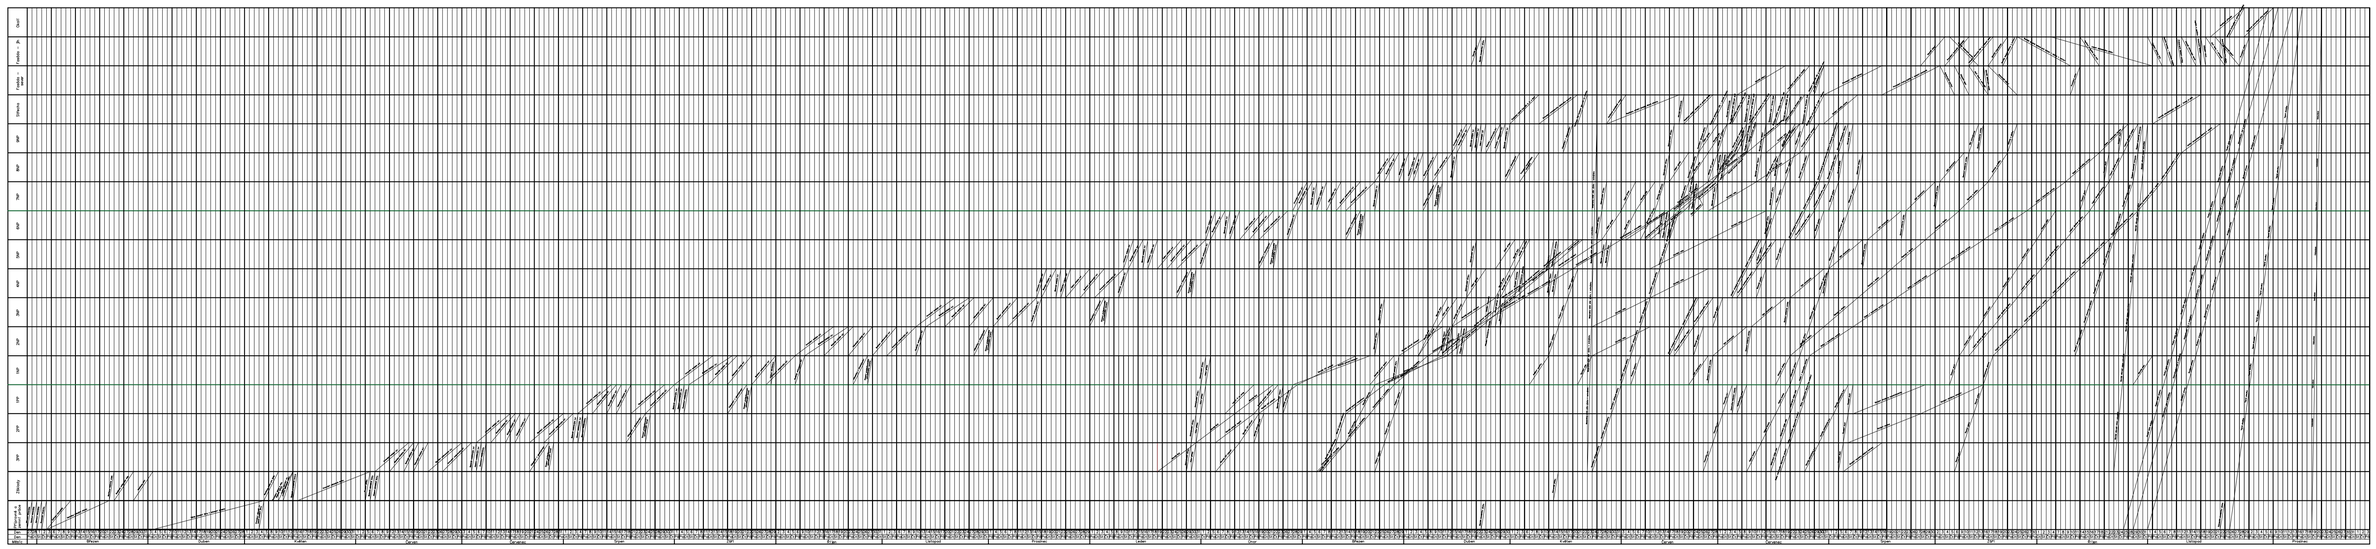

OBOR	DOPRAVNÍ STAVBY		
ROČNÍK INŽENÝRSKÉ	MGR		
ROZVRH	CELOSVĚTOVÝ	Grafický Server	
TRVLY	Ing. Radek Matoušek, Ph.D.		
CÍLOVÝ	Řešení jednosmerné dopravy - Časoprostorový graf	DATUM	14.12.2010
		FORMÁT	A0
		MĚŘÍTKO	1:1000
OBSAH	Řešení jednosmerné dopravy - Časoprostorový graf	ČÍSLO PŘÍLOHY	1

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		**Přípravné a zemní práce**	**55 dny**	**27.02. 23**	**12.05. 23**		
2		Převzetí staveniště	1 den	27.02. 23	27.02. 23		3
3		Vytyčení staveniště	1 den	28.02. 23	28.02. 23	2	4
4		Oplocení staveniště	1 den	01.03. 23	01.03. 23	3	5
5		Rozebrání chodníku	1 den	02.03. 23	02.03. 23	4	6
6		Zařízení staveniště	5 dny	03.03. 23	09.03. 23	5	7SS
7		Demolice stávající stavby	13 dny	03.03. 23	21.03. 23	6SS	8
8		Realizace vodících zídek	1 den	22.03. 23	22.03. 23	7	9
9		Realizace milánských stěn	4 dny	23.03. 23	28.03. 23	8	10
10		Realizace pilot	4 dny	29.03. 23	03.04. 23	9	11
11		Výkop stavební jámy + odvezení výkopku	23 dny	04.04. 23	04.05. 23	10	12FF
12		Provedení zábradlí na hraně stavební jámy	1 den	04.05. 23	04.05. 23	11FF	13
13		Realizace desky pro jeřáb	3 dny	05.05. 23	09.05. 23	12	14
14		Provedení desky a stěn dojezdů	3 dny	10.05. 23	12.05. 23	13	15FF;17
15		Uložení zemnění na základové	2 dny	11.05. 23	12.05. 23	14FF	
16		**Hrubá spodní stavba**	**157 dny**	**15.05. 23**	**19.12. 23**		
17		Betonáž podkladních betonů	1 den	15.05. 23	15.05. 23	14	18
18		Armování základové desky	15 dny	16.05. 23	05.06. 23	17	19FF;20
19		Osazení jeřábu	1 den	05.06. 23	05.06. 23	18FF	
20		Betonáž základové desky	1 den	06.06. 23	06.06. 23	18	21;23
21		Hlazení základové desky	1 den	07.06. 23	07.06. 23	20	
22		**3PP**	**96 dny**	**07.06. 23**	**18.10. 23**		
23		Armování svislých kcí	7 dny	07.06. 23	15.06. 23	20	24SS+3 dny
24		Bednění svislých kcí	5 dny	12.06. 23	16.06. 23	23SS+3 dny	25SS+3 dny
25		Betonáž svislých kcí	3 dny	15.06. 23	19.06. 23	24SS+3 dny	26SS+2 dny
26		Odbednění svislých kcí	3 dny	19.06. 23	21.06. 23	25SS+2 dny	27
27		Bednění vodorovných kcí	7 dny	22.06. 23	30.06. 23	26	28SS+3 dny
28		Armování vodorovných kcí	7 dny	27.06. 23	05.07. 23	27SS+3 dny	29;36
29		Betonáž vodorovných kcí	1 den	06.07. 23	06.07. 23	28	30;32FS+10
30		Hlazení vodorvných kcí	1 den	07.07. 23	07.07. 23	29	31
31		Provedení mezipodesty	1 den	10.07. 23	10.07. 23	30	
32		Odbednění + přestojkování	4 dny	21.07. 23	26.07. 23	29FS+10 dr	33
33		Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	1 den	27.07. 23	27.07. 23	32	
34		Odstojkování stropu	1 den	18.10. 23	18.10. 23	75	
35		**2PP**	**100 dny**	**06.07. 23**	**22.11. 23**		
36		Armování svislých kcí	7 dny	06.07. 23	14.07. 23	28	37SS+3 dny
37		Bednění svislých kcí	5 dny	11.07. 23	17.07. 23	36SS+3 dny	38SS+3 dny
38		Betonáž svislých kcí	3 dny	14.07. 23	18.07. 23	37SS+3 dny	39SS+2 dny
39		Odbednění svislých kcí	3 dny	18.07. 23	20.07. 23	38SS+2 dny	40
40		Bednění vodorovných kcí	7 dny	21.07. 23	31.07. 23	39	41SS+3 dny
41		Armování vodorovných kcí	7 dny	26.07. 23	03.08. 23	40SS+3 dny	42;49

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
42		Betonáž vodorovných kcí	1 den	04.08. 23	04.08. 23	41	43;45FS+10
43		Hlazení vodorvných kcí	1 den	07.08. 23	07.08. 23	42	44
44		Provedení mezipodesty	1 den	08.08. 23	08.08. 23	43	
45		Odbednění + přestojkování	4 dny	21.08. 23	24.08. 23	42FS+10 dr	46
46		Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	1 den	25.08. 23	25.08. 23	45	
47		Odstojkování stropu	1 den	22.11. 23	22.11. 23	86	
48		**1PP**	**98 dny**	**04.08. 23**	**19.12. 23**		
49		Armování svislých kcí	7 dny	04.08. 23	14.08. 23	41	50SS+3 dny
50		Bednění svislých kcí	5 dny	09.08. 23	15.08. 23	49SS+3 dny	51SS+3 dny
51		Betonáž svislých kcí	3 dny	14.08. 23	16.08. 23	50SS+3 dny	52SS+2 dny
52		Odbednění svislých kcí	3 dny	16.08. 23	18.08. 23	51SS+2 dny	53
53		Bednění vodorovných kcí	7 dny	21.08. 23	29.08. 23	52	54SS+3 dny
54		Armování vodorovných kcí	7 dny	24.08. 23	01.09. 23	53SS+3 dny	55;63
55		Betonáž vodorovných kcí	1 den	04.09. 23	04.09. 23	54	56;58FS+10
56		Hlazení vodorvných kcí	1 den	05.09. 23	05.09. 23	55	57
57		Provedení mezipodesty	1 den	06.09. 23	06.09. 23	56	
58		Odbednění + přestojkování	4 dny	19.09. 23	22.09. 23	55FS+10 dr	59
59		Osazení prefabrikovaných schodišťových ramen	1 den	25.09. 23	25.09. 23	58	
60		Odstojkování stropu	1 den	19.12. 23	19.12. 23	97	
61		**Hrubá vrchní stavba**	**185 dny**	**04.09. 23**	**17.05. 24**		
62		**1NP**	**95 dny**	**04.09. 23**	**12.01. 24**		
63		Armování svislých kcí	8 dny	04.09. 23	13.09. 23	54	64SS+3 dny
64		Bednění svislých kcí	9 dny	07.09. 23	19.09. 23	63SS+3 dny	65SS+4 dny
65		Betonáž svislých kcí	6 dny	13.09. 23	20.09. 23	64SS+4 dny	66SS+4 dny
66		Odbednění svislých kcí	5 dny	19.09. 23	25.09. 23	65SS+4 dny	67
67		Bednění vodorovných kcí	5 dny	26.09. 23	02.10. 23	66	68FF;69SS+2
68		Vložení vibroizolace	1 den	02.10. 23	02.10. 23	67FF	
69		Armování vodorovných kcí	6 dny	28.09. 23	05.10. 23	67SS+2 dny	70
70		Betonáž vodorovných kcí	2 dny	06.10. 23	09.10. 23	69	71FS+10 dny
71		Odbednění + přestojkování	3 dny	24.10. 23	26.10. 23	70FS+10 dr	72
72		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	27.10. 23	27.10. 23	71	
73		Odstojkování stropu	1 den	12.01. 24	12.01. 24	109	
74		**2NP**	**88 dny**	**06.10. 23**	**06.02. 24**		
75		Armování svislých kcí	8 dny	06.10. 23	17.10. 23	70SS	76SS+2 dny;
76		Bednění svislých kcí	9 dny	10.10. 23	20.10. 23	75SS+2 dny	77SS+4 dny
77		Betonáž svislých kcí	6 dny	16.10. 23	23.10. 23	76SS+4 dny	78SS+5 dny
78		Odbednění svislých kcí	5 dny	23.10. 23	27.10. 23	77SS+5 dny	79
79		Bednění vodorovných kcí	5 dny	30.10. 23	03.11. 23	78	80SS+3 dny
80		Armování vodorovných kcí	6 dny	02.11. 23	09.11. 23	79SS+3 dny	81
81		Betonáž vodorovných kcí	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	80	82FS+10 dny
82		Odbednění + přestojkování	3 dny	28.11. 23	30.11. 23	81FS+10 dr	83

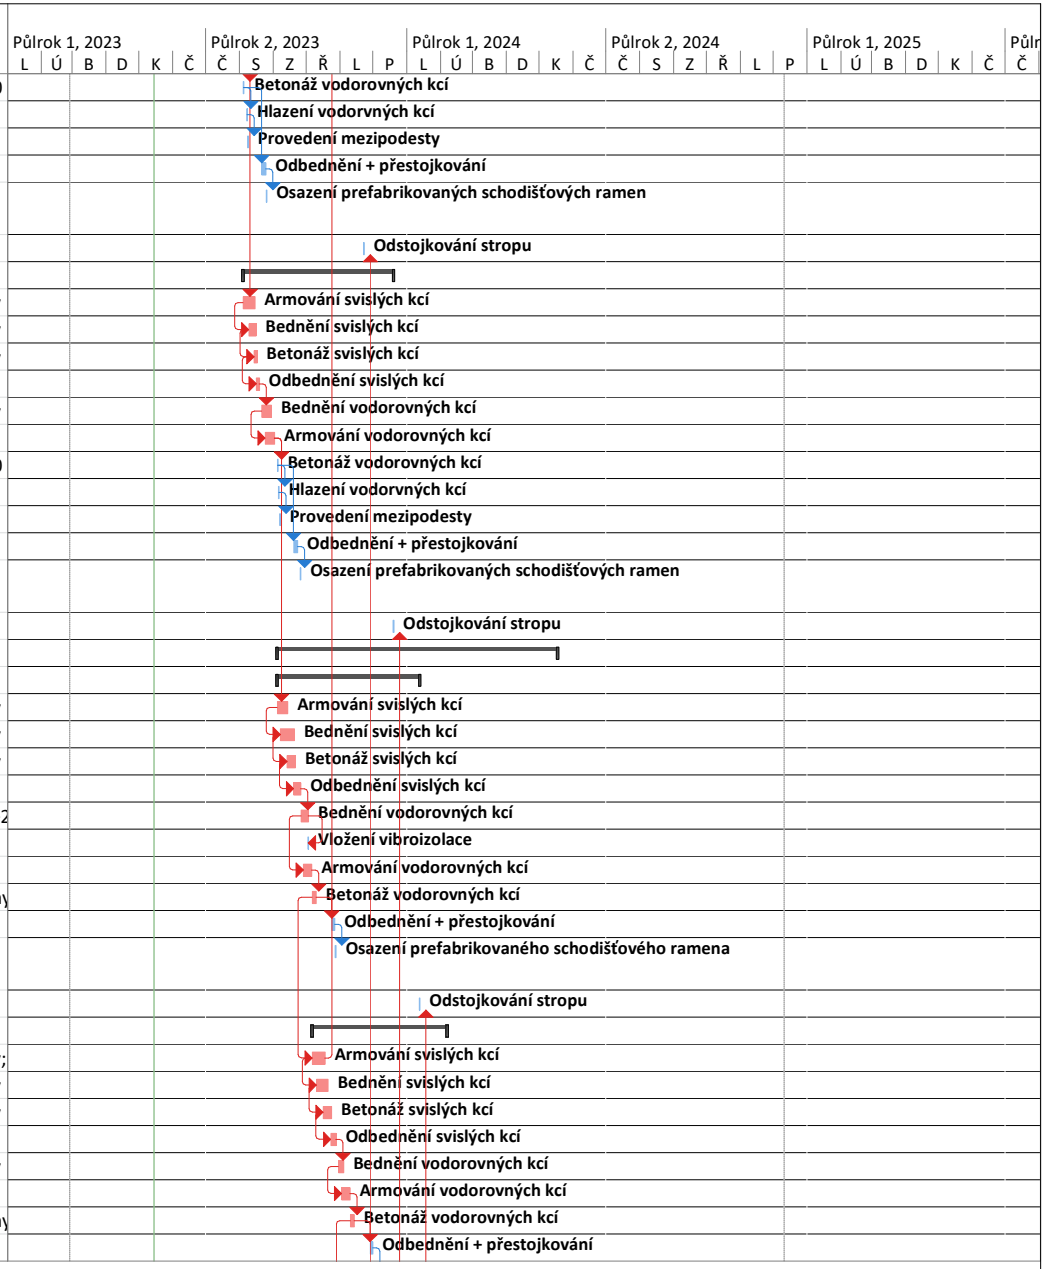

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
83		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	01.12. 23	01.12. 23	82	
84		Odstojkování stropu	1 den	06.02. 24	06.02. 24	121	
85		**3NP**	**82 dny**	**10.11. 23**	**04.03. 24**		
86		Armování svislých kcí	8 dny	10.11. 23	21.11. 23	81SS	87SS+2 dny;
87		Bednění svislých kcí	9 dny	14.11. 23	24.11. 23	86SS+2 dny	88SS+4 dny
88		Betonáž svislých kcí	6 dny	20.11. 23	27.11. 23	87SS+4 dny	89SS+5 dny
89		Odbednění svislých kcí	5 dny	27.11. 23	01.12. 23	88SS+5 dny	90
90		Bednění vodorovných kcí	5 dny	04.12. 23	08.12. 23	89	91SS+3 dny
91		Armování vodorovných kcí	6 dny	07.12. 23	14.12. 23	90SS+3 dny	92FS-1 den
92		Betonáž vodorovných kcí	2 dny	14.12. 23	15.12. 23	91FS-1 den	93FS+10 dny
93		Odbednění + přestojkování	3 dny	01.01. 24	03.01. 24	92FS+10 dr	94
94		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	04.01. 24	04.01. 24	93	
95		Odstojkování stropu	1 den	04.03. 24	04.03. 24	133	
96		**4NP**	**75 dny**	**15.12. 23**	**28.03. 24**		
97		Armování svislých kcí	2 dny	15.12. 23	18.12. 23	92SS+1 den	98SS+1 den;
98		Bednění svislých kcí	3 dny	18.12. 23	20.12. 23	97SS+1 den	99
99		Betonáž svislých kcí	1 den	21.12. 23	21.12. 23	98	100
100		Odbednění svislých kcí	2 dny	22.12. 23	25.12. 23	99	101SS+1 den
101		Zdění svislých kcí	5 dny	25.12. 23	29.12. 23	100SS+1 de	102SS+3 dny
102		Bednění vodorovných kcí	5 dny	28.12. 23	03.01. 24	101SS+3 dr	103SS+3 dny
103		Armování vodorovných kcí	6 dny	02.01. 24	09.01. 24	102SS+3 dr	104SS+5 dny
104		Betonáž vodorovných kcí	2 dny	09.01. 24	10.01. 24	103SS+5 dr	105FS+10 dr
105		Odbednění + přestojkování	3 dny	25.01. 24	29.01. 24	104FS+10 c	106
106		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	30.01. 24	30.01. 24	105	
107		Odstojkování stropu	1 den	28.03. 24	28.03. 24	145	
108		**5NP**	**72 dny**	**10.01. 24**	**18.04. 24**		
109		Armování svislých kcí	2 dny	10.01. 24	11.01. 24	104SS+1 de	110SS+1 den
110		Bednění svislých kcí	3 dny	11.01. 24	15.01. 24	109SS+1 de	111
111		Betonáž svislých kcí	1 den	16.01. 24	16.01. 24	110	112
112		Odbednění svislých kcí	2 dny	17.01. 24	18.01. 24	111	113
113		Zdění svislých kcí	5 dny	19.01. 24	25.01. 24	112	114SS+2 dny
114		Bednění vodorovných kcí	5 dny	23.01. 24	29.01. 24	113SS+2 dr	115SS+2 dny
115		Armování vodorovných kcí	6 dny	25.01. 24	01.02. 24	114SS+2 dr	116SS+5 dny
116		Betonáž vodorovných kcí	2 dny	01.02. 24	02.02. 24	115SS+5 dr	117FS+10 dr
117		Odbednění + přestojkování	3 dny	19.02. 24	21.02. 24	116FS+10 c	118
118		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	22.02. 24	22.02. 24	117	
119		Odstojkování stropu	1 den	18.04. 24	18.04. 24	157	
120		**6NP**	**76 dny**	**02.02. 24**	**17.05. 24**		
121		Armování svislých kcí	2 dny	02.02. 24	05.02. 24	116SS+1 de	122SS+1 den
122		Bednění svislých kcí	3 dny	05.02. 24	07.02. 24	121SS+1 de	123

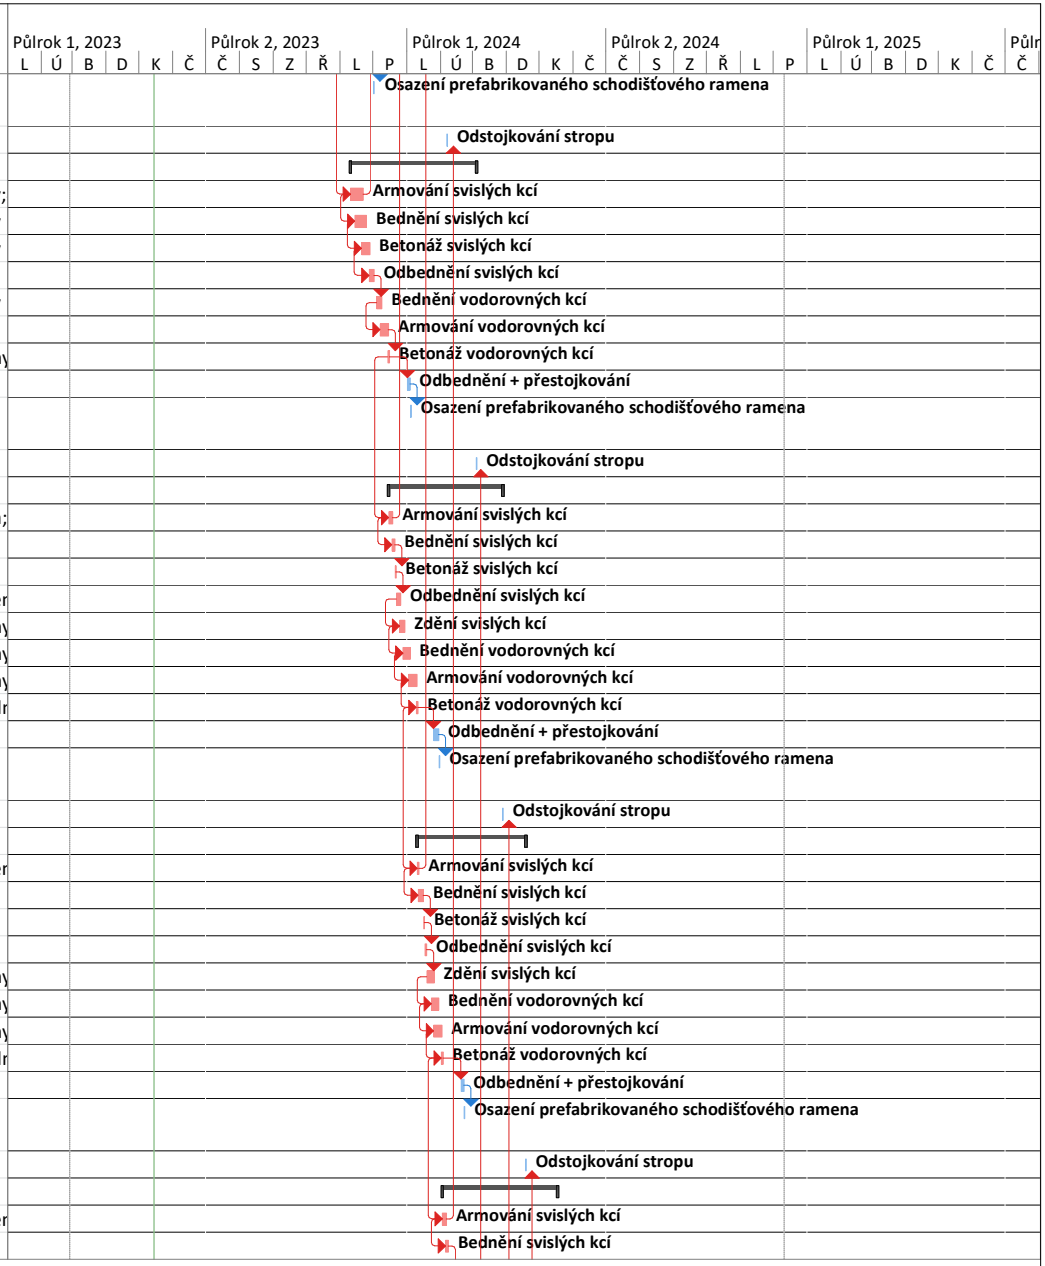

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
123		Betonáž svislých kcí	1 den	08.02. 24	08.02. 24	122	124
124		Odbednění svislých kcí	2 dny	09.02. 24	12.02. 24	123	125
125		Zdění svislých kcí	5 dny	13.02. 24	19.02. 24	124	126SS+2 dny
126		Bednění vodorovných kcí	5 dny	15.02. 24	21.02. 24	125SS+2 dr	127SS+2 dny
127		Armování vodorovných kcí	6 dny	19.02. 24	26.02. 24	126SS+2 dr	128SS+6 dny
128		Betonáž vodorovných kcí	2 dny	27.02. 24	28.02. 24	127SS+6 dr	129FS+10 dr
129		Odbednění + přestojkování	3 dny	14.03. 24	18.03. 24	128FS+10 c	130
130		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	19.03. 24	19.03. 24	129	
131		Odstojkování stropu	1 den	17.05. 24	17.05. 24	165	
132		**7NP**	**58 dny**	**28.02. 24**	**17.05. 24**		
133		Armování svislých kcí	3 dny	28.02. 24	01.03. 24	128SS+1 de	134SS+1 den
134		Bednění svislých kcí	3 dny	29.02. 24	04.03. 24	133SS+1 de	135
135		Betonáž svislých kcí	1 den	05.03. 24	05.03. 24	134	136
136		Odbednění svislých kcí	2 dny	06.03. 24	07.03. 24	135	137
137		Zdění svislých kcí	3 dny	08.03. 24	12.03. 24	136	138SS+2 dny
138		Bednění vodorovných kcí	5 dny	12.03. 24	18.03. 24	137SS+2 dr	139SS+2 dny
139		Armování vodorovných kcí	6 dny	14.03. 24	21.03. 24	138SS+2 dr	140
140		Betonáž vodorovných kcí	1 den	22.03. 24	22.03. 24	139	141FS+10 dr
141		Odbednění + přestojkování	3 dny	08.04. 24	10.04. 24	140FS+10 c	142
142		Osazení prefabrikovaného schodišťového ramena	1 den	11.04. 24	11.04. 24	141	
143		Odstojkování stropu	1 den	17.05. 24	17.05. 24	165	
144		**8NP**	**41 dny**	**22.03. 24**	**17.05. 24**		
145		Armování svislých kcí	4 dny	22.03. 24	27.03. 24	140SS	146SS+2 dny
146		Bednění svislých kcí	3 dny	26.03. 24	28.03. 24	145SS+2 dr	147
147		Betonáž svislých kcí	2 dny	29.03. 24	01.04. 24	146	148
148		Odbednění svislých kcí	2 dny	02.04. 24	03.04. 24	147	149SS+1 den
149		Zdění svislých kcí	2 dny	03.04. 24	04.04. 24	148SS+1 de	150
150		Bednění vodorovných kcí	3 dny	05.04. 24	09.04. 24	149	151SS+2 dny
151		Armování vodorovných kcí	4 dny	09.04. 24	12.04. 24	150SS+2 dr	152
152		Betonáž vodorovných kcí	1 den	15.04. 24	15.04. 24	151	153FS+10 dr
153		Odbednění + přestojkování	3 dny	30.04. 24	02.05. 24	152FS+10 c	154
154		Provedení monolitického sch	4 dny	03.05. 24	08.05. 24	153	
155		Odstojkování stropu	1 den	17.05. 24	17.05. 24	165	
156		**9NP**	**24 dny**	**15.04. 24**	**16.05. 24**		
157		Armování svislých kcí	3 dny	15.04. 24	17.04. 24	152SS	158SS+1 den
158		Bednění svislých kcí	3 dny	16.04. 24	18.04. 24	157SS+1 de	159
159		Betonáž svislých kcí	1 den	19.04. 24	19.04. 24	158	160
160		Odbednění svislých kcí	1 den	22.04. 24	22.04. 24	159	161
161		Zdění svislých kcí	1 den	23.04. 24	23.04. 24	160	162
162		Bednění vodorovných kcí	3 dny	24.04. 24	26.04. 24	161	163SS+2 dny
163		Armování vodorovných kcí	2 dny	26.04. 24	29.04. 24	162SS+2 dr	164
164		Betonáž vodorovných kcí	1 den	30.04. 24	30.04. 24	163	165FS+10 dr

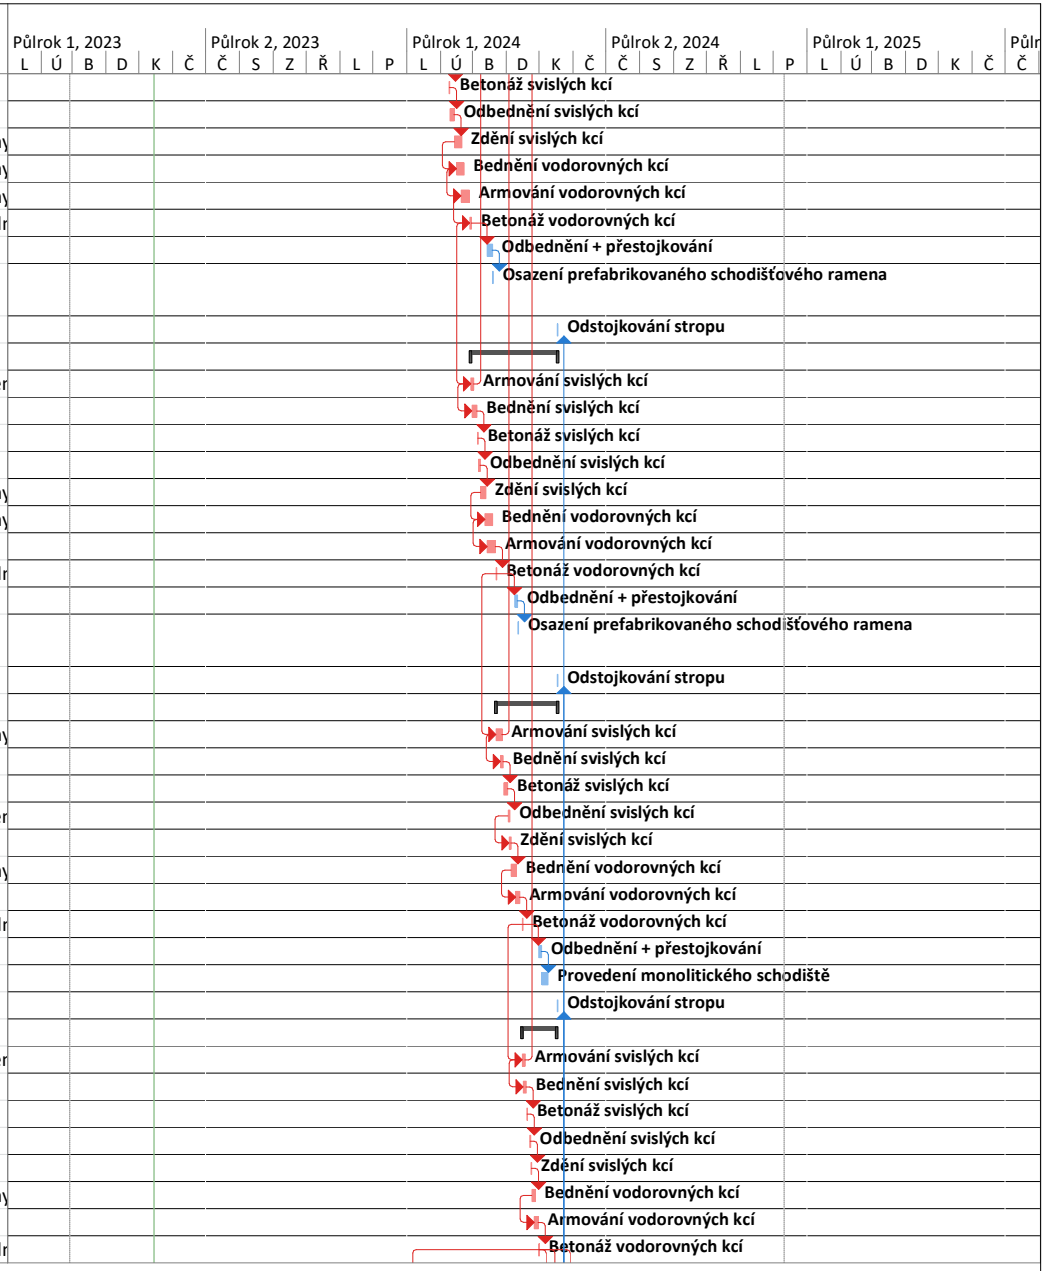

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
165		Odbednění + odstojkování	2 dny	15.05. 24	16.05. 24	164FS+10 c	131;143;155
166		**Zastřešení**	**69 dny**	**01.05. 24**	**05.08. 24**		
167		Realizace nosné kce atik 2-8.NP	6 dny	01.05. 24	08.05. 24	164	168
168		Provedení provizorního dešťového potrubí	8 dny	09.05. 24	20.05. 24	167	169
169		Realizace TZB instalací jdoucích na střechu	2 dny	21.05. 24	22.05. 24	168	
170		Realiazce parotěsné vrstvy	3 dny	29.05. 24	31.05. 24	164FS+20 c	171SS
171		Realizace střešní skladby šikmé	15 dny	29.05. 24	18.06. 24	170SS	172
172		Montáž hromosvodu	1 den	19.06. 24	19.06. 24	171	173
173		Realizace střešní skladby na ploché střeše	6 dny	20.06. 24	27.06. 24	172	174
174		Realizace oplechování atik na ploché střeše	3 dny	28.06. 24	02.07. 24	173	175
175		Montáž hromosvodu	1 den	03.07. 24	03.07. 24	174	176
176		Montáž kotev pro zábradlí 9.NP	1 den	04.07. 24	04.07. 24	175	177SS
177		Realizace střešní skladby na terase 9.NP	3 dny	04.07. 24	08.07. 24	176SS	178
178		Oplechování atik terasa 9.NP	1 den	09.07. 24	09.07. 24	177	179
179		Montáž kotev pro zábradlí 8.NP	1 den	10.07. 24	10.07. 24	178	180SS
180		Realizace střešní skladby na 8.N	4 dny	10.07. 24	15.07. 24	179SS	181
181		Oplechování atik 8.NP	1 den	16.07. 24	16.07. 24	180	182
182		Realizace střešní skladby na terase 7.NP	2 dny	17.07. 24	18.07. 24	181	183
183		Montáž kotev pro zábradlí 2.N	1 den	19.07. 24	19.07. 24	182	184SS
184		Střešní skladba na terasách 2.N	4 dny	19.07. 24	24.07. 24	183SS	185
185		Oplechování atik na terasách 2	1 den	25.07. 24	25.07. 24	184	186;187
186		Montáž kotev 2-7.NP balkony	3 dny	26.07. 24	30.07. 24	185	
187		Střešní skladba ve vnitrobloku	7 dny	26.07. 24	05.08. 24	185	
188		**Příčky a hrubé instalace**	**134 dny**	**19.01. 24**	**24.07. 24**		
189		**3PP**	**47 dny**	**19.01. 24**	**25.03. 24**		
190		Montáž SHZ	8 dny	19.01. 24	30.01. 24	164SS-72 d	191FF;198
191		Zdění příček	1 den	30.01. 24	30.01. 24	190FF	192FS+4 dny
192		Montáž VZT potrubí	5 dny	06.02. 24	12.02. 24	191FS+4 dr	193FS+17 dr
193		Montáž potrubí kanalizace	3 dny	07.03. 24	11.03. 24	192FS+17 c	194SS;201
194		Montáž vodovodu	5 dny	07.03. 24	13.03. 24	193SS	195FF;202
195		Elektroinstalace + rozvaděče	6 dny	06.03. 24	13.03. 24	194FF	196FS+6 dny
196		Požární ucpávky	2 dny	22.03. 24	25.03. 24	195FS+6 dr	204;338SS+6
197		**2PP**	**41 dny**	**31.01. 24**	**27.03. 24**		
198		Montáž SHZ	8 dny	31.01. 24	09.02. 24	190	205SS+4 dny
199		Zdění příček	1 den	31.01. 24	31.01. 24	191	209
200		Montáž VZT potrubí	4 dny	13.02. 24	16.02. 24	192	211
201		Montáž potrubí kanalizace	2 dny	12.03. 24	13.03. 24	193	212
202		Montáž vodovodu	3 dny	14.03. 24	18.03. 24	194	213

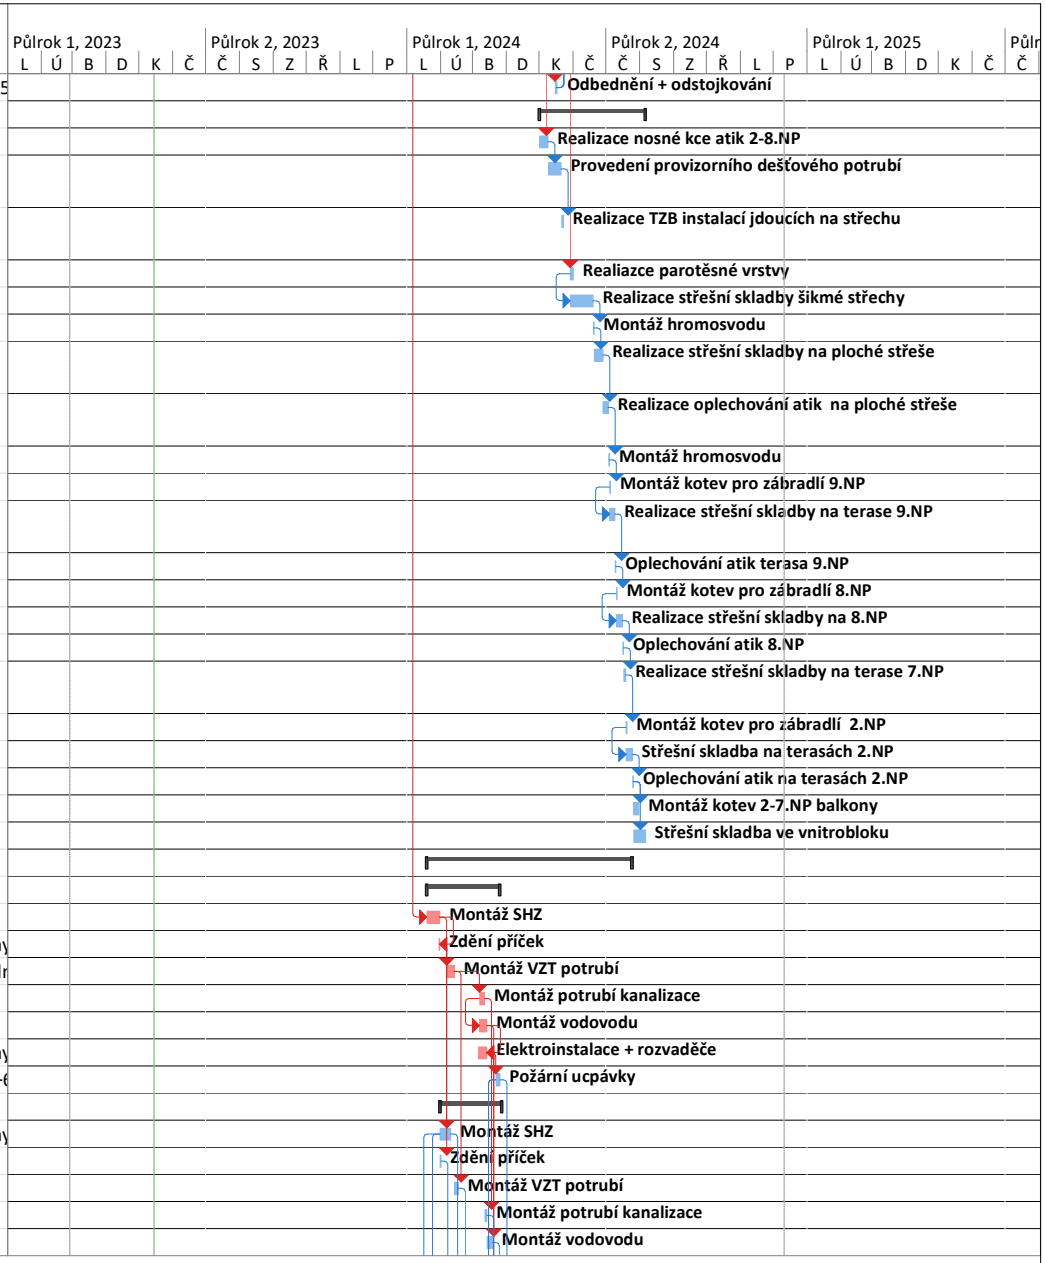

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
203		Elektroinstalace + rozvaděče	5 dny	14.03. 24	20.03. 24	195	214
204		Požární ucpávky	2 dny	26.03. 24	27.03. 24	196	215
205		Montáž potrubí topení	8 dny	06.02. 24	15.02. 24	198SS+4 dr	206
206		Montáž potrubí plynu	2 dny	16.02. 24	19.02. 24	205	216
207		**1PP**	**45 dny**	**29.01. 24**	**29.03. 24**		
208		Montáž SHZ	8 dny	12.02. 24	21.02. 24	198	
209		Zdění příček	1 den	01.02. 24	01.02. 24	199	220
210		Lepení TI na strop	6 dny	29.01. 24	05.02. 24	198SS-2 dn	
211		Montáž VZT potrubí	8 dny	19.02. 24	28.02. 24	200	221
212		Montáž potrubí kanalizace	8 dny	14.03. 24	25.03. 24	201	222
213		Montáž vodovodu	3 dny	19.03. 24	21.03. 24	202	223
214		Elektroinstalace + rozvaděče	5 dny	21.03. 24	27.03. 24	203	224
215		Požární ucpávky	2 dny	28.03. 24	29.03. 24	204	
216		Montáž potrubí chlazení	5 dny	20.02. 24	26.02. 24	206	217
217		Montáž potrubí topení	1 den	27.02. 24	27.02. 24	216	218
218		Montáž potrubí plynu	2 dny	28.02. 24	29.02. 24	217	226
219		**1NP**	**71 dny**	**02.02. 24**	**10.05. 24**		
220		Zdění příček	1 den	02.02. 24	02.02. 24	209	230FS+43 dr
221		Montáž VZT potrubí	12 dny	29.02. 24	15.03. 24	211	232FS+16 dr
222		Montáž potrubí kanalizace	12 dny	26.03. 24	10.04. 24	212	233
223		Montáž vodovodu	15 dny	22.03. 24	11.04. 24	213	225FS+17 dr
224		Elektroinstalace + rozvaděče	7 dny	28.03. 24	05.04. 24	214	235
225		Požární ucpávky	4 dny	07.05. 24	10.05. 24	223FS+17 c	241
226		Montáž potrubí chlazení	16 dny	01.03. 24	22.03. 24	218	227
227		Montáž potrubí topení	4 dny	25.03. 24	28.03. 24	226	228
228		Montáž potrubí plynu	1 den	29.03. 24	29.03. 24	227	236
229		**2NP**	**32 dny**	**01.04. 24**	**14.05. 24**		
230		Zdění příček	4 dny	04.04. 24	09.04. 24	220FS+43 c	231SS;243
231		Montáž oken	3 dny	04.04. 24	08.04. 24	230SS	244
232		Montáž VZT potrubí	3 dny	09.04. 24	11.04. 24	221FS+16 c	245
233		Montáž potrubí kanalizace	7 dny	11.04. 24	19.04. 24	222	246
234		Montáž vodovodu	7 dny	12.04. 24	22.04. 24	223	247
235		Elektroinstalace + rozvaděče	10 dny	08.04. 24	19.04. 24	224	248
236		Montáž potrubí chlazení	9 dny	01.04. 24	11.04. 24	228	237
237		Montáž potrubí topení	1 den	12.04. 24	12.04. 24	236	238
238		Montáž potrubí plynu	1 den	15.04. 24	15.04. 24	237	249
239		Zazdění stoupaček	1 den	16.04. 24	16.04. 24	243	240
240		Přizdění instalačních předstě	1 den	17.04. 24	17.04. 24	239	256
241		Požární ucpávky	2 dny	13.05. 24	14.05. 24	225	254
242		**3NP**	**28 dny**	**09.04. 24**	**16.05. 24**		
243		Zdění příček	4 dny	10.04. 24	15.04. 24	230	239
244		Montáž oken	3 dny	09.04. 24	11.04. 24	231	
245		Montáž VZT potrubí	3 dny	12.04. 24	16.04. 24	232	258FS+8 dny
246		Montáž potrubí kanalizace	7 dny	22.04. 24	30.04. 24	233	259

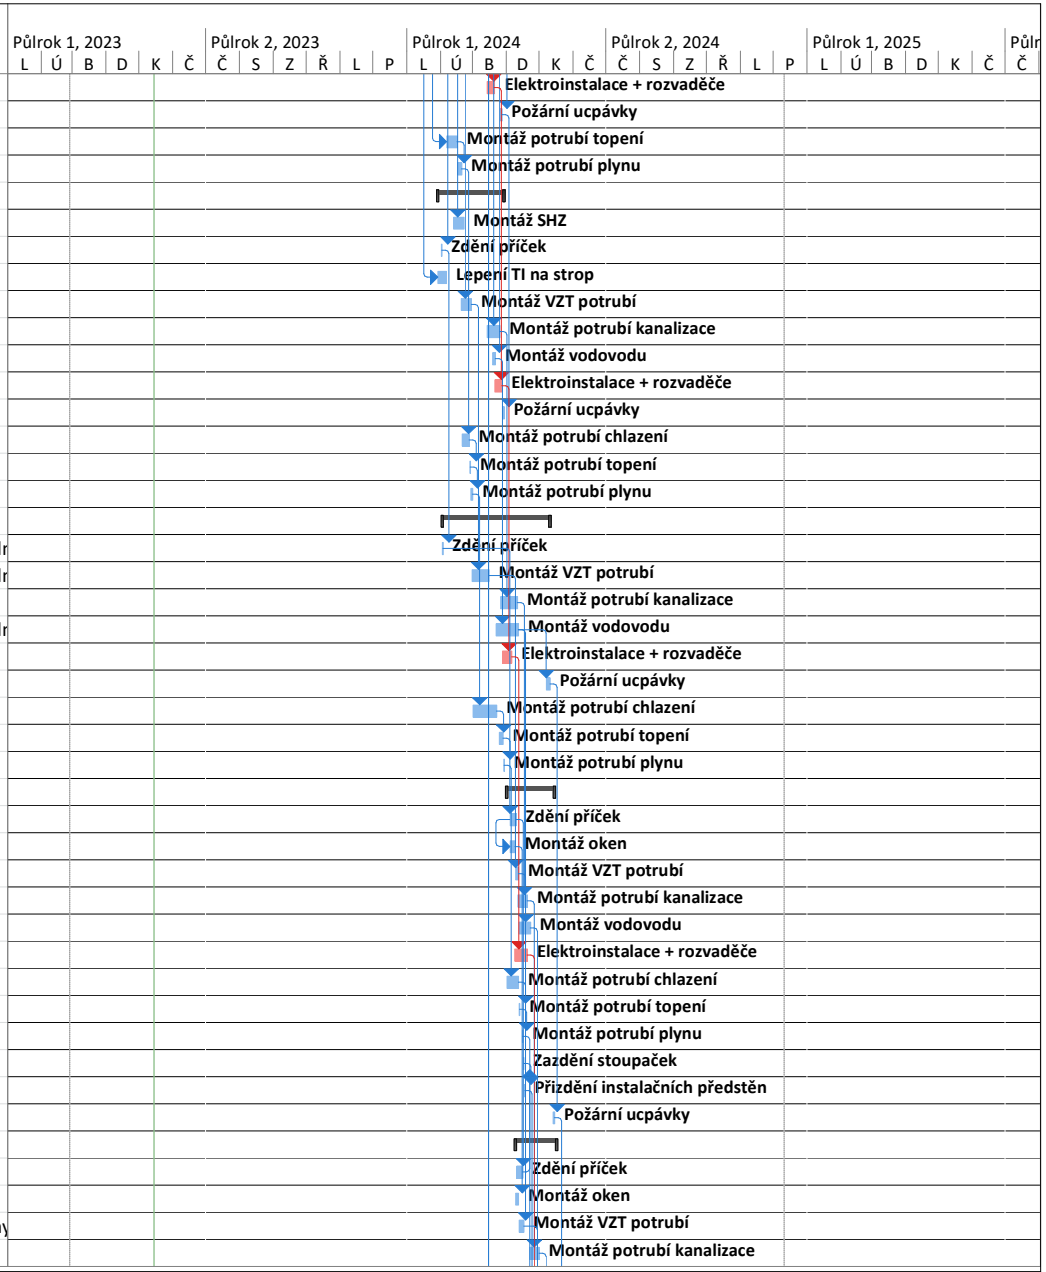

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
247		Montáž vodovodu	7 dny	23.04. 24	01.05. 24	234	260
248		Elektroinstalace + rozvaděče	10 dny	22.04. 24	03.05. 24	235	261
249		Montáž potrubí chlazení	9 dny	16.04. 24	26.04. 24	238	250
250		Montáž potrubí topení	1 den	29.04. 24	29.04. 24	249	251
251		Montáž potrubí plynu	1 den	30.04. 24	30.04. 24	250	262
252		Zazdění stoupaček	1 den	24.04. 24	24.04. 24	256	253
253		Přizdění instalačních předstě	1 den	25.04. 24	25.04. 24	252	269
254		Požární ucpávky	2 dny	15.05. 24	16.05. 24	241	267
255		**4NP**	**23 dny**	**18.04. 24**	**20.05. 24**		
256		Zdění příček	4 dny	18.04. 24	23.04. 24	240	252;257FS+
257		Montáž oken	3 dny	26.04. 24	30.04. 24	256FS+2 dr	270
258		Montáž VZT potrubí	3 dny	29.04. 24	01.05. 24	245FS+8 dr	271
259		Montáž potrubí kanalizace	7 dny	01.05. 24	09.05. 24	246	272
260		Montáž vodovodu	7 dny	02.05. 24	10.05. 24	247	273
261		Elektroinstalace + rozvaděče	10 dny	06.05. 24	17.05. 24	248	274
262		Montáž potrubí chlazení	8 dny	01.05. 24	10.05. 24	251	263
263		Montáž potrubí topení	1 den	13.05. 24	13.05. 24	262	264
264		Montáž potrubí plynu	1 den	14.05. 24	14.05. 24	263	275
265		Zazdění stoupaček	1 den	02.05. 24	02.05. 24	269	266
266		Přizdění instalačních předstě	1 den	03.05. 24	03.05. 24	265	278FS+5 dny
267		Požární ucpávky	2 dny	17.05. 24	20.05. 24	254	280FS+32 dr
268		**5NP**	**51 dny**	**26.04. 24**	**05.07. 24**		
269		Zdění příček	4 dny	26.04. 24	01.05. 24	253	265
270		Montáž oken	3 dny	01.05. 24	03.05. 24	257	
271		Montáž VZT potrubí	3 dny	02.05. 24	06.05. 24	258	284FS+23 dr
272		Montáž potrubí kanalizace	7 dny	10.05. 24	20.05. 24	259	285FS+9 dny
273		Montáž vodovodu	7 dny	13.05. 24	21.05. 24	260	286FS+14 dr
274		Elektroinstalace + rozvaděče	10 dny	20.05. 24	31.05. 24	261	287
275		Montáž potrubí chlazení	9 dny	15.05. 24	27.05. 24	264	276
276		Montáž potrubí topení	1 den	28.05. 24	28.05. 24	275	277
277		Montáž potrubí plynu	1 den	29.05. 24	29.05. 24	276	288FS+3 dny
278		**Zazdění stoupaček**	1 den	13.05. 24	13.05. 24	266FS+5 dr	279
279		Přizdění instalačních předstě	1 den	14.05. 24	14.05. 24	278	282FS+9 dny
280		Požární ucpávky	2 dny	04.07. 24	05.07. 24	267FS+32 c	293
281		**6NP**	**31 dny**	**28.05. 24**	**09.07. 24**		
282		Zdění příček	4 dny	28.05. 24	31.05. 24	279FS+9 dr	283;291FS+
283		Montáž oken	3 dny	03.06. 24	05.06. 24	282	296
284		Montáž VZT potrubí	3 dny	07.06. 24	11.06. 24	271FS+23 c	297
285		Montáž potrubí kanalizace	7 dny	03.06. 24	11.06. 24	272FS+9 dr	298
286		Montáž vodovodu	7 dny	11.06. 24	19.06. 24	273FS+14 c	299
287		Elektroinstalace + rozvaděče	10 dny	03.06. 24	14.06. 24	274	300
288		Montáž potrubí chlazení	9 dny	04.06. 24	14.06. 24	277FS+3 dr	289
289		Montáž potrubí topení	1 den	17.06. 24	17.06. 24	288	290
290		Montáž potrubí plynu	1 den	18.06. 24	18.06. 24	289	301

ID	Režim úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
291		Zazdění stoupaček	1 den	13.06. 24	13.06. 24	282FS+8 dr	292;308
292		Přizdění instalačních předstě	1 den	14.06. 24	14.06. 24	291	
293		Požární ucpávky	2 dny	08.07. 24	09.07. 24	280	306
294		**7NP**	**29 dny**	**03.06. 24**	**11.07. 24**		
295		Zdění příček	3 dny	03.06. 24	05.06. 24	282	
296		Montáž oken	4 dny	06.06. 24	11.06. 24	283	309FS+7 dny
297		Montáž VZT potrubí	2 dny	12.06. 24	13.06. 24	284	310
298		Montáž potrubí kanalizace	7 dny	12.06. 24	20.06. 24	285	311
299		Montáž vodovodu	6 dny	20.06. 24	27.06. 24	286	312
300		Elektroinstalace + rozvaděče	8 dny	17.06. 24	26.06. 24	287	313
301		Montáž potrubí chlazení	8 dny	19.06. 24	28.06. 24	290	302
302		Montáž potrubí topení	1 den	01.07. 24	01.07. 24	301	303
303		Montáž potrubí plynu	1 den	02.07. 24	02.07. 24	302	314
304		Zazdění stoupaček	1 den	20.06. 24	20.06. 24	308	305
305		Přizdění instalačních předstě	1 den	21.06. 24	21.06. 24	304	322
306		Požární ucpávky	2 dny	10.07. 24	11.07. 24	293	320
307		**8NP**	**25 dny**	**14.06. 24**	**18.07. 24**		
308		Zdění příček	4 dny	14.06. 24	19.06. 24	291	304
309		Montáž oken	4 dny	21.06. 24	26.06. 24	296FS+7 dr	323
310		Montáž VZT potrubí	2 dny	14.06. 24	17.06. 24	297	324
311		Montáž potrubí kanalizace	4 dny	21.06. 24	26.06. 24	298	325
312		Montáž vodovodu	3 dny	28.06. 24	02.07. 24	299	326
313		Elektroinstalace + rozvaděče	8 dny	27.06. 24	08.07. 24	300	327
314		Montáž potrubí chlazení	6 dny	03.07. 24	10.07. 24	303	315;328
315		Montáž potrubí topení	1 den	11.07. 24	11.07. 24	314	316;329
316		Montáž potrubí plynu	1 den	12.07. 24	12.07. 24	315	330
317		Montáž stropního chlazení	3 dny	16.07. 24	18.07. 24	330	331
318		Zazdění stoupaček	1 den	28.06. 24	28.06. 24	322	319
319		Přizdění instalačních předstě	1 den	01.07. 24	01.07. 24	318	
320		Požární ucpávky	2 dny	12.07. 24	15.07. 24	306	334
321		**9NP**	**27 dny**	**18.06. 24**	**24.07. 24**		
322		Zdění příček	4 dny	24.06. 24	27.06. 24	305	318;332FS+5
323		Montáž oken	4 dny	27.06. 24	02.07. 24	309	
324		Montáž VZT potrubí	2 dny	18.06. 24	19.06. 24	310	
325		Montáž potrubí kanalizace	4 dny	27.06. 24	02.07. 24	311	
326		Montáž vodovodu	3 dny	03.07. 24	05.07. 24	312	
327		Elektroinstalace + rozvaděče	8 dny	09.07. 24	18.07. 24	313	349SS-42 dn
328		Montáž potrubí chlazení	6 dny	11.07. 24	18.07. 24	314	
329		Montáž potrubí topení	1 den	12.07. 24	12.07. 24	315	
330		Montáž potrubí plynu	1 den	15.07. 24	15.07. 24	316	317
331		Montáž stropního chlazení	4 dny	19.07. 24	24.07. 24	317	
332		Zazdění stoupaček	1 den	05.07. 24	05.07. 24	322FS+5 dr	333
333		Přizdění instalačních předstě	1 den	08.07. 24	08.07. 24	332	
334		Požární ucpávky	2 dny	16.07. 24	17.07. 24	320	

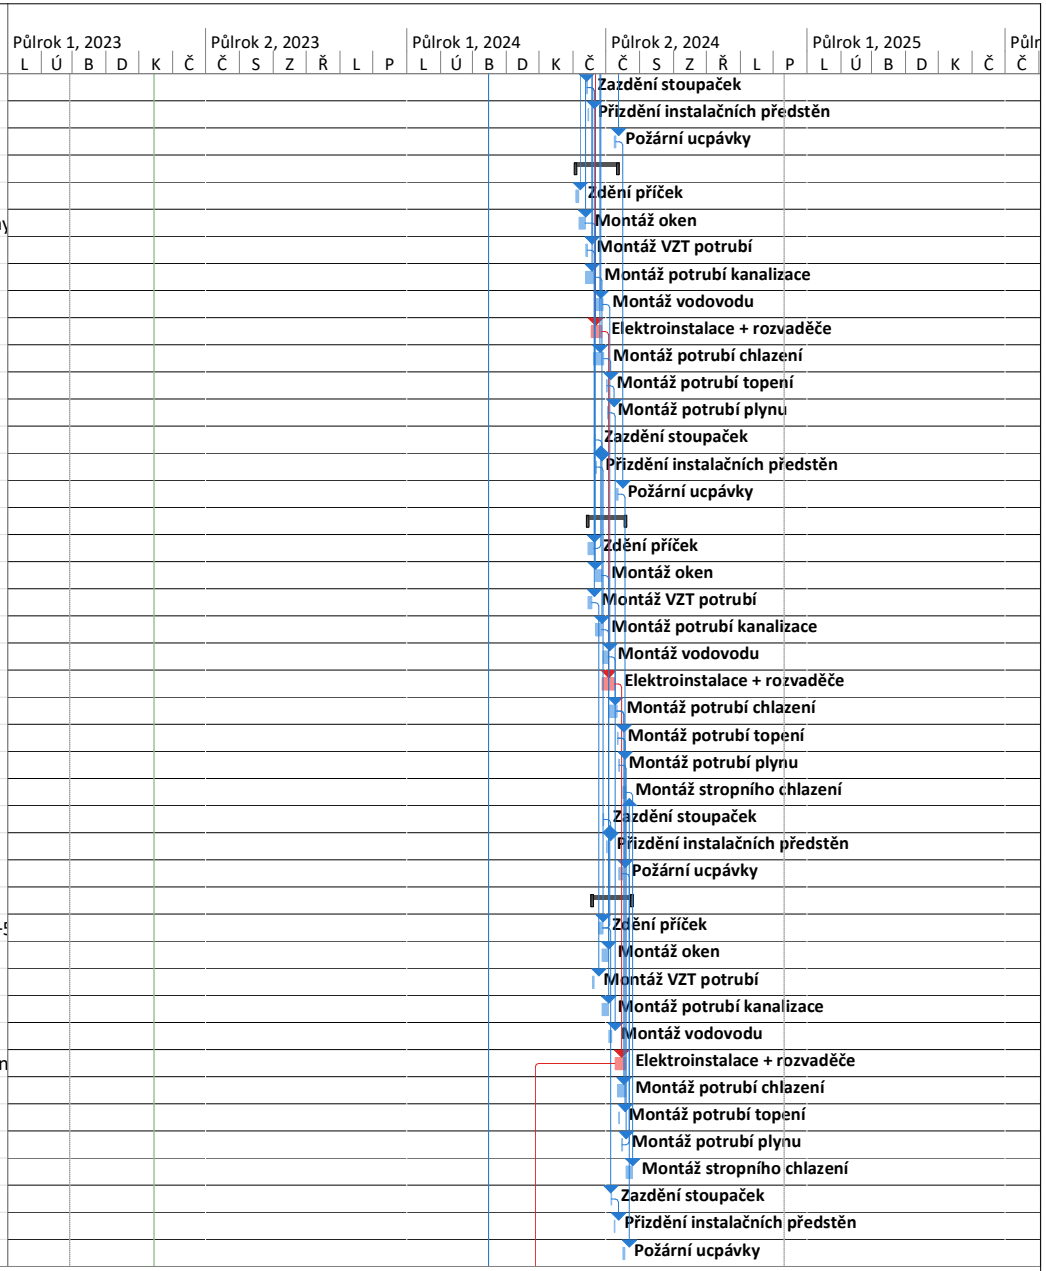

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
335		**Hrubé úpravy povrchlů**	**83 dny**	**10.05. 24**	**03.09. 24**		
336		Bezprašný nátěr stěn výtahu	2 dny	23.05. 24	24.05. 24	196SS+44 c	469
337		**3PP**	**12 dny**	**26.06. 24**	**11.07. 24**		
338		Kosmetiky kcí	2 dny	26.06. 24	27.06. 24	196SS+68 c	339FS+7 dny
339		Nátěry podlah	3 dny	09.07. 24	11.07. 24	338FS+7 dr	342;411FS+2
340		**2PP**	**13 dny**	**28.06. 24**	**16.07. 24**		
341		Kosmetiky kcí	2 dny	28.06. 24	01.07. 24	338	344
342		Nátěry podlah	3 dny	12.07. 24	16.07. 24	339	347
343		**1PP**	**14 dny**	**02.07. 24**	**19.07. 24**		
344		Kosmetiky kcí	2 dny	02.07. 24	03.07. 24	341	345
345		Kosmetika retenční nádrže	1 den	04.07. 24	04.07. 24	344	346
346		Hydroizolační nátěr retenční	2 dny	05.07. 24	08.07. 24	345	
347		Nátěry podlah	3 dny	17.07. 24	19.07. 24	342	358
348		**1NP**	**27 dny**	**10.05. 24**	**17.06. 24**		
349		Omítání stěn	3 dny	10.05. 24	14.05. 24	327SS-42 d	350FS+8 dny
350		Podlaha komplet	2 dny	27.05. 24	28.05. 24	349FS+8 dr	351FS+10 dr
351		SDK konstrukce	4 dny	12.06. 24	17.06. 24	350FS+10 c	
352		**2NP**	**50 dny**	**15.05. 24**	**23.07. 24**		
353		Omítání stěn	12 dny	15.05. 24	30.05. 24	349	354FS+4 dny
354		Uložení kročejové izolace + f	3 dny	06.06. 24	10.06. 24	353FS+4 dr	355SS+1 der
355		Provedení podlahového top	4 dny	07.06. 24	12.06. 24	354SS+1 de	356
356		Betonáž podlah	2 dny	13.06. 24	14.06. 24	355	357FS+2 dny
357		SDK konstrukce	7 dny	19.06. 24	27.06. 24	356FS+2 dr	364FS+1 der
358		Stěrkování stropu	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	347	365
359		**3NP**	**52 dny**	**15.05. 24**	**25.07. 24**		
360		Omítání stěn	12 dny	15.05. 24	30.05. 24	349	374;361FS+7
361		Uložení kročejové izolace + f	3 dny	11.06. 24	13.06. 24	360FS+7 dr	362SS+2 dny
362		Provedení podlahového top	4 dny	13.06. 24	18.06. 24	361SS+2 dr	363
363		Betonáž podlah	2 dny	19.06. 24	20.06. 24	362	428FS+21 dr
364		SDK konstrukce	7 dny	01.07. 24	09.07. 24	357FS+1 de	371FS+1 der
365		Stěrkování stropu	2 dny	24.07. 24	25.07. 24	358	372
366		**4NP**	**42 dny**	**31.05. 24**	**29.07. 24**		
367		Omítání stěn	12 dny	31.05. 24	17.06. 24	353	368FS+5 dny
368		Uložení kročejové izolace + f	3 dny	25.06. 24	27.06. 24	367FS+5 dr	369SS+1 der
369		Provedení podlahového top	4 dny	26.06. 24	01.07. 24	368SS+1 de	370
370		Betonáž podlah	2 dny	02.07. 24	03.07. 24	369	433FS+19 dr
371		SDK konstrukce	7 dny	11.07. 24	19.07. 24	364FS+1 de	378FS+1 der
372		Stěrkování stropu	2 dny	26.07. 24	29.07. 24	365	379
373		**5NP**	**44 dny**	**31.05. 24**	**31.07. 24**		
374		Omítání stěn	12 dny	31.05. 24	17.06. 24	360	375FS+8 dny
375		Uložení kročejové izolace + f	3 dny	28.06. 24	02.07. 24	374FS+8 dr	376SS+1 der
376		Provedení podlahového top	4 dny	01.07. 24	04.07. 24	375SS+1 de	377
377		Betonáž podlah	2 dny	05.07. 24	08.07. 24	376	438FS+22 dr
378		SDK konstrukce	7 dny	23.07. 24	31.07. 24	371FS+1 de	385FS+1 der

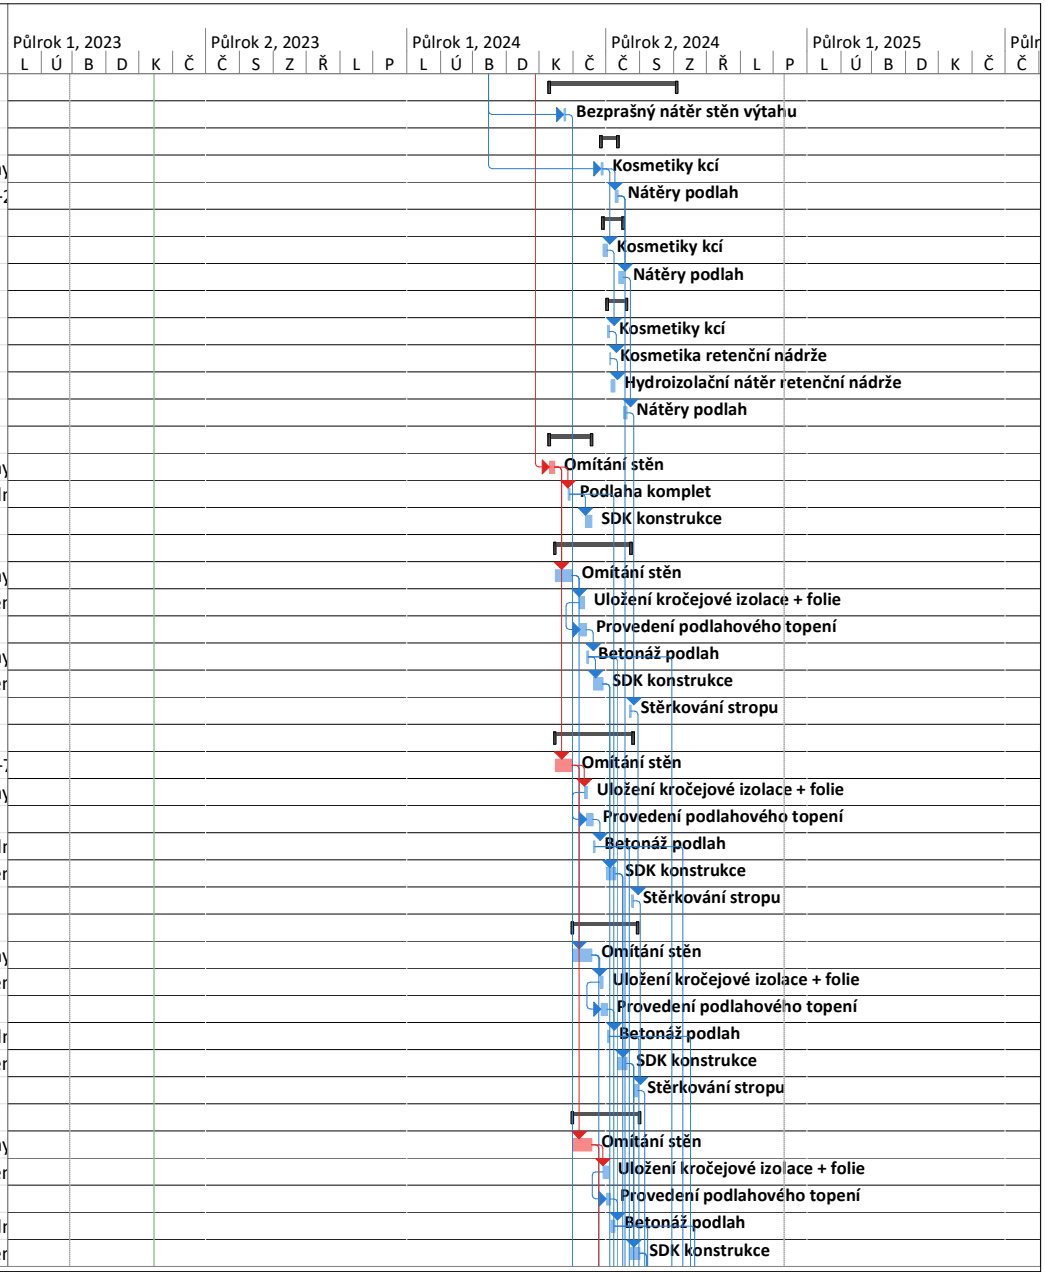

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
379		Stěrkování stropu	2 dny	30.07. 24	31.07. 24	372	386
380		**6NP**	**40 dny**	**18.06. 24**	**12.08. 24**		
381		Omítání stěn	12 dny	18.06. 24	03.07. 24	367	382FS+5 dny
382		Uložení kročejové izolace + f	3 dny	11.07. 24	15.07. 24	381FS+5 dr	383SS+1 der
383		Provedení podlahového topé	4 dny	12.07. 24	17.07. 24	382SS+1 de	384
384		Betonáž podlah	2 dny	18.07. 24	19.07. 24	383	443FS+21 dr
385		SDK konstrukce	7 dny	02.08. 24	12.08. 24	378FS+1 de	392FS+1 der
386		Stěrkování stropu	2 dny	01.08. 24	02.08. 24	379	393
387		**7NP**	**47 dny**	**18.06. 24**	**21.08. 24**		
388		Omítání stěn	10 dny	18.06. 24	01.07. 24	374	389FS+10 dr
389		Uložení kročejové izolace + f	3 dny	16.07. 24	18.07. 24	388FS+10 c	390SS+2 dny
390		Provedení podlahového topé	3 dny	18.07. 24	22.07. 24	389SS+2 dr	391
391		Betonáž podlah	2 dny	23.07. 24	24.07. 24	390	448FS+25 dr
392		SDK konstrukce	6 dny	14.08. 24	21.08. 24	385FS+1 de	399FS+1 der
393		Stěrkování stropu	2 dny	05.08. 24	06.08. 24	386	400
394		**8NP**	**41 dny**	**04.07. 24**	**29.08. 24**		
395		Omítání stěn	9 dny	04.07. 24	16.07. 24	381	396FS+4 dny
396		Uložení kročejové izolace + f	2 dny	23.07. 24	24.07. 24	395FS+4 dr	397
397		Provedení podlahového topé	2 dny	25.07. 24	26.07. 24	396	398
398		Betonáž podlah	1 den	29.07. 24	29.07. 24	397	453FS+30 dr
399		SDK konstrukce	5 dny	23.08. 24	29.08. 24	392FS+1 de	407FS+1 der
400		Stěrkování stropu	1 den	07.08. 24	07.08. 24	393	
401		Omítání stropu se stropním chlazením	2 dny	17.07. 24	18.07. 24	395	
402		**9NP**	**46 dny**	**02.07. 24**	**03.09. 24**		
403		Omítání stěn	7 dny	02.07. 24	10.07. 24	388	404FS+6 dny
404		Uložení kročejové izolace + f	2 dny	19.07. 24	22.07. 24	403FS+6 dr	405
405		Provedení podlahového topé	2 dny	23.07. 24	24.07. 24	404	406
406		Betonáž podlah	1 den	25.07. 24	25.07. 24	405	458FS+32 dr
407		SDK konstrukce	2 dny	02.09. 24	03.09. 24	399FS+1 de	459
408		Omítání stropu se stropním chlazením	4 dny	11.07. 24	16.07. 24	403	
409		**Finální úpravy povrchů**	**80 dny**	**28.06. 24**	**17.10. 24**		
410		**3PP**	**4 dny**	**16.07. 24**	**19.07. 24**		
411		Bezprašný nátěr stěn	2 dny	16.07. 24	17.07. 24	339FS+2 dr	412;414
412		Malba vodorovného dopravního značení	2 dny	18.07. 24	19.07. 24	411	415;465FS+3 dny
413		**2PP**	**4 dny**	**18.07. 24**	**23.07. 24**		
414		Bezprašný nátěr stěn	2 dny	18.07. 24	19.07. 24	411	417
415		Malba vodorovného dopravního značení	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	412	418
416		**1PP**	**4 dny**	**22.07. 24**	**25.07. 24**		
417		Bezprašný nátěr stěn	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	414	

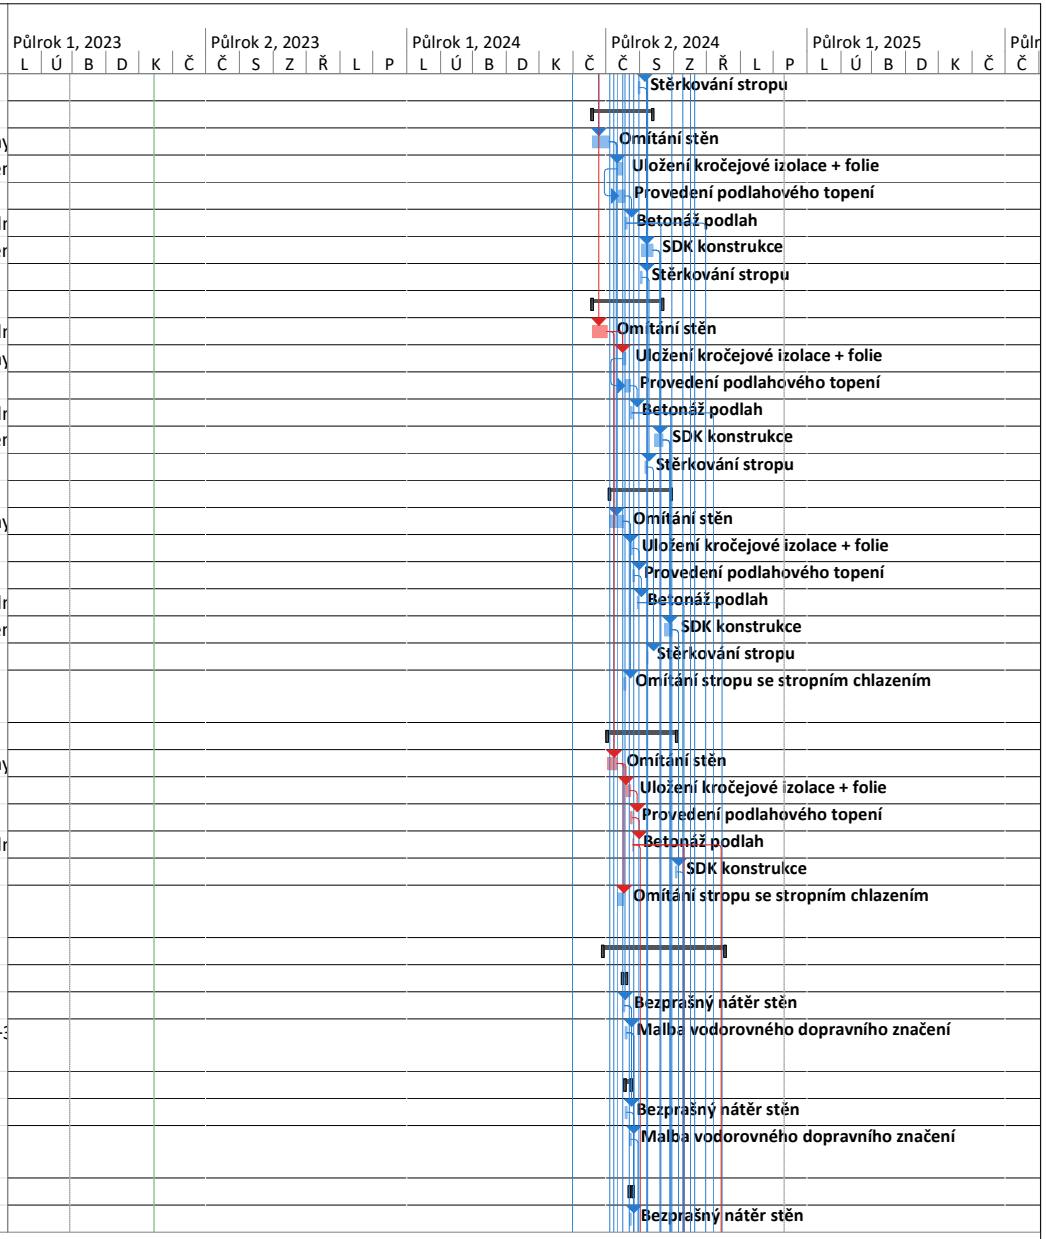

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
418		Malba vodorovného dopravního značení	2 dny	24.07. 24	25.07. 24	415	
419		**1NP**	**7 dny**	**08.07. 24**	**16.07. 24**		
420		Provedení dlažby	3 dny	08.07. 24	10.07. 24	350FS+28 c	421FS+2 dny
421		Malba+kosmetika omítek	2 dny	15.07. 24	16.07. 24	420FS+2 dr	425
422		**2NP**	**50 dny**	**28.06. 24**	**05.09. 24**		
423		Obklady a dlažby	7 dny	11.07. 24	19.07. 24	356FS+18 c	
424		Osazení revizních dvířek pod	1 den	28.06. 24	28.06. 24	357	
425		Malba+kosmetika omítek	9 dny	17.07. 24	29.07. 24	421	430
426		Lepení dřevěné podlahy	5 dny	30.08. 24	05.09. 24	356FS+54 c	
427		**3NP**	**48 dny**	**10.07. 24**	**13.09. 24**		
428		Obklady a dlažby	7 dny	22.07. 24	30.07. 24	363FS+21 c	
429		Osazení revizních dvířek pod	1 den	10.07. 24	10.07. 24	364	
430		Malba+kosmetika omítek	9 dny	30.07. 24	09.08. 24	425	435
431		Lepení dřevěné podlahy	5 dny	09.09. 24	13.09. 24	363FS+56 c	
432		**4NP**	**45 dny**	**22.07. 24**	**20.09. 24**		
433		Obklady a dlažby	7 dny	31.07. 24	08.08. 24	370FS+19 c	
434		Osazení revizních dvířek pod	1 den	22.07. 24	22.07. 24	371	
435		Malba+kosmetika omítek	9 dny	12.08. 24	22.08. 24	430	440
436		Lepení dřevěné podlahy	5 dny	16.09. 24	20.09. 24	370FS+52 c	
437		**5NP**	**41 dny**	**01.08. 24**	**26.09. 24**		
438		Obklady a dlažby	7 dny	08.08. 24	16.08. 24	377FS+22 c	
439		Osazení revizních dvířek pod	1 den	01.08. 24	01.08. 24	378	
440		Malba+kosmetika omítek	9 dny	23.08. 24	04.09. 24	435	445
441		Lepení dřevěné podlahy	5 dny	20.09. 24	26.09. 24	377FS+53 c	
442		**6NP**	**39 dny**	**13.08. 24**	**04.10. 24**		
443		Obklady a dlažby	7 dny	20.08. 24	28.08. 24	384FS+21 c	
444		Osazení revizních dvířek pod	1 den	13.08. 24	13.08. 24	385	
445		Malba+kosmetika omítek	9 dny	05.09. 24	17.09. 24	440	450
446		Lepení dřevěné podlahy	5 dny	30.09. 24	04.10. 24	384FS+50 c	
447		**7NP**	**36 dny**	**22.08. 24**	**10.10. 24**		
448		Obklady a dlažby	6 dny	29.08. 24	05.09. 24	391FS+25 c	
449		Osazení revizních dvířek pod	1 den	22.08. 24	22.08. 24	392	
450		Malba+kosmetika omítek	8 dny	18.09. 24	27.09. 24	445	455
451		Lepení dřevěné podlahy	4 dny	07.10. 24	10.10. 24	391FS+52 c	
452		**8NP**	**35 dny**	**30.08. 24**	**17.10. 24**		
453		Obklady a dlažby	4 dny	10.09. 24	13.09. 24	398FS+30 c	
454		Osazení revizních dvířek pod	1 den	30.08. 24	30.08. 24	399	
455		Malba+kosmetika omítek	7 dny	30.09. 24	08.10. 24	450	460
456		Lepení dřevěné podlahy	3 dny	15.10. 24	17.10. 24	398FS+55 c	
457		**9NP**	**31 dny**	**04.09. 24**	**16.10. 24**		
458		Obklady a dlažby	2 dny	10.09. 24	11.09. 24	406FS+32 c	
459		Osazení revizních dvířek pod	1 den	04.09. 24	04.09. 24	407	
460		Malba+kosmetika omítek	6 dny	09.10. 24	16.10. 24	455	

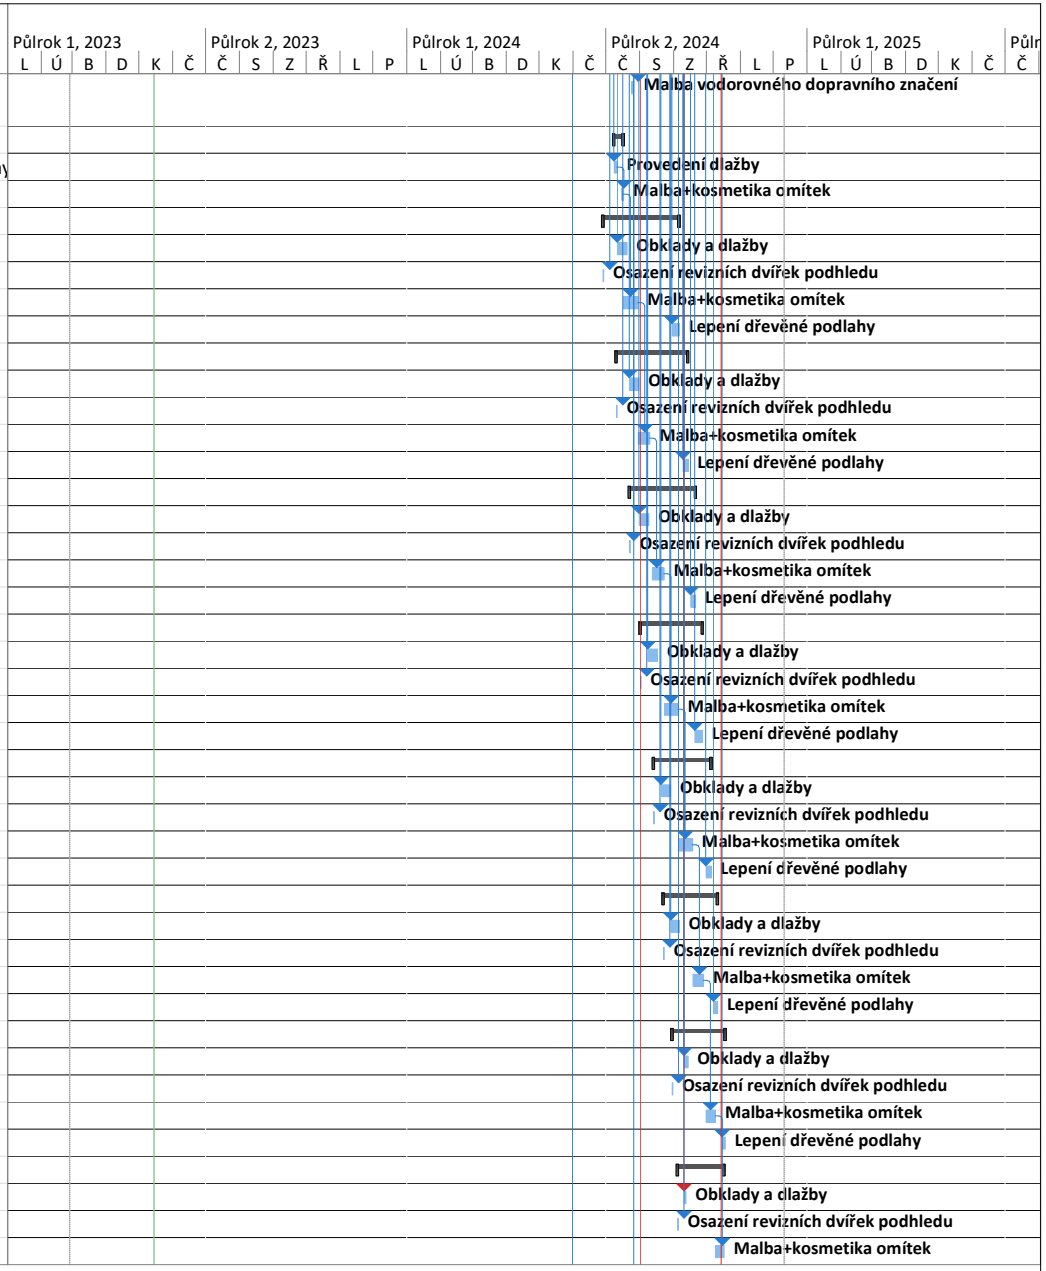

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
461		Lepení dřevěné podlahy	3 dny	14.10. 24	16.10. 24	406FS+56 d	
462		**Vnitřní kompletace**	**129 dny**	**27.05. 24**	**21.11. 24**		
463		Montáž zábradlí kolem schodiš	7 dny	23.10. 24	31.10. 24	524FF+1 de	
464		**3PP**	**76 dny**	**27.05. 24**	**09.09. 24**		
465		Montáž zámečnické kce	3 dny	25.07. 24	29.07. 24	412FS+3 dr	466FS+4 dny
466		Osazení dveří	1 den	05.08. 24	05.08. 24	465FS+4 dr	467;472
467		Strojení rozvodny požární oc	8 dny	06.08. 24	15.08. 24	466	468FS+15 dr
468		Rozvod světel	2 dny	06.09. 24	09.09. 24	467FS+15 d	474
469		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	27.05. 24	28.05. 24	336	475
470		**2PP**	**76 dny**	**29.05. 24**	**11.09. 24**		
471		Montáž zámečnické kce	3 dny	30.07. 24	01.08. 24	465	477
472		Osazení dveří	1 den	06.08. 24	06.08. 24	466	473;478
473		Strojení kotelny	15 dny	07.08. 24	27.08. 24	472	480
474		Rozvod světel	2 dny	10.09. 24	11.09. 24	468	481
475		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	29.05. 24	30.05. 24	469	482
476		**1PP**	**76 dny**	**31.05. 24**	**13.09. 24**		
477		Montáž zámečnické kce	3 dny	02.08. 24	06.08. 24	471	
478		Osazení dveří	1 den	07.08. 24	07.08. 24	472	479;487FS+2
479		Strojení strojovny vzduchote	15 dny	08.08. 24	28.08. 24	478	
480		Strojení strojovny chlazení	13 dny	28.08. 24	13.09. 24	473	
481		Rozvod světel	2 dny	12.09. 24	13.09. 24	474	484
482		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	31.05. 24	03.06. 24	475	485
483		**1NP**	**76 dny**	**04.06. 24**	**17.09. 24**		
484		Kompletace elektro	2 dny	16.09. 24	17.09. 24	481	488
485		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	04.06. 24	05.06. 24	482	490
486		**2NP**	**93 dny**	**06.06. 24**	**14.10. 24**		
487		Osazení dveří	4 dny	05.09. 24	10.09. 24	478FS+20 d	492
488		Vnitřní kompletace	6 dny	18.09. 24	25.09. 24	484	489FS+11 dr
489		Osazení parapetů	2 dny	11.10. 24	14.10. 24	488FS+11 d	494
490		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	06.06. 24	07.06. 24	485	495
491		**3NP**	**93 dny**	**10.06. 24**	**16.10. 24**		
492		Osazení dveří	4 dny	11.09. 24	16.09. 24	487	497
493		Vnitřní kompletace	6 dny	26.09. 24	03.10. 24	488	498
494		Osazení parapetů	2 dny	15.10. 24	16.10. 24	489	499
495		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	10.06. 24	11.06. 24	490	500
496		**4NP**	**93 dny**	**12.06. 24**	**18.10. 24**		
497		Osazení dveří	4 dny	17.09. 24	20.09. 24	492	502
498		Vnitřní kompletace	6 dny	04.10. 24	11.10. 24	493	503
499		Osazení parapetů	2 dny	17.10. 24	18.10. 24	494	504
500		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	12.06. 24	13.06. 24	495	505
501		**5NP**	**93 dny**	**14.06. 24**	**22.10. 24**		
502		Osazení dveří	4 dny	23.09. 24	26.09. 24	497	507
503		Vnitřní kompletace	6 dny	14.10. 24	21.10. 24	498	508
504		Osazení parapetů	2 dny	21.10. 24	22.10. 24	499	509

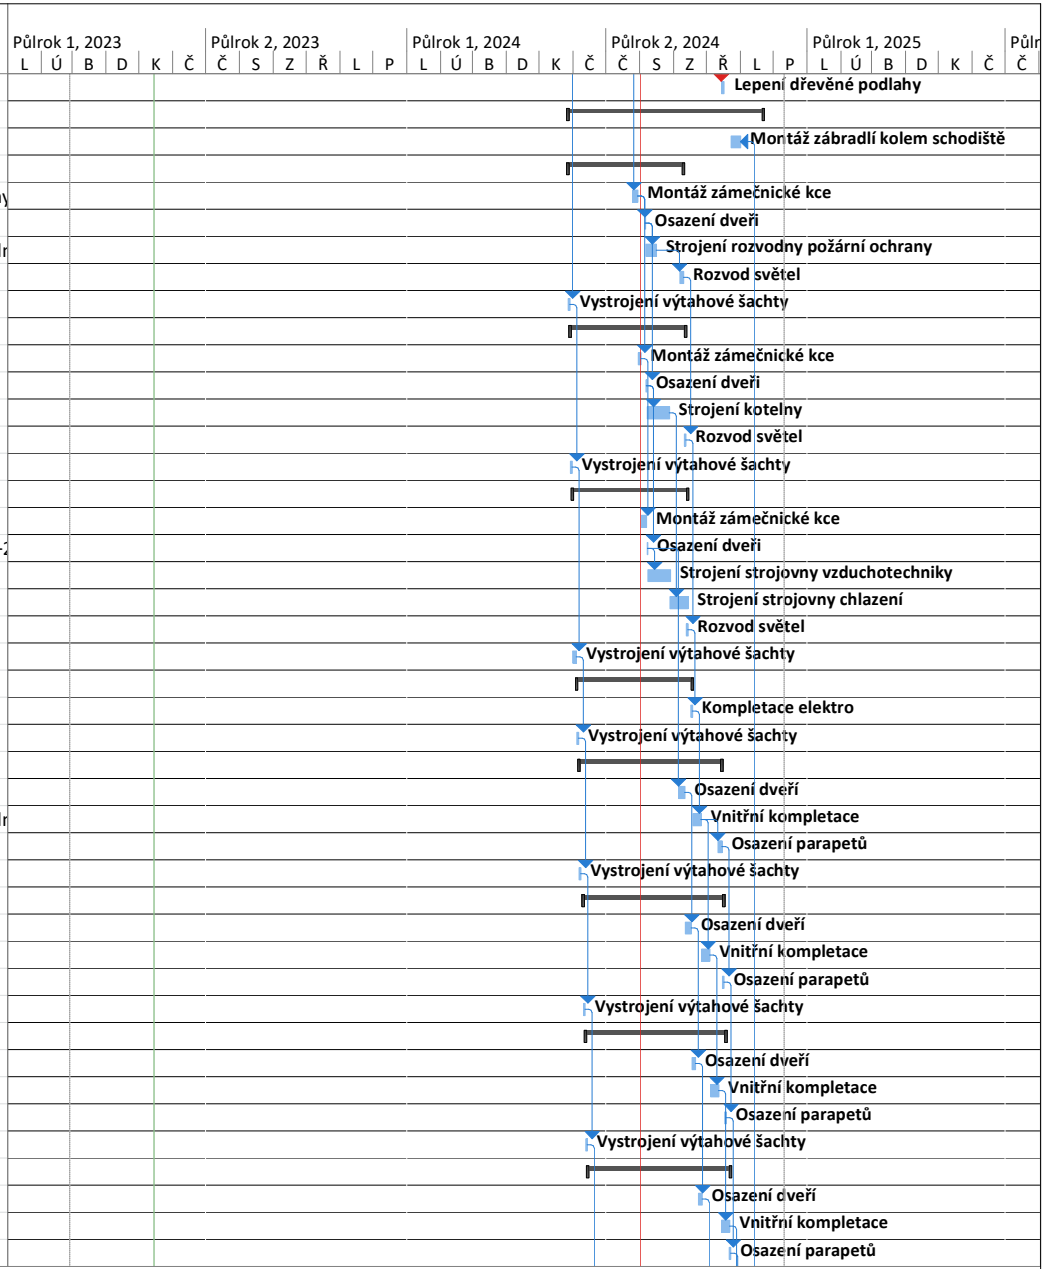

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
505		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	14.06. 24	17.06. 24	500	510
506		**6NP**	**96 dny**	**18.06. 24**	**29.10. 24**		
507		Osazení dveří	4 dny	27.09. 24	02.10. 24	502	512FS+5 dny
508		Vnitřní kompletace	6 dny	22.10. 24	29.10. 24	503	513
509		Osazení parapetů	2 dny	23.10. 24	24.10. 24	504	514
510		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	18.06. 24	19.06. 24	505	515
511		**7NP**	**99 dny**	**20.06. 24**	**05.11. 24**		
512		Osazení dveří	2 dny	10.10. 24	11.10. 24	507FS+5 dr	517FS+3 dny
513		Vnitřní kompletace	5 dny	30.10. 24	05.11. 24	508	518
514		Osazení parapetů	2 dny	25.10. 24	28.10. 24	509	519
515		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	20.06. 24	21.06. 24	510	520
516		**8NP**	**101 dny**	**24.06. 24**	**11.11. 24**		
517		Osazení dveří	1 den	17.10. 24	17.10. 24	512FS+3 dr	522FS+2 dny
518		Vnitřní kompletace	4 dny	06.11. 24	11.11. 24	513	523
519		Osazení parapetů	1 den	29.10. 24	29.10. 24	514	524
520		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	24.06. 24	25.06. 24	515	525
521		**9NP**	**107 dny**	**26.06. 24**	**21.11. 24**		
522		Osazení dveří	1 den	22.10. 24	22.10. 24	517FS+2 dr	
523		Vnitřní kompletace	8 dny	12.11. 24	21.11. 24	518	
524		Osazení parapetů	1 den	30.10. 24	30.10. 24	519	463FF+1 der
525		Vystrojení výtahové šachty	2 dny	26.06. 24	27.06. 24	520	
526		**Fasáda sever**	**71 dny**	**26.06. 24**	**02.10. 24**		
527		Montáž lešení	10 dny	26.06. 24	10.07. 24	528SF	
528		Kosmetika fasády	5 dny	10.07. 24	17.07. 24	529SF	527SF
529		Nalepení okenních lišt a zalepe	3 dny	17.07. 24	22.07. 24	531SF	528SF
530		Montáž hromosvodu	2 dny	18.07. 24	22.07. 24	531SF	
531		Provedení tepelné izolace	12 dny	22.07. 24	06.08. 24	406FS-4 dn	530SF;529SF
532		Provedení vrstvy lepidla+ osazení parapetů	12 dny	07.08. 24	22.08. 24	531	533
533		Fasádní probarvená omítka	3 dny	23.08. 24	27.08. 24	532	534
534		Odlepení oken	3 dny	28.08. 24	30.08. 24	533	535;543
535		Mytí oken + parapetů	4 dny	02.09. 24	05.09. 24	534	536FF
536		Montáž dešťových svodů	1 den	05.09. 24	05.09. 24	535FF	537
537		Demontáž lešení	6 dny	06.09. 24	13.09. 24	536	538FS+11 dr
538		Provední soklu	2 dny	01.10. 24	02.10. 24	537FS+11 c	548
539		**Fasáda jih**	**67 dny**	**19.08. 24**	**19.11. 24**		
540		Montáž lešení	5 dny	19.08. 24	26.08. 24	541SF	
541		Provedení kosmetik na fasádě	5 dny	26.08. 24	02.09. 24	543SF	540SF;542SS
542		Montáž dešťových svodů	6 dny	27.08. 24	03.09. 24	541SS+1 de	544FS+2 dny
543		Nalepení okenních lišt a zalepe	5 dny	02.09. 24	06.09. 24	534	541SF
544		Montáž hromosvodu	4 dny	06.09. 24	11.09. 24	542FS+2 dr	545FS-1 den
545		Montáž tepelné izolace + kotve	3 dny	11.09. 24	13.09. 24	544FS-1 de	546
546		Montáž tepelné izolace + perlinka + lepidlo + kotvení	11 dny	16.09. 24	30.09. 24	545	547FS-4 dny

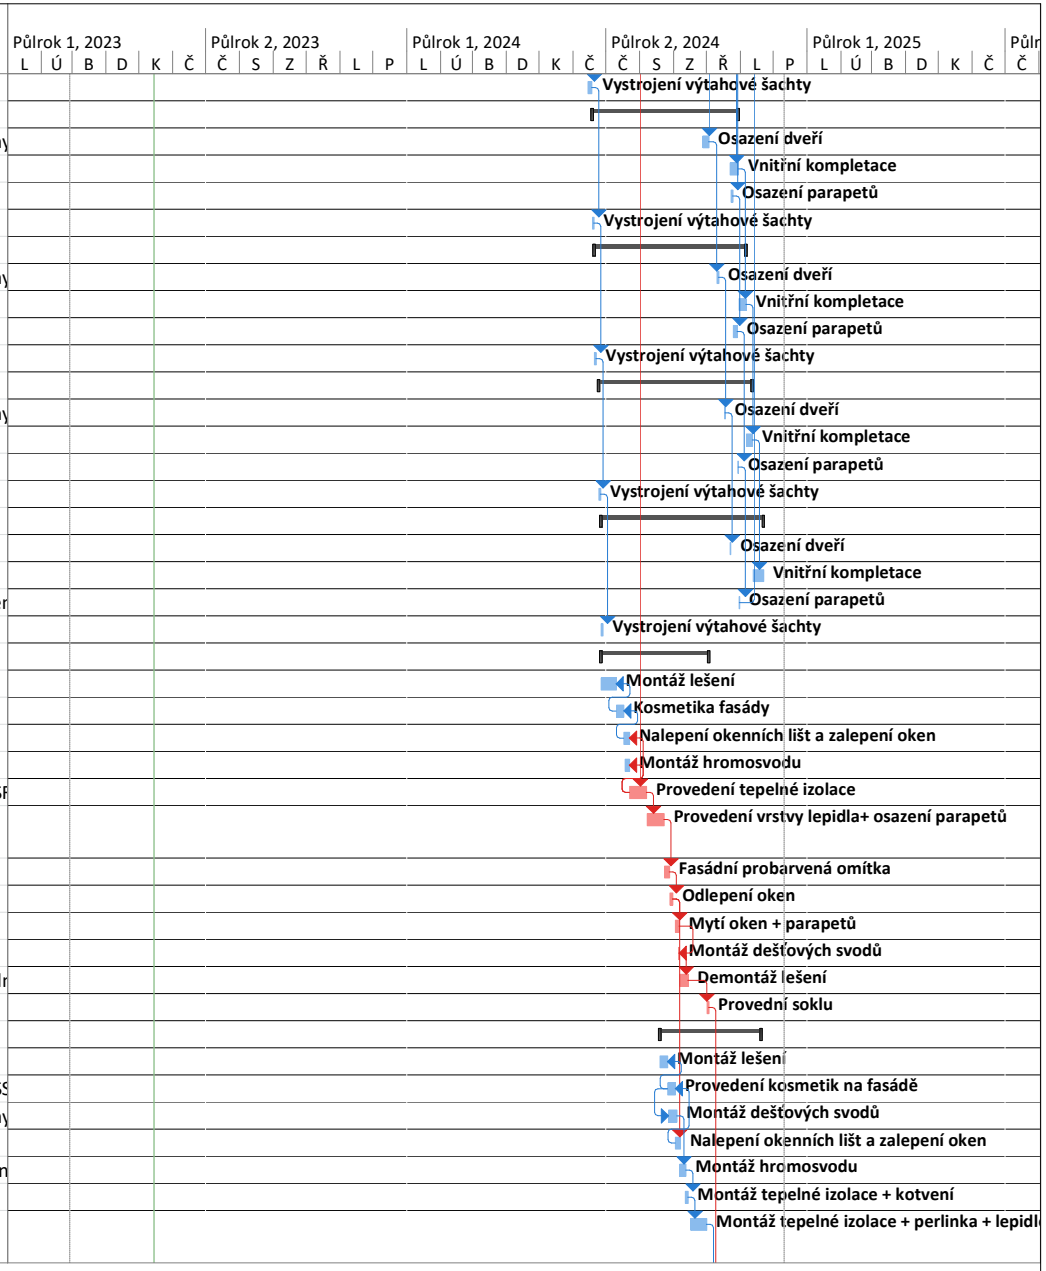

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
547		Lepení obkladového pásku	21 dny	25.09. 24	23.10. 24	546FS-4 dn	
548		Perlinka + lepení pod STO	4 dny	03.10. 24	08.10. 24	538	549FS+10 dr
549		Fasádní omítka sto	3 dny	23.10. 24	25.10. 24	548FS+10 c	550
550		Tepelná izolace - historická fas	2 dny	28.10. 24	29.10. 24	549	551
551		Probarvená fasádní omítka	1 den	30.10. 24	30.10. 24	550	553
552		Montáž hliníkových lamel	3 dny	01.11. 24	05.11. 24	553	554
553		Lepidlo + perlinka - historická f	1 den	31.10. 24	31.10. 24	551	552
554		Odlepení oken	1 den	06.11. 24	06.11. 24	552	555
555		Mytí oken + parapetů	4 dny	07.11. 24	12.11. 24	554	556FF;557SS
556		Demontáž stavebního výtahu	1 den	12.11. 24	12.11. 24	555FF	
557		Demontáž lešení	5 dny	11.11. 24	15.11. 24	555SS+2 dr	558
558		Provedení soklu	2 dny	18.11. 24	19.11. 24	557	559FF+4 dny
559		Finální úklid objektu	25 dny	22.10. 24	25.11. 24	558FF+4 dr	560FF+2 dny
560		Odstraňování vad a nedodělků	25 dny	24.10. 24	27.11. 24	559FF+2 dr	561FF+3 dny
561		Zkušební provoz	25 dny	29.10. 24	02.12. 24	560FF+3 dr	562FF+2 dny
562		Topná zkouška	15 dny	14.11. 24	04.12. 24	561FF+2 dr	563FS+2 dny
563		Kolaudace	2 dny	09.12. 24	10.12. 24	562FS+2 dr	
564		**Přípojky + komunikace**	**14 dny**	**08.11. 24**	**27.11. 24**		
565		Realiazce přípojek	7 dny	08.11. 24	18.11. 24	566FF-1 de	
566		Demontáž buňkoviště a zařízení staveniště	4 dny	14.11. 24	20.11. 24	567SF	565FF-1 den
567		Realizace komunikací před stav	6 dny	20.11. 24	27.11. 24	558	566SF

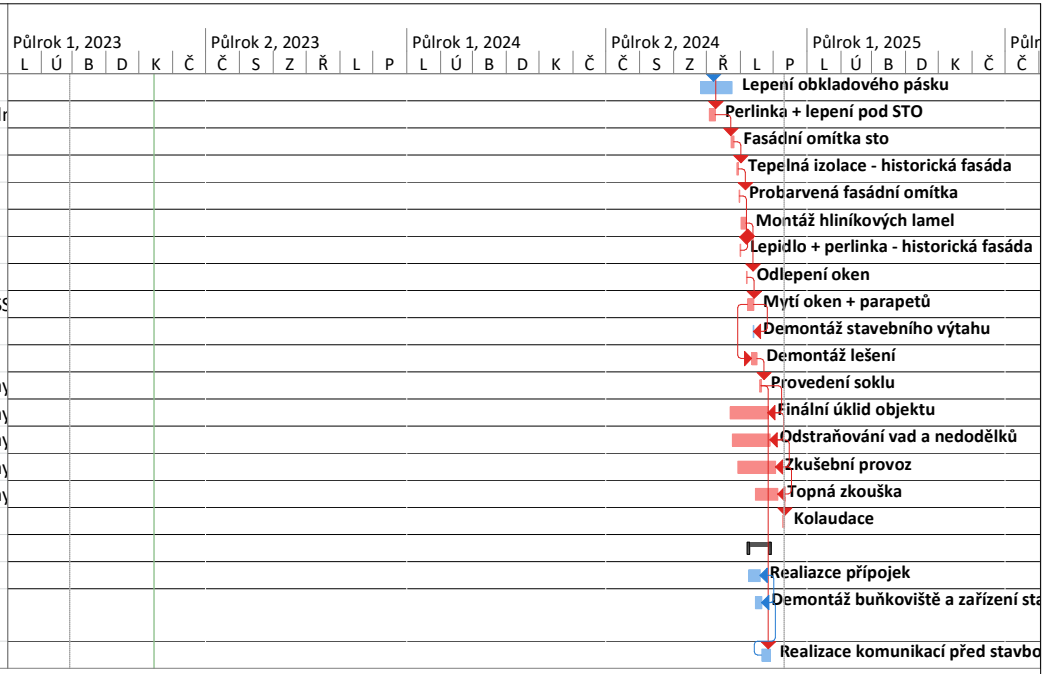

Projekt: msproj15
Datum: 15.05. 23

Úkol		Neaktivní úkol		Pouze zahájení	
Rozdělení		Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení	
Mezník		Neaktivní souhrn		Konečný termín	
Souhrnný		Ruční úkol		Kritický	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Kritické rozdělení	
Vnější úkoly		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
Vnější milník		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	

Graf nasazení pracovníků, strojů a materiálu





OBOR	KATEGORIE	JMÉNO STUDENTA	
Stavební inženýrství	M-KC		
ROČNÍK	JMÉNO ÚLOHY	Ondřej Barna	
TRVÁ	Ing. Martin Mecko, PhD.		
ZADÁNÍ	Graf nasazení pracovníků strojů a materiálu	DATUM ODEVZDÁNÍ	27.
		DATUM OBHAJOBY	27.
VÝSLEDEK	Graf nasazení pracovníků strojů a materiálu	ZNÁMKA	1
