ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT OBECNÍ PENZION POLEŠOVICE

4. ČASOVÁ STRUKTURA

VOJTĚCH KOREL
2023

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
Ing. ROSTISLAV ŠULC, Ph.D.

Obsah

4.1 Graf nasazení pracovníků

4.2 Graf využití mechanizace

4.3 Síťový graf (harmonogram)

Graf nasazení pracovníků

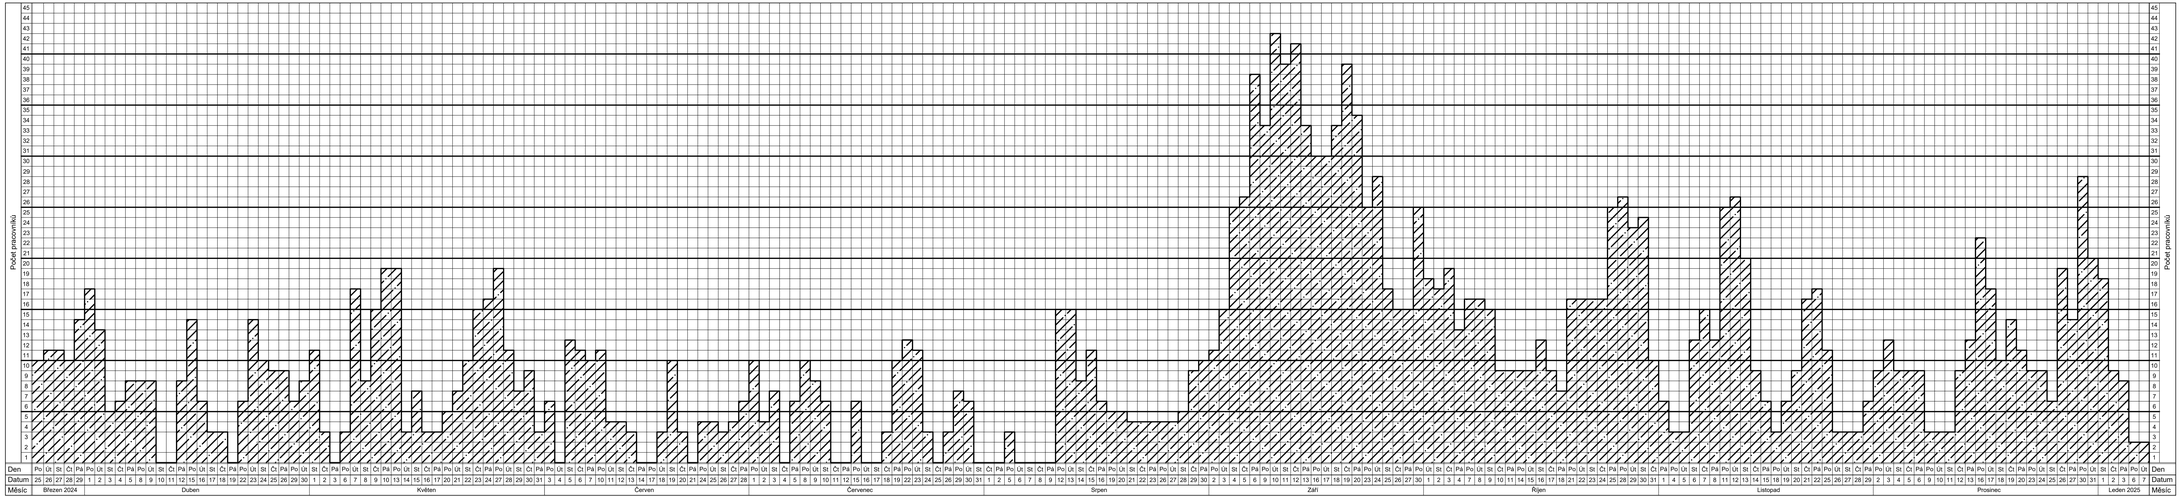

OBOR: R	ŠKOLNÍ ROK: 2022/2023	JMENO STUDENTA: Vojtěch Korel	ČVUT v Praze Fakulta stavební
PŘEDMĚT: 122BAPR	KONZULTANT: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.		
NÁZEV ÚLOHY: Časová struktura		FORMÁT: 6xA4 MĚŘÍTKO: 1:1 DATUM: 22.5.2023	
NÁZEV VÝKRESU: Graf nasazení pracovníků		ČÍSLO VÝKRESU: 1	

Graf využití mechanizace



OBOR: R	ŠKOLNÍ ROK: 2022/2023	JMÉNO STUDENTA: Vojtěch Korel	ČVUT v Praze Fakulta stavební
PŘEDMĚT: 122BAPR	KONZULTANT: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.		
NÁZEV ÚLOHY: Časová struktura		FORMÁT: 6xA4 MĚŘÍTKO: 1:1 DATUM: 22.5.2023	
NÁZEV VÝKRESU: Graf využití mechanizace		ČÍSLO VÝKRESU: 2	

ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		**Přípravné práce**	**7 dny**	**25.03. 24**	**02.04. 24**		
2		Převzetí staveniště	1 den	25.03. 24	25.03. 24		3SS
3		Staveniště	1 den	25.03. 24	25.03. 24	2SS	4
4		Bourací práce	2 dny	26.03. 24	27.03. 24	3	5;6
5		Skrývka ornice	1 den	28.03. 24	28.03. 24	4	8SS+1 den;10;
6		Kanalizační přípojka	4 dny	28.03. 24	02.04. 24	4	12
7		Vodovodní přípojka	2 dny	01.04. 24	02.04. 24	5SS+2 dny	12
8		Vytyčení ostatních stávajících sítí	1 den	29.03. 24	29.03. 24	5SS+1 den	12
9		**Výkopové práce**	**6 dny**	**29.03. 24**	**05.04. 24**		
10		Vytyčení objektu	1 den	29.03. 24	29.03. 24	5	12;11
11		Zřízení zápor záporového pažení	1 den	01.04. 24	01.04. 24	10	12
12		Hloubení stavebích jam + realizace pažení	2 dny	03.04. 24	04.04. 24	10;8;6;7;11	13SS+1 den;14
13		Posouzení výkopku geotechnikem	1 den	04.04. 24	04.04. 24	12SS+1 den	14
14		Podbetonování základů soused. obj.	1 den	05.04. 24	05.04. 24	12;13	17
15		**základové konstrukce**	**22 dny**	**05.04. 24**	**06.05. 24**		
16		Vytyčení ŽB základových pasů	1 den	05.04. 24	05.04. 24	12	18
17		Montáž stavebního jeřábu	2 dny	08.04. 24	09.04. 24	14	20
18		Realizace podkladních betonů pod pasy	2 dny	08.04. 24	09.04. 24	16	19FS+2 dny
19		Armování ŽB základových pasů	2 dny	12.04. 24	15.04. 24	18FS+2 dny	20SS+1 den
20		Bednění ŽB základových pasů	2 dny	15.04. 24	16.04. 24	19SS+1 den;1	21
21		Betonáž ŽB základových pasů	2 dny	17.04. 24	18.04. 24	20	22FS+1 den
22		Odbednění ŽB základových pasů	1 den	22.04. 24	22.04. 24	21FS+1 den	23;24
23		Provedení ležatého potrubí	2 dny	23.04. 24	24.04. 24	22	25
24		Zaizolování základových pasů	1 den	23.04. 24	23.04. 24	22	25
25		Hutněný podsyp pod žb desku zeminou	2 dny	25.04. 24	26.04. 24	23;24	26
26		Hutněný podsyp pod žb desku štěrkodrtí	1 den	29.04. 24	29.04. 24	25	27
27		Armování ŽB základové desky	2 dny	30.04. 24	01.05. 24	26	28SS+50%
28		Bednění ŽB základové desky	1 den	01.05. 24	01.05. 24	27SS+50%	29
29		Betonáž ŽB základové desky	1 den	02.05. 24	02.05. 24	28	30FS+1 den
30		Odbednění ŽB základové desky	1 den	06.05. 24	06.05. 24	29FS+1 den	33;40;42;66FS
31		**Hrubá spodní stavba**	**42 dny**	**07.05. 24**	**03.07. 24**		
32		**penzion 1.PP**	**40 dny**	**07.05. 24**	**01.07. 24**		
33		Vytyčení obvodových nodných stěn + prostupů	1 den	07.05. 24	07.05. 24	30	34
34		Armování ŽB obvodových stěn	2 dny	08.05. 24	09.05. 24	33	35SS+1 den;55
35		Bednění ŽB obvodových stěn	2 dny	09.05. 24	10.05. 24	34SS+1 den	36
36		Betonáž ŽB obvodových stěn	1 den	13.05. 24	13.05. 24	35	37FS+4 dny
37		Odbednění ŽB obvodových stěn	2 dny	20.05. 24	21.05. 24	36FS+4 dny	38;47;76
38		Natavení povlakové HI + bentonitový pásek	1 den	22.05. 24	22.05. 24	37	39
39		Provedení TI XPS	1 den	23.05. 24	23.05. 24	38	77
40		Vytyčení vnitřních nosných stěn + prostupů	1 den	07.05. 24	07.05. 24	30	41
41		Zdění vnitřních nosných stěn	1 den	08.05. 24	08.05. 24	40	54
42		Vytyčení ŽB schodiště	1 den	07.05. 24	07.05. 24	30	43FS+4 dny;53
43		Bednění ŽB schodiště	1 den	14.05. 24	14.05. 24	42FS+4 dny	44;56
44		Armování ŽB schodiště	1 den	15.05. 24	15.05. 24	43	45
45		Betonáž ŽB schodiště	1 den	16.05. 24	16.05. 24	44	46FS+5 dny
46		Odbednění ŽB schodiště	1 den	24.05. 24	24.05. 24	45FS+5 dny	68
47		Bednění ŽB stropní desky 1.PP	1 den	22.05. 24	22.05. 24	37	48
48		Armování ŽB stropní desky 1.PP	1 den	23.05. 24	23.05. 24	47	49
49		Betonáž ŽB stropní desky 1.PP	1 den	24.05. 24	24.05. 24	48	50FS+3 dny
50		Přestojkování/odbednění ŽB stropní desky 1.PP	1 den	30.05. 24	30.05. 24	49FS+3 dny	51FS+21 dny;8
51		Odstojkování ŽB stropní desky 1.PP	1 den	01.07. 24	01.07. 24	50FS+21 dny	102
52		**sál**	**42 dny**	**07.05. 24**	**03.07. 24**		
53		Vytyčení obvodových nosných stěn + prostupů	1 den	07.05. 24	07.05. 24	42SS	54;55
54		Zdění obvodových nosných stěn	3 dny	09.05. 24	13.05. 24	53;41	61
55		Armování ŽB obvodových stěn	2 dny	10.05. 24	13.05. 24	53;34	56
56		Bednění ŽB obvodových stěn	1 den	15.05. 24	15.05. 24	55;43	57FS+1 den
57		Betonáž ŽB obvodových stěn	1 den	17.05. 24	17.05. 24	56FS+1 den	58FS+3 dny
58		Odbednění ŽB obvodových stěn	1 den	23.05. 24	23.05. 24	57FS+3 dny	59;61;76;128
59		Natavení povlakové HI + bentonitový pásek	2 dny	24.05. 24	27.05. 24	58	60SS+50%
60		Provedení TI XPS	2 dny	27.05. 24	28.05. 24	59SS+50%	77
61		Bednění ŽB stropní desky skladu + zázemí	1 den	24.05. 24	24.05. 24	58;54	62
62		Armování ŽB stropní desky skladu + zázemí	1 den	27.05. 24	27.05. 24	61	63
63		Betonáž ŽB stropní desky skladu + zázemí	1 den	28.05. 24	28.05. 24	62	64FS+3 dny;74
64		Přestojkování/odbednění ŽB desky skladu + zázemí	1 den	03.06. 24	03.06. 24	63FS+3 dny	65FS+21 dny
65		Odstojkování ŽB desky skladu + zázemí	1 den	03.07. 24	03.07. 24	64FS+21 dny	102
66		Vytyčení ŽB schodišť + opěrných ŽB stěn	1 den	20.05. 24	20.05. 24	30FS+9 dny	67;72
67		Podezdění ŽB schodišť	1 den	21.05. 24	21.05. 24	66	68
68		Bednění ŽB schodišť	1 den	27.05. 24	27.05. 24	67;46	69
69		Armování ŽB schodišť	1 den	28.05. 24	28.05. 24	68	70;72
70		Betonáž ŽB schodišť	1 den	29.05. 24	29.05. 24	69	71FS+4 dny
71		Odbednění ŽB schodišť	1 den	05.06. 24	05.06. 24	70FS+4 dny	88
72		Armování opěrných ŽB stěn	1 den	29.05. 24	29.05. 24	66;69	73
73		Bednění opěrných ŽB stěn	1 den	30.05. 24	30.05. 24	72	74
74		Betonáž opěrných ŽB stěn	1 den	31.05. 24	31.05. 24	63;73	75FS+3 dny
75		Odbednění opěrných ŽB stěn	1 den	06.06. 24	06.06. 24	74FS+3 dny	76
76		Geodetické zaměření nosných stěn	1 den	07.06. 24	07.06. 24	37;58;75	77
77		Zpětný zásyp okolo hrubé spodní stavby	1 den	10.06. 24	10.06. 24	76;39;60	83
78		**Hrubá vrchní stavba**	**66 dny**	**05.06. 24**	**04.09. 24**		
79		**penzion 1.NP**	**33 dny**	**05.06. 24**	**19.07. 24**		
80		Vytyčení nosných stěn	1 den	05.06. 24	05.06. 24	50FS+3 dny	81;87SS
81		Zdění nosných stěn	2 dny	06.06. 24	07.06. 24	80	82
82		Bednění ŽB stropní desky 1.NP	1 den	10.06. 24	10.06. 24	81	83
83		Armování ŽB stropní desky 1.NP	2 dny	11.06. 24	12.06. 24	82;77	84
84		Betonáž ŽB stropní desky 1.NP	1 den	13.06. 24	13.06. 24	83	85FS+3 dny
85		Přestojkování/odbednění ŽB stropní desky 1.NP	1 den	19.06. 24	19.06. 24	84FS+3 dny	86FS+21 dny
86		Odstojkování ŽB stropní desky 1.NP	1 den	19.07. 24	19.07. 24	85FS+21 dny	120
87		Vytyčení ŽB schodiště	1 den	05.06. 24	05.06. 24	80SS	88FS+8 dny;92
88		Bednění ŽB schodiště	1 den	18.06. 24	18.06. 24	87FS+8 dny;7	189
89		Armování ŽB schodiště	1 den	19.06. 24	19.06. 24	88	90
90		Betonáž ŽB schodiště	1 den	20.06. 24	20.06. 24	89	91FS+5 dny
91		Odbednění ŽB schodiště	1 den	28.06. 24	28.06. 24	90FS+5 dny	100
92		Vytyčení vnějšího ŽB schodiště	1 den	05.06. 24	05.06. 24	87SS	93FS+12 dny
93		Uložení tepelného izolantu mezi schodiště a stěnu	1 den	24.06. 24	24.06. 24	92FS+12 dny	94
94		Podezdění vnějšího ŽB schodiště	1 den	25.06. 24	25.06. 24	93	95
95		Bednění vnějšího ŽB schodiště	1 den	26.06. 24	26.06. 24	94	96
96		Armování vnějšího ŽB schodiště	1 den	27.06. 24	27.06. 24	95	97
97		Betonáž vnějšího ŽB schodiště	1 den	28.06. 24	28.06. 24	96	98FS+4 dny
98		Odbednění vnějšího ŽB schodiště	1 den	05.07. 24	05.07. 24	97FS+4 dny	108
99		**penzion 2.NP**	**33 dny**	**01.07. 24**	**14.08. 24**		
100		Vytyčení nosných stěn	1 den	01.07. 24	01.07. 24	91	101;107SS
101		Zdění nosných stěn	2 dny	02.07. 24	03.07. 24	100	102SS+3 dny
102		Bednění ŽB stropní desky 2.NP	2 dny	05.07. 24	08.07. 24	101SS+3 dny;1	103SS+50%
103		Armování ŽB stropní desky 2.NP	2 dny	08.07. 24	09.07. 24	102SS+50%	104
104		Betonáž ŽB stropní desky 2.NP	1 den	10.07. 24	10.07. 24	103	105FS+2 dny
105		Přestojkování/odbednění ŽB stropní desky 2.NP	1 den	15.07. 24	15.07. 24	104FS+2 dny	106FS+21 dny
106		Odstojkování ŽB stropní desky 2.NP	1 den	14.08. 24	14.08. 24	105FS+21 dny	124
107		Vytyčení ŽB schodiště	1 den	01.07. 24	01.07. 24	100SS	108
108		Bednění ŽB schodišť	1 den	08.07. 24	08.07. 24	107;98	109
109		Armování ŽB schodišť	1 den	09.07. 24	09.07. 24	108	110
110		Betonáž ŽB schodišť	1 den	10.07. 24	10.07. 24	109	111FS+5 dny
111		Odbednění ŽB schodišť	1 den	18.07. 24	18.07. 24	110FS+5 dny	117
112		**penzion 3.NP+4.NP**	**34 dny**	**19.07. 24**	**04.09. 24**		
113		Vytyčení nosných stěn	1 den	19.07. 24	19.07. 24	105FS+3 dny	114;115SS
114		Zdění nosných stěn	2 dny	22.07. 24	23.07. 24	113	120
115		Vytyčení ŽB pilířů	1 den	19.07. 24	19.07. 24	113SS	116
116		Armování ŽB pilířů	1 den	22.07. 24	22.07. 24	115	117
117		Bednění ŽB pilířů	1 den	23.07. 24	23.07. 24	116;111	118
118		Betonáž ŽB pilířů	1 den	24.07. 24	24.07. 24	117	119FS+2 dny;1
119		Odbednění ŽB pilířů	1 den	29.07. 24	29.07. 24	118FS+2 dny	125
120		Bednění ŽB stropní desky 3.NP	1 den	26.07. 24	26.07. 24	118FS+1 den;1	121
121		Armování ŽB stropní desky 3.NP	1 den	29.07. 24	29.07. 24	120	122
122		Betonáž ŽB stropní desky 3.NP	1 den	30.07. 24	30.07. 24	121	123FS+3 dny
123		Přestojkování/odbednění ŽB stropní desky 3.NP	1 den	05.08. 24	05.08. 24	122FS+3 dny	124FS+21 dny
124		Odstojkování ŽB stropní desky 3.NP	1 den	04.09. 24	04.09. 24	123FS+21 dny	142
125		Ukotvení ocelové konzoly pro VZT na pilíře	1 den	30.07. 24	30.07. 24	119	202
126		Montáž vázaných krovů zastřešení	2 dny	12.08. 24	13.08. 24	123FS+4 dny	128FS-2 dny;1
127		**sál**	**4 dny**	**12.08. 24**	**15.08. 24**		
128		Realizace betonových kapes pro uložení vaznic	2 dny	12.08. 24	13.08. 24	58;126FS-2 dn	129
129		Montáž vázaných krovů zastřešení	2 dny	14.08. 24	15.08. 24	128	153
130		**Zastřešení**	**35 dny**	**15.08. 24**	**02.10. 24**		
131		Montáž lešení	2 dny	15.08. 24	16.08. 24	126FS+1 den	133;217
132		**penzion 3.NP+4NP**	**15 dny**	**19.08. 24**	**06.09. 24**		
133		Provedení záklopu na krokve z OSB desek	2 dny	19.08. 24	20.08. 24	126;131	134
134		Realizace parozábrany	1 den	21.08. 24	21.08. 24	133	135
135		Realizace TI PIR 022	3 dny	22.08. 24	26.08. 24	134	136
136		Lepení HI SBS tl. 1,8 mm	1 den	27.08. 24	27.08. 24	135	137
137		Montáž střešních latí	2 dny	28.08. 24	29.08. 24	136	138SS+1 den
138		Osazení děrovaného pásu pro přívod vzduchu	1 den	29.08. 24	29.08. 24	137SS+1 den	139
139		Montáž kontralatí	2 dny	30.08. 24	02.09. 24	138	140;141;1635
140		Vybednění pro nástřešní žlab u okapů	1 den	03.09. 24	03.09. 24	139	141
141		Pokládka pálených tašek	3 dny	04.09. 24	06.09. 24	139;140	144;1425SS+2 d
142		Instalace hromosvodu	1 den	06.09. 24	06.09. 24	141SS+2 dny;1	257
143		**penzion 2.NP**	**8 dny**	**09.09. 24**	**18.09. 24**		
144		Realizace parozábrany	1 den	09.09. 24	09.09. 24	141	145

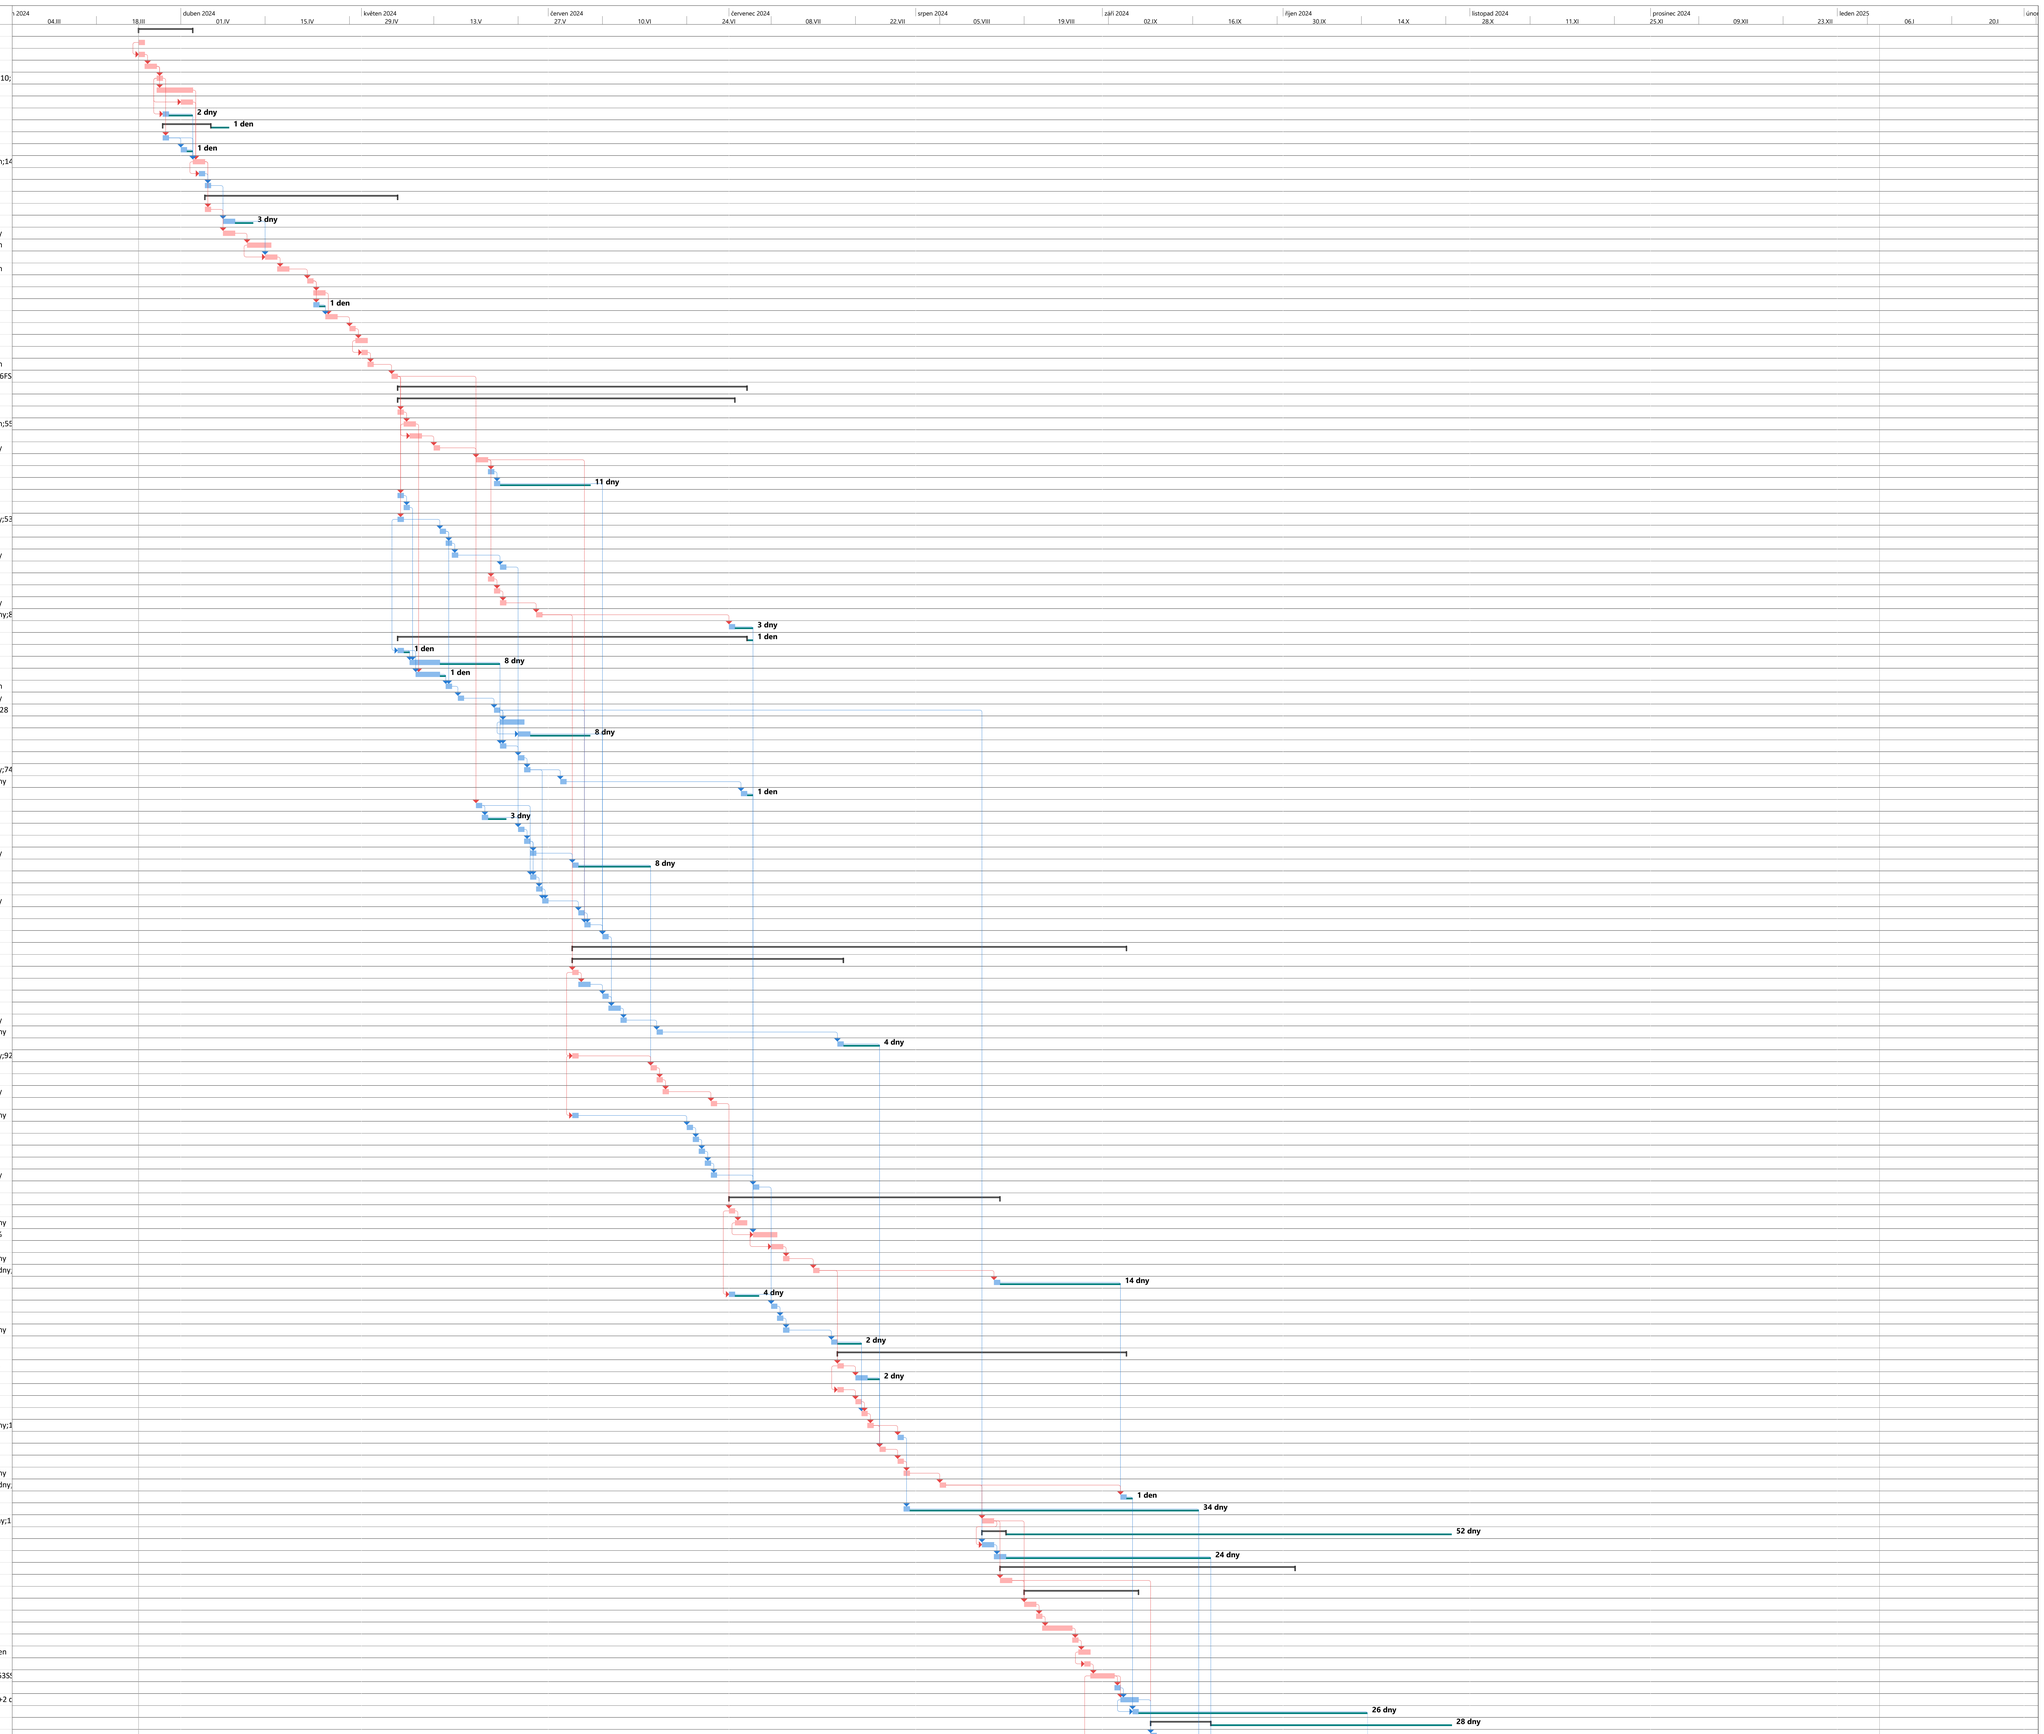

Kritický | Úkol | Milník | Sklůz | Souhrn projektu | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Neaktivní milník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější milník | Průběh

ID	Režim Úkol	Název	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následnici
145		Realizace TI (PIR a XPS desky tl. 100 mm)	2 dny	10.09. 24	11.09. 24	144	146
146		Lepení HI SBS tl. 3,0 mm	1 den	12.09. 24	12.09. 24	145	147
147		Natavení HI SBS tl. 4,5 mm	1 den	13.09. 24	13.09. 24	146	148
148		Uložení ochranné vrstvy z vlieseu	1 den	16.09. 24	16.09. 24	147	149
149		Realiazce hliníkového roštu	1 den	17.09. 24	17.09. 24	148	150
150		Kotvení dřevoplastových lamel	1 den	18.09. 24	18.09. 24	149	151SS
151		Kontrola spádování pro odvodnění	1 den	18.09. 24	18.09. 24	150SS	153
152		**sál**	**10 dny**	**19.09. 24**	**02.10. 24**		
153		Provedení bednění z OSB desek	2 dny	19.09. 24	20.09. 24	151;129	154
154		Realizace parozábrany	2 dny	23.09. 24	24.09. 24	153	155SS+1 den
155		Realizace TI z EPS	2 dny	24.09. 24	25.09. 24	154SS+1 den	156
156		Realizace separační vrstvy	1 den	26.09. 24	26.09. 24	155	157
157		Provedení HI z PVC folie	2 dny	27.09. 24	30.09. 24	156	158SS+1 den;2
158		Ošetření prostupů	1 den	30.09. 24	30.09. 24	157SS+1 den	160
159		Instalace hromosvodu	1 den	01.10. 24	01.10. 24	157	160
160		Kontrola provedení zastřešení	1 den	02.10. 24	02.10. 24	158;159	288
161		**Příčky a hrubé konstrukce**	**19 dny**	**30.08. 24**	**25.09. 24**		
162		**penzion 1.PP**	**9 dny**	**30.08. 24**	**11.09. 24**		
163		Vytyčení příček	1 den	30.08. 24	30.08. 24	139SS	164
164		Zdění příček	2 dny	02.09. 24	03.09. 24	163	165SS;166;17
165		Realiazce SDK příček	1 den	02.09. 24	02.09. 24	164SS	166
166		Úklid prostoru	1 den	04.09. 24	04.09. 24	164;165	167SS
167		Kontrola provedení	1 den	04.09. 24	04.09. 24	166SS	168
168		Stoupací potrubí kanalizace + hrubé rozvody	2 dny	05.09. 24	06.09. 24	167	169SS+1 den;1
169		Stoupací potrubí VZT + hrubé rozvody	2 dny	06.09. 24	09.09. 24	168SS+1 den	170SS+1 den
170		Hrubé rozvody vodovodu + topení	2 dny	09.09. 24	10.09. 24	169SS+1 den	171SS+1 den
171		Hrubé rozvody slaboproudu a silnoproudu	2 dny	10.09. 24	11.09. 24	170SS+1 den	261
172		**penzion 1.NP**	**9 dny**	**03.09. 24**	**13.09. 24**		
173		Vytyčení příček	1 den	03.09. 24	03.09. 24	164FS-1 den	174;178SS
174		Zdění příček	1 den	04.09. 24	04.09. 24	173	175SS;176;184
175		Realiazce SDK příček	1 den	04.09. 24	04.09. 24	174SS	176
176		Úklid prostoru	1 den	05.09. 24	05.09. 24	174;175	177SS
177		Kontrola provedení	1 den	05.09. 24	05.09. 24	176SS	179
178		Osazení oken	1 den	03.09. 24	03.09. 24	173SS	218
179		Stoupací potrubí kanalizace + hrubé rozvody	2 dny	09.09. 24	10.09. 24	177;168	180SS+1 den;1
180		Stoupací potrubí VZT + hrubé rozvody	2 dny	10.09. 24	11.09. 24	179SS+1 den	181SS+1 den
181		Hrubé rozvody vodovodu + topení	2 dny	11.09. 24	12.09. 24	180SS+1 den	182SS+1 den
182		Hrubé rozvody slaboproudu a silnoproudu	2 dny	12.09. 24	13.09. 24	181SS+1 den	277
183		**penzion 2.NP**	**10 dny**	**04.09. 24**	**17.09. 24**		
184		Vytyčení příček	1 den	04.09. 24	04.09. 24	174FS-1 den	185;187;189SS
185		Zdění příček	1 den	05.09. 24	05.09. 24	184	186SS;187;19
186		Realiazce SDK příček	1 den	05.09. 24	05.09. 24	185SS	187
187		Úklid prostoru	1 den	06.09. 24	06.09. 24	184;185;186	188SS
188		Kontrola provedení	1 den	06.09. 24	06.09. 24	187SS	190
189		Osazení oken	1 den	04.09. 24	04.09. 24	184SS	218
190		Stoupací potrubí kanalizace + hrubé rozvody	2 dny	11.09. 24	12.09. 24	188;179	191SS+1 den
191		Stoupací potrubí VZT + hrubé rozvody	2 dny	12.09. 24	13.09. 24	190SS+1 den	192SS+1 den;2
192		Hrubé rozvody vodovodu + topení	2 dny	13.09. 24	16.09. 24	191SS+1 den	193SS+1 den
193		Hrubé rozvody slaboproudu a silnoproudu	2 dny	16.09. 24	17.09. 24	192SS+1 den	295
194		**penzion 3.NP+4.NP**	**12 dny**	**05.09. 24**	**20.09. 24**		
195		Vytyčení příček	1 den	05.09. 24	05.09. 24	185FS-1 den	196;200SS
196		Zdění příček	1 den	06.09. 24	06.09. 24	195	197SS;198;206
197		Realiazce SDK příček	2 dny	06.09. 24	09.09. 24	196SS	198;208
198		Úklid prostoru	1 den	10.09. 24	10.09. 24	196;197	199SS
199		Kontrola provedení	1 den	10.09. 24	10.09. 24	198SS	201
200		Osazení oken	2 dny	05.09. 24	06.09. 24	195SS	217
201		Stoupací potrubí kanalizace + hrubé rozvody	2 dny	16.09. 24	17.09. 24	199;191	202SS+1 den;2
202		Stoupací potrubí VZT + hrubé rozvody	2 dny	17.09. 24	18.09. 24	201SS+1 den;	1203SS+1 den
203		Hrubé rozvody vodovodu + topení	2 dny	18.09. 24	19.09. 24	202SS+1 den	204SS+1 den
204		Hrubé rozvody slaboproudu a silnoproudu	2 dny	19.09. 24	20.09. 24	203SS+1 den	313
205		**sál**	**14 dny**	**06.09. 24**	**25.09. 24**		
206		Vytyčení příček	1 den	06.09. 24	06.09. 24	196FS-1 den	207;211SS
207		Zdění příček	2 dny	09.09. 24	10.09. 24	206	209;254
208		Realiazce SDK příček	1 den	10.09. 24	10.09. 24	197	209
209		Úklid prostoru	1 den	11.09. 24	11.09. 24	207;208	210SS;254
210		Kontrola provedení	1 den	11.09. 24	11.09. 24	209SS	212
211		Montáž prosklené fasádní hliníkové stěny	14 dny	06.09. 24	25.09. 24	206SS	341
212		Stoupací potrubí kanalizace + hrubé rozvody	2 dny	18.09. 24	19.09. 24	210;201	213SS+1 den
213		Stoupací potrubí VZT + hrubé rozvody	2 dny	19.09. 24	20.09. 24	212SS+1 den	214SS+1 den
214		Hrubé rozvody vodovodu + topení	2 dny	20.09. 24	23.09. 24	213SS+1 den	215SS+1 den
215		Hrubé rozvody slaboproudu a silnoproudu	2 dny	23.09. 24	24.09. 24	214SS+1 den	329;339FS+1 d
216		**Fasádní úpravy**	**29 dny**	**09.09. 24**	**17.10. 24**		
217		Zaměření podkladových konstrukcí	1 den	09.09. 24	09.09. 24	131;200	218SS
218		Zakrývání vnějších otvorů	1 den	09.09. 24	09.09. 24	217SS;178;18	220;229
219		**penzion uliční**	**15 dny**	**10.09. 24**	**30.09. 24**		
220		Příprava podkladu/penetrační nátěr	1 den	10.09. 24	10.09. 24	218	221
221		Provedení TI EPS/minerálních desek	1 den	11.09. 24	11.09. 24	220	222
222		Montáž + impregnace dřevěných profilů	2 dny	12.09. 24	13.09. 24	221	223SS;224
223		Provedení průběžné štěrbiny	1 den	12.09. 24	12.09. 24	222SS	224
224		Montáž + impregnace modřínových hranolů	1 den	16.09. 24	16.09. 24	222;223	225
225		Montáž + impregnace prkenného obkladu	2 dny	17.09. 24	18.09. 24	224	226
226		Provedení stěrkového tmelu s perlinkou	1 den	19.09. 24	19.09. 24	225	227FS+6 dny;2
227		Penetrace + lepení cihelných pásků/klinkerů	1 den	30.09. 24	30.09. 24	226FS+6 dny	240;257
228		**penzion štít**	**9 dny**	**10.09. 24**	**20.09. 24**		
229		Příprava podkladu/penetrační nátěr	1 den	10.09. 24	10.09. 24	218	230
230		Provedení TI EPS	1 den	11.09. 24	11.09. 24	229	231
231		Provedení tepelněizolační omítky s perlinkou	1 den	12.09. 24	12.09. 24	230	232
232		Provedení podkladního nátěru stěn	1 den	13.09. 24	13.09. 24	231	233FS+4 dny;2
233		Provedení silikonsilikátové stěrky	1 den	20.09. 24	20.09. 24	232FS+4 dny	242;257
234		**penzion průchod**	**13 dny**	**20.09. 24**	**08.10. 24**		
235		Příprava podkladu	1 den	20.09. 24	20.09. 24	226	236
236		Příprava podkladu/penetrační nátěr	1 den	23.09. 24	23.09. 24	235	237
237		Provedení TI EPS/minerálních desek	3 dny	24.09. 24	26.09. 24	236	238SS;239
238		Provedení okapních profilů PVC	1 den	24.09. 24	24.09. 24	237SS	239
239		Provedení stěrkového elastifikovaného tmelu + perlinka	2 dny	27.09. 24	30.09. 24	237;238	240FS+4 dny;249
240		Penetrace + provedení silikonsilikátové stěrky	2 dny	07.10. 24	08.10. 24	239FS+4 dny;	2252;257
241		**venkovní schodiště**	**16 dny**	**23.09. 24**	**14.10. 24**		
242		Příprava podkladu	1 den	23.09. 24	23.09. 24	232;233	243FS+4 dny
243		Provedení vyrovnávací vápenocem. omítky	2 dny	30.09. 24	01.10. 24	242FS+4 dny	244
244		Nástřik cementového postřiku	1 den	02.10. 24	02.10. 24	243	245
245		Provedení stěrkového elastifikovaného tmelu + perlinka	1 den	03.10. 24	03.10. 24	244	246FS+5 dny
246		Provedení podkladního nátěru stěn	1 den	11.10. 24	11.10. 24	245FS+5 dny	247
247		Provedení silikonsilikátové stěrky	1 den	14.10. 24	14.10. 24	246	257
248		**sál**	**8 dny**	**01.10. 24**	**10.10. 24**		
249		Příprava podkladu	1 den	01.10. 24	01.10. 24	239	250
250		Provedení TI EPS	1 den	02.10. 24	02.10. 24	249	251
251		Provedení stěrkového elastifikovaného tmelu + perlinka	1 den	03.10. 24	03.10. 24	250	252FS+4 dny
252		Provedení silikonsilikátové stěrky	1 den	10.10. 24	10.10. 24	251FS+4 dny;	2257
253		**sál dělící příčka**	**3 dny**	**12.09. 24**	**16.09. 24**		
254		Příprava podkladu	1 den	12.09. 24	12.09. 24	207;209	255
255		Provedení TI minerálních desek	1 den	13.09. 24	13.09. 24	254	256
256		Provedení vnitřní štukové omítky	1 den	16.09. 24	16.09. 24	255	265
257		Demontáž lešení	3 dny	15.10. 24	17.10. 24	247;252;142;	2398
258		Demontáž stavebního jeřábu	2 dny	01.10. 24	02.10. 24	157	410
259		**Úpravy vnitřních povrchů**	**75 dny**	**12.09. 24**	**25.12. 24**		
260		**penzion 1.PP**	**31 dny**	**12.09. 24**	**24.10. 24**		
261		Příprava podkladu	1 den	12.09. 24	12.09. 24	171	262
262		Provedení vyztužené stěrky perlinkou na stropech	2 dny	13.09. 24	16.09. 24	261	263
263		Provedení jednovrstvé systémové omítky vyztužené vlákny	4 dny	17.09. 24	20.09. 24	262	264;350FS+5 dny
264		Příprava podkladu	1 den	23.09. 24	23.09. 24	263	265
265		Provedení tenkovrstvé omítky + perlinka	3 dny	24.09. 24	26.09. 24	264;256	266
266		Zahlazení omítky	1 den	27.09. 24	27.09. 24	265	267FS+3 dny;2
267		Provedení obkladu stěn 300x300 do 600x900	4 dny	03.10. 24	08.10. 24	266FS+3 dny	268
268		Příprava podkladu	1 den	09.10. 24	09.10. 24	267	269
269		Provedení penetrace ALP	1 den	10.10. 24	10.10. 24	268	270
270		Natavení SBS pásu tl. 4 mm	1 den	11.10. 24	11.10. 24	269	271
271		Provedení TI EPS S 100	1 den	14.10. 24	14.10. 24	270	272
272		Provedení rychletuhnoucího potěru E300 Cemflow	2 dny	15.10. 24	16.10. 24	271	273FS+2 dny
273		Penetrace, těsnící HI stěrka	1 den	21.10. 24	21.10. 24	272FS+2 dny	274
274		Provedení keramické dlažby 600(900)x600(900)	2 dny	22.10. 24	23.10. 24	273	275
275		Osazení HPL soklu	1 den	24.10. 24	24.10. 24	274	344
276		**penzion 1.NP + sál**	**30 dny**	**30.09. 24**	**08.11. 24**		
277		Příprava podkladu	1 den	30.09. 24	30.09. 24	182;266	278
278		Provedení vyztužené stěrky perlinkou na stropech	2 dny	01.10. 24	02.10. 24	277	279
279		Provedení jednovrstvé systémové omítky vyztužené vlákny	4 dny	03.10. 24	08.10. 24	278	280;360FS+5 dny
280		Začištění povrchu	1 den	09.10. 24	09.10. 24	279	281
281		Příprava podkladu	1 den	10.10. 24	10.10. 24	280	282
282		Provedení tenkovrstvé omítky + perlinka	2 dny	11.10. 24	14.10. 24	281	283
283		Zahlazení omítky	1 den	15.10. 24	15.10. 24	282	284FS+3 dny;2
284		Provedení obkladu stěn 300x300 do 300x600	3 dny	21.10. 24	23.10. 24	283FS+3 dny	285

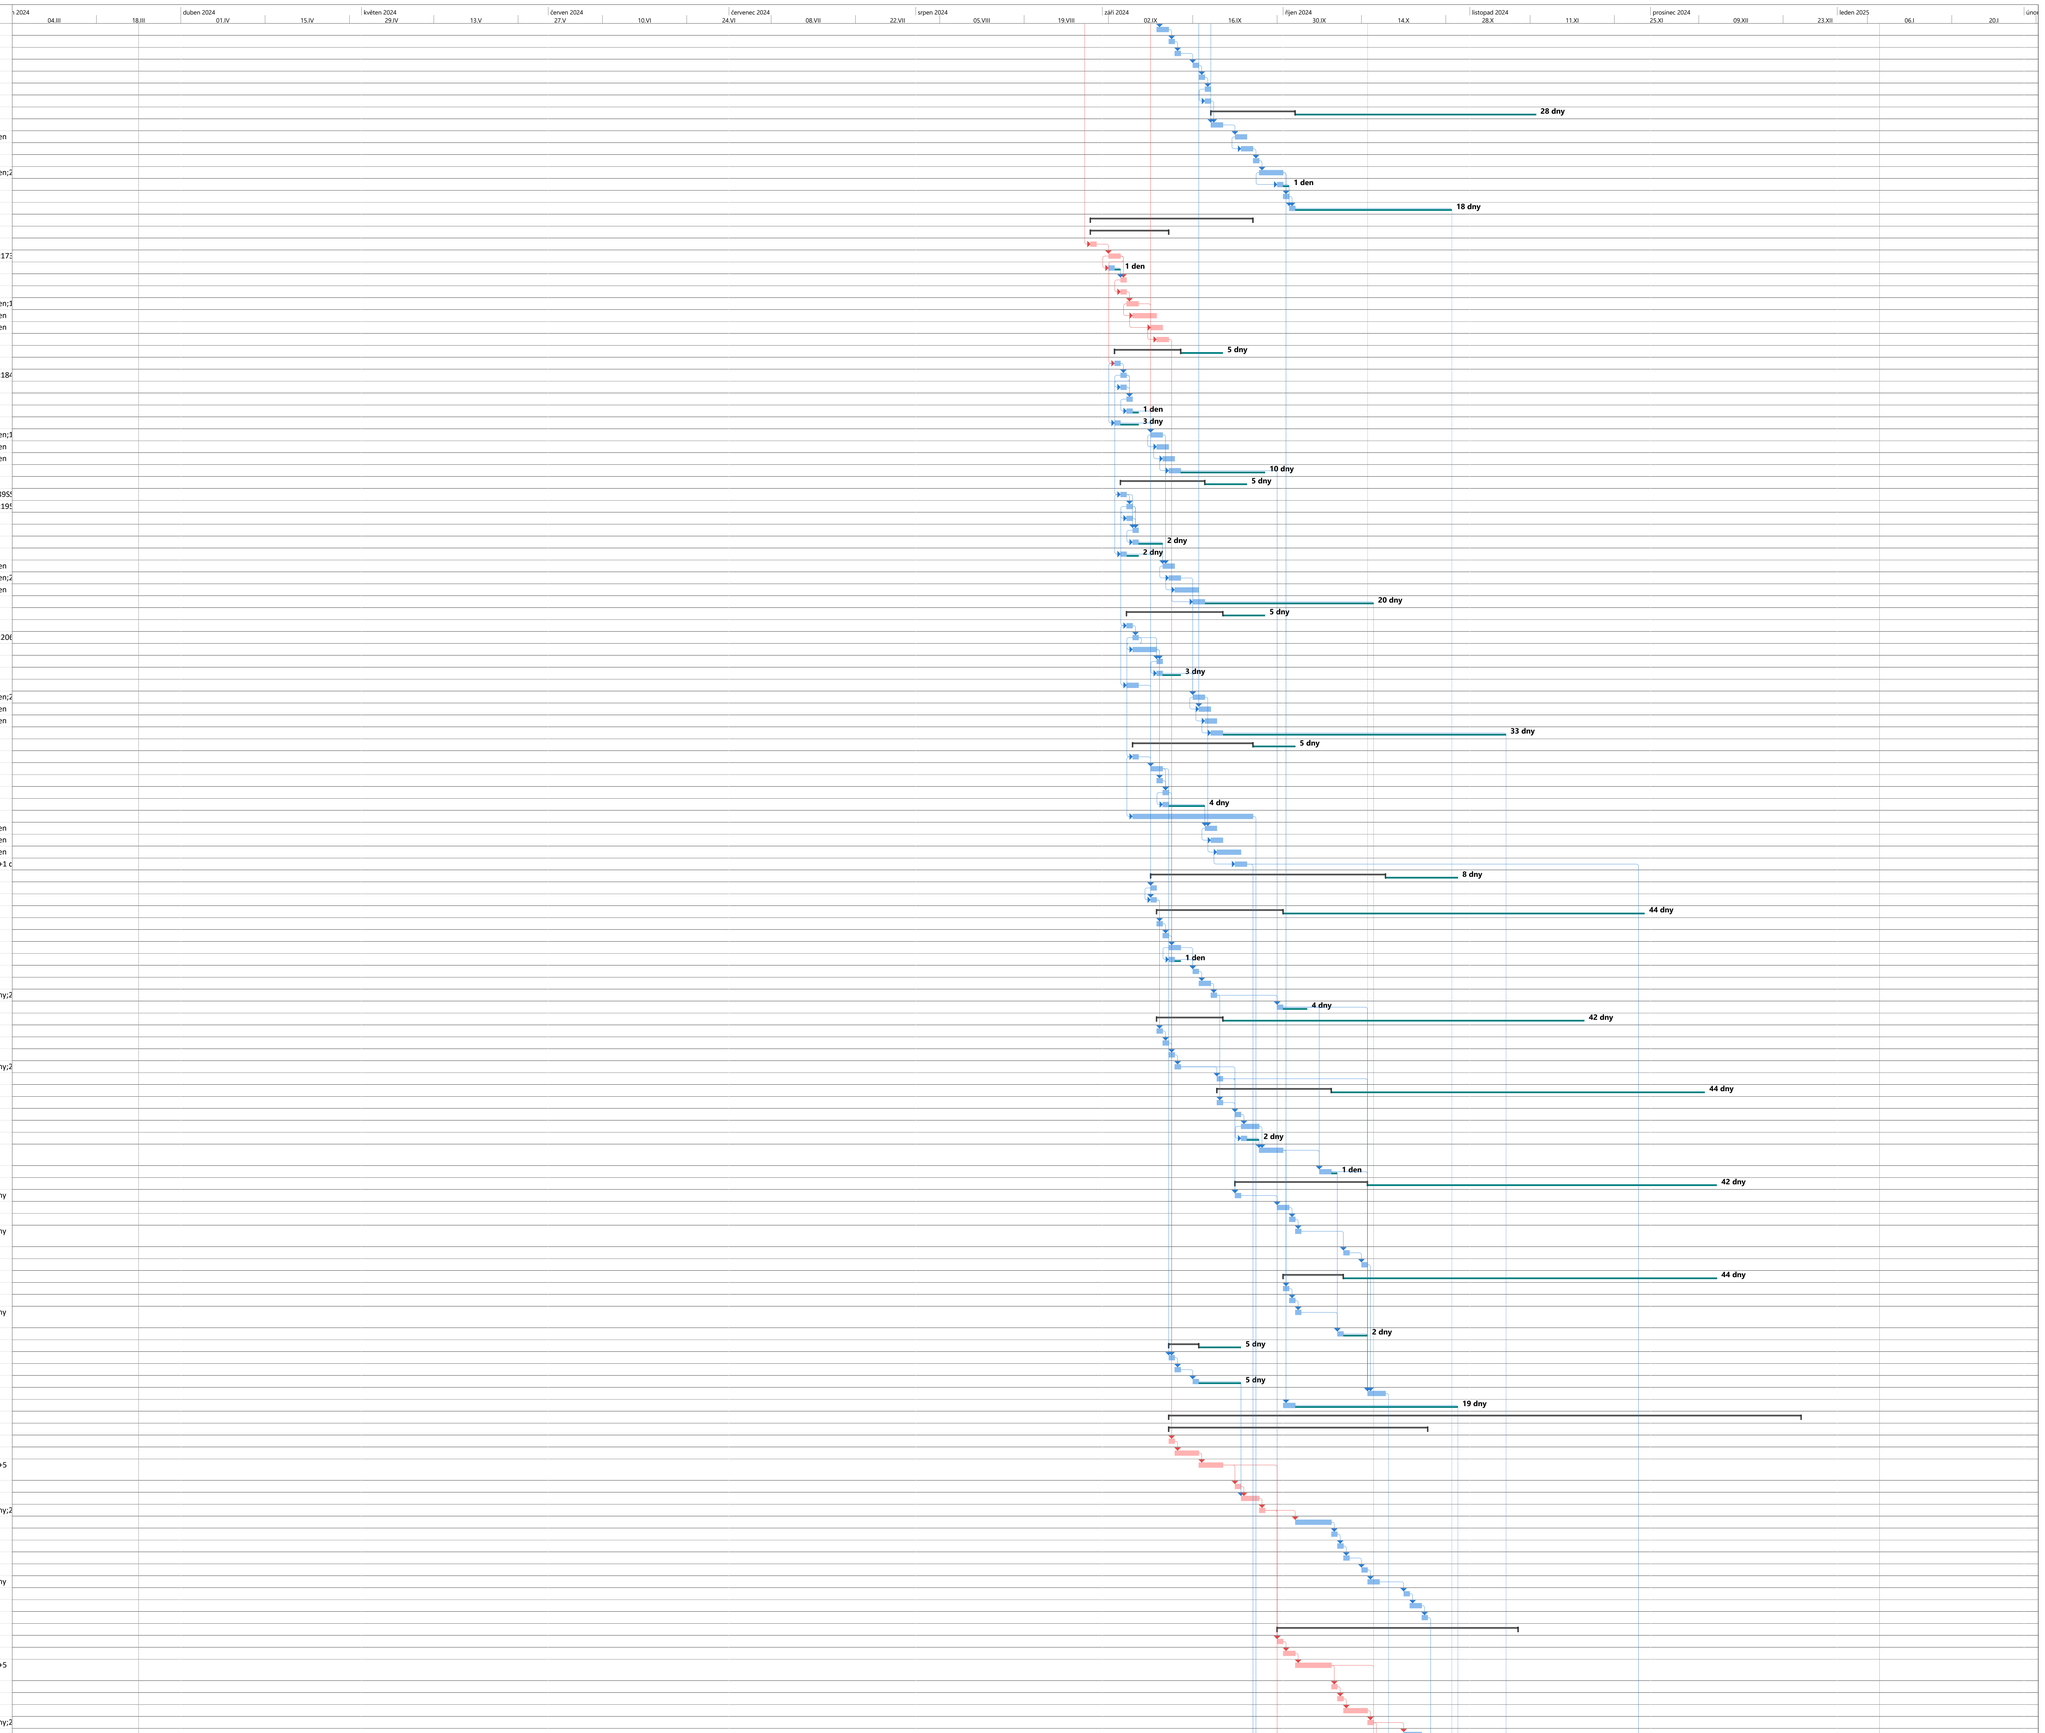

Kritický | Úkol | Milník | Skluz | Souhrn projektu | Rozdělení zahrnutého kritického úkolu | Neaktivní milník | Ruční úkol | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze zahájení | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení kritického úkolu | Rozdělení | Časová rezerva | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Neaktivní úkol | Neaktivní souhrn | Pouze s dobou trvání | Ruční souhrn | Pouze s datem dokončení | Vnější milník | Průběh

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
285	Příprava podkladu	1 den	24.10. 24	24.10. 24	284	286
286	Natavení SBS pásu tl. 4 mm	1 den	25.10. 24	25.10. 24	285	287
287	Provedení kročejové izolace	1 den	28.10. 24	28.10. 24	286	288
288	Provedení rychletuhnoucího potěru E300 Cemflow	2 dny	29.10. 24	30.10. 24	287;160	289FS+2 dny
289	Hloubková penetrace + samonivelační stěrka	1 den	04.11. 24	04.11. 24	288FS+2 dny	290FS+1 den
290	Realizace podlahy z dubových vlysů	1 den	06.11. 24	06.11. 24	289FS+1 den	291;292SS
291	Osazení podlahové lišty	1 den	07.11. 24	07.11. 24	290	304
292	Provedení keramické dlažby 300(900)x300(900)	2 dny	06.11. 24	07.11. 24	290SS	293
293	Osazení HPL soklu	1 den	08.11. 24	08.11. 24	292	353
294	**penzion 2.NP**	**28 dny**	**16.10. 24**	**22.11. 24**		
295	Příprava podkladu	1 den	16.10. 24	16.10. 24	193;283	296
296	Provedení vyztužené stěrky perlinkou na stropech	2 dny	17.10. 24	18.10. 24	295	297
297	Provedení jednovrstvé systémové omítky vyztužené vlákny	4 dny	21.10. 24	24.10. 24	296	298;370FS+5 dny
298	Začištění povrchu	1 den	25.10. 24	25.10. 24	297	299
299	Příprava podkladu	1 den	28.10. 24	28.10. 24	298	300
300	Provedení tenkovrstvé omítky + perlinka	1 den	29.10. 24	29.10. 24	299	301
301	Zahlazení omítky	1 den	30.10. 24	30.10. 24	300	302FS+3 dny
302	Provedení obkladu stěn 300x600 do 600x900	2 dny	05.11. 24	06.11. 24	301FS+3 dny	303;313
303	Příprava podkladu	1 den	07.11. 24	07.11. 24	302	304
304	Nanesení těsnící HI stěky	1 den	08.11. 24	08.11. 24	303;291	305
305	Provedení keramických schodovek	1 den	11.11. 24	11.11. 24	304	306SS
306	Provedení kročejové izolace	1 den	11.11. 24	11.11. 24	305SS	307
307	Provedení rychletuhnoucího potěru E300 Cemflow	2 dny	12.11. 24	13.11. 24	306	308FS+3 dny
308	Penetrace + těsnící HI stěrka	1 den	19.11. 24	19.11. 24	307FS+3 dny	309
309	Provedení keramické dlažby 600(900)x600(900)	2 dny	20.11. 24	21.11. 24	308	310;311SS
310	Osazení HPL soklu	1 den	22.11. 24	22.11. 24	309	320
311	Montáž plovoucí podlahy	1 den	20.11. 24	20.11. 24	309SS	363
312	**penzion 3.NP+4.NP**	**29 dny**	**07.11. 24**	**17.12. 24**		
313	Příprava podkladu	1 den	07.11. 24	07.11. 24	204;302	314
314	Provedení jednovrstvé systémové omítky vyztužené vlákny	6 dny	08.11. 24	15.11. 24	313	315;381FS+5 dny
315	Začištění povrchu	1 den	18.11. 24	18.11. 24	314	316
316	Provedení tenkovrstvé omítky + perlinka	1 den	19.11. 24	19.11. 24	315	317
317	Zahlazení omítky	1 den	20.11. 24	20.11. 24	316	318FS+4 dny
318	Provedení obkladu stěn 300x600 do 600x900	2 dny	27.11. 24	28.11. 24	317FS+4 dny	319;329
319	Příprava podkladu	1 den	29.11. 24	29.11. 24	318	320;330
320	Nanesení těsnící HI stěky	1 den	02.12. 24	02.12. 24	319;310	321
321	Provedení keramických schodovek	1 den	03.12. 24	03.12. 24	320	322SS
322	Provedení kročejové izolace	2 dny	03.12. 24	04.12. 24	321SS	323
323	Provedení rychletuhnoucího potěru E300 Cemflow	2 dny	05.12. 24	06.12. 24	322	324FS+3 dny
324	Penetrace + těsnící HI stěrka	1 den	12.12. 24	12.12. 24	323FS+3 dny	325
325	Provedení keramické dlažby 600(900)x600(900)	2 dny	13.12. 24	16.12. 24	324	326;327SS
326	Osazení HPL soklu	1 den	17.12. 24	17.12. 24	325	338
327	Montáž plovoucí podlahy	1 den	13.12. 24	13.12. 24	325SS	373
328	**sál**	**19 dny**	**29.11. 24**	**25.12. 24**		
329	Příprava podkladu	1 den	29.11. 24	29.11. 24	215;318	330
330	Provedení jednovrstvé systémové omítky vyztužené vlákny	3 dny	02.12. 24	04.12. 24	319;329	331;394FS+5 dny
331	Začištění povrchu	1 den	05.12. 24	05.12. 24	330	332
332	Příprava podkladu	1 den	06.12. 24	06.12. 24	331	333
333	Natavení SBS pásu tl. 4 mm	2 dny	09.12. 24	10.12. 24	332	334
334	Provedení TI EPS S 100	3 dny	11.12. 24	13.12. 24	333	335
335	Provedení rychletuhnoucího potěru E300 Cemflow	3 dny	16.12. 24	18.12. 24	334	336FS+1 den
336	Hloubková penetrace + samonivelační stěrka	1 den	20.12. 24	20.12. 24	335FS+1 den	337
337	Realizace podlahy z dubových vlysů	2 dny	23.12. 24	24.12. 24	336	338
338	Osazení podlahové lišty	1 den	25.12. 24	25.12. 24	337;326	385
339	Očištění a nátěr ocelových kcí	2 dny	26.09. 24	27.09. 24	215FS+1 den	351
340	**Dokončovací práce**	**71 dny**	**26.09. 24**	**02.01. 25**		
341	Montáž řídící jednotky pro venkovní žaluzie	2 dny	26.09. 24	27.09. 24	211	351
342	Montáž hasících přístrojů a bezpečnostních značek	1 den	13.12. 24	13.12. 24	394	423
343	**penzion 1.PP + zázemí sálu**	**24 dny**	**30.09. 24**	**31.10. 24**		
344	Osazení zábradlí schodiště	1 den	25.10. 24	25.10. 24	275	345SS
345	Kompletace elektro + osazení svítidel	2 dny	25.10. 24	28.10. 24	344SS	346SS
346	Osazení kotle + kompletace vytápění	2 dny	25.10. 24	28.10. 24	345SS	347
347	Kompletace vzduchotechniky	2 dny	29.10. 24	30.10. 24	346	348SS
348	Osazení zařizovacích předmětů	1 den	29.10. 24	29.10. 24	347SS	349
349	Osazení dveřních křídel	1 den	30.10. 24	30.10. 24	348	351
350	Nátěr malby	1 den	30.09. 24	30.09. 24	263FS+5 dny	351
351	Úklid prostoru	1 den	31.10. 24	31.10. 24	349;339;341;3	353
352	**penzion 1.NP**	**22 dny**	**16.10. 24**	**14.11. 24**		
353	Osazení zábradlí schodiště	1 den	11.11. 24	11.11. 24	293;351	354SS
354	Osazení parapetů	1 den	11.11. 24	11.11. 24	353SS	355SS
355	Kompletace elektro + osazení svítidel	2 dny	11.11. 24	12.11. 24	354SS	356SS
356	Kompletace vytápění	1 den	11.11. 24	11.11. 24	355SS	357
357	Kompletace vzduchotechniky	2 dny	12.11. 24	13.11. 24	356	358SS
358	Osazení zařizovacích předmětů	1 den	12.11. 24	12.11. 24	357SS	359
359	Osazení dveřních křídel	1 den	13.11. 24	13.11. 24	358	361
360	Nátěr malby	2 dny	16.10. 24	17.10. 24	279FS+5 dny	361
361	Úklid prostoru	1 den	14.11. 24	14.11. 24	359;360	363
362	**penzion 2.NP**	**18 dny**	**01.11. 24**	**26.11. 24**		
363	Osazení zábradlí schodiště	1 den	21.11. 24	21.11. 24	311;361	364SS
364	Osazení parapetů	1 den	21.11. 24	21.11. 24	363SS	365SS
365	Kompletace elektro + osazení svítidel	2 dny	21.11. 24	22.11. 24	364SS	366SS
366	Kompletace vytápění	1 den	21.11. 24	21.11. 24	365SS	367
367	Kompletace vzduchotechniky	2 dny	22.11. 24	25.11. 24	366	368SS
368	Osazení zařizovacích předmětů	1 den	22.11. 24	22.11. 24	367SS	369
369	Osazení dveřních křídel	1 den	25.11. 24	25.11. 24	368	371
370	Nátěr malby	1 den	01.11. 24	01.11. 24	297FS+5 dny	371
371	Úklid prostoru	1 den	26.11. 24	26.11. 24	369;370	373
372	**penzion 3.NP+4.NP**	**21 dny**	**25.11. 24**	**23.12. 24**		
373	Osazení zábradlí schodiště	1 den	16.12. 24	16.12. 24	327;371	374SS
374	Osazení parapetů	1 den	16.12. 24	16.12. 24	373SS	375SS
375	Kompletace/ošetření truhlářských výrobků	2 dny	16.12. 24	17.12. 24	374SS	376SS
376	Kompletace elektro + osazení svítidel	3 dny	16.12. 24	18.12. 24	375SS	377
377	Kompletace vytápění	1 den	19.12. 24	19.12. 24	376	378SS
378	Kompletace vzduchotechniky	2 dny	19.12. 24	20.12. 24	377SS	379SS
379	Osazení zařizovacích předmětů	1 den	19.12. 24	19.12. 24	378SS	380
380	Osazení dveřních křídel	1 den	20.12. 24	20.12. 24	379	382
381	Nátěr malby	1 den	25.11. 24	25.11. 24	314FS+5 dny	382
382	Úklid prostoru	1 den	23.12. 24	23.12. 24	380;381	384
383	**sál**	**16 dny**	**12.12. 24**	**02.01. 25**		
384	Osazení střešního záchytného systému	1 den	24.12. 24	24.12. 24	382	395
385	Osazení parapetů	1 den	26.12. 24	26.12. 24	338	386SS
386	Osazení zábradlí schodiště	1 den	26.12. 24	26.12. 24	385SS	387SS
387	Kompletace/ošetření truhlářských výrobků	3 dny	26.12. 24	30.12. 24	386SS	388SS
388	Montáž sestavy vnitřních screenových rolet	6 dny	26.12. 24	02.01. 25	387SS	389SS;423
389	Kompletace elektro + osazení svítidel	2 dny	26.12. 24	27.12. 24	388SS	390;420
390	Kompletace vytápění	1 den	30.12. 24	30.12. 24	389	391SS;419
391	Kompletace vzduchotechniky	2 dny	30.12. 24	31.12. 24	390SS	392SS;422
392	Osazení zařizovacích předmětů	2 dny	30.12. 24	31.12. 24	391SS	393;418;421
393	Osazení dveřních křídel	1 den	01.01. 25	01.01. 25	392	395
394	Nátěr malby	1 den	12.12. 24	12.12. 24	330FS+5 dny	342
395	Úklid prostoru	1 den	02.01. 25	02.01. 25	393;384	418
396	**Terénní úpravy**	**14 dny**	**18.10. 24**	**06.11. 24**		
397	**ZDN**	**7 dny**	**18.10. 24**	**28.10. 24**		
398	Odkopávka zeminy + zhutnění podloží	1 den	18.10. 24	18.10. 24	257	404
399	Rozprostření + zhutnění 1. vrstvy ŠD	1 den	22.10. 24	22.10. 24	404	400
400	Provedení obrub do betonového lože	1 den	23.10. 24	23.10. 24	399	401
401	Rozprostření + zhutnění 2. vrstvy ŠD	1 den	24.10. 24	24.10. 24	400	402
402	Provedení zámkové dlažby	2 dny	25.10. 24	28.10. 24	401	405SS
403	**VPD**	**9 dny**	**21.10. 24**	**31.10. 24**		
404	Odkopávka zeminy + zhutnění podloží	1 den	21.10. 24	21.10. 24	398	399;405
405	Pokládka separační geotextilie	1 den	25.10. 24	25.10. 24	404;402SS	406
406	Rozprostření + zhutnění vrstvy ŠD	1 den	28.10. 24	28.10. 24	405	407
407	Rozprostření vyrovnávací vrtsvy	1 den	29.10. 24	29.10. 24	406	408
408	Pokládka vegetačních panelů + výplň humusem	2 dny	30.10. 24	31.10. 24	407	416;410SS
409	**OSP**	**6 dny**	**30.10. 24**	**06.11. 24**		
410	Odkopávka zeminy + zhutnění podloží	1 den	30.10. 24	30.10. 24	258;408SS	411
411	Rozprostření + zhutnění 1. vrstvy ŠD	1 den	31.10. 24	31.10. 24	410	412
412	Provedení obrub do betonového lože	1 den	01.11. 24	01.11. 24	411	413
413	Rozprostření + zhutnění 2. vrstvy ŠD	1 den	04.11. 24	04.11. 24	412	414
414	Provedení zámkové dlažby	1 den	05.11. 24	05.11. 24	413	415SS
415	Oprava asfaltového povrchu	1 den	05.11. 24	05.11. 24	414SS	416
416	Demontáž ZS a oplocení	1 den	06.11. 24	06.11. 24	415;408	424
417	**Přejímka stavby**	**7 dny**	**30.12. 24**	**07.01. 25**		
418	Zkouška vodovodu	1 den	03.01. 25	03.01. 25	392;395	424
419	Provedení otopné zkoušky	1 den	31.12. 24	31.12. 24	390	424
420	Revize elektro	1 den	30.12. 24	30.12. 24	389	424
421	Revize plynu	1 den	01.01. 25	01.01. 25	392	424
422	Revize VZT	1 den	01.01. 25	01.01. 25	391	424
423	Úklid prostoru	1 den	03.01. 25	03.01. 25	388;342	424
424	Předání stavby	1 den	06.01. 25	06.01. 25	423;416;418;4	425
425	Předpoklad kolaudace	1 den	07.01. 25	07.01. 25	424	

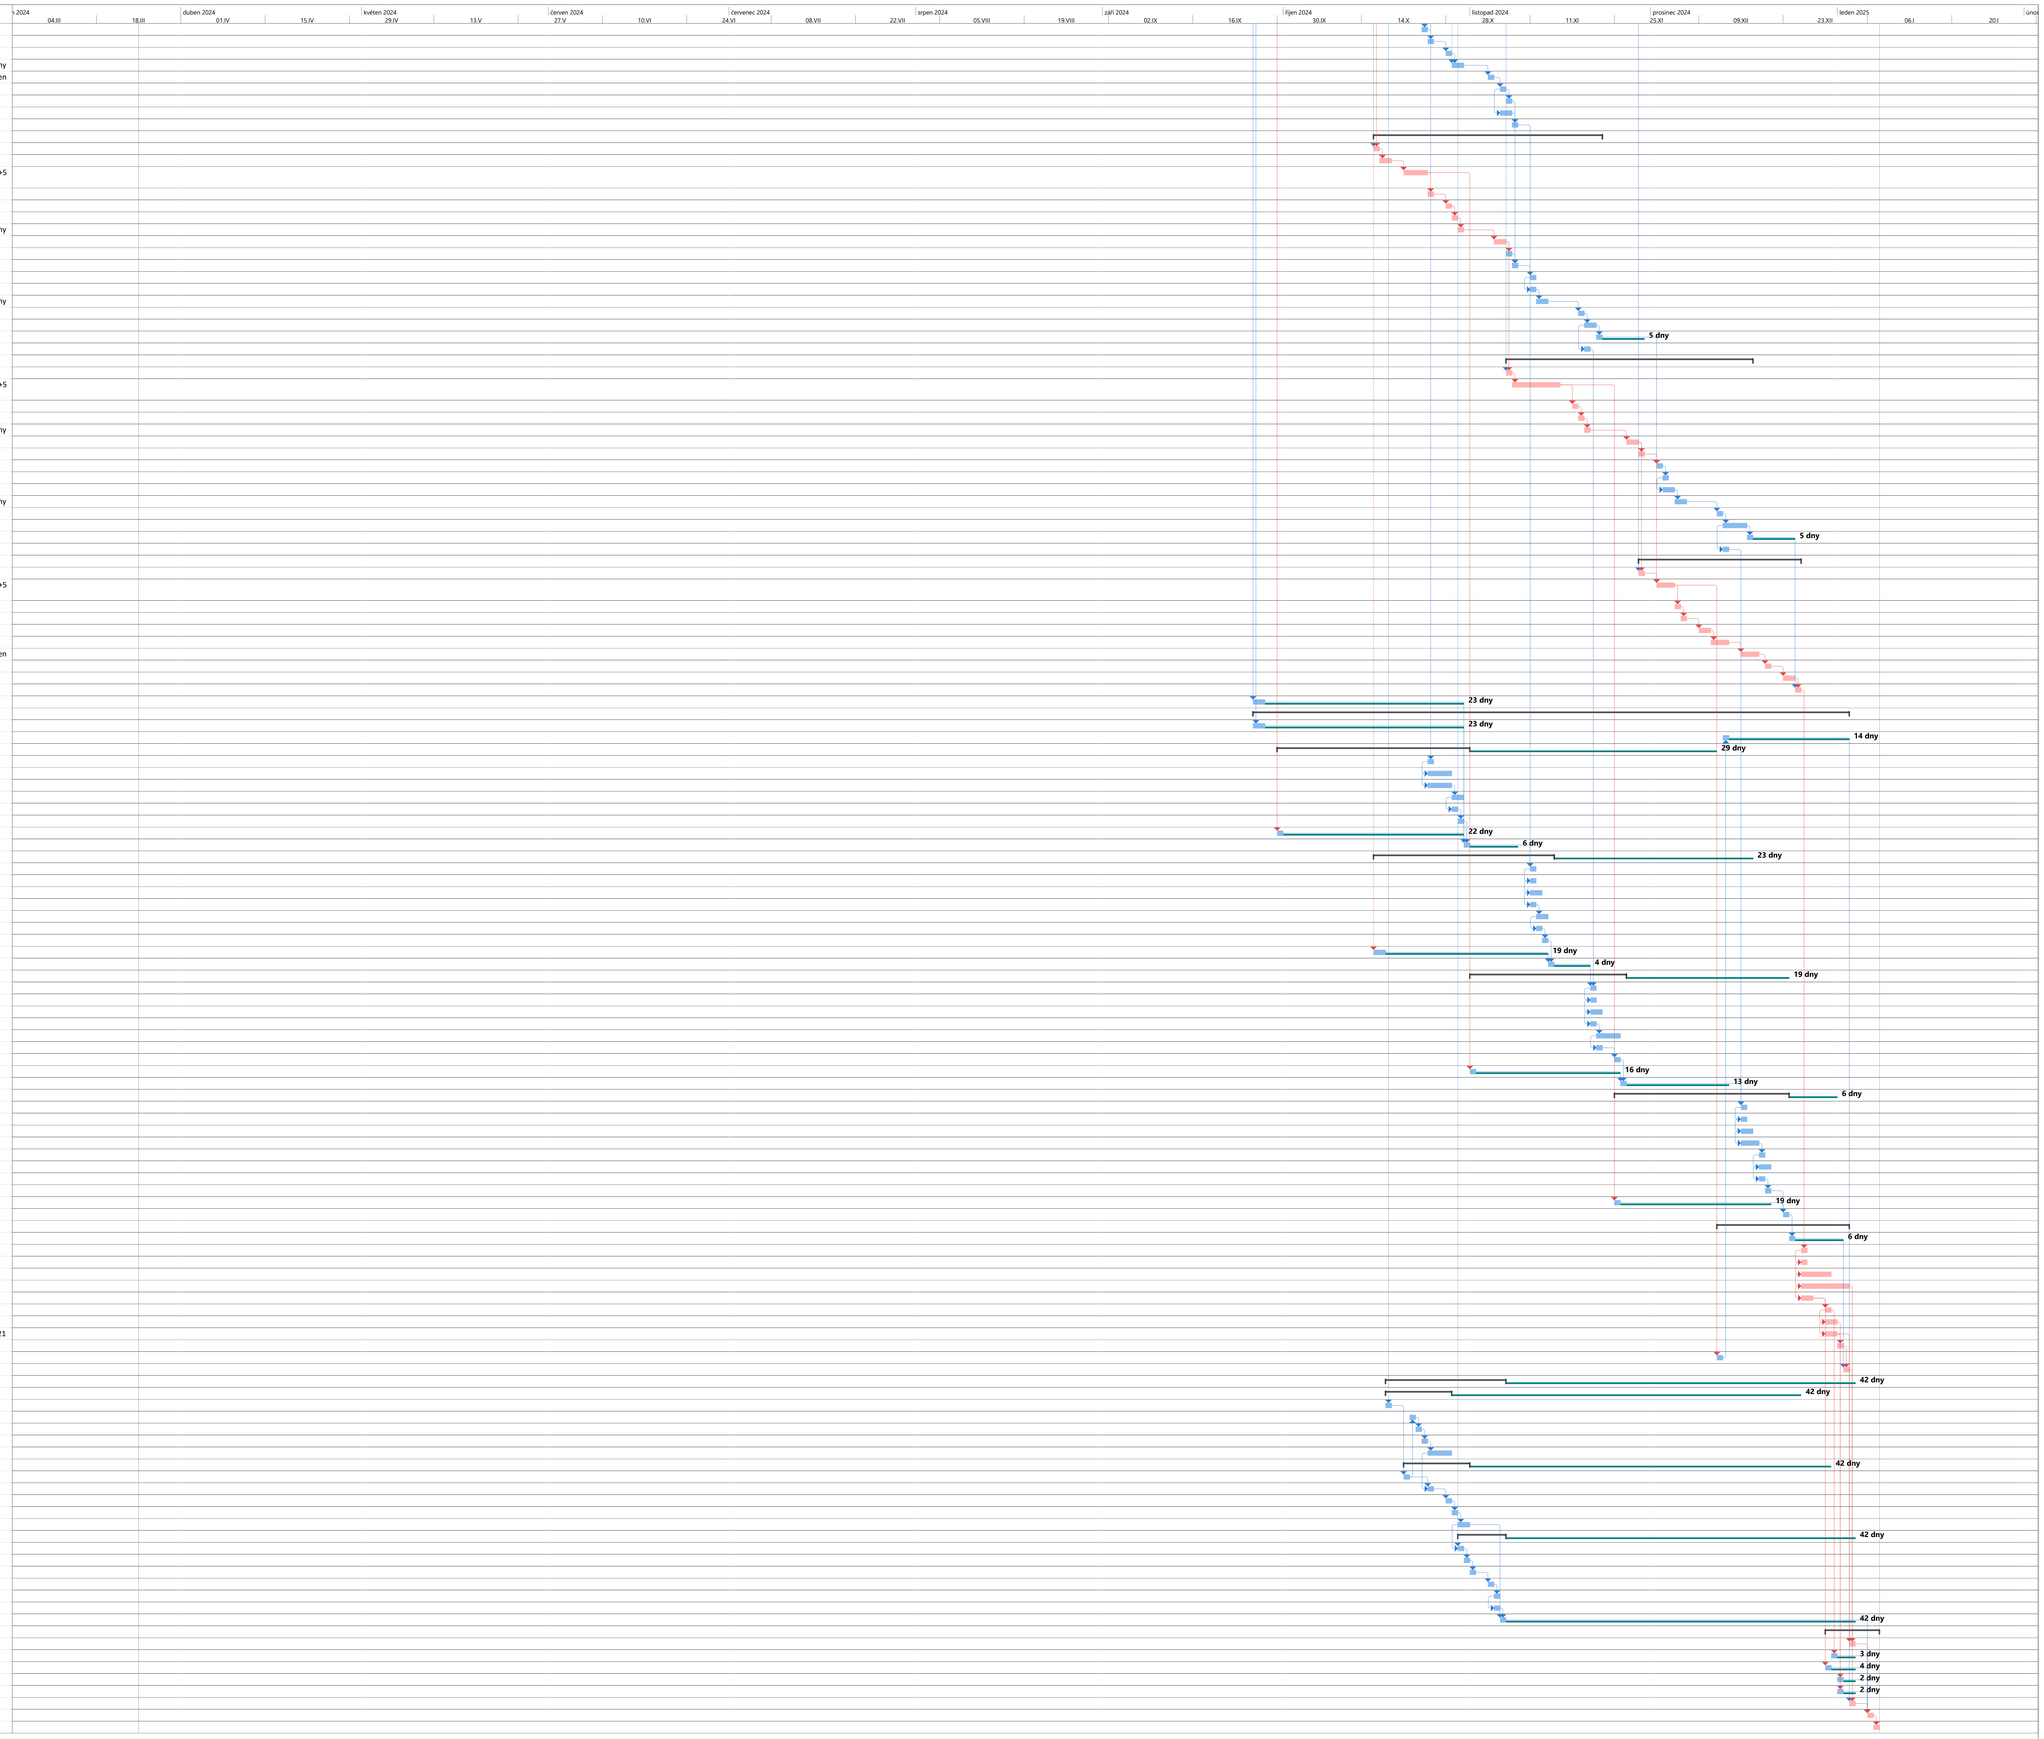

Kritický · Úkol · Milník · Skluz · Souhrn projektu · Rozdělení zahrnutého kritického úkolu · Neaktivní milník · Ruční úkol · Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu · Pouze zahájení · Vnější úkoly · Konečný termín

Rozdělení kritického úkolu · Rozdělení · Časová rezerva · Souhrnný · Zahrnutý kritický · Neaktivní úkol · Neaktivní souhrn · Pouze s dobou trvání · Ruční souhrn · Pouze s datem dokončení · Vnější milník · Průběh
