ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Náklady
1		**Příloha č.2.1.2-METODA PROUDOVÁ**	**311 dny**	**02.01. 24**	**11.03. 25**			**171 250 559,00 Kč**
2		**TE0 - Přípravné práce**	**3 dny**	**02.01. 24**	**04.01. 24**			**960 452,00 Kč**
3		Obj4 - Přípravné práce	3 dny	02.01. 24	04.01. 24		5;26	960 452,00 Kč
4		**TE1 - Demolice**	**92 dny**	**05.01. 24**	**13.05. 24**			**12 493 409,00 Kč**
5		Obj4 - Demolice	92 dny	05.01. 24	13.05. 24	3	28;7FS-25 (	12 493 409,00 Kč
6		**TE2 - Zemní práce a základové konstrukce**	**80 dny**	**18.04. 24**	**07.08. 24**			**12 031 685,00 Kč**
7		Obj4 - Zemní práce a základové konstrukce	35 dny	18.04. 24	05.06. 24	5FS-25 dn	10;30	9 023 763,75 Kč
8		Obj4 - Zemní práce a základové konstrukce	11 dny	24.07. 24	07.08. 24	10FS-3 dn		3 007 921,25 Kč
9		**TE3 - Hrubá spodní stavba**	**37 dny**	**06.06. 24**	**26.07. 24**			**6 900 589,00 Kč**
10		Obj4 - Hrubá spodní stavba	37 dny	06.06. 24	26.07. 24	7	8FS-3 dny	6 900 589,00 Kč
11		**TE4 - Hrubé stavební práce**	**69 dny**	**10.05. 24**	**14.08. 24**			**18 019 400,00 Kč**
12		Obj4 - Hrubé stavební práce	69 dny	10.05. 24	14.08. 24	5FS-3 dny	14FS-10 dn	18 019 400,00 Kč
13		**TE5 - Zastřešení**	**35 dny**	**01.08. 24**	**18.09. 24**			**7 794 954,00 Kč**
14		Obj4 - Zastřešení	35 dny	01.08. 24	18.09. 24	12FS-10 d	34	7 794 954,00 Kč
15		**TE6 - Hrubé vnitřní práce**	**69 dny**	**11.07. 24**	**15.10. 24**			**29 371 473,00 Kč**
16		Obj4 - Hrubé vnitřní práce	69 dny	11.07. 24	15.10. 24	12FS-34 d	36;18SS+3	29 371 473,00 Kč
17		**TE7 - Vnitřní úpravy povrchů**	**85 dny**	**27.08. 24**	**23.12. 24**			**13 778 122,00 Kč**
18		Obj4 - Vnitřní úpravy povrchů	85 dny	27.08. 24	23.12. 24	16SS+33 c	20FS-26 dn	13 778 122,00 Kč
19		**TE8 - Vnitřní kompletace**	**56 dny**	**27.11. 24**	**12.02. 25**			**37 004 491,00 Kč**
20		Obj4 - Vnitřní kompletace	56 dny	27.11. 24	12.02. 25	18FS-26 d	40	37 004 491,00 Kč
21		**TE9 - Fasádní práce**	**62 dny**	**22.08. 24**	**15.11. 24**			**18 510 498,00 Kč**
22		Obj4 - Fasádní práce	62 dny	22.08. 24	15.11. 24		24;42	18 510 498,00 Kč
23		**TE10 - Vnější práce**	**36 dny**	**18.11. 24**	**06.01. 25**			**5 020 967,00 Kč**
24		Obj4 - Vnější práce	36 dny	18.11. 24	06.01. 25	22	44	5 020 967,00 Kč
25		**TE0 - Přípravné práce**	**4 dny**	**05.01. 24**	**10.01. 24**			**606 000,00 Kč**
26		Hal1 - Přípravné práce	4 dny	05.01. 24	10.01. 24	3		606 000,00 Kč
27		**TE1 - Demolice**	**27 dny**	**14.05. 24**	**19.06. 24**			**1 202 311,00 Kč**
28		Hal1 - Demolice	27 dny	14.05. 24	19.06. 24	5		1 202 311,00 Kč
29		**TE2 - Zemní práce a podkladní vrstvy**	**6 dny**	**06.06. 24**	**13.06. 24**			**183 221,00 Kč**
30		Hal1 - Zemní práce a podkladní vrstvy	6 dny	06.06. 24	13.06. 24	7		183 221,00 Kč
31		**TE3 - Hrubé stavební práce**	**9 dny**	**15.08. 24**	**27.08. 24**			**1 813 286,00 Kč**
32		Hal1 - Hrubé stavební práce	9 dny	15.08. 24	27.08. 24	12		1 813 286,00 Kč
33		**TE4 - Zastřešení**	**21 dny**	**19.09. 24**	**17.10. 24**			**882 610,00 Kč**
34		Hal1 - Zastřešení	21 dny	19.09. 24	17.10. 24	14		882 610,00 Kč
35		**TE5 - Hrubé vnitřní rozvody**	**11 dny**	**16.10. 24**	**30.10. 24**			**1 384 215,00 Kč**
36		Hal1 - Hrubé vnitřní rozvody	11 dny	16.10. 24	30.10. 24	16		1 384 215,00 Kč
37		**TE6 - Vnitřní úpravy povrchů**	**28 dny**	**24.12. 24**	**30.01. 25**			**223 890,00 Kč**
38		Hal1 - Vnitřní úpravy povrchů	28 dny	24.12. 24	30.01. 25	18		223 890,00 Kč
39		**TE7 - Vnitřní kompletace**	**19 dny**	**13.02. 25**	**11.03. 25**			**1 017 509,00 Kč**
40		Hal1 - Vnitřní kompletace	19 dny	13.02. 25	11.03. 25	20		1 017 509,00 Kč
41		**TE8 - Fasádní práce**	**28 dny**	**18.11. 24**	**25.12. 24**			**932 806,00 Kč**
42		Hal1 - Fasádní práce	28 dny	18.11. 24	25.12. 24	22		932 806,00 Kč
43		**TE9 - Vnější práce**	**11 dny**	**07.01. 25**	**21.01. 25**			**1 118 671,00 Kč**
44		Hal1 - Vnější práce	11 dny	07.01. 25	21.01. 25	24		1 118 671,00 Kč

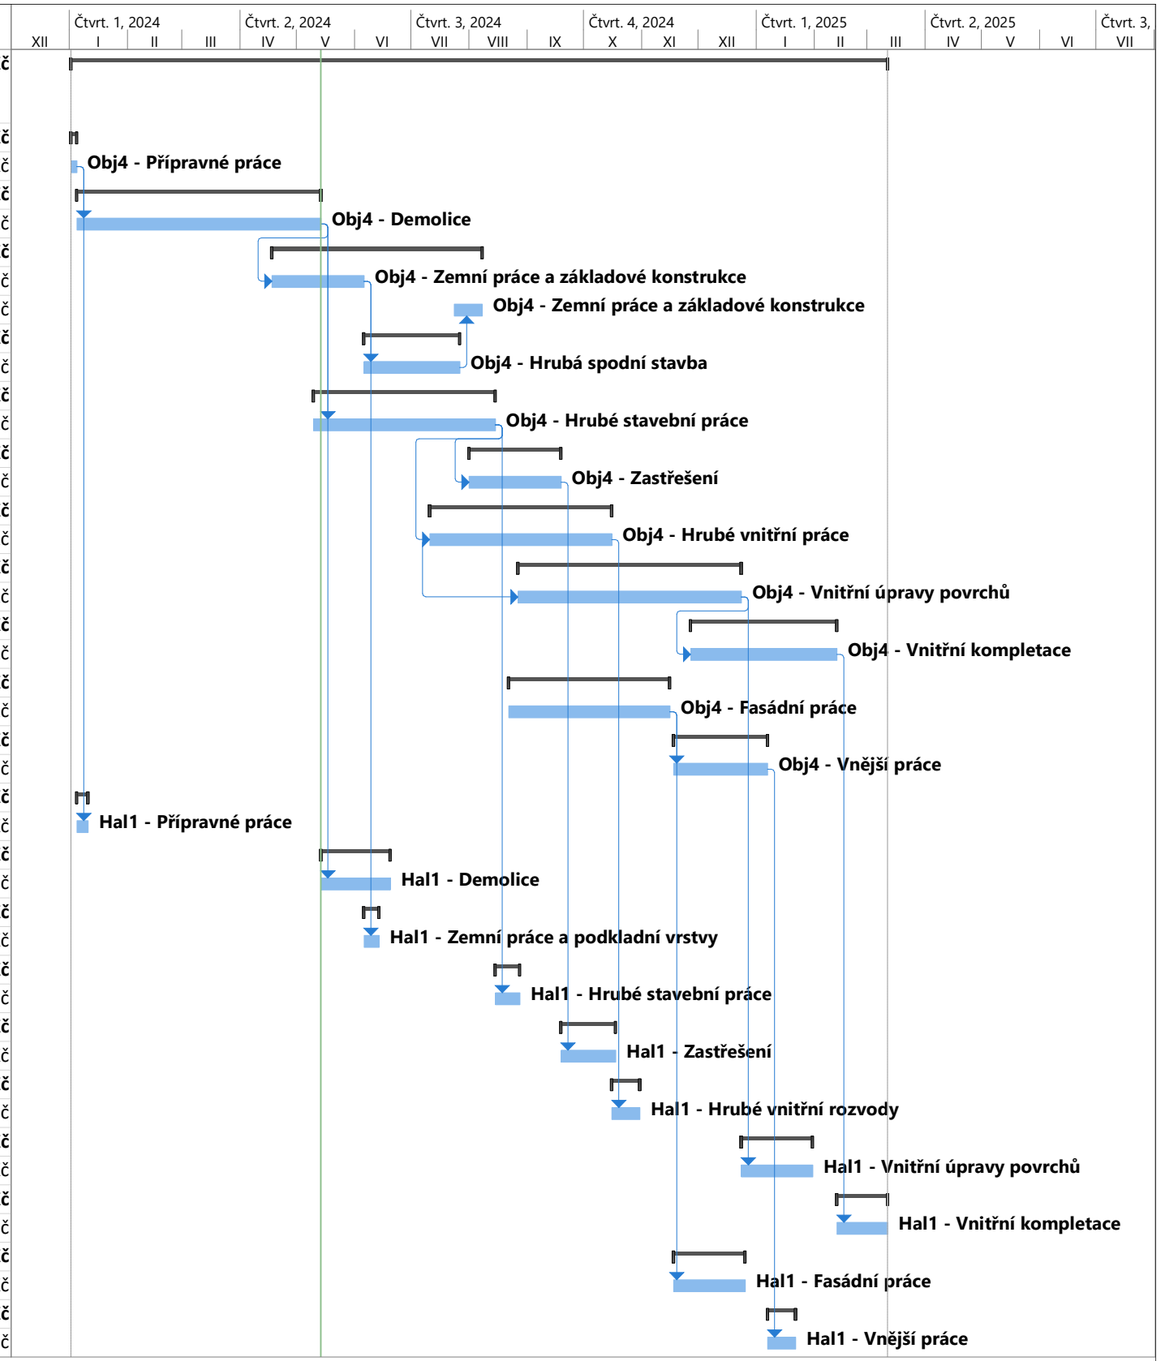

Projekt: PR02 project
Datum: 14.05. 24

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			
