ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

Katedra technologie staveb

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Stavebně technologický projekt

Polyfunkční dům U Koruny

Tomáš Jakoubek

2017

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Tomáš Váchal, Arquitecto Técnico

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY

OBSAH

4. ŘEŠENÍ ČASOVÉ STRUKTURY
   4.1. ČASOPROSTOROVÝ GRAF
   4.2. HARMONOGRAM

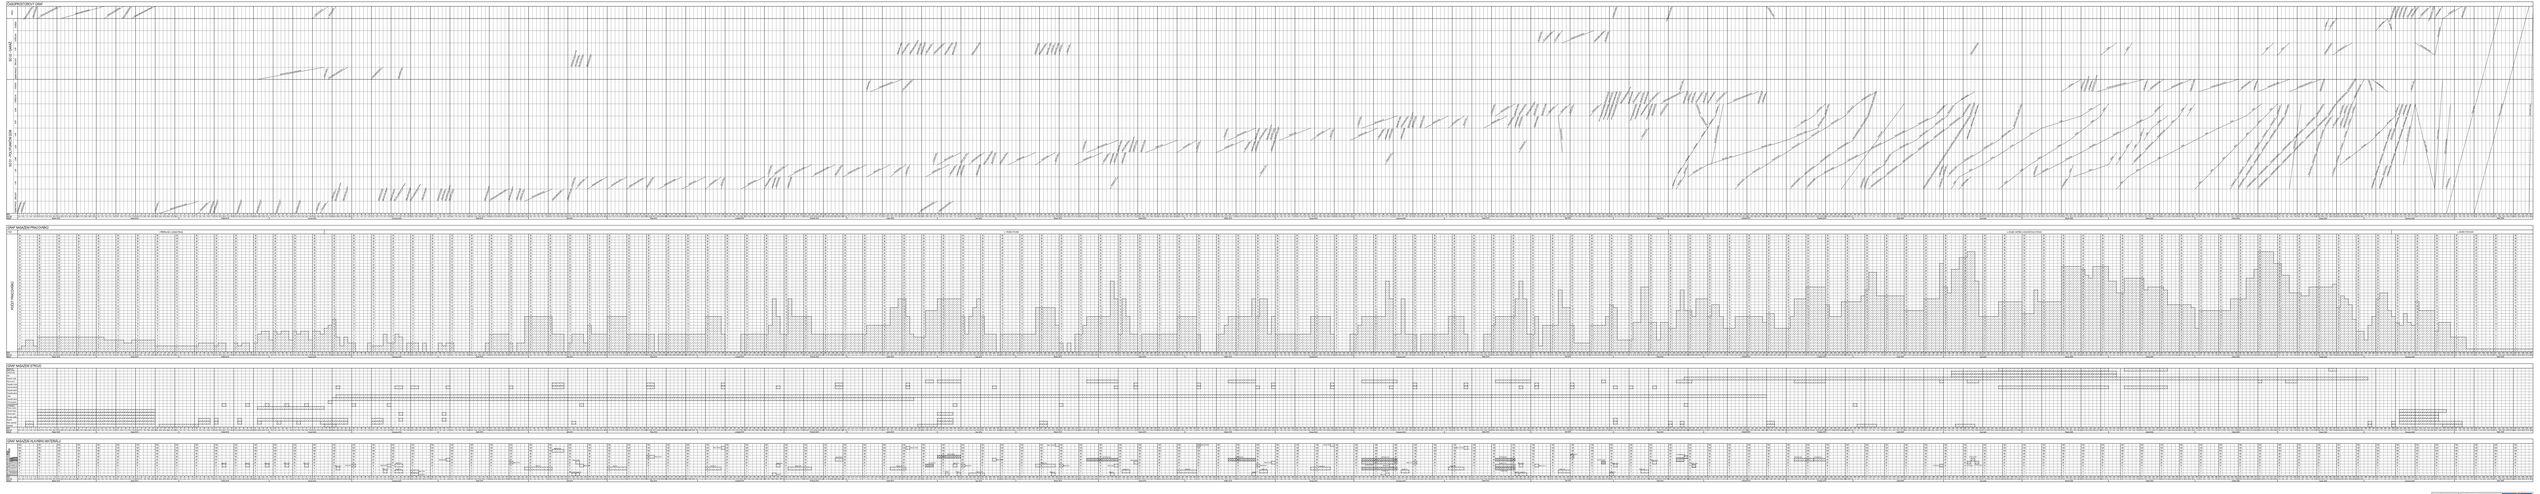

CITRATION		DATE ARCHIVE	
REVISED		06 JUN 2006	
REVISED		DATE DRAWN	
REVISED		06 JUN 2006	
PROJECT		DRAWN BY	
		Bradford Smith	
SCALE		DRAWING	
		Magnet Island analysis	
DRAWING NUMBER			
		Transient Draft	

4.2. HARMONOGRAM

ID		Název	Trvání	Začátek	Konec	Předchůdci	Následníci	Názvy zdrojů
1		**TE 00 - PŘÍPRAVNÉ, ZEMNÍ A BOURACÍ PRA**	**5.5. 10 - 22.6. 10**					
2		Přípravné staveniště	1 den	5.5. 10	5.5. 10		3	1_Zvedací	
3		Vytýčení staveniště	1 den	6.5. 10	6.5. 10	2	4	2_Geodet
4		Výstavba zařízení staveniště pro zemní práce	7.5. 10	6.5. 10	5.5. 10	3	5	3_Stroj / zednické zařízení staveniště
5		Vytýčení a zajištění inženýrských sítí	1 den	7.5. 10	7.5. 10	4	6	4_Geodet
6		Provedení přípravy areálové kc 11	20 5. 10	7.5. 10	4.6. 10	5	7	5_Přípravy / přípravky rozdvovodu a kanalizace
7		Provedení přípravy areálové kc 11 dne	20 5. 10	5.6. 10	5.6. 10	6	8	6_Přípravy / přípravky rozdvovodu a kanalizace
8		Provedení přípravy plynovodu	5 dny	6.6. 10	10.6. 10	7	9	7_Přípravy / přípravky plynovodu
9		Provedení geoprůzkumu přípravy kc2 dne		11.6. 10	12.6. 10	8	10	8_Přípravy / přípravky teplovodu
10		Příprava zálkovacího kabelu TrafoB dne		11.6. 10	18.6. 10	9	12	9_Přípravy / přípravky elektro
11		**Polyfunkční dům**	**155 dní**	**21.6. 10**	**21.1. 11**			
12		Zemní práce - bourací práce	20 dní	21.6. 10	16.7. 10		13	2_Geodet
13		Zakrytování Stěžovacovného pažení		19.7. 10	7.8. 10	12	14	8_Provedení Stěžovacovného pažení
14		Hloubení a odvoz zeminy stavební jámy	8 dní	10.8. 10	19.8. 10	13	15	9_Hloubení a odvoz zeminy jámy
15		Vytyčení výkopů pro podbetonování	1 den	11.8. 10	11.8. 10	14	16	2_Geodet
16		Hloubení a odvoz zeminy pro 1 den	14 dní	12.8. 10	31.8. 10	15	17	10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
17		Zřízení jednostranného bednění pro	3 dní	1.9. 10	3.9. 10	16	18	11_Podbetonování základů
18		Podbetonování základů vsucí dne		6.9. 10	17.9. 10	19FS+1 den	19	11_Podbetonování základů
19		Odstranění jednostranného bednění pro	2 dní	20.9. 10	21.9. 10	18	20	11_Podbetonování základů
20		Hloubení a odvoz zeminy pro 1 den	14 dní	22.9. 10	12.10. 10	21	22	10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
21		Zřízení jednostranného bednění pro	3 dní	13.10. 10	15.10. 10	20	23	11_Podbetonování základů
22		Podbetonování základů vsucí dne	2 dní	18.10. 10	19.10. 10	23FS+2 dny	24	11_Podbetonování základů
23		Odstranění jednostranného bednění pro	2 dní	20.10. 10	21.10. 10	24,41	25	11_Podbetonování základů
24		Hloubení a odvoz zeminy pro 1 den	14 dní	22.10. 10	11.11. 10	23	26	10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
25		Zřízení jednostranného bednění pro	3 dní	12.11. 10	16.11. 10	26	27	11_Podbetonování základů
26		Podbetonování základů vsucí dne	2 dní	17.11. 10	18.11. 10	25FS+2 dny	28	11_Podbetonování základů
27		Odstranění jednostranného bednění pro	2 dní	19.11. 10	22.11. 10	28	29	11_Podbetonování základů
28		Hloubení a odvoz zeminy pro 1 den	14 dní	23.11. 10	12.12. 10	27	30	10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
29		Zřízení jednostranného bednění pro	3 dní	13.12. 10	15.12. 10	30	31	11_Podbetonování základů
30		Podbetonování základů vsucí dne	2 dní	16.12. 10	17.12. 10	29FS+2 dny	32	11_Podbetonování základů
31		Odstranění jednostranného bednění pro	2 dní	18.12. 10	19.12. 10	32	33	11_Podbetonování základů
32		Hloubení a odvoz zeminy pro 1 den	14 dní	20.12. 10	10.1. 11	31	34	10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
33		Zřízení jednostranného bednění pro	3 dní	11.1. 11	13.1. 11	34	35	11_Podbetonování základů
34		Podbetonování základů vsucí dne	2 dní	14.1. 11	17.1. 11	33FS+2 dny	36	11_Podbetonování základů
35		Odstranění jednostranného bednění pro	2 dní	18.1. 11	19.1. 11	36	37	11_Podbetonování základů
36		Vytyčení betonáží pro výstavbu v 1.	1 den	19.1. 11	19.1. 11	37	38	2_Geodet
37		Hloubení a odvoz zeminy kc 2 dny	2 dní	20.1. 11	21.1. 11	38	39	10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
38		Provedení zednického kc 1 den	2 dní	22.1. 11	23.1. 11	39,56	40	12_Provedení zednického kc studní
39		Čerpání podzemní vody	148 dní	25.1. 10	21.1. 11	78		12_Provedení zednického kc studní
40		**Zemní práce**	**20 dní**	**21.6. 10**	**16.7. 10**			
41		Demolice přípravy, zděny a pod 27 dnů		21.6. 10	16.7. 10	42		13_Demolice/ pouze
42		Vytyčení výkopů základů pro 1 den		21.6. 10	21.6. 10	41		2_Geodet
43		Hloubení a odvoz zeminy kc 5 dny		22.6. 10	28.6. 10	42		10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
44		Zřízení jednostranného bednění pro		29.6. 10	29.6. 10	43		11_Podbetonování základů
45		Podsypání podbetonování základů	1 den	2.7. 10	2.7. 10	46FS+1 den		11_Podbetonování základů
46		Odstranění jednostranného bednění	1 den	4.7. 10	5.7. 10	45,47		11_Podbetonování základů
47		Hloubení a odvoz zeminy kc 5 dny		6.7. 10	12.7. 10	46		10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
48		Zřízení jednostranného bednění pro		13.7. 10	13.7. 10	49		11_Podbetonování základů
49		Podsypání podbetonování základů	1 den	15.7. 10	15.7. 10	50FS+1 den		11_Podbetonování základů
50		Odstranění jednostranného bednění	1 den	17.7. 10	17.7. 10	49,51		11_Podbetonování základů
51		Provedení hydroizolace (doporučení	3 dní	18.7. 10	18.7. 10	50		10_Hloubení a odvoz zeminy (ručně a pod) pro základy
52		**TE 01 - ZÁKLADY**	**154 dní**	**19.6. 10**	**20.1. 11**			
53		Výstavba zařízení staveniště pro tvrdou	1 den	19.6. 10	19.6. 10	54		3_Stroj / zednické zařízení staveniště
54		Vytýčení betonáží základů	1 den	20.6. 10	20.6. 10	53		14_Montáž / demontáž zesuvného přístřeší a výstavba
55		**Polyfunkční dům**	**145 dní**	**21.6. 10**	**20.1. 11**			
56		Uložení zemnících pásků pro 1 den		21.6. 10	21.6. 10	57		7_Přípravky / přípravky elektro
57		Zřízení bednění a betonáž pro 1 den		26.6. 10	26.6. 10	56%C14	58FS+1 týden	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
58		Odstranění bednění podkladní desk		28.6. 10	28.6. 10	57FS+1 týden	59	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
59		Zřízení bednění a betonáž pro 1 den		12.7. 10	12.7. 10	58FS+2 týdny	60	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
60		Zřízení bednění a betonáž pro 1 den		13.7. 10	13.7. 10	59	61	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
61		Odstranění bednění schránek betonáž		16.7. 10	16.7. 10	60FS+1 den	62	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
62		Zřízení bednění, armování a betonáž		17.7. 10	18.7. 10	61	63	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
63		Odstranění bednění základníc desek		20.7. 10	20.7. 10	62FS+1 den	64	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
64		Zřízení bednění, armování a betonáž		23.7. 10	24.7. 10	63FS+1 týden	65%C14	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
65		Odstranění bednění stěn (sací) den		26.7. 10	26.7. 10	64FS+1 týden	66	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
66		Provedení hydroizolace (doporučení	3 dní	27.7. 10	29.7. 10	65FS+1 den	67	16_Hydroizolace a tepelná izolace
67		Provedení hydroizolace (doporučení	2 dní	2.8. 10	3.8. 10	66	68	16_Hydroizolace a tepelná izolace
68		Zřízení bednění a betonáž pro 1 den		5.8. 10	5.8. 10	67	69	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
69		Odstranění bednění podkladní desk		6.8. 10	6.8. 10	68FS+1 týden	70	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
70		Montáž dilatace mezi základníc desk		17.8. 10	17.8. 10	69FS+10 dnů	71	16_Hydroizolace a tepelná izolace
71		Provedení hydroizolace pod 2 dny		20.8. 10	24.8. 10	69FS+14 dnů	72	16_Hydroizolace a tepelná izolace
72		Zřízení bednění a betonáž kc1 den		27.8. 10	27.8. 10	71FS+1 týden	73	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
73		Odstranění bednění základníc desek		30.8. 10	30.8. 10	72	74	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
74		Zřízení bednění, armování a betonáž		31.8. 10	31.8. 10	73	75	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
75		Armování základové desky 7 dní		31.8. 10	10.9. 10	74	76	18_Armování
76		Betonáž základové desky 7 dní		11.9. 10	17.9. 10	75%C1 den	77	17_Betonáž
77		Odstranění bednění základníc desk		17.9. 10	17.9. 10	76,86	78	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
78		Demontáž zesuvného přístřeší 2 dny		24.1. 10	26.1. 10	39,95	104	12_Provedení zednického kc studní
79		**Garáž**	**5 dní**	**18.9. 10**	**24.9. 10**			
80		Zřízení bednění podkladní betonové	1 den	18.9. 10	18.9. 10	81		15_Bednění, armování a betonáž desková kc
81		Armování a betonáž 2m pasů	2 dní	19.9. 10	20.9. 10	80	82	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
82		Zřízení bednění a betonáž kc1 den		20.9. 10	20.9. 10	81	83FS+1 týden	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
83		Odstranění bednění nosných 11 dní		24.9. 10	24.9. 10	82FS+1 týden	93	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
84		**TE 02 - HRUBÁ SPODNÍ STAVBA**	**97 dní**	**18.9. 10**	**4.2. 11**			
85		**Polyfunkční dům**	**97 dní**	**18.9. 10**	**4.2. 11**			
86		Montáž tepelné izolace mc1 den		18.9. 10	18.9. 10	87		16_Hydroizolace a tepelná izolace
87		Montáž hydroizolace na tvrdé dny		19.9. 10	19.9. 10	86	88	16_Hydroizolace a tepelná izolace
88		Zřízení bednění nosných 2m dny		19.9. 10	20.9. 10	87	89	15_Bednění
89		Armování nosných 2m stěn 5 dny		1.10. 10	5.10. 10	88	90	18_Armování
90		Zřízení bednění nosných 2m dny		6.10. 10	12.10. 10	89	91	15_Bednění
91		Betonáž nosných 2m stěn 2 dny		13.10. 10	14.10. 10	90%=1	92	17_Betonáž
92		Odstranění bednění a přelití dny		18.10. 10	25.10. 10	91%=1	93	15_Bednění
93		Zřízení bednění 2m stropů dny		26.10. 10	2.11. 10	92	94	15_Bednění
94		Armování 2m stropů 5 dní		3.11. 10	9.11. 10	93	95	18_Armování
95		Betonáž 2m stropu 7 dní		9.11. 10	16.11. 10	94	96%=1 den	17_Betonáž
96		Odstranění bednění a přelití dny		16.11. 10	23.11. 10	95,109FS+1 týden	97,109FS+1 týden	15_Bednění
97		Zřízení bednění 2m schodišť dny		26.11. 10	27.11. 10	96	98	15_Bednění
98		Armování 2m schodišť 7 dní		28.11. 10	6.12. 10	97	99	18_Armování
99		Betonáž 2m schodišť 7 dní		29.11. 10	6.12. 10	98	100%=1 den	17_Betonáž
100		Odstranění a přelití 2m schodišť		7.12. 10	14.12. 10	99	112	15_Bednění
101		Montáž tepelné izolace mc1 den		18.9. 10	18.9. 10	102	103	16_Hydroizolace a tepelná izolace
102		Montáž hydroizolace na tvrdé dny		19.9. 10	19.9. 10	101	104	16_Hydroizolace a tepelná izolace
103		Montáž tepelné izolace mc1 dny		21.9. 10	21.9. 10	101	78	16_Hydroizolace a tepelná izolace
104		Vytýčení bitbourovacího pás dny		21.1. 10	21.1. 10	78	105	8_Provedení bitbour pažení
105		Provedení hutněného zásypu dny		1.2. 10	1.2. 10	104	122	9_Hloubení a odvoz zeminy jámy
106		**TE 03 - HRUBÁ NADZEMNÍ STAVBA**	**239 dní**	**27.11. 10**	**1.8. 11**			
107		**1.NP**	**77 dní**	**27.11. 10**	**15.3. 11**			
108		**Polyfunkční dům**	**77 dní**	**27.11. 10**	**15.3. 11**			
109		Montáž tepelné izolace 7 den		27.11. 10	27.11. 10	110	110	16_Hydroizolace a tepelná izolace
110		Zřízení bednění nosných dny		28.11. 10	1.12. 10	109	111	15_Bednění
111		Armování nosných 2m stěn dny		4.12. 10	11.12. 10	110	112	18_Armování
112		Zřízení bednění nosných dny		12.12. 10	19.12. 10	111,100	113	15_Bednění
113		Betonáž nosných 2m stěn 2 dny		20.12. 10	21.12. 10	112	114%=1 den	17_Betonáž
114		Odstranění bednění nosných dny		31.12. 10	7.1. 11	113%=1 den	115,115	15_Bednění
115		Zřízení bednění průvlaků dny		10.1. 11	17.1. 11	114	116%=1 týden	15_Bednění
116		Armování průvlaků a věnců dny		18.1. 11	21.1. 11	115	117	18_Armování
117		Betonáž průvlaků a věnců 7 den		22.1. 11	28.1. 11	116	118%=1 den	17_Betonáž
118		Odstranění bednění a pilíř dny		29.1. 11	5.2. 11	117%=1 týden	119,119%=1 týden	15_Bednění
119		Zřízení bednění 2m schodišť dny		6.2. 11	7.2. 11	118	120	15_Bednění
120		Armování 2m schodišť 7 dní		8.2. 11	15.2. 11	119	121	18_Armování
121		Betonáž 2m schodišť 7 den		16.2. 11	22.2. 11	120	122%=1 den	17_Betonáž
122		Odstranění a přelepkování 2m		23.2. 11	25.2. 11	121	105	15_Bednění
123		**Garáž**	**44 dní**	**10.1. 11**	**10.3. 11**			
124		Zřízení bednění nosné 2 den		10.1. 11	18.1. 11	151%=2 dny	125	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
125		Armování nosné 2m stěn 2 dny		21.1. 11	24.1. 11	124	126	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
126		Zřízení bednění nosné 2 dny		25.1. 11	26.1. 11	125	127	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
127		Betonáž nosné 2m stěn 2 dny		27.1. 11	28.1. 11	126	128%=1 den	17_Betonáž
128		Odstranění bednění nosné 7 den		29.1. 11	2.2. 11	127%=1 den	129	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
129		Zděné vnitřní stěny z kc+2 dny		29.1. 11	30.1. 11	128	130	20_Zděné
130		Zřízení bednění 2m pro kc+2 dny		31.1. 11	4.2. 11	129	131	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
131		Armování 2m průvlaku a věnců		5.2. 11	9.2. 11	132	133	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
132		Betonáž 2m průvlaků a 1 den		7.2. 11	7.2. 11	131	134%=1 den	17_Betonáž
133		Odstranění bednění a pilíř dny		14.2. 11	15.2. 11	132%=1 den	134	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
134		Zřízení bednění 2m schodišť dny		16.2. 11	17.2. 11	133,133	135	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
135		Uložení ztraceného pareté 2m		21.2. 11	21.2. 11	134	136	21_Izolace SPRÁVA, pareté
136		Zřízení bednění atiky z 1 den		22.2. 11	22.2. 11	135	137	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
137		Armování atiky (120kg/7 den		23.2. 11	24.2. 11	136	138	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
138		Betonáž atiky z 1 den		25.2. 11	25.2. 11	137	139	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
139		Betonáž atiky beton C25/ den		28.2. 11	28.2. 11	138	140%=1 den	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
140		Odstranění bednění atiky 1 den		28.2. 11	28.2. 11	139	141%=1 den	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
141		**2.NP**	**77 dní**	**16.3. 11**	**1.7. 11**			
142		**Polyfunkční dům**	**77 dní**	**16.3. 11**	**1.7. 11**			
143		Montáž tepelné izolace 7 den		16.3. 11	16.3. 11	144	144	16_Hydroizolace a tepelná izolace
144		Zděné nosných stěn z kc4 dny		1.2. 10	5.2. 10	143	145	20_Zděné
145		Zřízení bednění nosných dny		11.2. 10	12.2. 10	144	146	15_Bednění
146		Armování nosných 2m kc4 dny		13.2. 10	18.2. 10	145	147	18_Armování
147		Zřízení bednění nosných 2m dny		19.2. 10	20.2. 10	146	148,132	15_Bednění
148		Betonáž nosných 2m stěn dnes		21.2. 10	21.2. 10	147	149%=1 den	17_Betonáž
149		Odstranění bednění nosné dny		25.2. 10	26.2. 10	148%=1 den	150	15_Bednění
150		Zřízení bednění průvlaků 7 dny		27.2. 10	1.3. 10	149	151	15_Bednění
151		Armování průvlaků, bakírů dny		8.3. 10	14.3. 10	150	152	18_Armování
152		Betonáž průvlaků, bakírů 7 den		15.3. 10	15.3. 10	151	153%=1 den	17_Betonáž
153		Odstranění bednění a pilíř dny		22.3. 10	1.4. 10	152%=1 den	154,160%=1 den	15_Bednění
154		Zřízení bednění 2m schodišť dny		2.4. 10	5.4. 10	153	155,175	15_Bednění
155		Armování 2m schodišť 7 den		6.4. 10	14.4. 10	154	156	18_Armování
156		Betonáž 2m schodišť 7 den		5.4. 10	5.4. 10	155	157%=1 den	17_Betonáž
157		Odstranění a přelepkování 7 den		6.4. 10	6.4. 10	156%=1 den	164	15_Bednění
158		**3.NP**	**69 dní**	**26.5. 10**	**31.1. 11**			
159		**Polyfunkční dům**	**69 dní**	**26.5. 10**	**31.1. 11**			
160		Montáž tepelné izolace 7 den		26.5. 10	26.5. 10	161%=2 dny	161	16_Hydroizolace a tepelná izolace
161		Zděné nosných stěn z kc4 dny		1.3. 10	5.3. 10	160	162	20_Zděné
162		Zřízení bednění nosných7 den		6.3. 10	8.3. 10	161,175	163	15_Bednění
163		Armování nosných 2m kc2 dny		9.4. 10	10.4. 10	162	164	18_Armování
164		Zřízení bednění nosných 2m dny		11.4. 10	11.4. 10	163,157	165	15_Bednění
165		Betonáž nosných 2m dnes		12.4. 10	12.4. 10	164	166%=1 den	17_Betonáž
166		Odstranění bednění nosné7 den		13.4. 10	19.4. 10	165%=1 den	167	15_Bednění
167		Zřízení bednění průvlaků dny		17.4. 10	18.4. 10	166	168	15_Bednění
168		Armování průvlaků, bakírů dny		19.4. 10	22.4. 10	167	169	18_Armování
169		Betonáž průvlaků, bakírů 7den		5.5. 10	5.5. 10	168	170%=1 den	17_Betonáž
170		Odstranění bednění a pilíř dny		13.5. 10	23.5. 10	169%=1 den	171,178%=1 den	15_Bednění
171		Zřízení bednění 2m schodišť dny		22.5. 10	23.5. 10	170	172	15_Bednění
172		Armování 2m schodišť 7 den		24.5. 10	24.5. 10	171	173	18_Armování
173		Betonáž 2m schodišť 7 den		27.5. 10	27.5. 10	172	174%=1 den	17_Betonáž
174		Odstranění a přelepkování 7 den		31.5. 10	31.5. 10	173%=1 den	184	15_Bednění
175		Odstranění stropu, - bednění	5 dní	31.5. 10	4.6. 10	162	176	15_Bednění
176		**4.NP**	**69 dní**	**15.6. 10**	**17.9. 10**			
177		**Polyfunkční dům**	**69 dní**	**15.6. 10**	**17.9. 10**			
178		Montáž tepelné izolace 7 den		15.6. 10	15.6. 10	179%=2 dny	179	16_Hydroizolace a tepelná izolace
179		Zděné nosných stěn z kc7 dny		16.6. 10	24.6. 10	178	180	20_Zděné
180		Zřízení bednění nosných7 den		27.6. 10	27.6. 10	179	181,193	15_Bednění
181		Armování nosných 2m kc2 dny		28.6. 10	29.6. 10	180	182	18_Armování
182		Zřízení bednění nosných 2m dny		30.6. 10	1.7. 10	181,193	183	15_Bednění
183		Betonáž nosných 2m stěn dnes		5.7. 10	5.7. 10	182	184%=1 den	17_Betonáž
184		Odstranění bednění nosné den		6.7. 10	7.7. 10	183%=1 den	185	15_Bednění
185		Zřízení bednění průvlaků dny		8.7. 10	12.7. 10	184	186	15_Bednění
186		Armování průvlaků, bakírů dny		14.7. 10	15.7. 10	185	187	18_Armování
187		Betonáž průvlaků, bakírů 7den		21.7. 10	21.7. 10	186	188%=1 den	17_Betonáž
188		Odstranění bednění a pilíř dny		28.7. 10	3.7. 10	187%=1 den	189,190%=1 den	15_Bednění
189		Zřízení bednění 2m schodišť dny		4.8. 10	5.8. 10	188	191,211	15_Bednění
190		Armování 2m schodišť 7 den		11.7. 10	11.7. 10	188	192	18_Armování
191		Betonáž 2m schodišť 7 den		12.7. 10	12.7. 10	190	193%=1 den	17_Betonáž
192		Odstranění a přelepkování 7 den		17.7. 10	17.7. 10	191%=1 den	200	15_Bednění
193		Odstranění průvlaků, 2 dny		28.5. 10	29.5. 10	182	194	15_Bednění
194		**5.NP**	**46 dní**	**2.7. 10**	**3.9. 10**			
195		**Polyfunkční dům**	**46 dní**	**2.7. 10**	**3.9. 10**			
196		Montáž tepelné izolace 7 den		2.7. 10	2.7. 10	197	197	16_Hydroizolace a tepelná izolace
197		Zděné nosných stěn z kc4 dny		5.7. 10	12.7. 10	196	198	20_Zděné
198		Zřízení bednění nosných7 den		16.7. 10	16.7. 10	197,211	199	15_Bednění
199		Armování nosných 2m kc2 dny		17.7. 10	18.7. 10	198	200	18_Armování
200		Zřízení bednění nosných7 den		19.7. 10	19.7. 10	199,192	201	15_Bednění
201		Betonáž nosných 2m stěn dnes		22.7. 10	22.7. 10	200	202%=1 den	17_Betonáž
202		Odstranění bednění nosné den		24.7. 10	24.7. 10	201%=1 den	203	15_Bednění
203		Zřízení bednění průvlaků dny		26.7. 10	29.7. 10	202	204	15_Bednění
204		Armování průvlaků a věnců dny		2.8. 10	7.8. 10	203	205	18_Armování
205		Betonáž průvlaků a věnců den		8.8. 10	8.8. 10	204	206%=1 den	17_Betonáž
206		Odstranění bednění a pilíř dny		15.8. 10	22.8. 10	205%=1 den	207,214%=1 den	15_Bednění
207		Zřízení bednění 2m schoz dny		23.8. 10	26.8. 10	206	208	15_Bednění
208		Armování 2m schodišť 7 den		27.8. 10	3.9. 10	207	209	18_Armování
209		Betonáž 2m schodišť 7 den		24.8. 10	24.8. 10	208	210%=1 den	17_Betonáž
210		Odstranění a přelepkování 7 den		3.9. 10	3.9. 10	209%=1 den	215%=1 den	15_Bednění
211		Odstranění průvlaků, 2 dny		11.7. 10	12.7. 10	198	194	15_Bednění
212		**6.NP**	**55 dní**	**19.8. 10**	**1.11. 10**			
213		**Polyfunkční dům**	**55 dní**	**19.8. 10**	**1.11. 10**			
214		Montáž tepelné izolace 7 den		19.8. 10	19.8. 10	206%=2 dny	215	16_Hydroizolace a tepelná izolace
215		Zděné nosných stěn z kc4 dny		2.8. 10	9.8. 10	214	216	20_Zděné
216		Zřízení bednění nosných7 den		27.8. 10	27.8. 10	215,215	217	15_Bednění
217		Armování nosných 2m kc2 dny		28.8. 10	29.8. 10	216	218	18_Armování
218		Zřízení bednění nosných2 dny		30.8. 10	2.9. 10	217,235	219	15_Bednění
219		Betonáž nosných 2m stěn den		3.9. 10	3.9. 10	218	220%=1 den	17_Betonáž
220		Odstranění bednění nosné den		5.9. 10	5.9. 10	219%=1 den	221	15_Bednění
221		Zřízení bednění stropu 3 dny		6.9. 10	10.9. 10	220,219%=2 dny	222,239	15_Bednění
222		Armování stropu 5 dní		13.9. 10	17.9. 10	221	223,239FF	18_Armování
223		Betonáž stropu 7 den		20.9. 10	20.9. 10	222	224%=1 den	17_Betonáž
224		Odstranění bednění a p.2 dny		23.9. 10	23.9. 10	223%=1 den	225	15_Bednění
225		Zřízení nosných stěn z kc7 den		26.9. 10	28.9. 10	224	226,242	20_Zděné
226		Zřízení bednění 2b stropu 2 den		27.9. 10	27.9. 10	225	227	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
227		Armování 2b stropu nad 7 den		30.9. 10	30.9. 10	226	228	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
228		Betonáž 2b stropu nad 7 den		1.10. 10	1.10. 10	227	229%=1 den	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
229		Odstranění bednění a p.2 dny		4.10. 10	4.10. 10	228%=1 den	230	15_Bednění, armování a betonáž desková kc
230		Zřízení bednění atiky nad 7 den		5.10. 10	5.10. 10	229	231,236	15_Bednění
231		Armování atiky nad 6 NP 2 dny		10.10. 10	11.10. 10	230	232	18_Armování
232		Zřízení bednění atik nad 7 den		14.10. 10	14.10. 10	231,236	233	15_Bednění
233		Betonáž atik nad 6 NP 1 den		15.10. 10	15.10. 10	232	234%=1 den	17_Betonáž
234		Odstranění bednění atik2 dny		17.10. 10	18.10. 10	233,233%=1 den	238,275	15_Bednění
235		Odstranění průvlaků, 2 dny		28.8. 10	29.8. 10	219	218	15_Bednění
236		Odstranění průvlaků, 2 dny		8.10. 10	11.10. 10	230	237	15_Bednění
237		Odstranění průvlaků, 2 dny		12.10. 10	13.10. 10	236	240	15_Bednění
238		Odstranění stropu 6. 11 den		30.10. 10	19.10. 10	192,228%=18	239	15_Bednění
239		Odstranění bakírů 7 den		13.9. 10	13.9. 10	222	222FF	15_Bednění
240		**TE 04 - ZAŘÍŠENÍ**	**60 dní**	**8.9. 10 - 26.11. 10**				
241		**Polyfunkční dům - nad 3. NP dny**		**27.9. 10**	**7.10. 10**			
242		Montáž parozábrany z asfaltových		27.9. 10	27.9. 10	243		22_Provedení větrání skladby
243		Montáž tepelné izolace mc1 den		28.9. 10	28.9. 10	242,563	244	22_Provedení větrání skladby
244		Montáž hydroizolace ve 1 den		1.10. 10	1.10. 10	243	245	22_Provedení větrání skladby
245		Montáž tepelné izolace ve 1den		2.10. 10	2.10. 10	244	246	22_Provedení větrání skladby
246		Montáž hydroizolace střech 2 dny		3.10. 10	4.10.
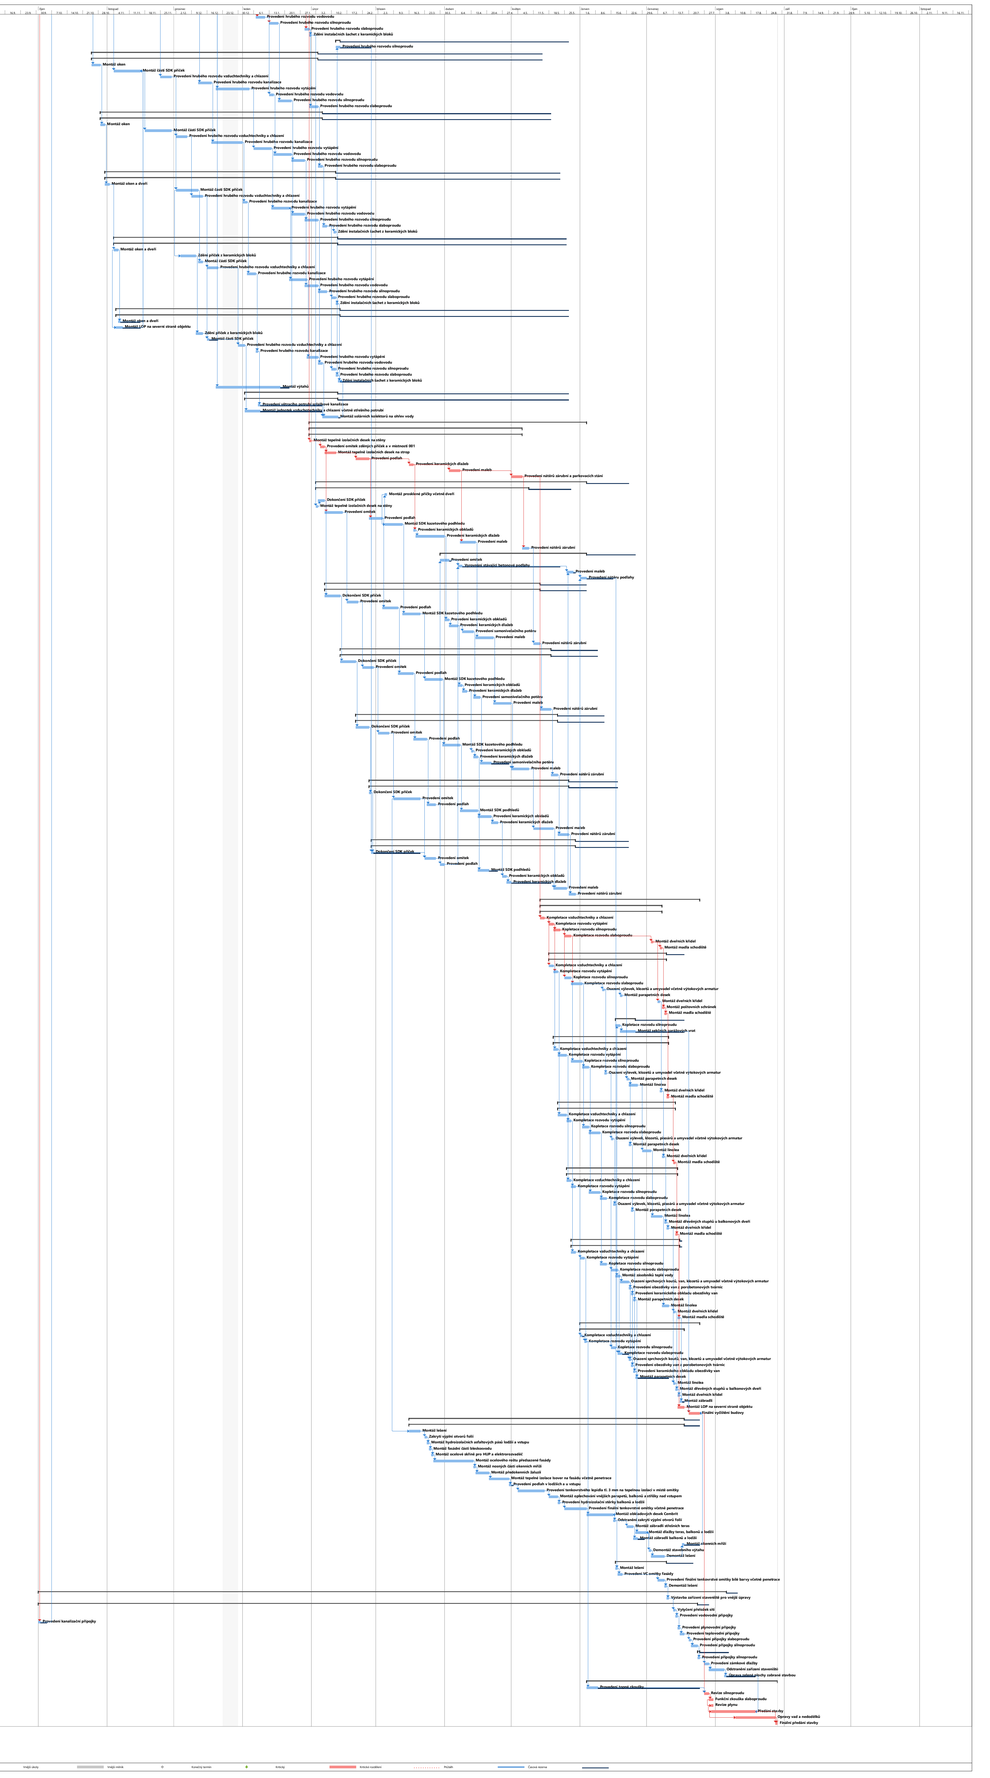
ID		Název Název	Délka	Začátek	Dokončení	Předchůdci	Následníci	Názvy zdrojů
234		Provedení hrubého rozvodu ZTI	5 dny	7.2.20	11.2.20	308	26_Rozvody vnitřního vodovodu	
235		Provedení hrubého rozvodu ÚT	5 dny	13.1.20	16.1.20	304	27_Rozvody ústředního	
236		Provedení hrubého rozvodu ZTI	5 dny	20.1.20	30.1.20	297,309	53_Rozvody tekuté	
237		Zděný instalačních šacht	5 dní	31.1.20	31.1.20	376	20_Zděný	
238		**Omítky**	**10 dní**	**17.2.20**	**28.2.20**			
239		Provedení hrubého rozvodu ZTI	5 dní	17.2.20	21.2.20	434	52_Rozvody vnitřního	
240		**2.NP**	**67 dní**	**25.08.19**	**3.3.20**			
241		**Polykončení dům**	**67 dní**	**25.08.19**	**3.3.20**			
242		Montáž oken	2 dny	25.10.	1028.10.	19;288	29_Montáž oken a dveří	
243		Montáž část SDK příček	3 dny	4.11.	1015.11.	19;290;349;P.2	30_Montáž SDK konstr	
244		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	25.11.	1029.11.	19;291	26_Rozvody VZT	
245		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	2.12.	1012.12.	19;292	27_Rozvody ústředního	
246		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	16.12.	1019.12.	19;293	25_Rozvody vytápění	
247		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	13.1.	20.1.20	14.1.20	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
248		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	17.1.	22.1.20	318	27_Rozvody ústředního	
249		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	31.1.	20.2.20	319	53_Rozvody tekuté	
250		**3.NP**	**67 dní**	**29.05.19**	**5.3.20**			
251		**Polykončení dům**	**67 dní**	**29.05.19**	**5.3.20**			
252		Montáž oken	2 dny	25.10.	1028.10.	19;288	29_Montáž oken a dveří	
253		Montáž část SDK příček	3 dny	4.11.	1015.11.	19;290;349	30_Montáž SDK konstr	
254		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	2.12.	1016.12.	19;304	26_Rozvody VZT	
255		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	18.12.	1021.12.	19;305	25_Rozvody vnitřní kanalizace	
256		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	6.1.	20.1.20	320	25_Rozvody vytápění	
257		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	21.1.	22.1.20	321	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
258		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	23.1.	28.1.20	328	27_Rozvody ústředního	
259		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	29.1.	20.2.20	329	53_Rozvody tekuté	
260		**4.NP**	**67 dní**	**30.05.19**	**11.3.20**			
261		**Polykončení dům**	**67 dní**	**30.05.19**	**11.3.20**			
262		Montáž oken a dveří	2 dny	30.10.	1031.10.	19;332	29_Montáž oken a dveří	
263		Montáž část SDK příček	3 dny	12.11.	1017.11.	19;332	30_Montáž SDK konstr	
264		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	2.12.	1011.12.	19;334	26_Rozvody VZT	
265		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	19.12.	1023.12.	19;335	25_Rozvody vnitřní kanalizace	
266		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	6.1.	20.1.20	336	25_Rozvody vytápění	
267		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	21.1.	22.1.20	337	25_Rozvody vnitřní kanalizace	
268		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	23.1.	28.1.20	338	27_Rozvody ústředního	
269		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	29.1.	20.2.20	339	53_Rozvody tekuté	
270		**5.NP**	**67 dní**	**31.05.19**	**12.3.20**			
271		**Polykončení dům**	**67 dní**	**31.05.19**	**12.3.20**			
272		Montáž oken a dveří	2 dny	31.10.	1.11.19	19;352	29_Montáž oken a dveří	
273		Montáž část SDK příček	3 dny	13.11.	1019.11.	19;352	30_Montáž SDK konstr	
274		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	3.12.	1013.12.	19;354	26_Rozvody VZT	
275		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	20.12.	1024.12.	19;355	25_Rozvody vnitřní kanalizace	
276		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	6.1.	20.1.20	356	25_Rozvody vytápění	
277		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	21.1.	22.1.20	357	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
278		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	23.1.	28.1.20	358	27_Rozvody ústředního	
279		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	29.1.	20.2.20	359	53_Rozvody tekuté	
280		Zděný instalačních šachtách	5 dní	11.2.	20.2.20	374;P.1-1 dní	20_Zděný	
281		**5.NP**	**68 dní**	**5.01.19**	**12.3.20**			
282		**Polykončení dům**	**68 dní**	**5.01.19**	**12.3.20**			
283		Montáž okna a dveří	2 dny	5.11.	19.11.19	1019	29_Montáž okna a dveří	
284		Montáž CDP na severní straně	2 dny	5.11.	19.11.19	1019;P.1-1 pd den	35;P	36_Montáž CDP
285		Zděný příček z keramických	5 dní	20.11.	26.11.19	1020;P.1-1 pd	20_Zděný	20_Zděný
286		Montáž část SDK příček	3 dny	26.12.	1016.12.	1010;1347	349	30_Montáž SDK konstr
287		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	30.12.	19.	1.1.2020;348	360	26_Rozvody VZT
288		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	7.1.20	9.1.2020		359	25_Rozvody vnitřní kanalizace
289		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	30.1.20	5.2.2020		352	25_Rozvody vytápění
290		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	6.2.	11.2.2020	361;351	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
291		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	12.2.	17.2.2020	295	27_Rozvody ústředního	
292		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	18.2.	20.2.2020	353	53_Rozvody tekuté	
293		Zděný instalačních šachtách	5 dní	10.2.	20.2.20	374;P.1-1 pd	20_Zděný	
294		Montáž výtahů	16 dní	20.02.	19.3.2020	326;P	34_Montáž výtahů	
295		**STŘECHA**	**30 dní**	**3.1.20**	**12.2.20**			
296		**Polykončení dům**	**30 dní**	**3.1.20**	**12.2.20**			
297		Montáž parapetní desky	5 dní	3.1.	9.1.2020	361	21_Rozvody vnitřní kanalizace	
298		Montáž pokrývání vodotěsné	5 dní	3.1.	9.1.2020	361	26_Rozvody VZT	
299		Montáž solárních kolektorů	5 dní	3.2.	10.2.2020	355;360	35_Montáž kolektorů	
300		**TE DE.-ZÁMEČNÍK PŘÍPOJEK**	**89 dní**	**30.1.20**	**3.6.20**			
301		**1.PP**	**68 dní**	**30.1.20**	**5.5.20**			
302		**Polykončení dům**	**68 dní**	**30.1.20**	**5.5.20**			
303		Montáž topné soustavy	10 dní	30.1.	20.1.	20;P.1-2 dní	36;P	36_Topná soustava stropní a stěn interiéru
304		Montáž topné soustavy	10 dní	30.1.	20.1.	20;P.1-2 dní	36;P	36_Topná soustava stropní a stěn interiéru
305		Montáž topné soustavy	5 dní	7.2.	11.2.	304	360;P.1-pd dny	36_Topná soustava stropní a stěn interiéru
306		Provedení podlah	4 dny	21.2.	26.2.	2;30;P.1-pd dny	369;P.1-1 dní	37;38;39;Provedení podlah
307		Provedení keramických	2 dny	10.3.	27.3.	2;308;P.1-2 dny	370;P.1-10 pd	39;Obkladu a dlažby
308		Provedení malování	3 dny	3.4.	20.	3.4.2020;P.1-10 pd	371;P.1-10 pd	40;Malby
309		Provedení nátěrů zámečníc	3 dny	5.5.	12.	5.5.2020;P.1-12 pd	372;P.1-10 pd	54;Nátěry
310		**1.NP**	**89 dní**	**3.2.20**	**3.6.20**			
311		**Polykončení dům**	**89 dní**	**3.2.20**	**3.6.20**			
312		Montáž prvoinstal.přípoj	5 dní	5.3.	11.	3.2.2020;P.1-1 pd	375;S	29_Montáž oken a dveří
313		Dokončení SDK příček	3 dny	4.2.	6.2.	2;317;P.	391	33_Montáž SDK konstr
314		Montáž topné soustavy	5 dní	3.2.	7.2.	3;319	375	36_Topná soustava stropní a stěn interiéru
315		Provedení omítek	6 dny	7.2.	14.2.	2;314;P.	392	37_Provedení omítek
316		Provedení podlah	4 dny	21.2.	26.	3.2.2020	374;P.1-1 pd den	38_Provedení podlah
317		Montáž SDK kazetového	5 dní	5.3.	11.	3.2.2020;P.1-1 pd	394	33_Montáž SDK konstr
318		Provedení hrubého rozvodu	3 dny	10.3.	12.	3.2.2020;P.1-1 pd	395	26_Rozvody VZT
319		Provedení keramických	5 dní	10.3.	20.	3.2.2020	395	39_Obkladu a dlažby
320		Provedení malování	5 dní	8.4.	20.	3.4.2020	398	40_Malby
321		Provedení nátěrů zámečníc	3 dny	4.5.	20.	3.5.2020	399	54_Nátěry
322		**Garáž**	**4 dny**	**30.3.20**	**3.4.20**			
323		Provedení omítek	4 dny	30.3.	2.4.	2;4;P.1-pd den	380;P.1-pd den	37_Provedení omítek
324		Vyrovnání nášlapných ploch	2 dny	7.4.20	8.4.2020	323;380;P.1-pd den	383;P.1-pd den	38_Provedení podlah
325		Provedení malování	3 dny	14.4.20	16.4.2020	324;383;P.1-pd den	384;P.1-pd den	40_Malby
326		Provedení nátěrů potrubí	2 dny	14.4.	15.4.2020	324;383;P.1-pd	385;P	54_Nátěry
327		**2.NP**	**69 dní**	**7.2.20**	**13.5.20**			
328		**Polykončení dům**	**69 dní**	**7.2.20**	**13.5.20**			
329		Dokončení SDK příček	5 dny	7.2.	11.2.2020	402	33_Montáž SDK konstr	
330		Provedení omítek	5 dny	17.2.	20.2.2020	403	37_Provedení omítek	
331		Provedení podlah	5 dny	4.3.	20.3.2020	404	38_Provedení podlah	
332		Montáž SDK kazetového	5 dní	5.3.	11.	3.2.2020;P.1-1 pd	405	33_Montáž SDK konstr
333		Provedení keramických	2 dny	1.4.20	2.4.2020	396	39_Obkladu a dlažby	
334		Provedení keramických	2 dny	3.4.	20.	4.4.2020	397;P.1-pd dny	39_Obkladu a dlažby
335		Provedení samonivelační	2 dny	9.4.	20.3.4.2020	397;P.1-pd dny	408	38_Provedení podlah
336		Provedení malování	6 dny	15.4.	22.2.4.2020	409	40_Malby	
337		Provedení nátěrů zámečníc	3 dny	15.5.	20.5.2020	410	54_Nátěry	
338		**TE DT.-DOKONČENÍ PRÁCE**	**12 dní**	**14.5.20**	**28.5.20**			
339		**1.NP**	**10 dní**	**14.5.20**	**7.7.20**			
340		**Polykončení dům**	**10 dní**	**14.5.20**	**7.7.20**			
341		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	14.5.	20.5.	2;372;P.1-pd dny	446;453	26_Rozvody VZT
342		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	18.5.	20.5.2020	447;454	25_Rozvody vytápění	
343		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	18.5.	20.5.2020	448;455	53_Rozvody tekuté	
344		Provedení hrubého rozvodu	2 dny	21.5.	22.5.2020	449;P.1-pd dny	456	53_Rozvody tekuté
345		Montáž dveřních křídel	1 den	5.7.	20.	5.7.2020;P.1-pd den	459;P.1-den	41_Truhlářské práce
346		Montáž madla schodišť	1 den	7.7.	20.	7.7.2020;P.1-den	460	42_Zámečnické práce
347		**1NP**	**10 dní**	**18.5.20**	**5.7.20**			
348		**Polykončení dům**	**10 dní**	**18.5.20**	**5.7.20**			
349		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	18.5.	20.5.	2;465	467	26_Rozvody VZT
350		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	18.5.	20.5.2020	2;466	468	25_Rozvody vytápění
351		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	21.5.	22.5.2020	469	27_Rozvody ústředního	
352		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	28.5.	29.	1.6.2020	470;P.1-pd dny	53_Rozvody tekuté	
353		Osazení výplně, kloubů	1 den	11.6.	22.1.6.2020	471;P.1-pd dny	472	24_Rozvody vnitřního vodovodu
354		Montáž parapetních desk	1 den	19.6.	20.1.6.2020	472;P.1-pd dny	473	41_Truhlářské práce
355		Montáž dveřních křídel	1 den	5.7.	20.	5.7.2020	474	41_Truhlářské práce
356		Montáž podlovních lišt	1 den	6.7.20	6.7.2020		461	42_Zámečnické práce
357		Montáž madla schodišť	1 den	7.7.	20.	7.7.2020	475	42_Zámečnické práce
358		**Garáž**	**7 dní**	**17.6.20**	**25.6.20**			
359		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	17.6.	20.1.6.2020	464	27_Rozvody ústředního	
360		Montáž sektorů garáží	5 dní	19.6.	20.6.2020	528	43_Montáž garážových vrat	
361		**2.NP**	**39 dní**	**20.5.20**	**10.7.20**			
362		**Polykončení dům**	**39 dní**	**20.5.20**	**10.7.20**			
363		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	20.5.	22.5.	2;465	476	26_Rozvody VZT
364		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	20.5.	22.5.2020	2;466	477	25_Rozvody vytápění
365		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	26.5.	28.	1.6.2020	480	27_Rozvody ústředního
366		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	2.6.	20.	4.6.2020	481	53_Rozvody tekuté
367		Osazení výplně, kloubů	1 den	12.6.	22.1.6.2020	482	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
368		Montáž parapetních desk	1 den	22.6.	22.1.6.2020	473;483	41_Truhlářské práce	
369		Montáž linoleu	4 dny	23.6.	20.6.2020	484	44_Montáž nášlapných vrstev podlah	
370		Montáž dveřních křídel	1 den	7.7.20	7.7.2020	485	41_Truhlářské práce	
371		Montáž madla schodišť	1 den	7.7.	20.	7.7.2020	486	42_Zámečnické práce
372		**3.NP**	**37 dní**	**22.5.20**	**13.7.20**			
373		**Polykončení dům**	**37 dní**	**22.5.20**	**13.7.20**			
374		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	22.5.	25.5.	2;465	489	26_Rozvody VZT
375		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	26.5.	27.5.2020	2;466	490	25_Rozvody vytápění
376		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	2.6.	20.	4.6.2020	491	27_Rozvody ústředního
377		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	5.6.	20.	9.6.2020	492	53_Rozvody tekuté
378		Osazení výplně, kloubů	1 den	12.6.	22.1.6.2020	493	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
379		Montáž parapetních desk	1 den	22.6.	22.1.6.2020	494	41_Truhlářské práce	
380		Montáž linoleu	4 dny	29.6.	22.	2.7.2020	495	44_Montáž nášlapných vrstev podlah
381		Montáž dveřních křídel	1 den	8.7.20	8.7.2020	496	41_Truhlářské práce	
382		Montáž madla schodišť	1 den	13.7.	20.	13.7.2020	498	42_Zámečnické práce
383		**4.NP**	**38 dní**	**25.5.20**	**16.7.20**			
384		**Polykončení dům**	**38 dní**	**25.5.20**	**16.7.20**			
385		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	25.5.	27.5.	2;465	503	26_Rozvody VZT
386		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	28.5.	29.5.2020	2;466	504	25_Rozvody vytápění
387		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	2.6.	20.	4.6.2020	505	27_Rozvody ústředního
388		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	8.6.	20.	11.6.2020	506	53_Rozvody tekuté
389		Osazení výplně, kloubů	1 den	16.6.	22.1.6.2020	507	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
390		Montáž parapetních desk	1 den	22.6.	22.1.6.2020	508	41_Truhlářské práce	
391		Montáž linoleu	4 dny	29.6.	20.	2.7.2020	509	44_Montáž nášlapných vrstev podlah
392		Montáž dřevěných stupňů	1 den	14.7.	20.	14.7.2020	511	41_Truhlářské práce
393		Montáž dveřních křídel	1 den	15.7.	20.	15.7.2020	524	41_Truhlářské práce
394		Montáž madla schodišť	1 den	15.7.	20.	15.7.2020	526	42_Zámečnické práce
395		**6.NP**	**38 dní**	**1.6.20**	**22.7.20**			
396		**Polykončení dům**	**38 dní**	**1.6.20**	**22.7.20**			
397		Kompletace vzduchotechniky	2 dny	1.6.	3.	2;465	515	26_Rozvody VZT
398		Kompletace rozvodu vytápění	2 dny	1.6.	2.	1.6.2020;515	517;534	25_Rozvody vytápění
399		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	15.6.	22.	16.6.2020;516	518;463	27_Rozvody ústředního
400		Kompletace rozvodu ZTI	2 dny	18.6.	20.	18.6.2020;517	519	53_Rozvody tekuté
401		Osazení výplně, kloubů	1 den	23.6.	23.1.6.2020;518	520	24_Rozvody vnitřního vodovodu	
402		Provedení obezdívky vany	1 den	24.6.	24.6.2020;519	521	45_Obezdívka vany	
403		Provedení keramického	1 den	25.6.	25.6.2020;520	522;548	39_Obkladu a dlažby	
404		Montáž dřevěných stupňů	1 den	14.7.	20.	14.7.2020;521	523	41_Truhlářské práce
405		Montáž linoleu	1 den	15.7.	20.	15.7.2020;522	524	44_Montáž nášlapných vrstev podlah
406		Montáž zábradlí	1 den	16.7.	20.	16.7.2020;523	525	41_Truhlářské práce
407		Montáž madla schodišť	1 den	16.7.	20.	16.7.2020;525	528	42_Zámečnické práce
408		Montáž LDP na severní	2 dny	15.7.	20.	17.7.2020	528	36_Montáž LDP
409		Finální vyčištění budovy	1 den	20.7.	20.	20.7.2020;546;528;550;575		46_Vyčištění objektu
410		**TE DT.-DOKONČENÍ PRÁCE**	**10 dní**	**16.6.20**	**29.7.20**			
411		**Polykončení dům**	**10 dní**	**16.6.20**	**17.7.20**			
412		Montáž telení	5 dní	16.6.	20.	20.6.2020;5-pd dny	532	47_Montáž / demontáž lešení
413		Zakrytí vnitřní otvorů fólí	1 den	23.6.	23.1.6.2020	533	48_Provedení KZS	
414		Montáž hydroizolačních ve	2 dny	24.6.	25.1.6.2020	534	16_Hydroizolace a tepelná izolace	
415		Montáž bazénu část bílá	2 dny	25.6.	26.6.2020	535	28_Montáž bazénového	
416		Montáž ocelové lešťové pod	1 den	26.6.	26.6.2020	536	48_Provedení KZS	
417		Provedení hrubého rozvodu	1 den	26.6.	26.6.2020	537	48_Provedení KZS	
418		Montáž nosných částí obvod	1 den	14.6.	20.	14.6.2020	538	49_Montáž plotové	
419		Montáž plotové	1 den	15.6.	20.	15.6.2020	539	49_Montáž plotové	
420		Montáž topné izolace	1 den	15.6.	20.	15.6.2020	540	48_Provedení KZS	
421		Provedení podlah v bažénu	1 den	30.6.	20.	30.6.2020	543;P.1-pd den	38_Provedení podlah	
422		Provedení tepelnoizolačního	1 dny	6.7.	20.	7.7.2020;P.1-1 pd den	542	48_Provedení KZS	
423		Montáž opakovaně vnější	1 dny	16.7.	20.	17.7.2020	541	31_Kompletní prací	
424		Provedení hydroizolačních	2 dny	20.6.	21.6.2020	534;P.1-pd dny	545	16_Hydroizolace a tepelná izolace	
425		Provedení finální tenkovrstvé	2 dny	21.7.	22.	14.2020;P.1-1 pd den	545	48_Provedení KZS	
426		Montáž obkládových desek	2 dny	4.6.	20.	5.6.2020;SBRF	546	48_Provedení KZS	
427		Odstranění zakrytí vnitřní	1 den	30.6.	20.	30.6.2020	547;P.1-pd dny;546	48_Provedení KZS	
428		Montáž zábradlí atrikách	3 dny	22.6.	24.	2.6.2020;P.1-1 pd dny	549	42_Zámečnické práce	
429		Montáž dlažby teras, balkó	3 dny	26.6.	30.6.2020	2;512;548;P.1-den	550;P.1-pd den	39_Obkladu a dlažby	
430		Montáž zábradlí balkonu až	3 dny	25.6.	26.6.2020	548;P.1-den	552	42_Zámečnické práce	
431		Montáž dveřních křídel	1 den	7.7.20	7.7.2020	549;P.1-den	553	41_Truhlářské práce	
432		Demontáž stavebního výtah	1 den	27.6.	27.1.6.2020	5-pd den;P.1-pd den	554	14_Montáž / demontáž stavebního jeřábu a výtahu	
433		Demontáž lešení	4 dny	3.7.20	8.7.2020	550;P.1-den	555;P.1-den;P.1-pd	47_Montáž / demontáž lešení	
434		**Garáž**	**17 dní**	**17.6.20**	**9.7.20**			
435		Montáž lešení	1 den	17.6.	23.1.6.2020	5;5	47_Montáž / demontáž lešení	
436		Provedení tenkovrstvé fasády	2 dny	18.6.	20.	19.6.2020	556;P.1-pd dny	48_Provedení KZS
437		Provedení finální tenkovrstvé	2 dny	22.6.	23.	23.6.2020;P.1-1 pd den	557	48_Provedení KZS
438		Demontáž lešení	1 den	9.7.20	9.7.2020	559	47_Montáž / demontáž lešení	
439		**TE DI -VNĚJŠÍ ÚPRAVY**	**37 dní**	**1.08.19**	**1.6.20**			
440		Výstavba zařízení staveniště	1 den	10.7.20	10.7.2020	561	1_Zřízení / odstranění zařízení staveniště	
441		**Přípojky eIS - Přeložkám LDS dny**	**1 dny**	**1.08.19**	**10.7.20**			
442		Výtyčení přeložek eIS	1 den	10.7.20	10.7.2020	562	2_Geodet	
443		Provedení kanalizační přípo	1 den	1.08.19	1.8.2019	1;563	4_Přípojky / přeložky vodovodu a kanalizac	
444		Provedení kanalizační přípo	1 den	1.08.19	1.8.2019	1;563	4_Přípojky / přeložky vodovodu a kanalizac	
445		Provedení plynovodní přípo	1 den	10.7.20	10.7.2020	565	5_Přípojky / přeložky plynovodu	
446		Provedení teplovodní přípo	1 den	10.7.20	10.7.2020	566	6_Přípojky / přeložky teplovodu	
447		Provedení přípojky elektro	1 den	20.7.20	20.7.2020	567	7_Přípojky / přeložky elektro	
448		Provedení přípojky slaboprú	1 den	21.7.20	21.7.2020	568	7_Přípojky / přeložky elektro	
449		**Přípojky eIS - Garáž**	**1 den**	**24.7.20**	**24.7.20**			
450		Provedení přípojky elektro	1 den	24.7.20	24.7.2020	570	7_Přípojky / přeložky elektro	
451		Provedení zámkové dlažby	2 dny	27.7.20	28.7.2020	573	50_Provedení kopané dlažby	
452		Odstranění zařízení staveniště	1 den	29.7.20	29.7.2020	572	1_Zřízení / odstranění zařízení staveniště	
453		Úprava zelené plochy zděné	1 den	5.8.20	5.8.2020	574;P	52_Zahradnické práce	
454		**TE DI -PŘÍJMKA**	**62 dny**	**4.6.20**	**28.8.20**			
455		Provedení topné zkoušky	2 dny	4.6.20	5.6.2020	575	50_Provedení topné zkoušky	
456		Revize elektroprovodu	2 dny	27.7.20	28.7.2020	574	7_Přípojky / přeložky elektro	
457		Provedení zkoušky dešťovým	1 den	27.8.20	27.8.2020	578;P.1-pd den	50_Provedení topné zkoušky	
458		Revize plynu	1 den	30.7.20	30.7.2020	577;P.1-pd den	5_Přípojky / přeložky plynovodu	
459		Předání zásuvky	14 dny	30.7.20	18.8.2020	577;P.1-1 dní	579;P.1-dní	1_Stavbyvedoucí
460		Opravy vad a nedodělků	14 dny	10.8.20	27.8.2020	579;P.1-1 dní	580	1_Stavbyvedoucí
461		Finální předání stavby	1 den	28.8.20	28.8.2020	579;580		1_Stavbyvedoucí
