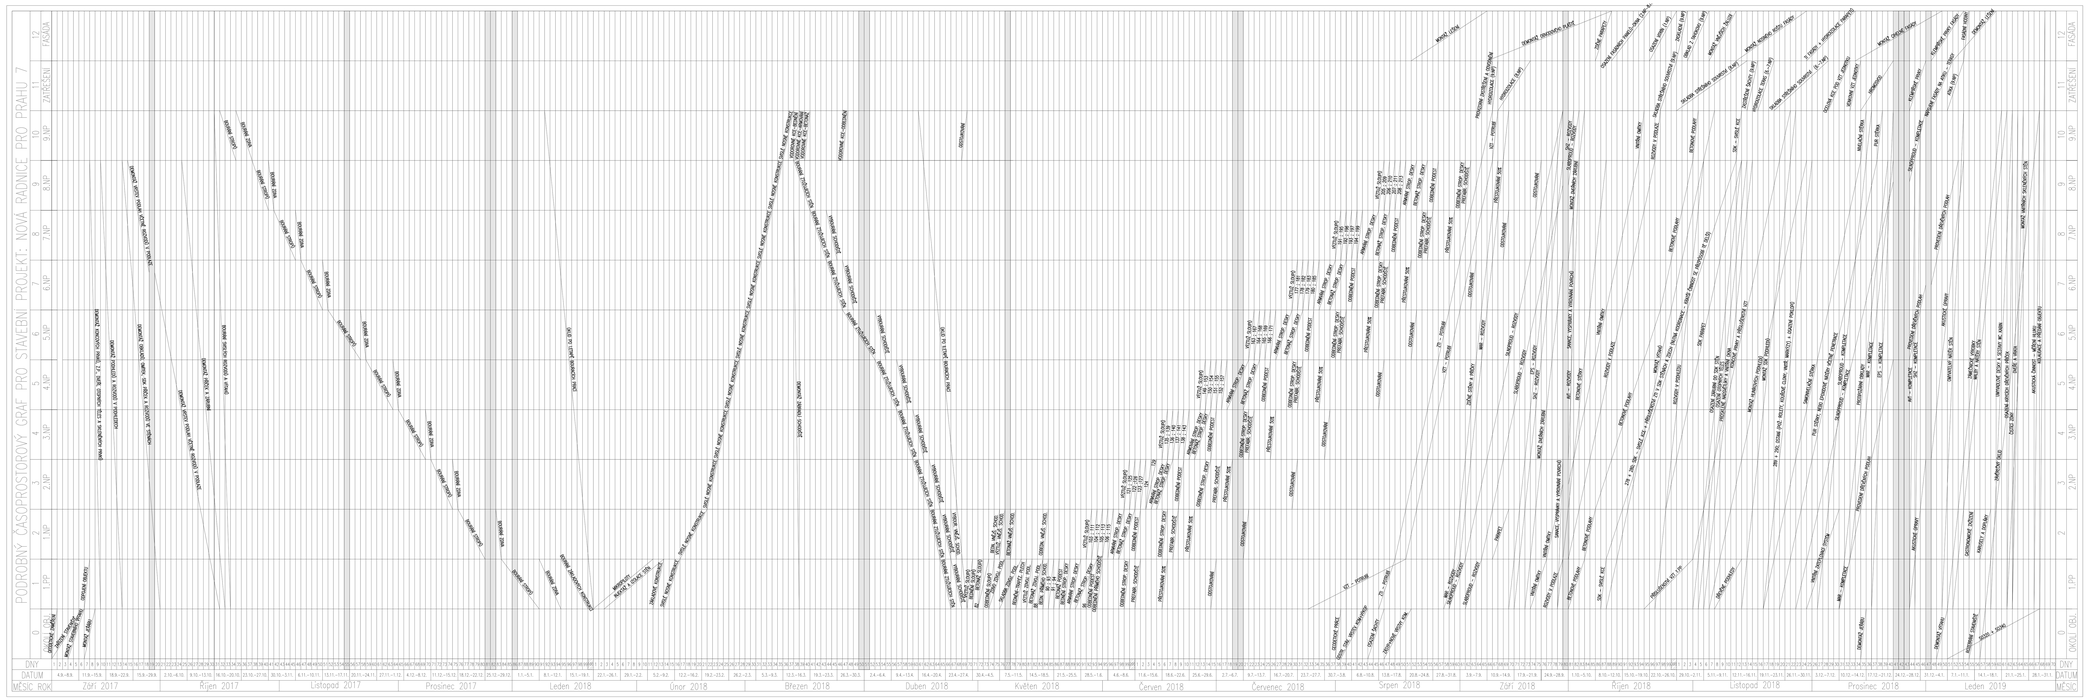

LEGENDA:
(PŘEKRÝVAJÍCÍSE A NEČITELNÉ NÁZVY ČINNOSTÍ BYLY NAHRAZENY JEJICH POŘADOVÝMI ČÍSLY Z TECHNOLOGICÉHO NORMÁLU)

1.PP
82 – HYDROIZ. POD NOSNÉ ST.
88 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
90 – VÝZTUŽ PŘÍMÉHO SCHOD.
93 – BEDNĚNÍ PODEST
91 – BETON. PŘÍMÉHO SCHOD.
94 – VÝZTUŽ PODEST
96 – ODBEDN. PŘÍMÉHO SCHOD.

1.NP
111 – BEDNĚNÍ PODEST
103 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
112 – VÝZTUŽ PODEST
104 – BETONAŽ SLOUPŮ
113 – BETONAŽ PODEST
105 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
106 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
115 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

2.NP
125 – BEDNĚNÍ PODEST
121 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
126 – VÝZTUŽ PODEST
122 – BETONAŽ SLOUPŮ
127 – BETONAŽ PODEST
133 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
124 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
129 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

3.NP
139 – BEDNĚNÍ PODEST
135 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
140 – VÝZTUŽ PODEST
136 – BETONAŽ SLOUPŮ
141 – BETONAŽ PODEST
137 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
138 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
143 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

4.NP
153 – BEDNĚNÍ PODEST
149 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
154 – VÝZTUŽ PODEST
150 – BETONAŽ SLOUPŮ
155 – BETONAŽ PODEST
151 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
152 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
157 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

5.NP
167 – BEDNĚNÍ PODEST
163 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
168 – VÝZTUŽ PODEST
164 – BETONAŽ SLOUPŮ
169 – BETONAŽ PODEST
165 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
166 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
171 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

6.NP
181 – BEDNĚNÍ PODEST
177 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
182 – VÝZTUŽ PODEST
178 – BETONAŽ SLOUPŮ
113 – BETONAŽ PODEST
179 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
180 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
185 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

7.NP
195 – BEDNĚNÍ PODEST
191 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
196 – VÝZTUŽ PODEST
192 – BETONAŽ SLOUPŮ
197 – BETONAŽ PODEST
193 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
194 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
199 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

8.NP
209 – BEDNĚNÍ PODEST
205 – BEDNĚNÍ SLOUPŮ
210 – VÝZTUŽ PODEST
206 – BETONAŽ SLOUPŮ
211 – BETONAŽ PODEST
207 – ODBEDNĚNÍ SLOUPŮ
208 – OSAZ. OCEL. PRVKŮ
213 – BEDNĚNÍ STROP. DESKY

GRAFICKÉ ZNAČKY NA ČASOVÉ OSE:

SVÁTEK – NEPROBÍHAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE – ČINNOSTI PROBÍHAJÍCÍ POUZE V JEDNÉ T.E. A KŘÍŽÍCÍ V ČPG SVÁTEK JSOU O PATŘIČNÝ POČET DNI PRODLOUŽENY
– ČÁRA ČINNOSTI KTERÉ PROBÍHAJÍ VE VÍCE NEŽ JEDNÉ T.E. JE V DEN SVÁTKU PŘERUŠENA

DEN S POŘADOVÝM ČÍSLEM KTERÉ JE NÁSOBKEM STA – PRO LEPŠÍ ORIENTACI NA ČASOVÉ OSE

ETAPOVÉ PROCESY:
0 – PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE
1 – BOURACÍ PRÁCE – STATIKA
2 – NOSNÉ KONSTRUKCE
3 – ZEMNÍ PRÁCE (Pouze pro kanalizační šachtu)
4 – ZASTŘEŠENÍ
5 – PROV. PŘÍČEK A ROZVODŮ INSTALACÍ
6 – PROV. OMÍTEK A PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAH
7 – PROV. PODLAH, KOMPL. POVRCHŮ A TECHNOLOGIE
8 – KOMPL. TECH. ZAŘÍZENÍ, DOK. PRÁCE A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
9 – FASÁDNÍ PRÁCE
10 – KOLAUDACE A PŘEJÍMKA STAVBY

SMĚR ETAPOVÉHO PROCESU:
HORIZONTÁLNÍ / HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNÍ
HORIZONTÁLNÍ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ

PROSTOROVÉ ÚSEKY:
PÚ 0 – OKOLÍ OBJEKTU
PÚ 1 – SPODNÍ STAVBA (1.PP)
PÚ 2 – 1.NP
PÚ 3 – 2.NP
PÚ 4 – 3.NP
PÚ 5 – 4.NP
PÚ 6 – 5.NP
PÚ 7 – 6.NP
PÚ 8 – 7.NP
PÚ 9 – 8.NP
PÚ 10 – 9.NP
PÚ 11 – ZASTŘEŠENÍ
PÚ 12 – FASÁDA

PŘIŘAZENÍ ETAPOVÝCH PROCESŮ:
0,3 (+ stavební objekty SO310, SO340)
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
4
9

Bc. MICHAL BARTOŠ		DATUM:	20/10/2018
Ing. KAREL POLÁK Ph.D.		FORMÁT:	D - 4
NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7		MĚŘÍTKO:	-
FSV	PODROBNÝ ČASOPROSTOROVÝ GRAF		
ČVUT	1.0016	DP	K122

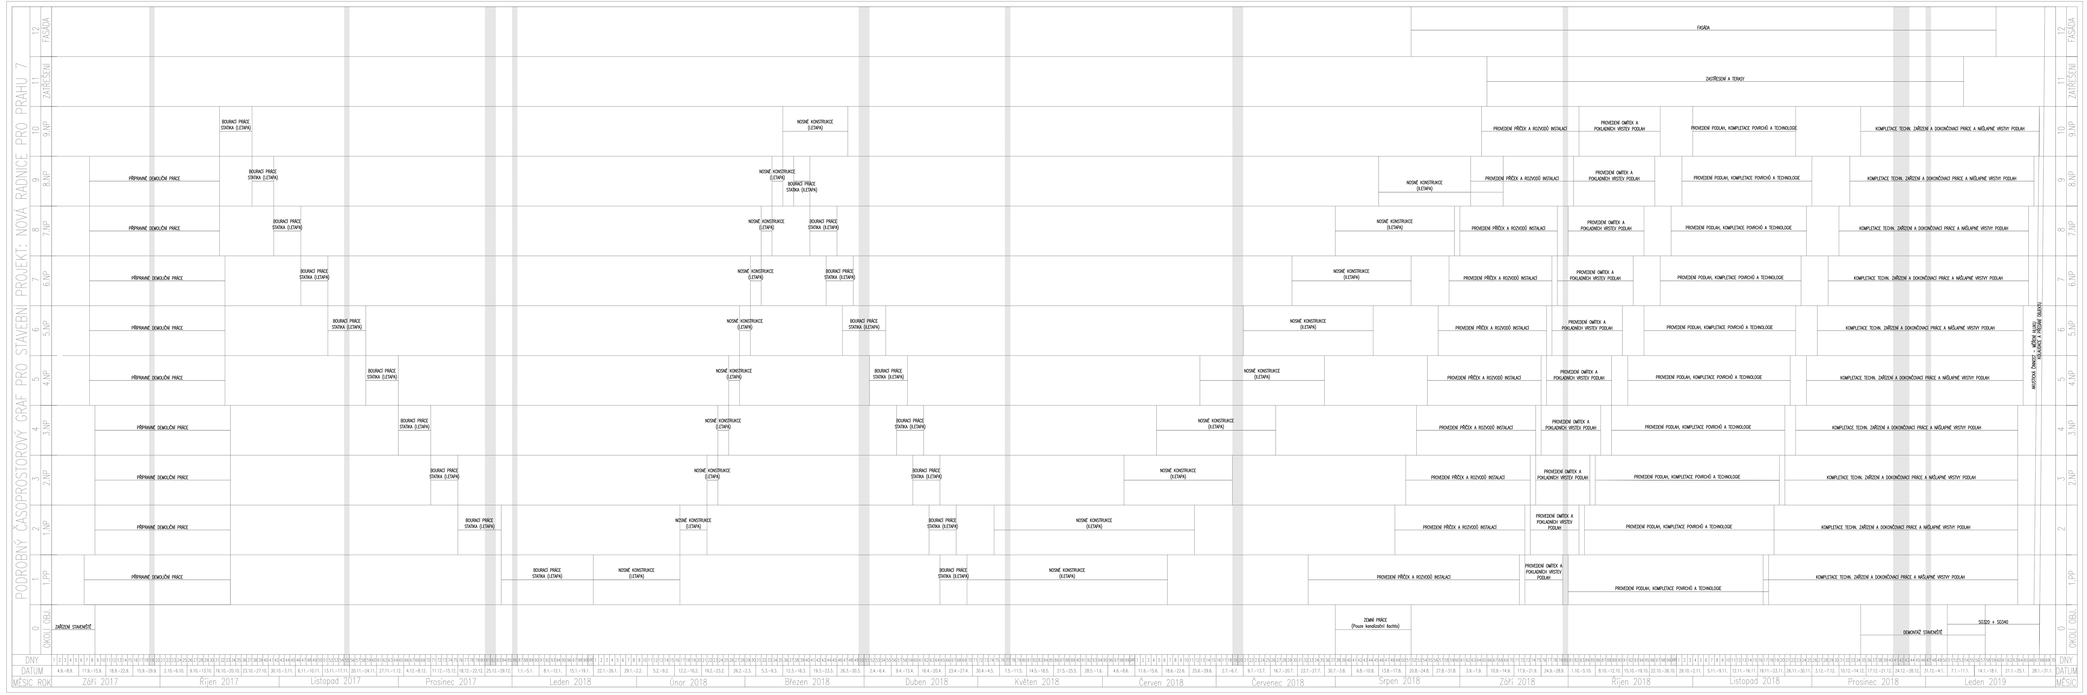

GRAFICKÉ ZNAČKY NA ČASOVÉ OSE:

SVÁTEK – NEPROBÍHAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE

DEN S POŘADOVÝM ČÍSLEM KTERÉ JE NÁSOBKEM STA – PRO LEPŠÍ ORIENTACI NA ČASOVÉ OSE

ETAPOVÉ PROCESY:
0 – PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE
1 – BOURACÍ PRÁCE – STATIKA
2 – NOSNÉ KONSTRUKCE
3 – ZEMNÍ PRÁCE (Pouze pro kanalizační šachtu)
4 – ZASTŘEŠENÍ
5 – PROV. PŘÍČEK A ROZVODŮ INSTALACÍ
6 – PROV. OMÍTEK A PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAH
7 – PROV. PODLAH A KOMPL. POVRCHŮ A TECHNOLOGIE
8 – KOMPL. TECH. ZAŘÍZENÍ A DOK. PRÁCE A NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
9 – FASÁDNÍ PRÁCE
10 – KOLAUDACE A PŘEJÍMKA STAVBY

SMĚR ETAPOVÉHO PROCESU:
HORIZONTÁLNÍ / HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ SESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNÍ
HORIZONTÁLNÍ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ
HORIZONTÁLNĚ VZESTUPNÝ

PROSTOROVÉ ÚSEKY:
PÚ 0 – OKOLÍ OBJEKTU
PÚ 1 – SPODNÍ STAVBA (1.PP)
PÚ 2 – 1.NP
PÚ 3 – 2.NP
PÚ 4 – 3.NP
PÚ 5 – 4.NP
PÚ 6 – 5.NP
PÚ 7 – 6.NP
PÚ 8 – 7.NP
PÚ 9 – 8.NP
PÚ 10 – 9.NP
PÚ 11 – ZASTŘEŠENÍ
PÚ 12 – FASÁDA

PŘIŘAZENÍ ETAPOVÝCH PROCESŮ:
0,3 (+ stavební objekty SO310, SO340)
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
2,5,6,7,8
4
9

Bc. MICHAL BARTOŠ		DATUM:	20/10/2018
Ing. KAREL POLÁK Ph.D.		FORMÁT:	D - 3
NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7		MĚŘÍTKO:	-
FSV	KOMPLEXNÍ ČASOPROSTOROVÝ GRAF		
ČVUT	1.0016	DP	K122
