# 22xxx Vzorový projekt / HMG pro schválení Investiční žádosti
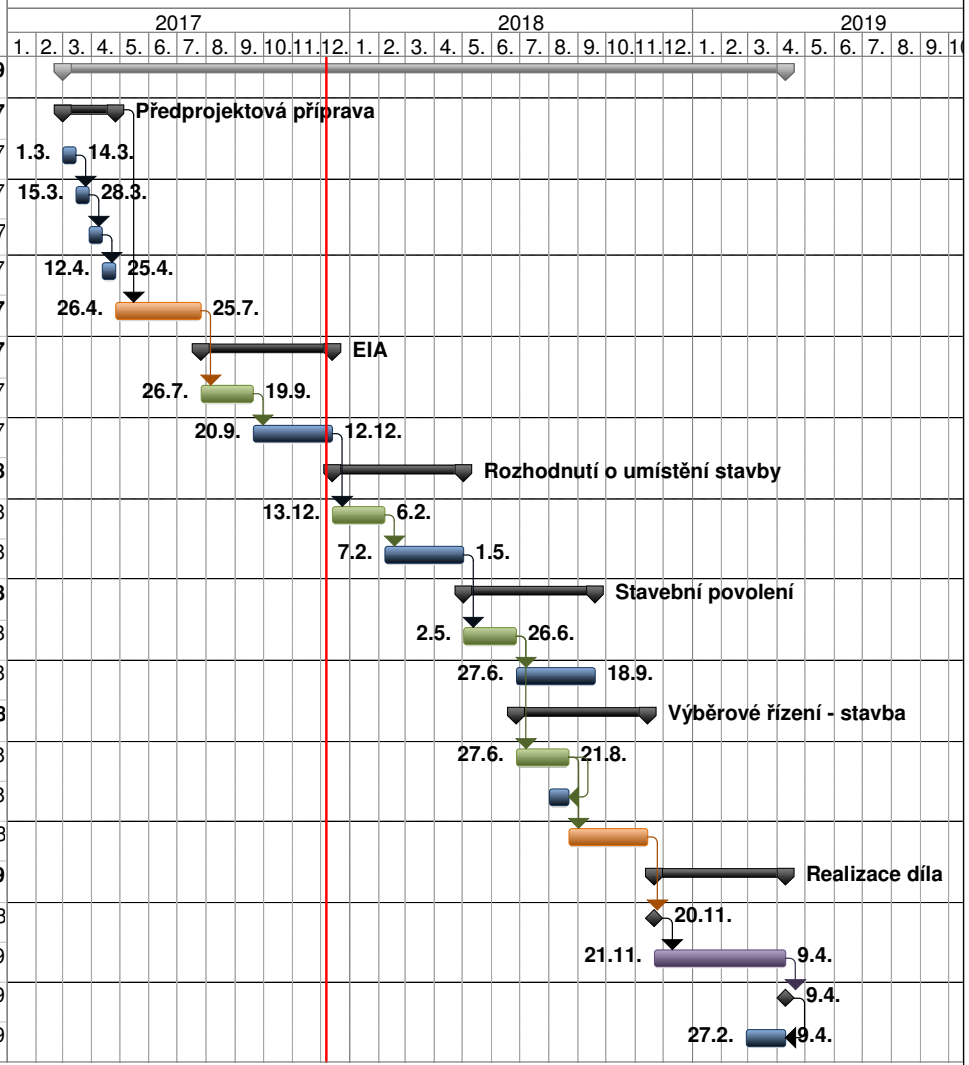
| ID | Rež úkol | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | **22xxx Vzorový projekt / HMG pro schválení Investiční žádosti** | **550 d** | **1.3. 17** | **9.4. 19** |
| 1 | | **1 Předprojektová příprava** | **40 d** | **1.3. 17** | **25.4. 17** |
| 2 | | 1.1 Investiční žádost - specifikace požadavku uživatele | 2 t | 1.3. 17 | 14.3. 17 |
| 3 | | 1.2 Investiční žádost - schvalování WF1 TAS | 2 t | 15.3. 17 | 28.3. 17 |
| 4 | | 1.3 Projednání žádosti ve výborech | 2 t | 29.3. 17 | 11.4. 17 |
| 5 | | 1.4 Investiční žádost - schválení ve WF3 TAS | 2 t | 12.4. 17 | 25.4. 17 |
| 6 | | **2 Výběrové řízení na Zhotovitele projektové dokumentace** | **65 d** | **26.4. 17** | **25.7. 17** |
| 7 | | **3 EIA** | **100 d** | **26.7. 17** | **12.12. 17** |
| 8 | | 3.1 Dokumentace EIA | 2 měs | 26.7. 17 | 19.9. 17 |
| 9 | | 3.2 Projednání EIA | 3 měs | 20.9. 17 | 12.12. 17 |
| 10 | | **4 Rozhodnutí o umístění stavby** | **100 d** | **13.12. 17** | **1.5. 18** |
| 11 | | 4.1 DÚR, včetně připomínek OJ | 2 měs | 13.12. 17 | 6.2. 18 |
| 12 | | 4.2 Projednání a získání Územního rozhodnutí | 3 měs | 7.2. 18 | 1.5. 18 |
| 13 | | **5 Stavební povolení** | **100 d** | **2.5. 18** | **18.9. 18** |
| 14 | | 5.1 DSP, včetně připomínek OJ | 2 měs | 2.5. 18 | 26.6. 18 |
| 15 | | 5.2 Projednání a získání Stavebního povolení | 3 měs | 27.6. 18 | 18.9. 18 |
| 16 | | **6 Výběrové řízení - stavba** | **100 d** | **27.6. 18** | **13.11. 18** |
| 17 | | 6.1 DPS, včetně připomínek OJ | 2 měs | 27.6. 18 | 21.8. 18 |
| 18 | | 6.2 Zadávací dokumentace | 3 t | 1.8. 18 | 21.8. 18 |
| 19 | | 6.3 Výběr zhotovitele | 3 měs | 22.8. 18 | 13.11. 18 |
| 20 | | **7 Realizace díla** | **100 d** | **20.11. 18** | **9.4. 19** |
| 21 | | 7.1 Předání staveniště Zhotoviteli | 0 d | 20.11. 18 | 20.11. 18 |
| 22 | | 7.2 Realizace | 5 měs | 21.11. 18 | 9.4. 19 |
| 23 | | 7.3 Předání díla a staveniště Objednateli | 0 d | 9.4. 19 | 9.4. 19 |
| 24 | | 7.4 Kolaudace | 30 d | 27.2. 19 | 9.4. 19 |
