CONTEC - Časový graf akce: 00ZS0VRN Polyfunkční dům - AFI Vokovice

26.12.17

ZS+VRN

Index Dodav.	Název činnosti Smlouva	Pracovníků	Doba [Kč]	Rez.	Začátek	Konec model	Konec model
5	VEDLEJŠÍ ROZP NÁKLADY 1 : ZS+VRN	10	2	0	2.5.18	11.5.18	11.5.18
10005	KAČENÍ POROSTU 1 : Kácení	2	1	0	14.5.18	18.5.18	
20005	Zemní práce, bourání 1 : Přeložka VN	8	1	1	21.5.18	25.5.18	
20030	Hrubá vrchní stavba 1 : Přeložka VN	5	1	0	28.5.18	1.6.18	
20060	Omítky a potěry 1 : Přeložka VN	3	3	0	4.6.18	22.6.18	
20090	Vnější úpravy 1 : Přeložka VN	5	1	0	25.6.18	29.6.18	
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Přeložka VN	1	1	0	25.6.18	29.6.18	
30005	Zemní práce, bourání 1 : TRAFO	3	10	0	21.5.18	27.7.18	
30030	Hrubá vrchní stavba 1 : TRAFO	7	2	0	11.6.18	22.6.18	
30060	Omítky a potěry 1 : TRAFO	3	6	1	25.6.18	3.8.18	
30090	Vnější úpravy 1 : TRAFO	7	3	0	23.7.18	10.8.18	
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : TRAFO	1	1	0	13.8.18	17.8.18	
40005	Zemní práce, bourání 1 : Přelož. SLABO	8	1	1	2.7.18	4.7.18	
40030	Hrubá vrchní stavba 1 : Přelož. SLABO	5	2	0	9.7.18	20.7.18	
40060	Omítky a potěry 1 : Přelož. SLABO	3	3	0	30.7.18	17.8.18	
40090	Vnější úpravy 1 : Přelož. SLABO	2	3	0	6.8.18	24.8.18	
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Přelož. SLABO	1	1	0	20.8.18	24.8.18	
50005	Zemní práce, bourání 1 : Přelož. KAN	12	3	5	9.7.18	27.7.18	
50030	Hrubá vrchní stavba 1 : Přelož. KAN	5	6	0	30.7.18	7.9.18	
50060	Omítky a potěry 1 : Přelož. KAN	7	2	2	10.9.18	21.9.18	
50090	Vnější úpravy 1 : Přelož. KAN	4	4	0	17.9.18	12.10.18	
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Přelož. KAN	1	1	0	15.10.18	19.10.18	
60005	Zemní práce, bourání 1 : Přelož. VOD	6	3	8	16.7.18	3.8.18	
60030	Hrubá vrchní stavba 1 : Přelož. VOD	5	1	5	20.8.18	24.8.18	
60060	Omítky a potěry 1 : Přelož. VOD	5	3	2	10.9.18	27.9.18	
60090	Vnější úpravy 1 : Přelož. VOD	3	5	0	24.9.18	26.10.18	
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Přelož. VOD	1	1	0	22.10.18	26.10.18	
70005	Zemní práce, bourání 1 : Přelož. PLYN.NTL	5	3	8	23.7.18	10.8.18	
70030	Hrubá vrchní stavba 1 : Přelož. PLYN.NTL	5	1	5	27.8.18	31.8.18	
70060	Omítky a potěry 1 : Přelož. PLYN.NTL	3	3	2	17.9.18	5.10.18	
70090	Vnější úpravy 1 : Přelož. PLYN.NTL	3	5	0	1.10.18	2.11.18	
70095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Přelož. PLYN.NTL	1	1	0	29.10.18	2.11.18	
80005	Zemní práce, bourání 1 : Přelož. PLYN.STL	5	3	8	30.7.18	17.8.18	
80030	Hrubá vrchní stavba 1 : Přelož. PLYN.STL	5	1	5	3.9.18	7.9.18	
80060	Omítky a potěry 1 : Přelož. PLYN.STL	3	5	2	10.9.18	12.10.18	
80090	Vnější úpravy 1 : Přelož. PLYN.STL	3	5	0	8.10.18	9.11.18	
80095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Přelož. PLYN.STL	1	1	0	5.11.18	9.11.18	
90005	Zemní práce, bourání 1 : Demolice A	13	16	0	22.10.18	8.2.19	
90010	UPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY 1 : Demolice A	7	1	0	11.2.19	15.2.19	
90020	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 : Demolice A	3	2	0	11.2.19	22.2.19	
90030	PŘESUN HMOT TE 3 1 : Demolice A	3	1	0	18.2.19	22.2.19	
90095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Demolice A	1	1	0	25.2.19	1.3.19	
100005	Zemní práce, bourání 1 : Demolice B	16	21	0	22.10.18	15.3.19	
100020	OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU 1 : Demolice B	6	3	0	4.3.19	22.3.19	
100030	PŘESUN HMOT TE 3 1 : Demolice B	3	1	0	18.3.19	22.3.19	
100095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Demolice B	1	1	0	25.3.19	29.3.19	
110005	Zemní práce, bourání 1 : OBJEKT A	5	157	2	1.4.19	1.4.22	
110010	Základání 1 : OBJEKT A	27	14	2	1.7.19	4.10.19	
110020	Spodní stavba 1 : OBJEKT A	41	37	4	16.9.19	29.5.20	
110030	Hrubá vrchní stavba 1 : OBJEKT A	62	19	0	6.4.20	14.8.20	
110040	Střecha 1 : OBJEKT A	9	38	7	17.8.20	7.5.21	
110050	Přípky,hrubé instalace 1 : OBJEKT A	39	60	3	10.8.20	1.10.21	
110060	Omítky a potěry 1 : OBJEKT A	11	80	0	17.8.20	25.2.22	
110070	Podlahy, povrchy, techn. 1 : OBJEKT A	18	39	2	7.7.21	1.4.22	
110080	Vnitřní kompletace 1 : OBJEKT A	19	42	0	28.6.21	15.4.22	
110090	Vnější úpravy 1 : OBJEKT A	8	35	39	16.11.20	16.7.21	
110095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : OBJEKT A	1	1	0	18.4.22	22.4.22	
120005	Zemní práce, bourání 1 : OBJEKT B	2	30	12	1.2.21	27.8.21	
120030	Hrubá vrchní stavba 1 : OBJEKT B	15	33	0	13.4.20	27.11.20	
120040	Střecha 1 : OBJEKT B	7	13	39	30.11.20	26.2.21	
120050	Přípky,hrubé instalace 1 : OBJEKT B	24	39	11	23.11.20	20.8.21	
120060	Omítky a potěry 1 : OBJEKT B	8	42	0	1.2.21	19.11.21	
120070	Podlahy, povrchy, techn. 1 : OBJEKT B	6	22	1	28.6.21	26.11.21	
120080	Vnitřní kompletace 1 : OBJEKT B	9	28	0	24.5.21	3.12.21	
120090	Vnější úpravy 1 : OBJEKT B	4	17	25	15.2.21	11.6.21	
120095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : OBJEKT B	1	1	0	6.12.21	10.12.21	
130005	Zemní práce, bourání 1 : VODOV. PŘÍP.	5	2	1	13.4.20	24.4.20	
130030	Hrubá vrchní stavba 1 : VODOV. PŘÍP.	4	2	0	27.4.20	7.5.20	
130060	Omítky a potěry 1 : VODOV. PŘÍP.	4	2	2	11.5.20	22.5.20	
130090	Vnější úpravy 1 : VODOV. PŘÍP.	4	3	0	18.5.20	5.6.20	
130095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : VODOV. PŘÍP.	1	1	0	1.6.20	5.6.20	
140005	Zemní práce, bourání 1 : Retenční nádrže	9	1	1	13.4.20	17.4.20	
140030	Hrubá vrchní stavba 1 : Retenční nádrže	4	7	0	20.4.20	5.6.20	
140060	Omítky a potěry 1 : Retenční nádrže	4	1	1	8.6.20	12.6.20	
140090	Vnější úpravy 1 : Retenční nádrže	5	2	0	8.6.20	19.6.20	
140095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Retenční nádrže	1	1	0	22.6.20	26.6.20	
150005	Zemní práce, bourání 1 : Kanal přip.	10	1	1	29.6.20	3.7.20	
150030	Hrubá vrchní stavba 1 : Kanal přip.	5	3	0	7.7.20	24.7.20	
150060	Omítky a potěry 1 : Kanal přip.	5	2	0	27.7.20	7.8.20	
150090	Vnější úpravy 1 : Kanal přip.	4	2	0	10.8.20	21.8.20	
150095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Kanal přip.	1	1	0	24.8.20	28.8.20	
160005	Zemní práce, bourání 1 : Data přípojka	8	1	1	31.8.20	4.9.20	
160030	Hrubá vrchní stavba 1 : Data přípojka	4	2	0	7.9.20	18.9.20	
160060	Omítky a potěry 1 : Data přípojka	4	2	0	21.9.20	2.10.20	
160095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Data přípojka	1	1	0	5.10.20	9.10.20	
170005	Zemní práce, bourání 1 : Plyn. přípojka	5	2	1	12.10.20	23.10.20	
170030	Hrubá vrchní stavba 1 : Plyn. přípojka	5	1	0	26.10.20	30.10.20	
170060	Omítky a potěry 1 : Plyn. přípojka	4	2	0	2.11.20	13.11.20	
170090	Vnější úpravy 1 : Plyn. přípojka	4	3	0	9.11.20	27.11.20	
170095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Plyn. přípojka	1	1	0	23.11.20	27.11.20	
180030	Hrubá vrchní stavba 1 : Opěrná stěna	10	5	1	21.6.21	23.7.21	
180060	Omítky a potěry 1 : Opěrná stěna	7	2	0	26.7.21	6.8.21	
180090	Vnější úpravy 1 : Opěrná stěna	6	1	0	9.8.21	13.8.21	
180095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Opěrná stěna	1	1	0	9.8.21	13.8.21	
190005	Zemní práce, bourání 1 : Areál. ověřlání	5	1	0	16.8.21	20.8.21	
190060	Omítky a potěry 1 : Areál. ověřlání	5	3	0	23.8.21	10.9.21	
190090	Vnější úpravy 1 : Areál. ověřlání	4	1	0	13.9.21	17.9.21	
190095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 : Areál. ověřlání	1	1	0	13.9.21	17.9.21	
200005	ŘEZÁNÍ VOZOVEK 1 : Komunikace	5	2	0	20.9.21	1.10.21	
200030	Hrubá vrchní stavba 1 : Komunikace	11	2	2	4.10.21	15.10.21	
200060	Omítky a potěry 1 : Komunikace	13	5	0	11.10.21	12.11.21	

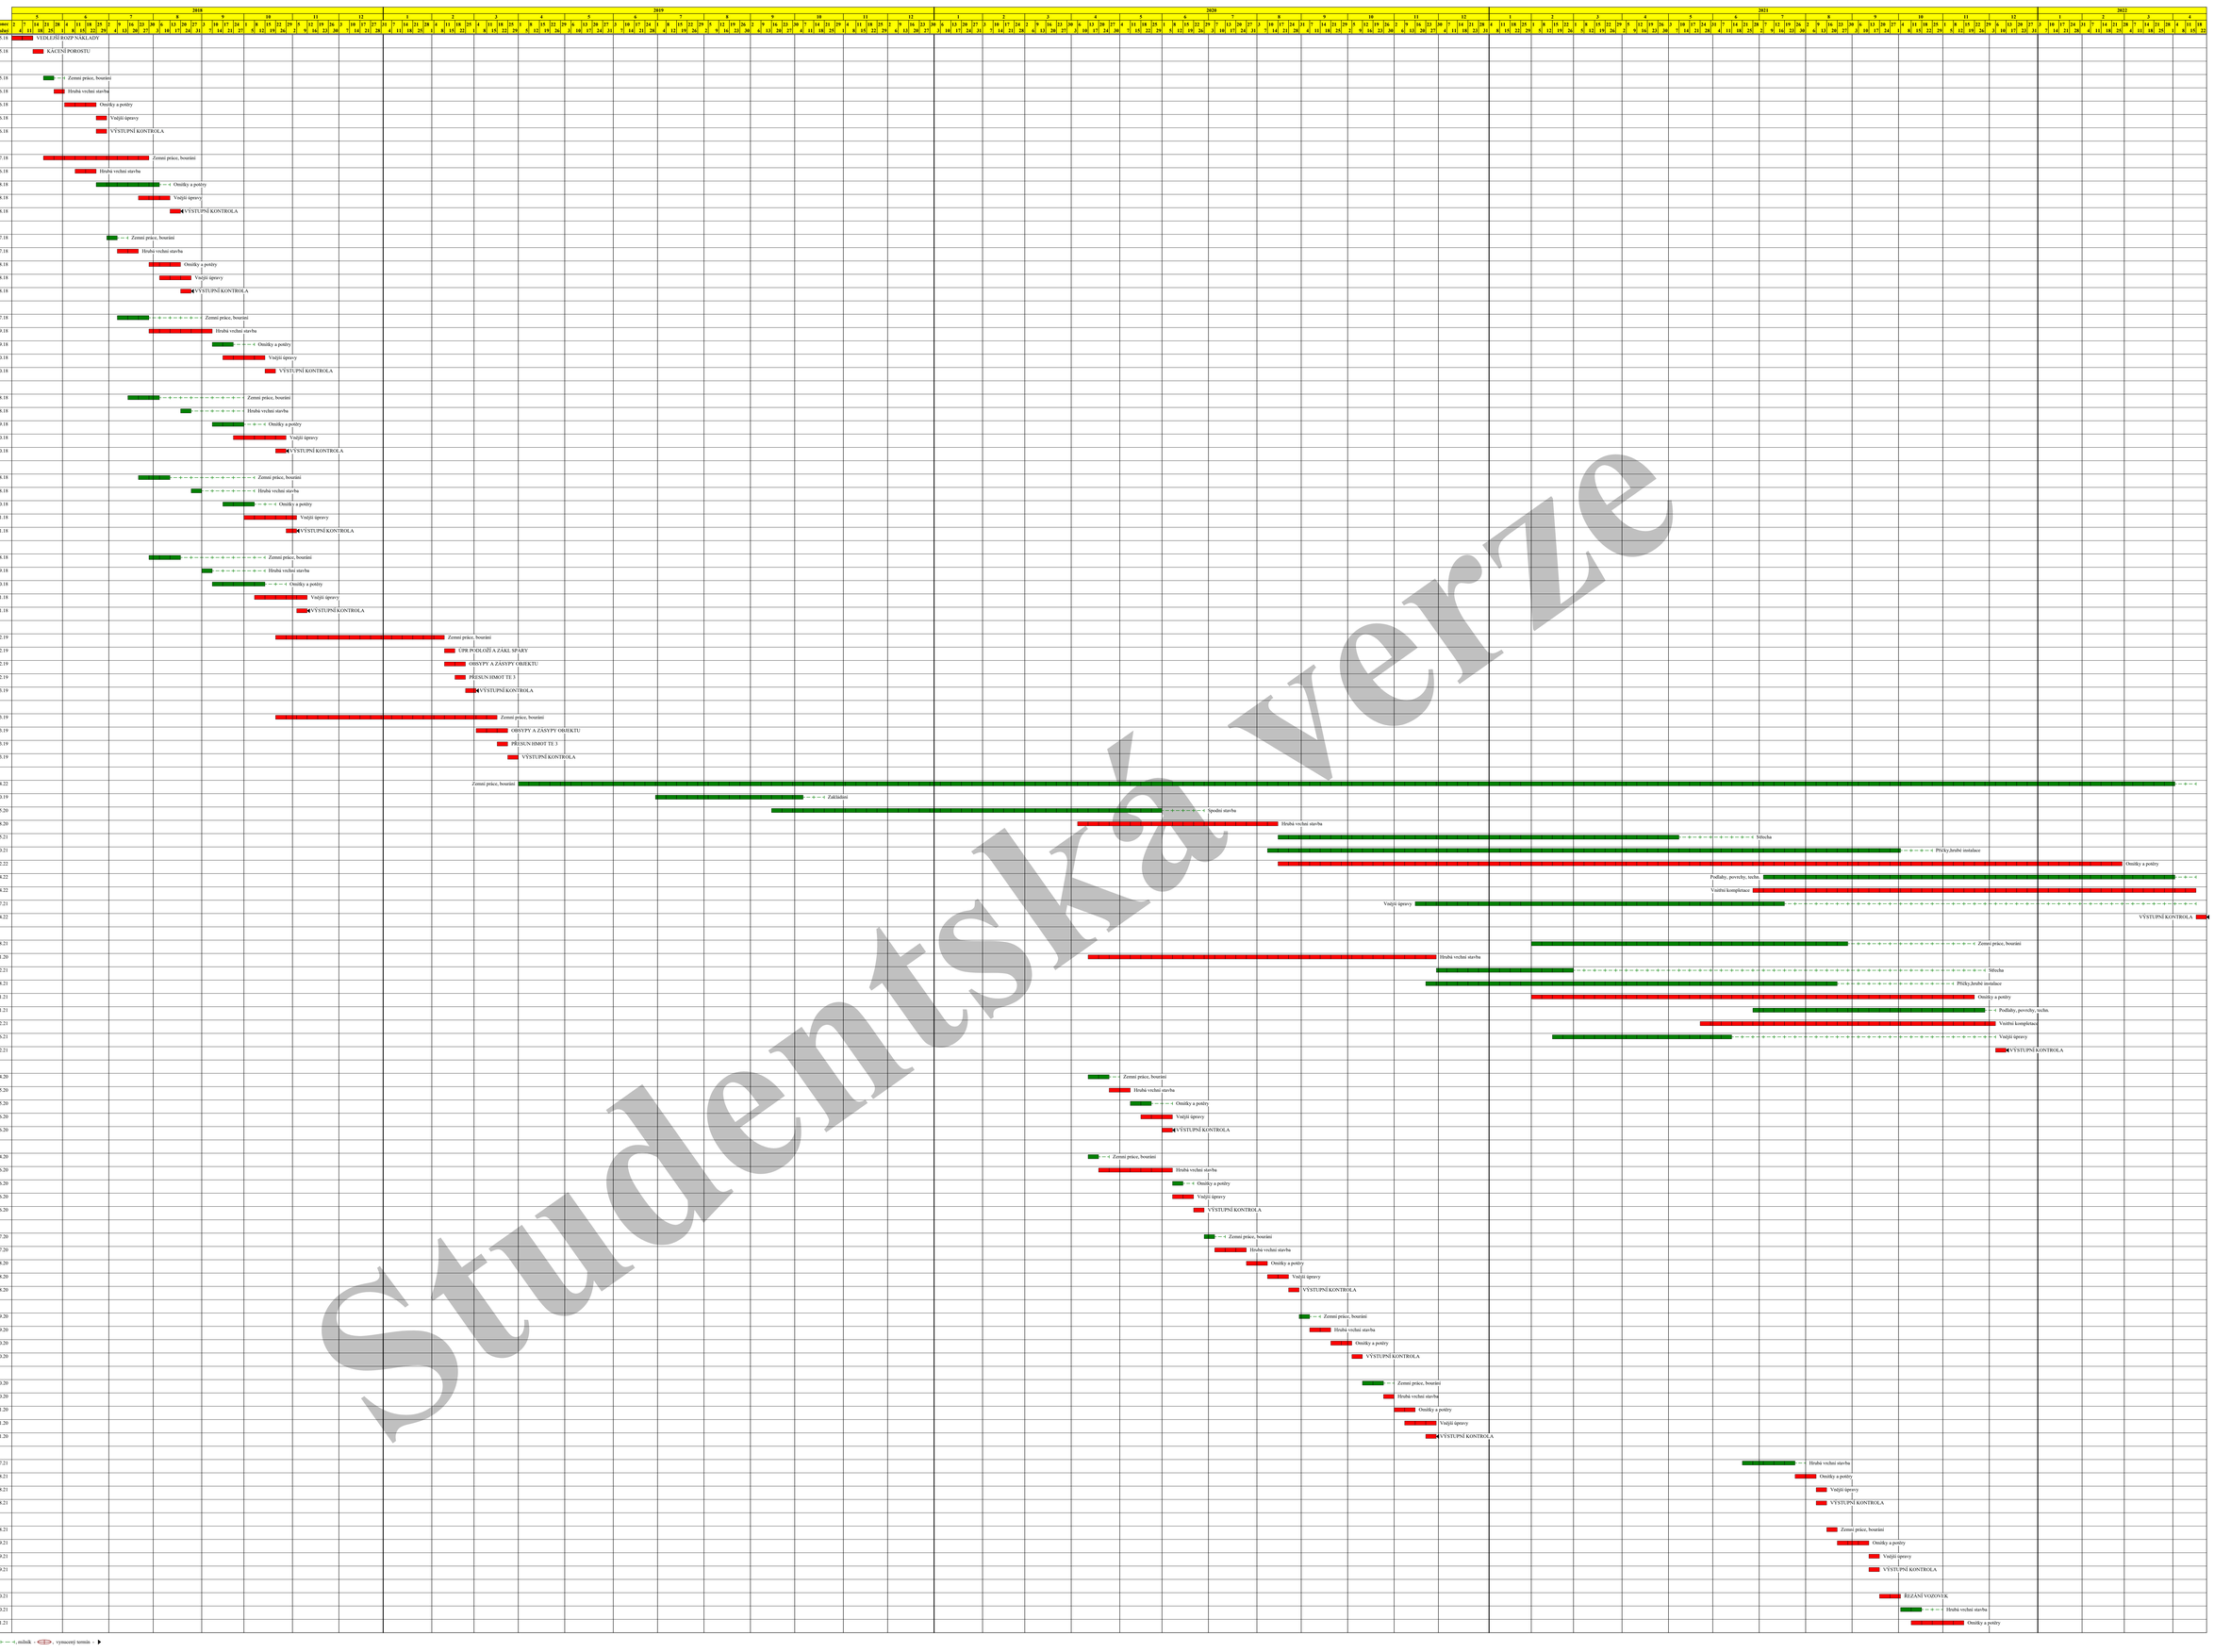

Činnost kritická, zpožděná, s rezervou, rezerva, milník, vymezený termín

Studentská verze

26.12.17

Kontrolkace

Index Dodav.	Název činnosti Smlouvou	Pracovníků	Doba [Hd]	Rez. [Hd]	Začátek nejdřív	Konec nejdřív
200090	Vnější úpravy 1 Kontrolkace	10	5	0	1.11.21	3.12.21
200095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Kontrolkace	1	1	0	29.11.21	3.12.21
210005	SADOVÉ ÚPRAVY 1 Sadové úpravy	4	2	0	6.12.21	17.12.21
210095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 Sadové úpravy	1	1	0	20.12.21	23.12.21



Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vymazený termín -

Studentská verze
