CONTEC - Casový graf akce: 00010001 Rekonstrukce rodinného domu

3.6.18

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti Smennost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
	RD Srbsko					
109	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 RD Srbsko	5	1	0	4.3.19	8.3.19
159	OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE 1 RD Srbsko	4	1	0	4.3.19	8.3.19
201	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 1 RD Srbsko	3	1	6	4.3.19	8.3.19
277	DMTŽ TESAØ KONSTRUKCÍ 1 RD Srbsko	2	2	8	4.3.19	15.3.19
287	DMTŽ KLEMPÍØ KONSTRUKCÍ 1 RD Srbsko	2	1	8	4.3.19	8.3.19
297	ODSTRAN TVRDÝCH KRYTIN 1 RD Srbsko	2	1	8	4.3.19	8.3.19
317	DMTŽ ZÁMEÈNICKÝCH KONSTR 1 RD Srbsko	2	1	8	4.3.19	8.3.19
347	ODSTR PODLAH DØEVÌNÝCH 1 RD Srbsko	2	1	8	4.3.19	8.3.19
417	DMTŽ POTRUBÍ KANALIZACE 1 RD Srbsko	2	1	8	4.3.19	8.3.19
427	DEMONTÁŽ POTRUBÍ VODOVOD 1 RD Srbsko	2	1	11	4.3.19	8.3.19
457	DMTŽ ZAØIZ PØEDMETÙ ZTI 1 RD Srbsko	2	1	11	4.3.19	8.3.19
517	DEMONTÁŽ KAMEN 1 RD Srbsko	2	1	11	4.3.19	8.3.19
527	DMTŽ STROJ VYBAVENÍ ÚT 1 RD Srbsko	2	1	11	4.3.19	8.3.19
537	DEMONTÁŽ ROZVODÙ ÚT 1 RD Srbsko	2	1	11	4.3.19	8.3.19
547	DEMONTÁŽ ARMATUR ÚT 1 RD Srbsko	2	1	11	4.3.19	8.3.19
569	DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT 1 RD Srbsko	6	12	0	4.3.19	24.5.19
601	PØEMÍSTÌNÍ VÝKOPKU 1 RD Srbsko	2	1	9	4.3.19	8.3.19
752	VRTY PRO INJEKTÁŽ 1 RD Srbsko	4	2	6	11.3.19	22.3.19
1807	KANALIZACE LEŽATÁ 1 RD Srbsko	2	1	6	25.3.19	29.3.19
2304	SCHODIŠTÌ SUTERÉN 1 RD Srbsko	4	1	6	1.4.19	5.4.19
2508	DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI 1 RD Srbsko	2	1	9	1.4.19	5.4.19
2657	IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI 1 RD Srbsko	2	1	9	1.4.19	5.4.19
3202	ZPEVÒOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 1 RD Srbsko	3	1	0	20.5.19	24.5.19
3253	ZDI NOSNÉ 1 RD Srbsko	4	1	0	27.5.19	31.5.19
3657	TESAØI STÌNY A STROPY 1 RD Srbsko	2	2	0	27.5.19	7.6.19
3709	LEHKÉ ØADOVÉ LEŠENÍ 1 RD Srbsko	3	1	2	27.5.19	31.5.19
3859	PØESUN HMOT TE 3 1 RD Srbsko	3	1	5	20.5.19	24.5.19
4107	TESAØI ZASTØEŠENÍ,KROV 1 RD Srbsko	4	1	1	10.6.19	14.6.19
4157	DØEVOSTAVBY STØEŠNÍ 1 RD Srbsko	3	2	0	10.6.19	21.6.19
4307	TRUHLÁØI STØEŠNÍ OKNA 1 RD Srbsko	2	1	0	24.6.19	28.6.19
4329	DOPLÒKY STØECH,ODVÌTRÁNÍ 1 RD Srbsko	2	1	0	24.6.19	28.6.19
4357	TEPELNÁ IZOLACE STØECH 1 RD Srbsko	2	1	0	24.6.19	28.6.19

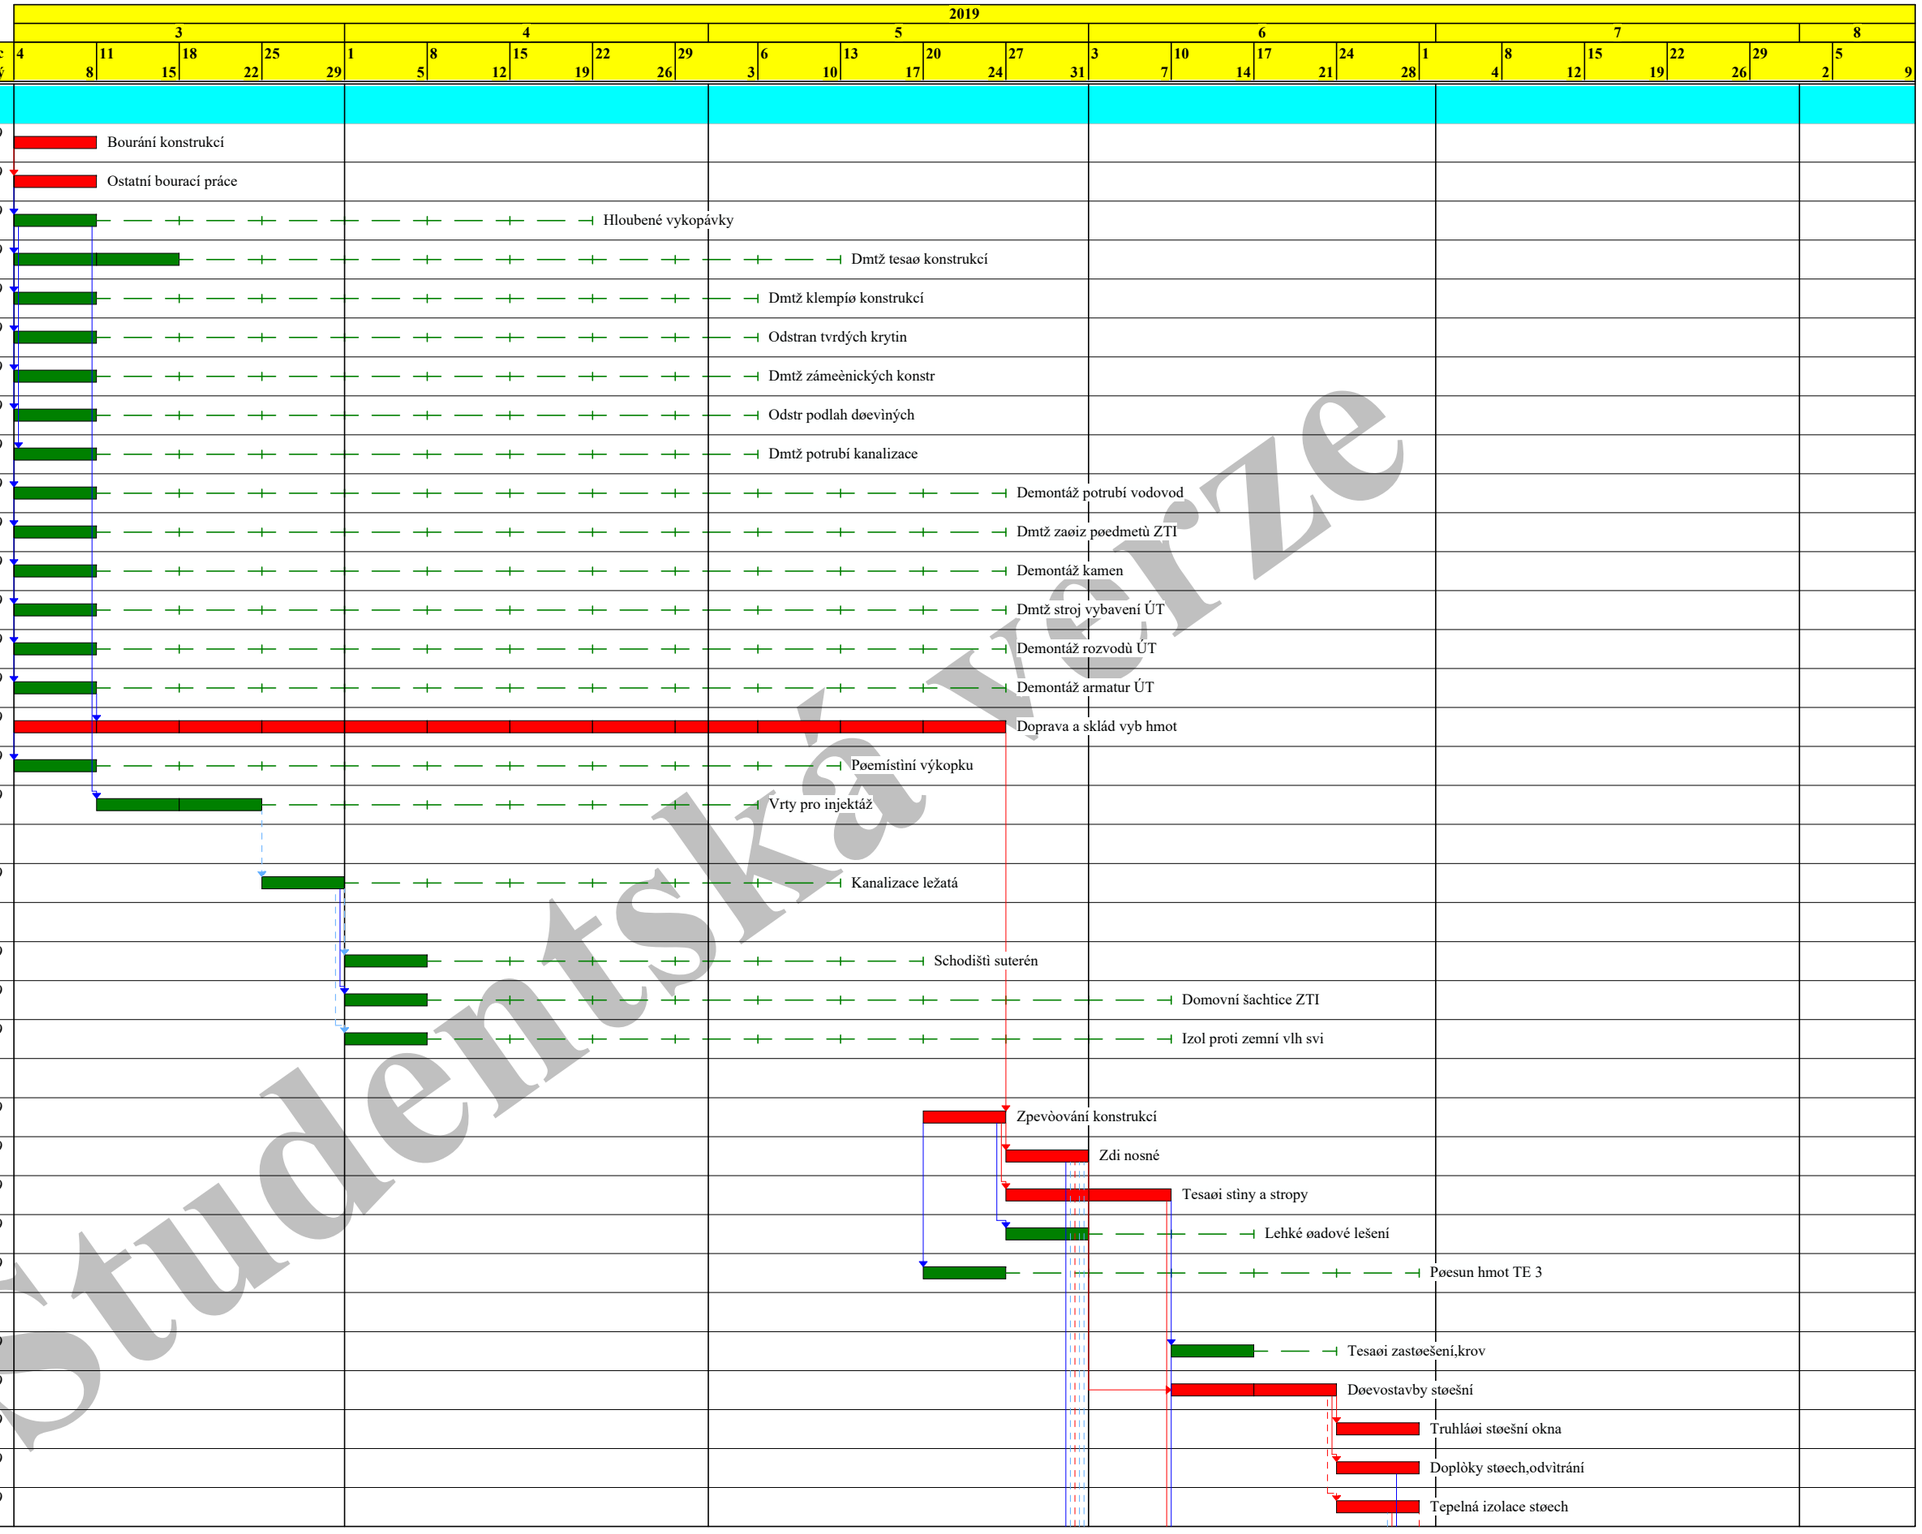

Cinnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Studentská verze

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti / Smennost	Pracovníku	Doba [týd.]	Rez.	Zacátek možný	Konec možný
4457	KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY 1 RD Srbsko	1	1	0	1.7.19	4.7.19
4509	PRODL KOMÍNU TROUBAMI 1 RD Srbsko	2	1	0	1.7.19	4.7.19
4557	STROJNÍ VYBAVENÍ VZT 1 RD Srbsko	3	1	0	1.7.19	4.7.19
4607	HROMOSVOD STREŠNÍ ÈÁST 1 RD Srbsko	2	1	2	1.7.19	4.7.19
4757	TVRDÉ KRYTINY STØEŠNÍ 1 RD Srbsko	3	2	0	8.7.19	19.7.19
4807	KLEMPÍØI STØEŠNÍ PRVKY 1 RD Srbsko	3	1	0	15.7.19	19.7.19
4859	PØESUN HMOT STØECHA 1 RD Srbsko	2	1	7	10.6.19	14.6.19
5187	PØÍÈKY A PODHL SÁDROKART 1 RD Srbsko	3	1	0	10.6.19	14.6.19
5256	VÝPLNÍ OTVORÙ 1 RD Srbsko	2	1	0	17.6.19	21.6.19
5327	TRUHLÁØI OKNA 1 RD Srbsko	2	1	0	24.6.19	28.6.19
5507	KANALIZACE VNITØNÍ 1 RD Srbsko	2	1	2	10.6.19	14.6.19
5527	VODOVOD ROZV A ARMATURY 1 RD Srbsko	4	1	2	10.6.19	14.6.19
5547	PLYNOVOD ROZV A ARMATURY 1 RD Srbsko	2	1	2	10.6.19	14.6.19
5567	ZAØ PØEDMÍTY ZABUDOVANÉ 1 RD Srbsko	2	1	2	17.6.19	21.6.19
5587	STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI 1 RD Srbsko	2	1	4	17.6.19	21.6.19
5607	ROZVODY ÚT VNITØNÍ 1 RD Srbsko	3	1	0	10.6.19	14.6.19
5627	ARMATURY ÚT 1 RD Srbsko	2	1	0	17.6.19	21.6.19
5647	OTOPNÁ TÍLESA 1 RD Srbsko	2	1	0	24.6.19	28.6.19
5657	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 1 RD Srbsko	2	1	0	24.6.19	28.6.19
5667	KOTELNY ÚT 1 RD Srbsko	2	1	4	24.6.19	28.6.19
5687	STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT 1 RD Srbsko	2	1	4	24.6.19	28.6.19
5707	SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ 1 RD Srbsko	1	1	2	10.6.19	14.6.19
5727	SILNOPROUD VODIÈE 1 RD Srbsko	1	1	0	8.7.19	12.7.19
5747	SILNOPROUD ROZVÁDÍÈE 1 RD Srbsko	2	1	0	15.7.19	19.7.19
5767	SLABOPROUD TRUBKY 1 RD Srbsko	1	1	2	10.6.19	14.6.19
5787	SLABOPROUD VODIÈE 1 RD Srbsko	1	1	1	8.7.19	12.7.19
5807	VZDUCHOTECHNIKA 1 RD Srbsko	4	1	0	24.6.19	28.6.19
5859	PØESUN HMOT VNITØ KONSTR 1 RD Srbsko	2	1	5	10.6.19	14.6.19
6207	TEPELNÁ IZOLACE KONSTR 1 RD Srbsko	3	1	2	17.6.19	21.6.19
6306	ÚPRAVA POVRCHÙ VNITØNÍ 1 RD Srbsko	10	1	1	24.6.19	28.6.19
6407	HYDROIZOL SANITÁR PROST 1 RD Srbsko	2	1	2	24.6.19	28.6.19
6507	IZOLACE AKUSTICKÁ VNITØ 1 RD Srbsko	2	1	1	1.7.19	4.7.19
6706	PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1 RD Srbsko	2	1	1	1.7.19	4.7.19
6859	PØESUN HMOT TE 6 1 RD Srbsko	2	1	5	17.6.19	21.6.19

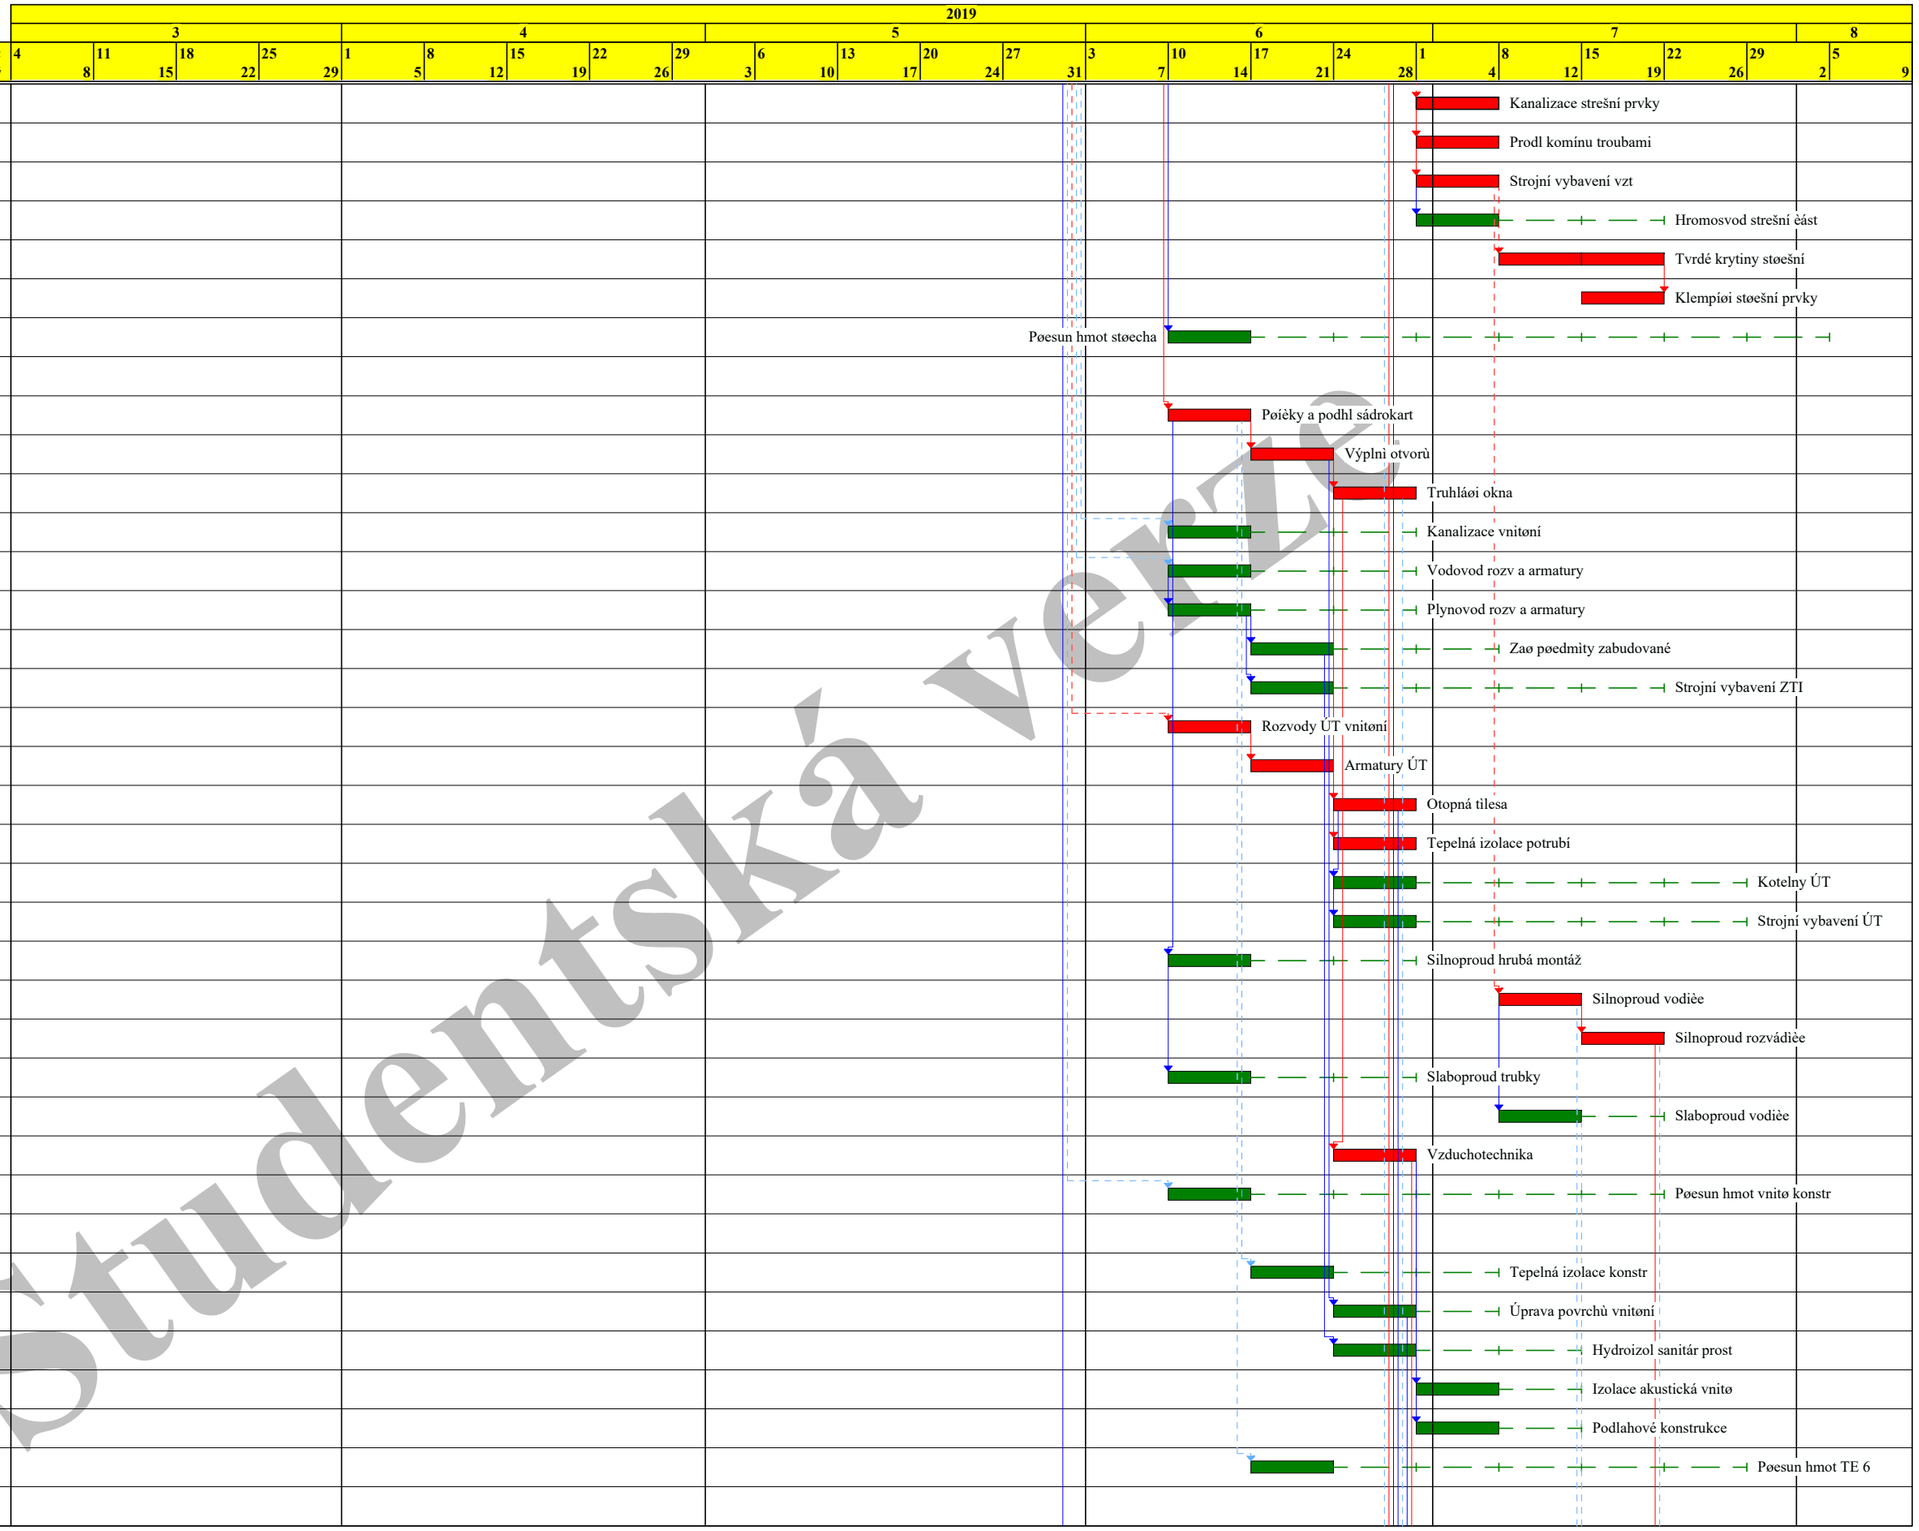

Studentská verze

Cinnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -

Zobrazení hlavních vazeb

Index Dodav.	Název činnosti / Smennost	Pracovníku	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
7107	OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ 1 RD Srbsko	3	3	0	1.7.19	19.7.19
7157	TRUHLÁØI OBKL STÌN,PODHL 1 RD Srbsko	4	1	3	1.7.19	4.7.19
7407	OBKLADY VNITØNÍ 1 RD Srbsko	3	1	1	15.7.19	19.7.19
7657	NÁTÌRY VNITØNÍ 1 RD Srbsko	3	1	3	1.7.19	4.7.19
7707	MALBY VNITØNÍ 1 RD Srbsko	4	1	0	22.7.19	26.7.19
7859	PØESUN HMOT POVRCHY 1 RD Srbsko	2	1	4	1.7.19	4.7.19
8107	TRUHLÁØI DVEØE,VYBAVENÍ 1 RD Srbsko	2	1	0	29.7.19	2.8.19
8207	PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET 1 RD Srbsko	4	1	0	29.7.19	2.8.19
8359	ZÁBRADLÍ SCHODIŠOVÉ 1 RD Srbsko	2	1	1	22.7.19	26.7.19
8407	ÈALOUNICKÉ ÚPRAVY 1 RD Srbsko	2	1	0	29.7.19	2.8.19
8457	ZÁMEÈNÍCI DOPLÒKY VNITØ 1 RD Srbsko	2	1	1	22.7.19	26.7.19
8527	ZAØIZOVACÍ PØEDMÌTY ZTI 1 RD Srbsko	3	1	0	29.7.19	2.8.19
8627	MÌØENÍ A REGULACE 1 RD Srbsko	2	1	4	1.7.19	4.7.19
8657	SLABOPROUD KOMPLET,ZAØÍZ 1 RD Srbsko	2	1	0	29.7.19	2.8.19
8707	SILNOPROUD KOMPLETACE 1 RD Srbsko	2	1	0	29.7.19	2.8.19
8809	VYÈISTÌNÍ OBJEKTU 1 RD Srbsko	4	1	0	29.7.19	2.8.19
8859	PØESUN HMOT KOMPLETACE 1 RD Srbsko	2	1	2	15.7.19	19.7.19
9109	VÝPLNÌ DILATAÈNÍCH SPÁR 1 RD Srbsko	3	1	1	10.6.19	14.6.19
9129	DROBNÉ DOPLÒKY VNÌJŠÍ 1 RD Srbsko	1	1	2	1.7.19	4.7.19
9157	TEPELNÁ IZOLACE VNÌJŠÍ 1 RD Srbsko	4	1	0	1.7.19	4.7.19
9209	ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ 1 RD Srbsko	2	1	2	1.7.19	4.7.19
9253	ØÍMSY 1 RD Srbsko	3	1	1	17.6.19	21.6.19
9287	HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNÌNÍ 1 RD Srbsko	2	1	2	8.7.19	12.7.19
9306	ÚPRAVA POVRCHÙ VNÌJŠÍ 1 RD Srbsko	8	1	0	8.7.19	12.7.19
9327	HYDROIZOL BALKONÙ,LODŽIÍ 1 RD Srbsko	2	1	0	15.7.19	19.7.19
9356	DESKY PARAPET A OKAPNICE 1 RD Srbsko	2	1	0	15.7.19	19.7.19
9457	SILNOPROUD KOMPLET VENK 1 RD Srbsko	2	1	0	22.7.19	26.7.19
9487	SLABOPROUD KOMPLET VENK 1 RD Srbsko	1	1	0	22.7.19	26.7.19
9587	PODLAHY Z DLAŽDIC VNÌJŠÍ 1 RD Srbsko	2	1	0	29.7.19	2.8.19
9657	KLEMPÍØI FASÁDNÍ PRVKY 1 RD Srbsko	2	1	0	29.7.19	2.8.19
9707	NÁTÌRY VENKOVNÍ 1 RD Srbsko	1	2	0	22.7.19	2.8.19
9859	PØESUN HMOT TE 9 1 RD Srbsko	2	1	4	1.7.19	4.7.19
9980	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 RD Srbsko	1	1	0	5.8.19	9.8.19

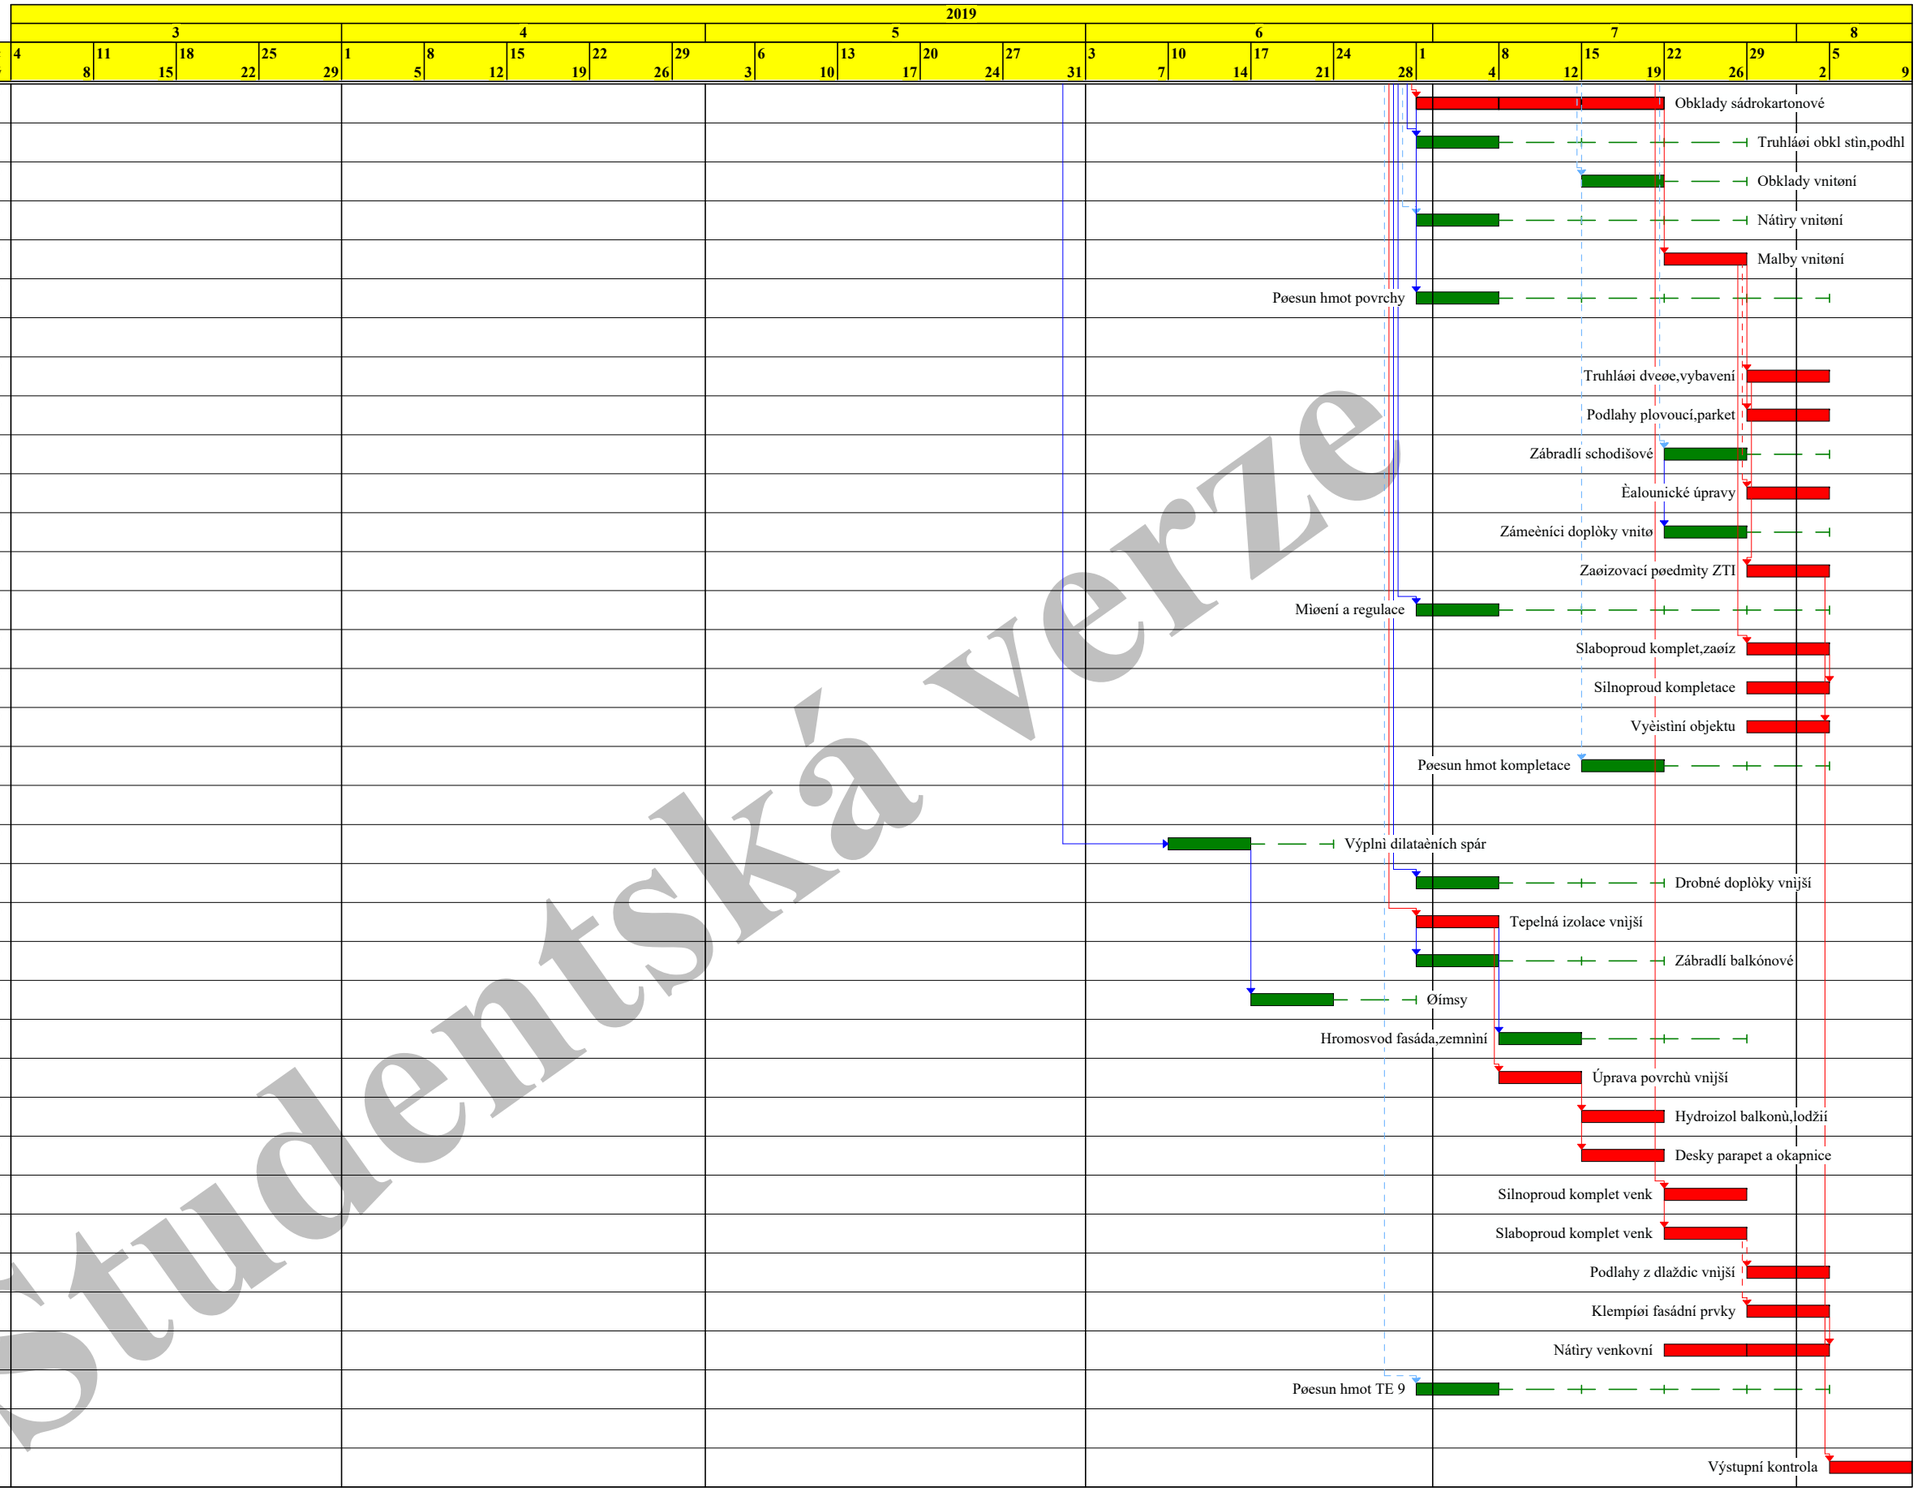

Studentská verze

Cinnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín - , hlavní vazba -
