CONTEC - Časový graf akce: 0FINVAR2 Prádelna nem.České Budějovice

6.11.19

SO01 - Příloha

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovník	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
5	Zemní práce, bourání 1 SO01 - Příloha	13	3	1	22.7.19	9.8.19
30	Hrubé konstrukce 1 SO01 - Příloha	4	4	0	12.8.19	6.9.19
60	Vlastní konstrukce 1 SO01 - Příloha	5	2	2	9.9.19	20.9.19
90	Dokončovací konstrukce 1 SO01 - Příloha	3	4	0	16.9.19	11.10.19
95	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO01 - Příloha	1	1	0	7.10.19	11.10.19
10005	Zemní práce, bourání 1 SO07 zpev. ploch	1	62	15	22.7.19	25.9.20
10030	Hrubé konstrukce 1 SO07 zpev. ploch	5	3	15	31.8.20	18.9.20
10060	Vlastní konstrukce 1 SO07 zpev. ploch	8	4	13	14.9.20	9.10.20
10090	Dokončovací konstrukce 1 SO07 zpev. ploch	2	18	0	29.9.20	29.1.21
10095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO07 zpev. ploch	1	1	0	25.1.21	29.1.21
20005	Zemní práce, bourání 1 SO02 Kan. přípoj	6	3	0	12.8.19	30.8.19
20030	Hrubé konstrukce 1 SO02 Kan. přípoj	9	9	0	19.8.19	18.10.19
20060	Vlastní konstrukce 1 SO02 Kan. přípoj	7	3	3	21.10.19	8.11.19
20090	Dokončovací konstrukce 1 SO02 Kan. přípoj	3	6	0	4.11.19	13.12.19
20095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO02 Kan. přípoj	1	1	0	9.12.19	13.12.19
30005	Zemní práce, bourání 1 SO03 vod. přípoj	4	4	1	19.8.19	13.9.19
30030	Hrubé konstrukce 1 SO03 vod. přípoj	2	6	3	16.9.19	25.10.19
30060	Vlastní konstrukce 1 SO03 vod. přípoj	6	3	4	29.10.19	15.11.19
30090	Dokončovací konstrukce 1 SO03 vod. přípoj	2	5	0	11.11.19	13.12.19
30095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO03 vod. přípoj	1	1	0	16.12.19	20.12.19
40005	Zemní práce, bourání 1 SO04 par. přípoj	2	4	1	26.8.19	20.9.19
40030	Hrubé konstrukce 1 SO04 par. přípoj	4	7	4	16.9.19	1.11.19
40060	Vlastní konstrukce 1 SO04 par. přípoj	3	8	1	4.11.19	27.12.19
40090	Dokončovací konstrukce 1 SO04 par. přípoj	2	8	0	18.11.19	10.1.20
40095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO04 par. přípoj	1	1	0	6.1.20	10.1.20
50005	Zemní práce, bourání 1 SO05 NN přípojka	2	4	1	2.9.19	27.9.19
50030	Hrubé konstrukce 1 SO05 NN přípojka	2	7	5	23.9.19	8.11.19
50060	Vlastní konstrukce 1 SO05 NN přípojka	2	9	0	18.11.19	17.1.20
50090	Př ESUN HMOT TE 9 1 SO05 NN přípojka	2	1	4	23.12.19	27.12.19
50095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO05 NN přípojka	1	1	0	20.1.20	24.1.20
60005	Zemní práce, bourání 1 SO06 hl. objekt	2	33	2	9.9.19	24.4.20

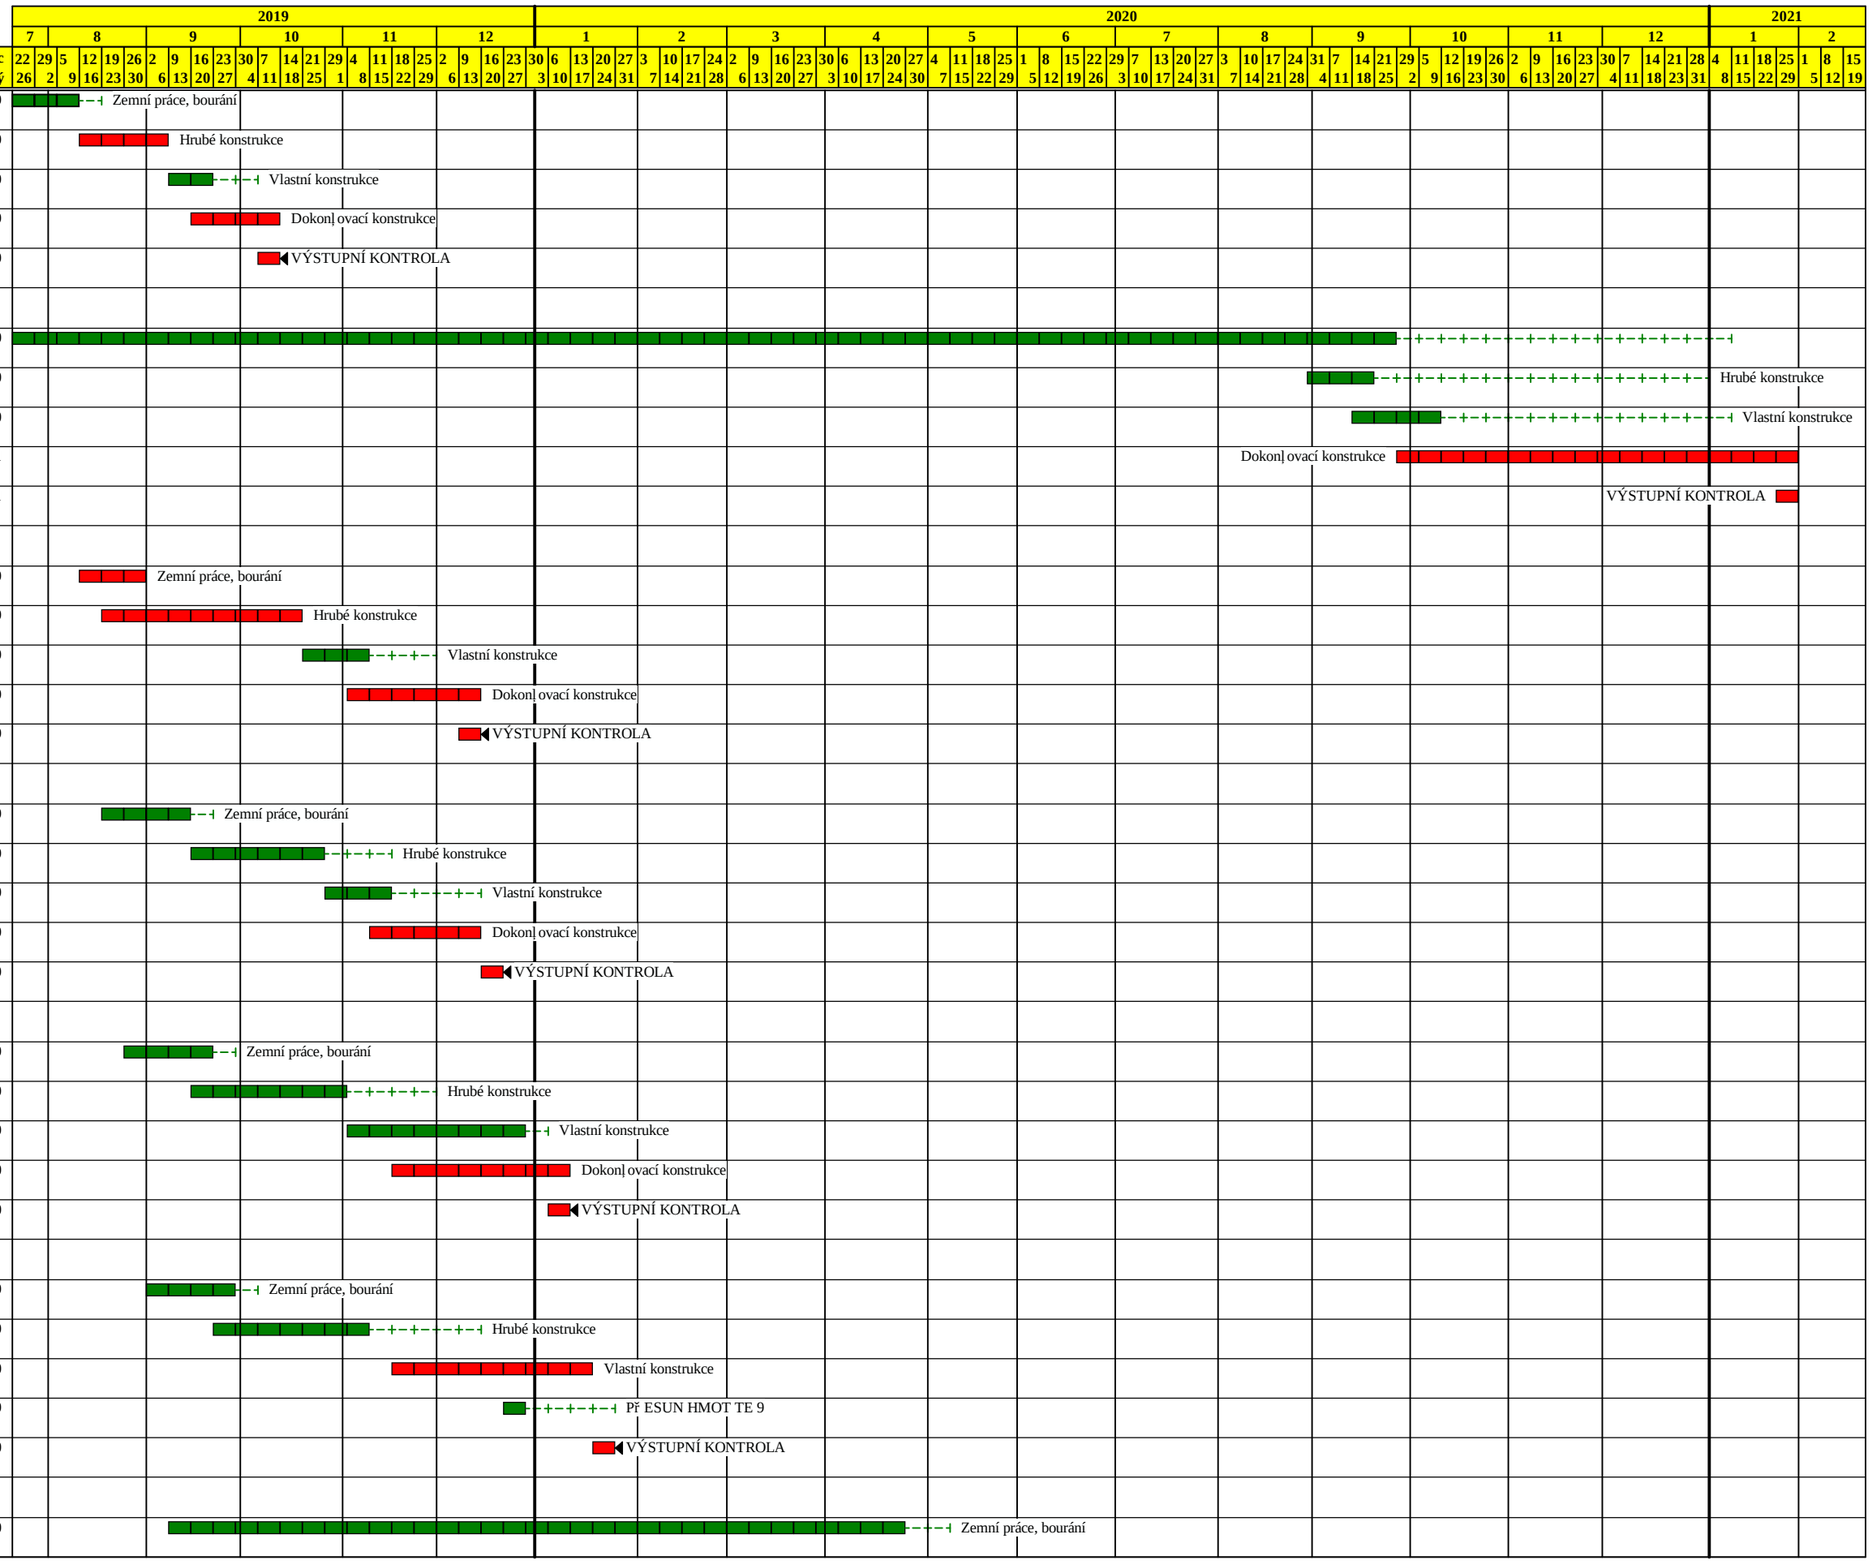

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -

CONTEC - Časový graf akce: 0FINVAR2 Prádelna nem.České Budějovice

6.11.19 SO06 hl. objekt

Index Dodav.	Název činnosti Směnnost	Pracovníků	Doba [týd.]	Rez.	Začátek možný	Konec možný
60010	Zakládání 1 SO06 hl. objekt	4	24	0	30.9.19	13.3.20
60020	Spodní stavba 1 SO06 hl. objekt	2	4	13	2.3.20	27.3.20
60030	Hrubá vrchní stavba 1 SO06 hl. objekt	4	28	13	29.10.19	7.5.20
60040	Střecha 1 SO06 hl. objekt	5	41	11	13.1.20	23.10.20
60050	Příčky,hrubé instalace 1 SO06 hl. objekt	9	30	17	23.3.20	16.10.20
60060	Omítky a potěry 1 SO06 hl. objekt	7	31	3	6.4.20	6.11.20
60070	Podlahy, povrchy, techn. 1 SO06 hl. objekt	3	32	3	18.5.20	23.12.20
60080	Vnitřní kompletace 1 SO06 hl. objekt	3	29	0	27.7.20	12.2.21
60090	Vnější úpravy 1 SO06 hl. objekt	3	45	1	30.3.20	5.2.21
60095	VÝSTUPNÍ KONTROLA 1 SO06 hl. objekt	1	1	0	15.2.21	19.2.21

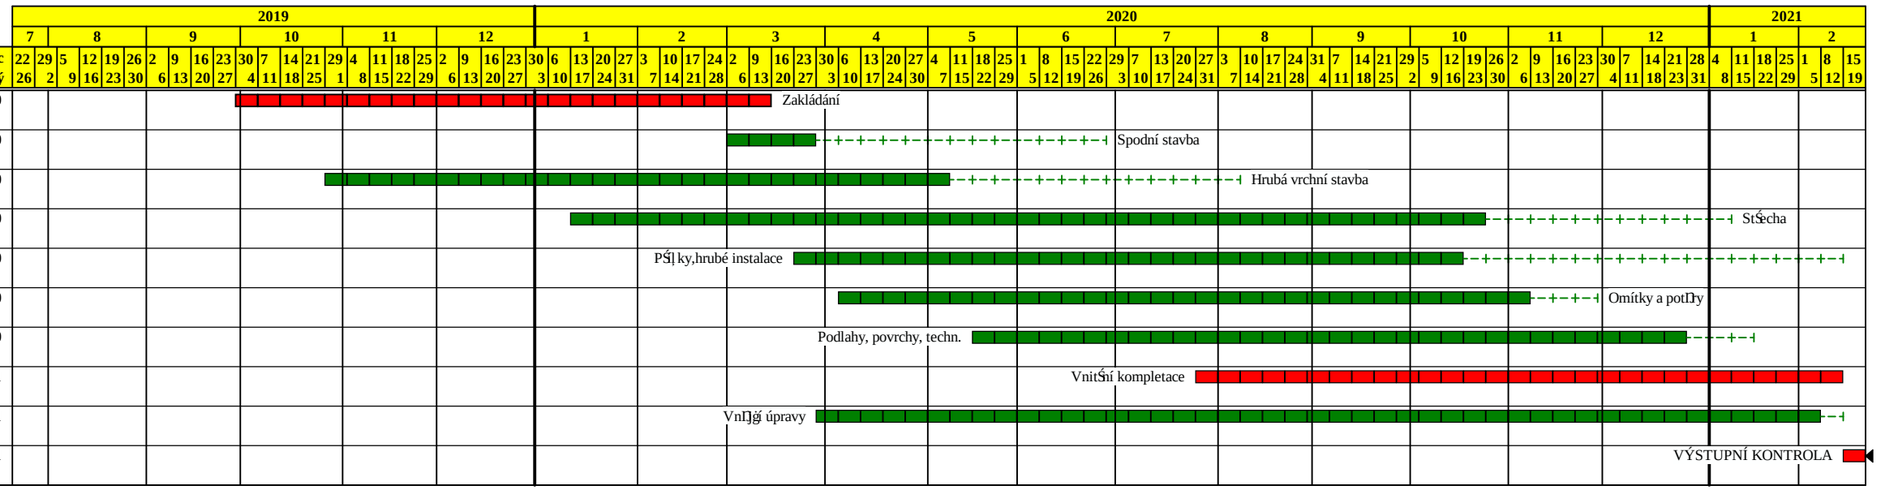

Činnost: kritická - , zpožděná - , s rezervou - , rezerva - , milník - , vynucený termín -
